

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXVII

n. 19

## RELAZIONI

### DEI COMMISSARI STRAORDINARI DELEGATI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PRO- GRAMMA FINALIZZATI ALLA PROGRAMMA- ZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

*(Articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26)*

*Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

**(GALLETTI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 28 gennaio 2015*

---

**VOLUME I**

**RELAZIONI ANNUALI PER IL 2013**

PAGINA BIANCA





*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

## Relazione annuale anno 2013

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 8 marzo 2011

08/03/2013

Commissario Straordinario Delegato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo

Ing- Emilio Santori

PAGINA BIANCA

**1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA***( Compilare i campi sottostanti)*

<b>Regione</b>	Abruzzo
<b>Commissario straordinario delegato</b>	Ing- Emilio Santori
<b>Decreto nomina</b>	<b>8 marzo 2011</b>
<b>Data sottoscrizione Accordo</b>	<b>16 settembre 2010</b>
<b>Data sottoscrizione Accordo Integrativo</b>	<b>I Atto Integrativo del 6/2/2013</b> <b>II Atto Integrativo del 4/12/2013</b>
<b>Importo complessivo assentito in Accordo orig.</b>	<b>€ 40.750.000,00</b>
<b>Importo complessivo assentito in I Atto Int.</b>	<b>€ 30.750.000,00</b>
<b>Importo addizionato con II Atto Int.</b>	<b>€ 900.000,00</b>
<b>Importo programmato per il periodo (anno 2014)</b>	<b>€ 28.237.052,08</b>
<b>Importo speso per il periodo (anno 2013)</b>	<b>€ 3.045.200,28</b>
<b>Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2013)</b>	<b>€ 31.650.000,00</b>

## 1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

*Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.*

*Riguardo il contesto ambientale della Regione Abruzzo, all'interno della quale si collocano tutti gli interventi di gestione di questo commissariamento, si rimanda alla precedente Relazione Annuale, in testa alla quale è descritto (in forma sintetica) lo stato geomorfologico e ambientale di riferimento.*

*Una brevissima ricapitolazione può essere la seguente:*

*L'Abruzzo conforma una regione fisicamente caratterizzata da una famiglia di rilievi appenninici che si addossano gli uni sugli altri. In alcuni casi – come per le gole di Celano e l'alto bacino dell'Aventino – questi rilievi si accavallano in derivazione del raddoppio tettonico, allungandosi come fronti di onde orogenetiche, con partenza da NO e arrivo a SE, dunque procedenti dal Tirreno all'Adriatico. In tempi remoti, tra cresta e cresta si sono formate alcune vaste aree depressionarie, in genere di età tardo-pliocenica, attualmente livellate sia da coltri di materiali alluvionali, sia da sedimenti di alcune generazioni lacustri, argille di dissoluzione calcarea. I rilievi calcarei delimitano i margini delle pianure, cui sono raccordati quasi sempre con scarpate di faglia inverse sui forti declivi dei fianchi occidentali, con scarpate di faglia dirette sui meno ripidi fianchi orientali, con una serie di terrazzamenti sedimentari fluviali e lacustri, per lo più sollevati dalla neo-tettonica quaternaria, o da detriti di falda e da conoidi torrentizi. Questa particolare strutturazione, ampiamente sedimentaria e alluvionale, del territorio regionale, ha conformato un ambiente altamente soggetto a smottamenti, straripamenti e alterazioni varie del tessuto geomorfologico.*

*In data 01.02.2013, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013 sono stati trasferiti ulteriori fondi alla contabilità speciale aperta a mio nome, a valere sull'avvio degli altri interventi di Difesa del Suolo. Ricordo che gli interventi di Difesa dei Fiumi, aggiunti di uno pertinente la Difesa del Suolo, sono già stati avviati e quelli di Difesa della Costa sono programmati a valere sui fondi FAS, mai trasferiti. Con l'arrivo dei nuovi fondi, come sopra citato, è dunque stata sancita la circostanza di ampliamento delle azioni a me ascritte con un ritardo di oltre due anni dalla mia nomina. Si tratta, come anticipato con la nota MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche (relativa all'allora prefigurato trasferimento della somma complessiva di € 10.017.229,24), pervenuta all'Ufficio commissariale fin dal 27.09.2012 (acquisita con Prot. 291-2-3/CS del 28.09.2012), nella quale si rappresentava che il relativo mandato era stato inviato al competente Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di legge.*

*L'attività di preparazione delle azioni per la messa in cantiere delle opere residue di Difesa del Suolo (in sostanza, la quasi completezza, tranne l'opera n° 5 che era stata avviata per motivi di particolare urgenza, come meglio specificato in seguito), è stata avanzata immediatamente dopo la ricezione dell'importo di cui sopra detto. Sono stati eseguiti, a buon fine delle azioni, sopralluoghi nelle aree dissestate, a cura dell'Ufficio commissariale, in maniera da rilevare l'entità dei danni e le eventuali maggiorazioni dei dissesti. Questo per attestare eventuali nuove esigenze territoriali emergenti (es: rilevazione di maggior danno su specifiche aree, per via di cause calamitose) che avrebbero potuto richiedere la parziale revisione delle programmazioni.*

*D'altro canto e come già detto nella precedente Relazione Annuale, al fine di affrontare con meticolosità ogni azione, ho disposto il controllo esaminativo dei luoghi – tramite sopralluoghi esplorativi affidati al personale competente del mio Ufficio di supporto – fin dalle fasi di organizzazione del lavoro. Questi generi di sopralluoghi hanno avuto seguito, al fine di monitorare il lavoro in itinere.*

*Va precisato che la somma complessiva di € 10.017.229,24, come dal citato ultimo accredito, non è totalizzante rispetto all'importo necessario alla copertura del fabbisogno, necessitando questo di un importo complessivo di €*

10.750.000,00. Lo scarto, pari a € 732.770,76 è imputato al residuo tra il totale delle somme precedentemente pervenute alla Contabilità Speciale aperta a mio nome e le somme finora impegnate per l'attuazione degli interventi in essere (rif. Precedenti Relazioni Annuali).

Ho disposto che la quasi totalità dei nuovi interventi fosse gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Al fine di rendere possibile la velocizzazione delle azioni, derivata soprattutto dal ritardo con cui sono stati trasferiti i fondi necessari, ho predisposto due Avvisi Pubblici, denominati "bando integrale per la costituzione di un elenco imprese da invitare a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara" e "bando integrale per la costituzione di un elenco di professionisti, cui affidare incarichi professionali", emanati sul Sito del MATTM alla sezione Bandi, per l'attrazione di candidature utili a procedere celermente ad affidamenti, tramite procedure pubbliche facilitate (affidamento diretto sotto soglia e affidamento con procedura negoziata sotto soglia). Questo garantisce una maggiore rapidità di svolgimento delle azioni, al fine di pervenire in tempi rapidi alla cantierizzazione degli interventi, così tentando, almeno in parte, di attenuare lo slittamento d'esecuzione (rif. Gantt slittamenti e ritardi) per assenza di fondi.

Quando erano già avviate le procedure amministrative propedeutiche all'attuazione degli interventi, nel corso del 2013, con il I Atto Integrativo all'Accordo di Programma, stipulato in data 06.02.2013 ed approvato con Decreto del MATTM del 14/02/2013 Prot. n. 4049/TRI/DI, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Abruzzo, lo stato di consistenza (in numero) degli interventi a me affidati ha subito una mutazione.

Infatti, tale I Atto Integrativo all'Accordo di Programma è stato finalizzato a consentire l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse PAR-FAS regionali secondo le procedure concordate in sede di Comitato di indirizzo e controllo, nonché a ratificare la variazione di fonte finanziaria di alcuni interventi inseriti nell'Accordo di Programma 16.09.2010, al fine di identificarne nettamente la fonte finanziaria se ministeriale o regionale, lasciando comunque invariate le rispettive quote previste dall'Accordo medesimo.

Nella fattispecie, sono stati sottratti alla mia gestione, due interventi di difesa del suolo e l'insieme degli interventi di difesa della costa, tutti passati in gestione diretta da parte della Regione Abruzzo. Rimane a mio carico il monitoraggio dei citati interventi, al fine di garantirne la fluida esecuzione.

Con il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma, stipulato in data 04.12.2013 ed approvato con Decreto del MATTM del 04/12/2013 Prot. n. 4755/TRI/DI/G è stato affidato al Commissario l' "Intervento di chiusura dei varchi in sponda destra del fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" pari a € 900.000,00. Sarà cura del Commissario Straordinario a dare avvio nel modo più celere, entro i primi giorni del mese di gennaio 2014, l'intervento.

Si tratta dei seguenti:

Intervento denominato "Consolidamento e risanamento idrogeologico" nel Comune di Corfinio (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Intervento denominato "Capoluogo Borgo Pagliara Vecchia: rete drenante, stabilizzazione... - frazione Ceriseto: consolidamento" nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Martinsicuro (TE). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 3.000.000,00.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 3.000.000,00.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Francavilla al Mare (CH). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 2.000.000,00.

Gli interventi rimasti in capo alla mia gestione commissariale sono riportati di seguito (per ognuno è indicato il titolo, l'ambito amministrativo, l'ambito di attribuzione per la tipologia di difesa, l'importo e una breve descrizione del

dissesto in relazione all'intervento in previsione o in esecuzione o eseguito. Al termine di ognuno, è indicato sinteticamente lo stato di attuazione, rimandando – per precisazioni in merito – a quanto dettagliato più avanti in questa Relazione):

*Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" nel Comune di Carsoli (AQ). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 5.000.000,00*

*Il Torrente Vallemura, nel transito all'interno del Comune di Carsoli, presenta un'insufficienza del letto di portata, generando disagi e frequenti allagamenti, specie nelle stagioni piovose e di scioglimento delle nevi.*

*Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di espansione della capacità di mc 500.000, oltre che rinforzi delle arginature e vari interventi di difesa degli spondali. In aggiunta, sono previste opere di presa e restituzione controllata delle acque, al fine di regimentare le portate transitanti.*

*Lo stato di attuazione: si sta avanzando con l'organizzazione delle procedure di esproprio, mentre si attendono da tempo alcuni pareri ambientali (da parte degli Uffici della Regione, competenti in materia) necessari alla chiusura della Conferenza di Servizi.*

*Intervento denominato "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" nel Comune de L'Aquila. Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo di 3,8 Ml di Euro*

*Il fiume Aterno, in prossimità della confluenza col torrente Raio e praticamente all'altezza del nucleo industriale della città de L'Aquila, possiede una ingente portata, ostacolata anche dalla ostruzione di alcune sezioni di deflusso. In particolari periodi dell'anno e in condizioni meteo avverse, si determina lo straripamento delle acque, anche investendo pericolosamente le prossime aree dove sono siti gli impianti industriali.*

*Il progetto prevede la realizzazione di opere idrauliche e di ingegneria naturalistica, per la riapertura delle sezioni di deflusso, oltre che opere complementari necessarie a regimentare l'intero sistema.*

*Lo stato di attuazione: l'intervento, in avanzata esecuzione, ha subito un momentaneo arresto a causa di alcune interferenze emerse nel corso dei lavori.*

*Intervento denominato "per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara. Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 3.600.000,00*

*In un'ampia area praticamente interna alla città di Pescara, l'omonimo fiume provoca spesso allagamenti diffusi, a danno delle limitrofe aree insediate e delle ingenti infrastrutture di collegamento tra gli argini. Questa condizione di dissesto si è sviluppata in tempi rapidi, per il probabile effetto della variazione di portata del corso d'acqua.*

*Il progetto prevede la sistemazione del corso d'acqua tramite adeguamento delle sezioni di deflusso e della capacità di trasporto dell'alveo. Inoltre prevede la messa in opera di nuove arginature e altri interventi di supporto con tecniche di ingegneria naturalistica.*

*Lo stato di attuazione: l'intervento è in avanzato stato di attuazione.*

*Intervento denominato "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano" nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 3.600.000,00*

*Il fiume Vomano, nel percorso di attraversamento dei comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi, presenta frequenti esondazioni per via dei sovralluvionamenti in alveo.*

*Si prevede il ripristino delle difese spondali tramite gabbionate e/o ricarichi arginali. Si tratta di opere diffuse di ingegneria naturalistica.*

*Lo stato di attuazione: concluse le fasi progettuali, cui è seguita la Conferenza di Servizi, si è dato il via alle fasi di espropriazione. Queste ultime hanno determinato un certo rallentamento a causa di osservazioni da parte di un'azienda agricola che insiste ampiamente sull'area in espropriazione. E' in esame una possibile soluzione che prevede una breve traslazione di una porzione del progetto, a vantaggio di economie derivanti dal minor costo di esproprio.*

*Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (CH). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 5.000.000,00*

*In prossimità della confluenza del torrente Dendalo col fiume Foro, la capacità dei letti non è sufficiente a contenere le portate di transito. Ciò determina diffusi allagamenti, con pericolo di smottamenti e decompressioni del piano di campagna.*

*Si prevede la realizzazione di due vasche di espansione (una di grandi dimensioni e una di minore ampiezza), poste rispettivamente a monte e a valle del dissesto. L'obiettivo è contenere circa 1.000.000 di metri cubi. Sono da aggiungersi opere varie di difesa spondali e miglioramento di tratti delle arginature.*

*Lo stato di attuazione: la complessità dell'opera, soprattutto in relazione all'ambiente nel quale è destinata ad insediarsi, ha imposto particolare attenzione alla fase di progettazione. Si è in procinto di organizzare la Conferenza di Servizi.*

*Intervento denominato "Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Valone" nel Comune di Aielli (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.*

*Materiali detritici e argillosi, prodotti nel tempo dalle mutevoli condizioni geofisiche del territorio, hanno causato un evidente dissesto all'interno del Comune di Aielli, con rischio di smottamenti a danno del complesso più abitato.*

*Si prevede di realizzare opere di contenimento con paratie armate, previa rimozione dei materiali sedimentari sciolti. Inoltre, si prevede la chiodatura della parete rocciosa e il relativo rivestimento con rete metallica.*

*Lo stato di attuazione: è in definizione l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).*

*Intervento denominato "Sistemazione versanti del Centro Storico" nel Comune di Roccasale (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.*

*L'intero nucleo abitato del Comune di Roccasale è situato su un solo versante montuoso, con pendenza sostenuta. Fatto salvo il dissesto relativo a delocalizzati smottamenti di modesta entità, quello che appare problematico è il disagio strutturale del corso di regimentazione delle acque meteoriche che attraversa l'intero comune, da monte a valle. Disagio che potrebbe, in tempi rapidi, tradursi in grave forma di alterazione dell'equilibrio complessivo del sito.*

*Pertanto, oltre alla necessità di porre in sicurezza quattro ambiti diversamente dissestati (con rete metallica di contenimento, chiodature di parete rocciosa, modesta palificata con micropali, brevi tratti a tirante), quello che costituirà il focus dell'opera è la sistemazione complessiva del canale in c.a. e delle relative diramazioni di regimentazione.*

*Lo stato di attuazione: è in definizione l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).*

*Intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorio" nel Comune di Raiano (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.*

*L'abitato di Via per Vittorio, interna al Comune di Raiano, presenta un cedimento per slittamento dell'intera area collinare posta a valle. Slittamento che ha determinato nel tempo fenomeni di eccessiva compressione dell'area più irta posta a monte della stessa strada, con conseguente dissesto anche delle pregresse strutture di contenimento.*

*Sono previsti interventi di salvaguardia delle strutture preesistenti tramite recupero strutturale e rinforzo armato, nonché gabbionate in corrispondenza delle aree della scarpata a pendenza maggiore.*

*Lo stato di attuazione: è in definizione l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).*

*Intervento denominato "Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta – Intervento di risanamento del dissesto idro-geologico del centro abitato" nel Comune di Caramanico Terme (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.*

*Il centro abitato del Comune di Caramanico Terme s'erge al di sopra di un rilievo prevalentemente roccioso, comunque posto all'interno di una grande vallata caratterizzata da natura parzialmente solfatica del substrato. Le composizioni geofisiche della parte a rilievo e di quella valliva, presentano dunque differenze consistenti che hanno determinato, nel tempo, fenomeni di dissesto con pericolo per la pubblica incolumità.*

*L'intervento in attuazione riguarda la sagomatura dei versanti tramite gabbionate e terre armate, oltre che il rifacimento delle precedenti briglie danneggiate e opere di regimentazione delle acque superficiali.*

*Lo stato di attuazione: l'intervento è in avanzato stato di attuazione. Le opere sono in compimento definitivo.*



*Intervento denominato "Consolidamento movimento franoso" nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.*

*Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore presenta un dissesto a valle del nucleo principale, in area non particolarmente ripida. La composizione del terreno è del tipo sciolto (in prevalenza) e, per questo, facilmente soggetto a scivolamento. Pur se in prossimità dell'area di dissesto sono presenti pochi edifici, la localizzazione del danno è tale da suscitare attenzione per la più compatta area abitata posta a monte.*

*Sono previste opere diffuse di drenaggio del terreno e di consolidamento con diverse tecniche, anche di ingegneria naturalistica.*

*Lo stato di attuazione: è in definizione l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).*

*Intervento denominato "Completamento risanamento idrogeologico Roccacaramanico – consolidamento/risanamento frazione San Giacomo" nel Comune di Sant'Eufemia a Maiella (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.*

*Le frazioni Roccacaramanico e San Giacomo del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, sono investite da dissesto evidente, dovuto allo scorrimento delle pareti rocciose più esterne ai grossi rilievi di localizzazione, rispetto al substrato. Ciò ha determinato problematiche di distacco rotatorio, oltre che di decompressione destabilizzante. La situazione di dissesto è evidente anche dalle ampie lesioni che riportano gli edifici più prossimi.*

*Si prevedono la stabilizzazione del versante con opere di ingegneria naturalistica, interventi di ricostruzione orografica, catenarie e consolidamenti vari.*

*Lo stato di attuazione: è in definizione l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).*

*Intervento denominato "Consolidamento versante ovest del Centro Storico" nel Comune di Castelli (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.*

*Il Comune di Castelli è sito al di sopra di un enorme pendio, molto ripido. Interventi eseguiti nel passato, hanno garantito la stabilità del centro abitato tramite ingenti costruzioni di sostegno a parete della scarpata, complete di arcate, anche per il drenaggio delle falde acquifere. Tuttavia, più recenti fenomeni geofisici hanno spostato le azioni di dissesto oltre la citata opera di sostegno, interessando l'area più estrema del paese e non protetta.*

*L'azione di stabilizzazione va eseguita con la continuazione dell'opera di sostegno, anche compattando i due interventi tramite opportune catenarie. Si ravvisa, in ogni caso, l'esiguità della somma imputata a questo intervento rispetto alle necessità emerse in sede di sopralluogo. Pertanto, l'azione possibile sarà limitata e, pur potendo contribuire al miglioramento della staticità complessiva, non potrà essere considerata esaustiva.*

*Lo stato di attuazione: è in definizione l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).*

*Intervento denominato "Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa Carosi" nel Comune di Civitella del Tronto (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 750.000,00.*

*Il dissesto evidente nel comune di Civitella del Tronto, localizzato in un'area a borgo nella quale insistono alcune abitazioni, riguarda lo slittamento dell'intera scarpata a valle di Villa Carosi. La decompressione del suolo che si è venuta a creare al livello di campagna, ha determinato ingenti danni agli edifici, con situazione di elevata pericolosità per la pubblica incolumità.*

*Si prevede la realizzazione di palificate molto profonde e paratie, a completamento di interventi parziali già eseguiti nel recente passato. Tali interventi, settorializzati e non collegati tra loro, hanno infatti prodotto lo smottamento degli strati superficiali nelle direzioni libere, con conseguente rotazione delle aree insediate.*

*Lo stato di attuazione: è in definizione l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).*

*Intervento denominato "Consolidamento corona di frana" nel Comune di Treglio (CH). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.*

*In zona prossima al nucleo abitato del Comune di Treglio, si è prodotto un costone di frana, generando gradi di pericolosità elevata. Qui, la disponibilità di un pregresso studio geologico ha evidenziato la sedimentazione di diversi materiali, con conseguente riduzione di attrito stabilizzante.*

*Le previsioni iniziali (la difesa del ciglio di frana con berlinese di pali speciali di piccolo diametro, oltre che chiodature passive, reti armate e riforestazione) hanno subito una necessaria mutazione, in ragione di un movimento franoso registratosi agli inizi del mese di dicembre 2013 (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).*

*Lo stato di attuazione: data la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ho richiamato lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel codice degli appalti.*

*Intervento denominato "Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Ambligh" nel Comune di Vasto (CH). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.*

*La Loggia Ambligh, corrisponde al grande terrazzamento che apre verso il mare il centro abitato del Comune di Vasto. Si tratta di un'opera importante, che recentemente ha subito fenomeni decompressori con conseguente danno ad edifici e alla pavimentazione. Analogamente, il costone orientale di Piazza Marconi ha mostrato cedimenti piuttosto preoccupanti, data la elevata posizione orografica.*

*Le previsioni iniziali (placcaggio della falesia sub verticale tramite geo-rete, oltre che la realizzazione di gradonate rinforzate in terra e sistemi di regimentazione e drenaggio delle acque. Il tutto, aggiunto della piantumazione di essenze arboree stabilizzanti) hanno subito una necessaria mutazione, in ragione di un movimento franoso registratosi nel mese di dicembre 2013 (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).*

*Lo stato di attuazione: data la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ho richiamato lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel codice degli appalti.*

*A seguito del I Atto Integrativo all'Accordo di Programma, dunque, gli interventi in mia totale gestione sono passati da venti a quindici, cinque dei quali imputati alla Difesa dei Fiumi e dieci alla Difesa del Suolo.*

*Per maggiori specifiche, rimando al paragrafo 1.7.*

### **1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI**

*Descrivere la struttura commissariale sia dal punto di vista logistico sia come risorse umane.*

*La struttura commissariale è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. Pertanto e come detto anche nella precedente Relazione Annuale – fermo restando che la relativa creazione è stata possibile solo a seguito del DPCM aggiuntivo del 20 luglio 2011, a me notificato il 7 dicembre 2011, che all'Art. 5 destina la quota dell'1,5% delle risorse assegnate all'acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento dell'incarico – la conformazione conta figure amministrative (senior e Junior, già interne alla PP.AA.) per la gestione degli aspetti propri del mestiere con inclusione di quelli contabili, figure tecniche (senior e junior) per l'attuazione dei Cronoprogrammi (ivi inclusi la gestione delle questioni di controllo tecnico su campo e di esame degli atti progettuali nonché di gestione dei rapporti con le figure dei RUP), figure legali, con competenze fondamentali per le attività commissariali, figure di supporto.*

*Nel dettaglio, il personale è il seguente (al fianco di ogni figura è riportata la durata dell'incarico e l'oggetto del rapporto):*

- *Ragioniere ENNIO ANTONETTI 1/1/2012 – 8/3/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti amministrativi, contabili e di gestione dell'Ufficio Commissariale"*
- *Architetto ELODIA ROSSI 9/2/2012 – 8/3/2014 "Attuazione del Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo"*
- *Architetto SARA FRANCESCON 9/2/2012 – 9/2/2011 - 8/3/2014 "Attuazione del Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo"*
- *Dottor GIUSEPPE COSENTINO 1/2/2012 - 8/3/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti della gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio Commissariale" – già dirigente MATTM*
- *Avvocato MASSIMO PALLINI 19/3/2012 – 8/3/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti legali e amministrativi dell'Ufficio Commissariale"*
- *Avvocato LEONARDO SALVEMINI 19/3/2012 – 8/3/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti legati al codice degli appalti pubblici dell'Ufficio Commissariale"*
- *Ragioniere GIUSEPPE BUSCEMA in posizione di distacco dal MATTM con funzioni*
- *Signora Anna Monti, in posizione di distacco dal MATTM.*
- *Sig. Mario Imbrogno in posizione di distacco proveniente dall'Ispra*

*Questa fondamentale azione di reclutamento è stata operata nel rispetto del budget disposto dal DPCM integrativo prima richiamato.*

*Ogni considerazione aggiuntiva in merito all'organizzazione della struttura commissariale può essere tratta anche dalla precedente Relazione Annuale.*

*Appare importante ribadire che le risorse umane sono state acquisite*

- *direttamente, per quel che attiene il personale già occupato all'interno della PP.AA.;*
- *tramite regolare concorso (con preventiva pubblicazione all'interno del sito Ministeriale e di testate giornalistiche, ai sensi di legge), per l'acquisizione delle risorse esterne alla PP.AA., ma ritenute necessarie al*

*completamento delle necessità della struttura, comunque solo dopo aver verificato la non disponibilità di analoghe competenze all'interno del pubblico.*

*Logisticamente, la struttura è insediata in Uffici concessi dal MATTM e consistenti in due ambienti posti al Piano ottavo.*

**SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE**

Dichiarare quanto è stato versato sulla c.s. dal Ministero dell' Ambiente, dalla Regione, o da altre fonti sia con importo corrente che cumulato, lo speso, i relativi residui.

<b>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente</b>			
<b>Importo corrente (per l'anno 2013)</b>	<b>Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</b>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
€ 900.000,00	€ 31.650.000,00	€ 3.412.947,92	€ 28.237.052,08

<b>Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare)</b>			
<b>Importo corrente (per l'anno 2013)</b>	<b>Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</b>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**1.4. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA**

Indicare per ciascuna delle attività indicate nella seguente tabella il relativo stato di rendicontazione della spesa, considerando esclusivamente quanto effettivamente pagato.

<b>Descrizione attività</b>	<b>Importo speso corrente (per l'anno 2013)</b>	<b>Importo speso cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</b>
struttura commissariale	€ 107.748,10	€ 212.469,96
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	€ 2.937.452,18	€ 3.200.477,96

**1.5. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE**

*Allegare il prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013.*

CONTABILITA' SPECIALE N. 5631 APERTA PRESSO LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA - DENOMINATA "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO ABRUZZO" Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0081278 del 13/07/2011 a favore del Commissario straordinario delegato responsabile della gestione delle risorse per la realizzazione degli interventi del rischio idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo (Accordo di Programma del 16/09/2010) - (Ing. Emilio Santorì nominato con DPCM del 08/03/2011 registrato dalla Corte dei Conti il 13/06/2011)

TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - 2013	IMPORTO
Da Regione Abruzzo derivanti da anteriore trasferimento del MATTM alla medesima Regione Prov. Cap 8531-03 epr 2010	€ 6.219.831,23
Da Regione Abruzzo derivanti da anteriore trasferimento del MATTM alla medesima Regione Cap 8531-03 epr 2010 e parte Cap 8582 - 01 epr 2009 e cap 8531 - 01 epr 2009	€ 14.512.939,53
Da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Il Atto integrativo all'Accordo di Programma del 16 settembre 2010	€ 900.000,00
<b>TOTALE fondi trasferiti dalla Regione ma di provenienza MATTM sulla C.S. del Commissario</b>	<b>€ 20.732.770,76</b>
<b>TOTALE fondi trasferiti di provenienza MATTM sulla C.S. del Commissario</b>	<b>€ 10.917.229,24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI FONDI MATTM di cui all'ADP del 16.09.2010</b>	<b>€ 31.650.000,00</b>
Pagamenti 2011	€ 74.675,60
Pagamenti 2012	€ 293.072,04
Pagamenti 2013	€ 3.045.200,28
Totale Pagamenti al 31/12/2013	€ 3.412.947,92
<b>Saldo al 31 dicembre 2013</b>	<b>€ 28.237.052,08</b>

**1.6. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'****1.7.1 Descrizione delle attività**

*Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti realizzatori e rilevare gli eventuali ritardi/criticità rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento.*

*A seguito del I Atto Integrativo all'Accordo di Programma, come più volte richiamato, gli interventi in mia totale gestione sono passati da venti a quindici, cinque dei quali imputati alla Difesa dei Fiumi e dieci alla Difesa del Suolo.*

*Per alcuni degli interventi (in particolare, quelli per i quali era stata avviata una procedura di interlocuzione prima che fosse resa possibile la creazione della struttura commissariale), è stata scelta la strada dell'Avvalimento a valere su Amministrazioni territoriali competenti.*

*Degli interventi assoggettati a convenzione di avvalimento e di quelli gestiti direttamente dal mio ufficio si riporta, a seguire, una descrizione sintetica e cronologica delle principali attività riguardanti l'andamento dei lavori, relativamente all'anno 2013.*

*Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" nel Comune di Carsoli (AQ).*

*Ambito: Difesa dei Fiumi*

*Importo € 5.000.000,00*

*Convenzione di Avvalimento: firma avvenuta in data 27/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Carsoli (AQ).*

*Alcuni dati e informazioni sostanziali per l'inquadramento delle attività:*

*Nell'intenzione di equilibrare la spesa disponibile in ragione di alcuni fabbisogni emergenti sui territori interessati al dissesto, parte dei fondi pertinenti questa opera (per la quota di 2 ML di Euro) sono stati posti temporaneamente a disposizione di altro intervento particolarmente urgente (Difesa del Suolo). Pertanto si è proceduto verso l'organizzazione e l'esecuzione di un Primo Stralcio dei lavori di cui alla presente opera, per complessivi 3 ML di Euro.*

*Il Comune, al momento dell'Avvalimento, era già in possesso di uno Studio di Fattibilità abbastanza approfondito che è stato tenuto in considerazione, senza aggravio di costi (oneri progettuali) per il Commissariamento, essendo questo studio pre-datato rispetto alla mia nomina.*

*Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:*

QUADRO ATTUAZIONE			
FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
<i>Affidamento Progettazione (preliminare, definitiva,</i>	<i>Gara basata sull'individuazione dell'offerta economicamente</i>	<i>Il bando di gara è stato pubblicato nella settimana del 22-27/10/2012 con</i>	<i>N. offerte pervenute (al 07.12.2012 - scadenza del bando): 22 Composizione della Commissione di gara (nominata il 17.01.2013): Presidente: Ing. Quinto D'Andrea;</i>

<b>esecutiva), direzione lavori e coordinamento della sicurezza, esecuzione lavori</b>	<b>più vantaggiosa.</b>	scadenza 07.12.2012. Prevede che entro 6 mesi dalla stipula del contratto vengano completate le attività progettuali.	<u> Membri:</u> Ing. Giuseppe Venturini, Dirigente del Locale Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), e Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica del Fucino; <u> Segretario:</u> Geom. Mario Labianca <i>N. sedute della Commissione di gara:</i> 7 sedute dal 19.01.2013 al 21.03.2013;
<b>Aggiudicazione e stipula contratto Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), direzione lavori e coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori</b>	<b>Aggiudicatario:</b> RTI Raggruppamento Temporaneo (mandataria BETA Studio S.r.l. mandante C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.)	Aggiudicazione provvisoria: in data 21.03.2013 Aggiudicazione definitiva: con determina n.142 del 16.04.2013  Consegna sotto riserva di legge in data 23.04.2013	Tempi di accettazione delle offerte e di valutazione delle stesse: 3 mesi e mezzo I servizi tecnici per l'importo complessivo di Euro 500.000, così come previsto dal Quadro Economico di Progetto, sono stati offerti con un ribasso del 28% ed, inoltre, è stato offerto anche un ribasso sul tempo pari al 30%; pertanto, i servizi che dovevano svolgersi complessivamente per un periodo di tempo di mesi 6 si riducono circa a 4, con un significativo recupero sulla tempistica;  Ancora in attesa della documentazione antimafia da parte della Prefettura di Padova Dal verbale di consegna del 23.04.2013 si evince che entro la fine di luglio 2013 dovrà risultare completata la progettazione preliminare e definitiva dell'intero nodo idraulico;
<b>Acquisizione e approvazione Progetto Preliminare</b>		Consegnato in data 28.08.2013	In data 20.06.2013 è stata consegnata una prima versione del progetto preliminare ma sono state richieste integrazioni e modifiche. In data 02.10.2013 la Società Beta Studio Srl ha consegnato gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio, ad integrazione del Progetto Preliminare consegnato in data 28.08.2013
<b>Acquisizione e approvazione Progetto Definitivo</b>		Consegnato in data 04.10.2013.	
<b>Approvazione Progetto Definitivo</b>		Approvato in Conferenza di servizi del 11.12.2013 nelle more del completamento della procedura VIA e dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica	In data 29.10.2013 è stato discusso il Progetto Definitivo in Conferenza di servizi. È stato inviato un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso; richiesta motivata dalle particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della Conferenza di servizi decisoria) all'approvazione del Progetto Definitivo. Il Rup ha deciso di avviare la procedura di VIA affidando a Beta Studio S.r.l. la redazione del SIA il cui contratto è in corso di predisposizione. Alla scadenza dei termini di pubblicazione relativa alla procedura espropriativa prevista per il giorno



		07.11.2013 sono pervenute osservazioni da parte di alcuni privati.
--	--	--

Intervento denominato **"per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara.**

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Convenzione di Avvalimento siglata in data 18/11/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Comune di Pescara.

Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:

QUADRO DI ATTUAZIONE			
FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
Progetto preliminare		Approvato Con Delibera di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011	Il progetto preliminare è stato redatto da tecnici interni all'Ente
Affidamento Progettazione definitiva	Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo del D. Lgs. n.163/2006	Affidata con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011 alla Società BETA STUDIO s.r.l.	Per un importo complessivo di Euro 40.268,80 (IVA e oneri compresi al lordo della ritenuta d'acconto)  In data 12.01.2012 è stata stipulata la Convenzione di incarico per l'attività di redazione del Progetto Definitivo tra la Società BETA Studio e il Comune di Pescara, dalla quale si evince che la durata dell'incarico era pari a n. 35 giorni a partire dalla data di sottoscrizione;
Approvazione Progetto Definitivo		Delibera di Giunta comunale n. 691 del 25.10.2012 (le autorizzazioni e i pareri sono stati acquisiti in sede di Conferenza di servizi tenute nelle date: 11.04.2012 e 16.07.2012)	La determina a contrarre è stata fatta in data 02.11.2012, n.366, ed è stata resa esecutiva in data 06.11.2012;  Per quanto concerne la durata dei lavori il cronoprogramma del progetto definitivo (elaborato n. 7.5) prevede 224 giorni naturali e consecutivi.
Affidamento Progettazione esecutiva - esecuzione lavori	Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all'art. 53 c.2 lettera b. del D. Lgs. n. 163/2006	Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 07.12.2012	Scadenza per la presentazione delle offerte: N. offerte pervenute alla scadenza prevista dal bando (ore 13.00 del 16.01.2013): 6 Commissione interna di gara: Arch. Fabrizio Trisi in qualità di Presidente, Ing. Amedeo D'Aurelio e Ing. Giuliano Rossi in qualità di Commissari che si è riunita in più sedute a partire dal 21.01.2013 fino al 29.01.2013;

	con il <b>critero dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b>		
<b>Aggiudicazione Progettazione esecutiva – esecuzione lavori</b>	L'aggiudicataria <b>ATI DI Persio – CO.BE' s.r.l.</b> ha indicato come incaricato della progettazione la Società di Ingegneria <b>SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.</b> di Sarameola di Rubano (PD).	In data 29.01.2013 è avvenuta l'Aggiudicazione provvisoria. In data 11.03.2013 con Determinazione Dirigenziale n. 102/BR è avvenuta l'aggiudicazione definitiva all'ATI Di Persio s.r.l. – CO.BE' s.r.l. In data 14.05.2013 è stato stipulato il contratto (Rep. N. 39483) con la ditta aggiudicataria	Importo complessivo di 1.759.238,87 Euro per lavori ed Euro 41.039,81 per la progettazione esecutiva (con un ribasso pari al 5% dell'importo posto a base d'asta)  A seguito della stipula del contratto il RUP ha emesso in data 15.05.2013 l'ordine di servizio n. 1 nel quale si ordina di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, dell'opera in questione.
<b>Acquisizione e approvazione Progetto Esecutivo</b>		In data 03.07.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'opera da parte dello studio Galli Ingegneria S.p.A. Con Determinazione Dirigenziale n. 309/BR del 15.07.2013, esecutiva in data 16.07.2013, è stato approvato il progetto esecutivo	In pari data, con nota prot. n. 93149, il Progetto Esecutivo è stato trasmesso, in formato digitale alla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010
<b>Affidamento Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</b>	<b>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</b> , ai sensi degli artt. 91 c.2 e 57 c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.		La gara è stata indetta con atto Dirigenziale n. 272/BR del 16.08.2012 con importo a base d'asta di Euro 97.942,33 esclusi oneri ed IVA. Con invito a n. 5 operatori economici La procedura ha previsto la nomina di una Commissione interna di gara composta dai seguenti membri: Arch. Fabrizio Trisi in qualità di Presidente, Ing. Amedeo D'Aurelio e Ing. Giuliano Rossi in qualità di Commissari La gara si è svolta in più sedute a partire dal 14.09.2013, l'ultima è avvenuta in data 25.09.2012, con aggiudicazione definitiva alla Società Geina s.r.l.
<b>Aggiudicazione Direzione lavori coordinamento</b>		Aggiudicazione definitiva alla Società	Ribasso del 25% per un importo di Euro 73.456,75 (IVA e oneri esclusi)

<b>della sicurezza in fase di esecuzione</b>		GEINA s.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012.  In data 11.04.2013 è stato stipulato il contratto (rep. N. 39476) Ditta GEINA s.r.l.	
<b>Consegna dei Lavori</b>		In data 22.07.2013 sono stati consegnati i lavori.	Secondo quanto riportato nel verbale di consegna i lavori dovranno essere ultimati entro il 17.01.2014
<b>Affidamento Collaudo statico e tecnico amministrativo</b>	Procedura di <b>affidamento diretto</b> ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006	Affidato con Determinazione Dirigenziale n. 379/BR del 10.09.2013	Commissione di Collaudo costituita dai tecnici: Ing. Antonino Prospero (capogruppo) nella qualità di Presidente della Commissione di Collaudo, Ing. Rodolfo Mazzocca e Ing. Fabrizio Marcheggiani, nella qualità di componenti. L'importo previsto per l'Ing. Prospero è pari a Euro 15.730,00 (IVA e oneri compresi), per l'Ing. Mazzocca e l'Ing. Marcheggiani è pari a 3.901,04 (IVA e oneri compresi).
<b>Esecuzione lavori</b>		Rispetto al cronoprogramma del progetto esecutivo la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.	L'impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio Costruzioni S.r.l.) con nota prot. n. 17000 del 19.12.2013 ha richiesto una proroga, pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di una serie di motivazioni tra cui lo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere (fognature e strutture Enel). Il Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci) con nota prot n. 170847 del 20.12.2013 ha espresso parere favorevole circa la suddetta richiesta. Il RUP ha accolto la richiesta e ha concesso ulteriori giorni 60.

*Intervento denominato "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano" nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE).*

*Ambito: Difesa dei Fiumi*

*Importo € 3.600.000,00*

*Convenzione di Avvalimento siglata in data 16/12/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Provincia di Teramo.*

*Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:*

QUADRO DI ATTUAZIONE			
FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
<b>1° fase Affidamento</b>	<b>Procedura ristretta</b> ai sensi degli artt. 3	Con provvedimento dirigenziale del settore B5	<i>Importo 1° bando: 198.000 Euro. Tempistica prevista dal bando: 50 giorni per</i>

<b>Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza</b>	comma 38, 54-55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 per affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, di importo superiore a 100.000 Euro, con pubblicazione del bando di gara. Con provvedimento dirigenziale n. 107 del 19.04.2013 <b>è stata annullata la procedura ristretta</b> con la quale si intendeva affidare l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza	– Appalti e Contratti, n. 22 del 21.01.2013, è stato approvato il bando dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con scadenza 25.02.2013 per la presentazione delle offerte.	la progettazione definitiva e 40 giorni per la progettazione esecutiva.  <i>n. offerte pervenute:</i> n. 30 offerte.  <i>Importo progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza:</i> 192.012,91 Euro
<b>2° fase Affidamento Progettazione definitiva</b>	<b>Nuova procedura negoziata</b> , appalto integrato <u>esclusivamente per la progettazione definitiva</u>	Provvedimento dirigenziale n.404 del 19.04.2013 del Settore B12	Pubblicazione di un avviso di preselezione sul sito internet dell'Ente in data 22.04.2013 con scadenza 03.05.2013 <i>N. richieste di partecipazione:</i> 21 In data 06.05.2013: operazioni di disamina dei curricula pervenuti a seguito delle quali è stata inviata la lettera di invito ai candidati scelti per presentare l'offerta, individuata sulla base del miglior prezzo e del minor tempo per la realizzazione del progetto.  In data 13.05.2013: è stata indetta la gara mediante procedura negoziata tra gli operatori economici individuati attraverso l'avviso pubblico del 22.04.2013.  I soggetti invitati hanno prodotto le proprie offerte entro le ore 10.00 del 27 maggio 2013; nello stesso giorno alle ore 11.00, presso la sede dell'Ente, si sono svolte le operazioni di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario al prezzo più basso.
<b>Aggiudicazione Progettazione definitiva</b>	<b>Aggiudicatario:</b> <b>3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.</b>	Aggiudicazione provvisoria: con verbale di gara del 27.05.2013 Aggiudicazione definitiva: con provvedimento dirigenziale del Settore B5	L'aggiudicatario ha offerto il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara (90.000 Euro) pari al 70,23% (26.793 Euro) Con nota n. 169309 del 04.07.2013 del Settore B12 Viabilità e Difesa del Suolo, il RUP ha comunicato alla Società Aggiudicatario che il termine per la

		Appalti, n. 159 del 27.06.2013 è avvenuta	presentazione del Progetto Definitivo per l'appalto integrato scade in data 12.08.2013
<i>Stipula del contratto</i> <b>Progettazione definitiva</b>		Consegna sotto riserva di legge in data 23.04.2013	
<i>Acquisizione Progetto Definitivo</i>	<b>3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.</b>	Il progetto è stato consegnato in data 13.08.2013	Da una prima verifica degli elaborati è emersa la necessità di chiedere una integrazione del progetto definitivo acquisito secondo la normativa vigente (DPR n.207 del 2010); è stata inviata, in data 22.08.2013 prot. n. 204024 alla suddetta Società una richiesta di completamento alla quale non è stata data alcuna risposta; A seguito di mancati riscontri, l'Ufficio Viabilità e Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. n. 215240 del 04.09.2013, a segnalare nel dettaglio l'assenza degli elaborati progettuali necessari e ha dato un termine perentorio di 10 giorni, a far data dalla ricezione della nota suddetta, per la consegna del progetto completo in tutte le sue parti. Scadenza prevista: il 16.09.2013;
<i>Acquisizione Integrazioni Progetto Definitivo</i>	<b>3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.</b>	In data 16.09.2013 è stata consegnata una prima revisione del Progetto Definitivo In data 25.09.2013, sono state consegnate le integrazioni richieste durante la riunione del 18.09.2013  In data 03.10.2013 e 04.10.2013 sono state trasmesse le ulteriori integrazioni e revisioni del progetto	Il Progetto, il giorno successivo alla consegna, è stato prontamente esaminato dagli Uffici riscontrando il miglioramento rispetto alla prima versione ma il permanere di alcune criticità e carenze;  Il RUP ha immediatamente convocato la suddetta Società, per il giorno 18.09.2013, nel corso della riunione sono state valutate in contraddittorio le problematiche riscontrate che la stessa Società si è impegnata a sanare Il giorno successivo i suddetti elaborati sono stati riverificati riscontrando ulteriore necessità di approfondimenti;
<i>Approvazione Progetto Definitivo</i>		Approvato in Conferenza di servizi del 11.12.2013 nelle more del completamento della procedura VA/VIA e dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica	In data 29.10.2013 è stato discusso il Progetto Definitivo in Conferenza di servizi. È stato inviato un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso; richiesta motivata dalle particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della Conferenza di servizi decisoria) all'approvazione del Progetto Definitivo. È stato predisposto il documento di Rischio archeologico come da richieste formulate dalla Soprintendenza Archeologica. In merito all'Autorizzazione Paesaggistica si

			<p>è provveduto a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici, con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013, la Relazione Paesaggistica semplificata, richiesta con nota prot. n. 314764 del 12.12.2013, per l'ottenimento del parere necessario.</p> <p>Per quanto attiene il procedimento espropriativo, dall'avvio del procedimento, sono pervenute n. 6 osservazioni da parte degli intestatari catastali delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Si è in attesa di acquisire da parte della Regione Abruzzo (Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici), un riscontro in merito alla nota prot. n. 321339 del 20.12.2013 con la quale è stata trasmessa la Relazione Paesaggistica semplificata al fine di valutare se procedere all'inoltro della richiesta di V.A. per l'intervento in oggetto.</p>
<b>Redazione Relazione geologica</b>	<b>Affidamento diretto</b>	Determina Dirigenziale del settore B12 (n. 1022 del 13.11.2012)	Dott. Maurizio Rosa tecnico interno dell'Ente che ha redatto la relazione.
<b>Affidamento Esecuzione campagna geognostica</b>	<b>Procedura negoziata con indagine di mercato e invito a n. 6 ditte</b>	<p>Con lettera prot. n. 9442 del 08.01.2013, ad inoltrare richiesta di offerta economica per l'avvio della campagna geognostica a n. 6 ditte, selezionate dal RUP, concedendo 8 giorni per la presentazione delle offerte</p> <p><i>Aggiudicazione provvisoria:</i> 17.01.2013.</p> <p><i>Aggiudicazione definitiva:</i> 08.03.2013, con provvedimento n. 225</p>	<p><i>Importo:</i> Il piano di indagini prevede una somma complessiva di circa <b>13.000 Euro + IVA (a base d'asta)</b> per la campagna geognostica.</p> <p><i>Tempistica</i> prevista da progetto: 30 giorni per l'esecuzione delle indagini.</p> <p><i>Offerte pervenute:</i> n. 6.</p> <p><i>Aggiudicatario:</i> ditta SEGEO del dott. Umberto Biferi (importo pari a 7.434,76 Euro, per un ribasso offerto del 43,57%);</p>
<b>Lavori Esecuzione campagna</b>	<b>Ditta SEGEO del Dott. Umberto Biferi</b>	<i>Consegna delle indagini,</i> sotto riserva di legge e in	<p>In data 24.04.2013: ultimate le indagini</p> <p>In data 14.05.2013: consegna risultati delle</p>

geognostica		via d'urgenza: 26.03.2013	prove In data 31.05.2013: Consegna relazione geologica
-------------	--	---------------------------	---

Intervento denominato "**Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo**" nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (CH). Ambito:

Difesa dei Fiumi

Importo € 5.000.000,00

Convenzione di avvalimento siglata in data 19/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro.

Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:

QUADRO D'ATTUAZIONE			
FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
<b>Affidamento Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CSE</b>	Gara basata sull'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Il bando di gara è stato pubblicato a cura della società INTESTO in data 09.11.2012. Il bando di gara prevede: 60 giorni per la progettazione definitiva e 60 giorni per la progettazione esecutiva	<i>N. offerte pervenute</i> (al 29.11.2012 - scadenza del bando): 15 <i>Composizione della Commissione</i> di gara: <u>Presidente</u> : Ing. Tommaso Valerio; <u>Membri</u> : Arch. Francesco Faraone del Servizio Difesa Suolo della Provincia di Chieti, e Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica del Fucino; <u>Segretario</u> : Rag. Ennio Antonetti <i>N. sedute della Commissione di gara</i> : la Commissione, nominata in data dal 29.03.2013, è stata successivamente ricostruita in data 09.04.2013 con la sostituzione dell'Avv.to Pietromartire con l'Ing. Mauro Contestabile, ha eseguito n. 8 sedute dal 19.01.2013 al 30.05.2013
<b>Aggiudicazione Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CSE</b>	<i>Aggiudicatario</i> : RTI Beta Studio S.r.l. – C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.	Aggiudicazione provvisoria: in data 30.05.2013 Aggiudicazione definitiva: in data 10.07.2013 con Delibera n. 204 della deputazione amministrativa del Consorzio Stipula contratto: in data 09.09.2013 presso lo Studio del notaio Gioffrè.	Tempi di accettazione delle offerte e di valutazione delle stesse: 5 mesi dalla scadenza del bando, 2 mesi dalla nomina della Commissione di gara. L'importo complessivo di Euro 149.130,27 oltre IVA e Cassa, con un tempo per l'espletamento del servizio di 96 giorni secondo l'offerta tecnica risultante agli atti  Secondo la tempistica prevista nel contratto, al netto della definizione degli espropri, la consegna del progetto definitivo deve avvenire entro 48 giorni dalla data di stipula del contratto;

<b>Acquisizione Progetto Definitivo</b>		In data 19.11.2013 la Ditta ha rimesso copia del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale il cui affidamento deve essere ancora perfezionato dal RUP.	Si evidenzia l'elevato costo riguardante la voce "Acquisizione di aree" pari a circa a 3,2 MLEuro.  In data 14.01.2014 si è tenuto un incontro tecnico con i progettisti di BetaStudio Srl nel quale è stato richiesto che dal Progetto, così come presentato, sia stralciato un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento pari a 5.000.000,00 Euro.
---	--	---	--

*Intervento denominato "Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta – Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato" nel Comune di Caramanico Terme (PE).*

*Ambito: Difesa del Suolo*

*Importo € 1.000.000,00.*

*Convenzione di Avvalimento siglata in data 20/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE)*

*Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:*

QUADRO D'ATTUAZIONE			
FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
<b>Affidamento Progettazione definitiva</b>	<b>Affidamento diretto</b>	Determinazione (in attesa di acquisizione dal comune)	Il Progetto Definitivo è stato adeguato alle prescrizioni formulate dalle Conferenze di Servizi del 14-06-2012 e del 16-07-2012, in particolare dall'Ente Parco nazionale della Maiella;
<b>Affidamento Progettazione Esecutiva</b>	<b>Affidamento diretto</b> ad un tecnico esterno al Comune, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125 c. 11 del D.Lgs n. 163/2006 (importo inferiore a 40.000 Euro)	Determinazione n. 135 del 12.10.2012	Ing. Alberico Claudio per un importo pari a 19.300 Euro oltre cassa 4% e IVA 21%.  <i>Tempistica</i> prevista dal progetto esecutivo per i lavori: 150 giorni.
<b>Acquisizione Progetto esecutivo</b>		In data 25.10.2012 al prot. n. 7371 è stato acquisito il Progetto Esecutivo	In pari data è stata fatta la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Progetto Esecutivo medesimo (delibera n. 103).  In data 26.10.2012 è stata inviata copia del Progetto Esecutivo agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi del 16.07.2012.



<b>Affidamento Direzione lavori e contabilità</b>	<b>Affidamento diretto</b> a professionista	Determinazione n. 169 del 27.11.2012	Ing. Di Giovanni Bartolomeo per un importo pari a 26.033,70 Euro oltre cassa 4% e IVA 21%
<b>Affidamento Esecuzione Lavori</b>	<b>Procedura negoziata</b> , ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 163/2006, con invito ad almeno 10 soggetti	In data 15.11.2012: determina a contrarre con individuazione delle ditte da invitare alla gara.	Le lettere di invito sono state trasmesse alle imprese in data 27.11.2012 e le offerte dovevano pervenire entro il 20.12.2012. <i>N. ditte invitate: 10</i> <i>Composizione della Commissione di gara</i> <u>Presidente</u> : Geom. Filippo De Ingeniis, <u>Componenti</u> : Dott.ssa Francesca Vecchi e Rag. Elide Mazzocca <i>N. sedute della Commissione di gara</i> : la gara è stata espletata in data 20.12.2012 con l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE)
<b>Aggiudicazione Esecuzione lavori</b>	<b>Aggiudicatario</b> Impresa <b>Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE)</b>	Aggiudicazione provvisoria: in data 20.12.2012 Aggiudicazione definitiva: in data 23.01.2013 con determina n. 35 del Responsabile del Servizio Tecnico	L'importo a base d'asta dei lavori è pari a Euro 582.027,98 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 40.399,72; L'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. ha offerto il ribasso del 15,08% con un importo di aggiudicazione pari a Euro 494.258,17, a cui vanno aggiunti 40.399,72 per la sicurezza, per complessivi Euro 534.657,89;
<b>Stipula contratto Esecuzione lavori</b>	<b>Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE) – Comune di Caramanico</b>	In data 03.04.2013 è stato stipulato il contratto	
<b>Consegna dei lavori</b>		In data 10.07.2013 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori	In data 18.04.2013 si è proceduto alla "consegna parziale" dei lavori relativi alla realizzazione della pista di accesso (700 mt) e alla preparazione del cantiere in generale
Collaudo statico e tecnico amministrativo	<b>Affidamento diretto</b>	Con Determinazione n.170 del 28.12.2012	Ing. Palombo Paolo per un importo 4.800 Euro
<b>Ultimazione dei lavori</b>		Certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 05.11.2013.	E' in corso la predisposizione della Relazione finale di collaudo tecnico.

*A seguito della creazione della struttura commissariale e una volta acquisito il definitivo trasferimento delle risorse economiche complessive (ultimo accreditamento: febbraio 2013), ho programmato l'avviamento di una cospicua parte degli interventi rimasti attraverso la mia diretta opera, col supporto del mio Ufficio.*

*In sostanza, oltre all'intervento denominato "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno", ho ascritto alla mia gestione anche la quasi totalità degli interventi di Difesa del Suolo. Di seguito si elencano e se ne descrivono sinteticamente le attività svolte fino al termine dell'anno 2013.*

**Intervento denominato "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" nel Comune de L'Aquila.**

*Ambito: Difesa dei Fiumi*

*Importo di 3,8 MI di Euro*

**Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.**

Principali attività svolte fino al termine dell'anno 2013:

*Di tale opera esiste ed è completo l'intero iter progettuale fin dal momento dell'attribuzione alla mia gestione. Di queste attività era già stata coperta la spesa, precedentemente alla mia nomina e con risorse di altro Ente. Tali progettazioni sono state da me acquisite agli atti, esaminate e, soprattutto in riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo, è stata chiesta (e concessa) disponibilità non onerosa alla Beta Studio (firmataria della progettazione), per la verifica dell'attualità dei contenuti (risalenti all'anno 2006) e per l'eventuale aggiornamento. Attualmente è in corso di esecuzione e i lavori sono in stato d'attuazione avanzato. Nel corso del 2013 si è verificata un'interruzione dovuta all'insorgenza di inattese interferenze. Cosa che ha richiesto la redazione di una perizia di variante e la sospensione momentanea del cantiere. Tale sospensione è stata dovuta principalmente ai dilatati tempi di riscontro degli Enti introdotti per via delle interferenze (Enel Gas, Enel elettricità, etc.).*

**Intervento denominato "Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Valone" nel Comune di Aielli (AQ).**

*Ambito: Difesa del Suolo.*

*Importo € 1.000.000,00.*

**Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.**

*Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.*

#### QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631).

**08.05.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 099/CS, richiede all'Ente la segnalazione di figura interna alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell'intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 3 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
- ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
- ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**13.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**16.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**16.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 181/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**26.09.2013** con Determinazione n. 15, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**28.09.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**02.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**04.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**04.10.2013** il progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo, avendo acquisito il giorno 02.10.2013 le indagini geologiche e ritenendo opportuno, sulla base di queste, aggiornare il progetto preliminare trasmesso all'Ufficio Commissariale il 16.09.2013, consegna la documentazione integrativa.

**12.11.2013** Consegna il progetto definitivo.

**26.11.2013** Consegna del PSC.

**28.11.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo. Redazione di Verbale di prima seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**09.12.2013** trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto depositato il 12.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 28.11.2013.

**11.12.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**31.12.2013** Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 gennaio 2014.

*Intervento denominato “Sistemazione versanti del Centro Storico” nel Comune di Roccasale (AQ).*

*Ambito: Difesa del Suolo*

*Importo € 1.000.000,00.*

**Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.**

*Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.*

#### QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 8 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**07.08.2013** Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
  - ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
  - ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00;
- a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013 2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare..

**18.09.2013** con determinazione n. 176/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**26.09.2013** con Determinazione n 19, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**04.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**04.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**12.11.2013** il RUP richiede, a mezzo email, al Sindaco l'individuazione di un tecnico locale, facente parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o accreditato nell'albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa spedidamente eseguire le attività di esproprio/ occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune.

**02.12.2013** Consegna il progetto definitivo.

**05.12.2013** Consegna del PSC.

**05.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Verbale della prima seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono state richieste alcune integrazioni al progettista.

**09.12.2013** il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 05.12.2013.

**10.12.2013** Il Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**10.12.2013** Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2014.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il giorno 20 dicembre 2013.

**20.12.2013** su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della Conferenza all'8 gennaio 2014.

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

*Intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorito" nel Comune di Raiano (AQ).*

*Ambito: Difesa del Suolo*

*Importo € 1.000.000,00*

**Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.**

*Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.*

#### QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

**28.10.2011** il Comune di Raiano, con nota prot. 7036 trasmette il Progetto Preliminare e contestualmente la delibera di approvazione della Giunta Comunale.

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**19.04.2013** l'Ente, con nota prot. 082/CS, segnala i nominativi delle figure in organico in grado di ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 4 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**07.08.2013** dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determinazione Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
  - ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
  - ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00;
- a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** Il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** Il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 175/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**26.09.2013** con Determinazione n 18, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**04.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**04.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**10.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**05.12.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Definitivo.

**05.12.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**05.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**09.12.2013** Il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 05.12.2013.

**10.12.2013** Consegna del PSC.

**10.12.2013** Il Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**10.12.2013** Convocata Conferenza dei servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 23 dicembre 2013 presso Raiano.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza dei Servizi convocata il giorno 23 dicembre 2013.

**20.12.2013** su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della Conferenza di Servizi all'8 gennaio 2014.

*Intervento denominato "Consolidamento movimento franoso" nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).*

*Ambito: Difesa del Suolo*

*Importo € 1.000.000,00*

**Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.**

*Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.*

#### QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 32/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00 di risorse di bilancio MATTM (importo pari a € 10.017.229,24), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**24.04.2013** l'Ente comunica, con nota prot. 090/CS il 26.04.2013, la carenza in organico di personale laureato idoneo a ricoprire eventualmente il ruolo di RUP.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 5 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**08.08.2013** Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
- ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
- ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.



**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il PP;

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 173/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**26.09.2013** con Determinazione n. 14, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**14.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**15.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**27.11.2013** Consegna Progetto Definitivo.

**11.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**14.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**31.12.2013** Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PD, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 gennaio 2014 presso Aielli;

*Intervento denominato "Completamento risanamento idrogeologico Roccacaramanico – consolidamento/risanamento frazione San Giacomo" nel Comune di Sant'Eufemia a Maiella (PE).*

*Ambito: Difesa del Suolo*

*Importo € 1.000.000,00*

**Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.**

*Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato. E' in esame l'opportunità di affidare l'esecuzione di questo intervento, a partire dalle procedure di evidenza per pubblica gara, al Comune di Sant'Eufemia a Maiella.*

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**11.03.2013** stipula della Convenzione di Avvalimento tra il Commissario Straordinario e il Sindaco del Comune di Sant'Eufemia a Maiella avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 9 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**07.08.2013** Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
  - ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
  - ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00;
- a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 179/CS/RUP il responsabile del procedimento determina, sulla base delle verifiche effettuate, di prendere atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**14.10.2013** il Sindaco di Sant'Eufemia a Maiella conferma, a mezzo mail, in risposta alla nota prot. 248/CS dell'11.10.2013 l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di provvedere alle fasi successive a quella progettuale come da Convenzione stipulata l'11.03.2013.

**14.10.2013** acquisizione indagini geologiche.

**14.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**17.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**12.11.2013** il RUP richiede al Sindaco l'individuazione di un tecnico locale, facente parte o dell'ufficio tecnico Comunale o accreditato nell' albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa spedidamente eseguire le attività di esproprio/occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune.

**19.11.2013** Consegna del PSC.

**26.11.2013** Consegna il Progetto Definitivo.

**02.12.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**06.12.2013** il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del Progetto Definitivo.

**06.12.2013** Il Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**09.12.2013** convocata Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona.

**13.12.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne chiede il differimento a nuova data.

**17.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della Conferenza di Servizi del 20.12.2013 si dichiara disponibile ad un breve slittamento della stessa.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza di Servizi indetta il giorno 20 dicembre 2013.

**18.12.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS ribadisce i contenuti della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all'impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il 20.12.2013.

**18.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013 al fine di agevolare la stessa per l'espressione del parere di competenza.

**27.12.2013** Conferenza dei Servizi Decisoria.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi del comma 6 bis e 7

dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

*Intervento denominato "Consolidamento versante ovest del Centro Storico" nel Comune di Castelli (TE).*

*Ambito: Difesa del Suolo*

*Importo € 1.000.000,00*

**Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.**

*Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.*

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

**01.03.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PP.AA. per la nomina di Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 10 si procede alla nomina del Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Castelli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
- ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
- ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 180/CS/RUP il Responsabile del Procedimento sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**26.09.2013** con Determinazione n 16 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**28.09.2013** acquisite agli atti le Indagini Geologiche a cura del professionista incaricato.

**02.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**04.10.2013** il RUP, conferisce incarico professionale, a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**04.11.2013** il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, consegna gli elaborati e la relazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**11.11.2013** il progettista consegna il Progetto Definitivo.

**12.11.2013** istruttoria preliminare sul Progetto Definitivo consegnato dal progettista.

**18.11.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono emerse criticità e richieste puntuali integrazioni.

**28.11.2013** trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto depositato il giorno 11.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 18.11.2013.

**28.11.2013** Verifica tecnica del Progetto definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**06.12.2013** convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 19 dicembre 2013 presso Castelli.

**20.12.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del comma 2, dell'art. 95 del D.Lgs n.163/2006.

**23.12.2013** la Giunta Regionale D'Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – con *Nota prot. 863/BN 67012 del 13.12.2013*,

acquisita con prot. 350/CS - al fine dell'emissione del parere di competenza, richiede idonea documentazione necessaria a valutare se ricorrono i presupposti per attivare le procedure di VAVIA ai sensi del D. L.vo 152/2006.

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, in merito alla posizione assunta dalla Regione Abruzzo in sede di Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo e ai pareri negativi espressi dalla stessa, motivati dalla presunta necessità di una riperimetrazione PAI delle aree oggetto d'intervento, comunica che tale attività di riperimetrazione non rientra nelle funzioni commissariali né trova un presupposto necessario nell'Accordo di Programma. Coglie inoltre l'occasione per segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

*Intervento denominato "Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa Carosi" nel Comune di Civitella del Tronto (TE).*

*Ambito: Difesa del Suolo*

*Importo € 750.000,00*

**Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.**

*Lo stato di attuazione: è definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato.*

#### QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

**01.03.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PP.AA. per la nomina di Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

**05.06.2013** il Comune di Civitella del Tronto trasmette il Progetto Preliminare.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 7, si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Civitella, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
- ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
- ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per l'incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**18.09.2013** con determinazione n. 178/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**26.09.2013** con Determinazione n 17 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**21.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**21.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**22.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**22.11.2013** il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione consegna gli elaborati e la relazione del PSC;

**02.12.2013** il progettista consegna il Progetto Definitivo.

**02.12.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo. I seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono emerse criticità e richieste puntuali integrazioni.

**06.12.2013** il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del Progetto Definitivo.

**06.12.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo. Il seduta.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**09.12.2013** Convocata Conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona.

**13.12.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne chiede il differimento a nuova data.

**17.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della Conferenza di Servizi del 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, comunica alla Regione Abruzzo la disponibilità ad un breve slittamento.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenze di Servizi.

**18.12.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS, ribadisce i contenuti della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all'impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il 20.12.2013;

**18.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo - come d'accordo con il RUP che riceve la medesima nota per conoscenza - lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013, al fine di agevolare la stessa per l'espressione del parere di competenza.

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che l'intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

**27.12.2013** Esecuzione della I seduta della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo.

**30.12.2013** Convocata la II seduta della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii, per il giorno 10 gennaio 2014 presso Carsoli.

*Intervento denominato "Consolidamento corona di frana" nel Comune di Treglio (CH).*

*Ambito: Difesa del Suolo*

*Importo € 1.000.000,00.*

**Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.**

*Lo stato di attuazione: benché definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, e pur avendo stabilito - per ridurre i tempi complessivi - di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato, la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ha alterato lo stato dei luoghi, determinando la non attualizzazione delle scelte progettuali (ovviamente basate su diverse condizione geologica e conformazione del sito). La nuova condizione di pericolo mi ha portato a richiamare lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel codice degli appalti e nel relativo regolamento di attuazione.*

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di



risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**12.03.2013** sopralluogo tecnico – amministrativo dell'Ufficio Commissariale, per esaminare le aree interessate dall'intervento;

**01.03.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede con nota prot. 68/CS, richiede all'Ente la segnalazione di figura interna alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell'intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006. *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**15.04.2013** l'Ente, con nota acquisita con prot. 076/CS (rif. nota prot. 60/CS del 28.03.2013), comunica la carenza in organico di personale idoneo (laurea in architettura/ingegneria/geologia), ai sensi dell'art. 10, c. 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e della determinazione AVCP n. 10/2001 del 23.01.2001.*

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 11, è nominato il Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** incontro presso il MATTM tra il RUP e una figura interna all'Ente, cui è conferito l'incarico di collaborazione, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
- ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
- ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00; a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

**07.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare;

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**16.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 174/CS/RUP, il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento

**26.09.2013** con Determinazione n. 12, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**22.10.2013** Acquisite le indagini geologiche e i rilievi tecnici.

**22.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche e del rilievo, al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**23.10.2013** il RUP conferisce l'incarico professionale per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006, a professionista individuato all'interno dell'Albo pubblico.

**19.11.2013** il tecnico incaricato trasmette la verifica di stabilità del pendio, come richiesta ad integrazione dal progettista incaricato di redigere il Progetto Definitivo.

**09.12.2013** ORDINANZA n. 8 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto l'inagibilità dei fabbricati siti in via Roma n. 16, 18, 20 e 22 a causa degli eventi meteorici che i giorni 1 e 2 dicembre 2013 hanno causato frane e smottamenti in diversi punti del territorio cittadino.

**10.12.2013** il progettista, in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell'intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013, comunica al RUP di aver richiesto al geologo incaricato la conferma della validità dei risultati delle indagini commissionate e prodotte.

**12.12.2013** il progettista richiede al RUP, con pec prot. n. 364/CS/RUP del 12/12/2013, la necessità di acquisire ulteriori e nuove informazioni dal punto di vista dei rilievi, e delle indagini geologiche e geotecniche.

**13.12.2013** sopralluogo tecnico sulle aree oggetto della frana, su delega del Commissario Straordinario, da parte dell'Ufficio Commissariale e in presenza dei tecnici incaricati e dei responsabili dell'Ente Comunale.

**14.12.2013** ORDINANZA n. 9 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto lo sgombero cautelare degli edifici siti in via Roma n. 20 e 22;

**18.12.2013** il progettista incaricato trasmette il progetto definitivo in via provvisoria (essendo mutate le condizioni dell'ambiente).

**23.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 348/CS del 23.12.2013 - in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell'intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013; alla necessità di effettuare nuove indagini specialistiche; all'ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco - autorizza il RUP a intraprendere tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza del sito.

**23.12.2013** il RUP (con nota prot. n. 383/CS/RUP) conferisce a tecnico incaricato (società di servizi, regolarmente iscritta all'Albo pubblico) l'affidamento in somma urgenza dei servizi per rilievo topografico, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche a seguito di smottamento di parte della corona di frana sottostante edifici adibiti a civile abitazione, ai sensi del c. 11, art. 125 del D. Lgs. 163/2006;

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che l'intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

*Intervento denominato "Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Amblich" nel Comune di Vasto (CH).*

Ambito: Difesa del Suolo,

Importo € 1.000.000,00

**Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.**

*Lo stato di attuazione: benché definito l'iter progettuale (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente), fino alla progettazione definitiva, e pur avendo stabilito – per ridurre i tempi complessivi – di attivare le giuste procedure di gara con il metodo dell'appalto integrato, la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ha alterato lo stato dei luoghi, determinando la non attualizzazione delle scelte progettuali (ovviamente basate su diverse condizioni geologica e conformazione del sito). La nuova condizione di pericolo mi ha portato a richiamare lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel codice degli appalti e nel relativo regolamento di attuazione.*

QUADRO D'ATTUAZIONE (anno 2013)

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**01.03.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori (arch. Elodia Rossi e rag. Ennio Antonetti).

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**06.05.2013** il Comune di Vasto, nota prot. 17499, acquisita con prot. 100/CS dell'08.05.2013, individua il tecnico interno all'Ente che possa ricoprire eventualmente il ruolo di supporto al RUP.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 6 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Vasto, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** Dovendo il Commissario Straordinario procedere con l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva, ed avendo preliminarmente:

- ✓ istituito, con Determinazione Commissariale n. 10 del 14.06.2013 (ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006), un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali, pubblicato sul sito del MATTM;
  - ✓ verificato l'indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione in grado di svolgere i compiti suddetti;
  - ✓ stimato che, per ciascun intervento il valore per la progettazione preliminare e definitiva è inferiore a € 40.000,00;
- a seguito dell'analisi dei curricula inseriti nel suddetto elenco, e su indicazione del RUP, è stato individuato il professionista idoneo all'assunzione dell'incarico. Si trasmette relativa manifestazione d'interesse.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**18.09.2013** con determinazione n. 177/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**26.09.2013** con Determinazione n 11, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**11.10.2013** il Comune di Vasto, con nota prot. 38287 del 27.09.2013, acquisita con prot. 246/CS comunica che:

1. in data 19.10.2011 è stato trasmesso al Commissario Straordinario il Progetto Preliminare, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 279 del 12.10.2011, come richiesto dalla Regione Abruzzo;

2. in data 31.07.2013 sono state trasmesse al Commissario Straordinario le indagini e relazioni geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotecniche in possesso dell'Ente;

Alla luce di quanto esposto l'Ente richiede di inserire tali spese all'interno del quadro economico di progetto.

**21.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche.

**21.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**23.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**24.10.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, preso atto dell'insistenza delle richieste fatte dall'Ente, esorta lo stesso a voler revocare ogni atto illecito (delibere di affidamento di incarichi, prive di copertura economica e di potere procedurale) prodotto in sostituzione della competenza e delle mansioni affidate agli Uffici Commissariali.

In alternativa l'Ente potrà assumere in proprio l'onere di tali spese, verificandone prima la correttezza contenutistica e procedurale.

In caso di ulteriori insistenze, l'Ufficio commissariale sarà costretto a trasmettere alla Corte dei Conti quanto in contestazione, per le definitive valutazioni.

**23.10.2013** il RUP conferisce ad un tecnico abilitato l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

**14.11.2013** il tecnico incaricato delle verifiche archeologiche trasmette la verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera e), e art. 17 comma 1 lettera d) del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

**06.12.2013** ha avuto luogo un dissesto, sul versante orientale del centro storico, che ha portato al distacco di una porzione di terreno con conseguente svuotamento al di sotto di una ristretta porzione della balconata di via Tre Segni e scivolamento di una palma.

**10.12.2013** Consegna Progetto Definitivo.

**11.12.2013** Consegna del PSC.

**11.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**16.12.2013** Sopralluogo del progettista incaricato e del geologo incaricato, a seguito dell'evento franoso avvenuto in via Tre Segni in data 06.12.2013. La zona ricade all'interno della superficie interessata dall'intervento, oggetto dalla Progettazione Definitiva e, come si evince dalla *relazione illustrativa* redatta dal progettista: *Il sopralluogo ha permesso di constatare la presenza di una frana, il cui cinematismo è riferibile ad un movimento complesso di tipo scorrimento traslativo – colamento. E' stato infatti possibile osservare una zona di distacco la cui morfologia presenta le caratteristiche tipiche di uno scorrimento con prevalente componente traslativa; d'altro canto risulta evidente che la massa dislocata dal movimento franoso ha poi proseguito verso il basso con un cinematismo di tipo colata, come risulta evidente dalle caratteristiche del deposito finale. Il dissesto ha coinvolto una porzione di riporto sottostante la sede stradale e la balconata ed una parte della copertura di alterazione delle sabbie presenti lungo il pendio.*

**18.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

**24.01.2014** il Comune di Vasto, con nota prot. 3664 del 23.01.2014, acquisita con prot. 421/CS/RUP, in seguito all'evento franoso che ha interessato via Tre Segni – Piazza Marconi, richiede al Commissario Straordinario un intervento in regime di emergenza, da eseguirsi con ogni possibile urgenza a causa della vicinanza delle abitazioni alle aree interessate dalla frana avvenuta.

#### 1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Attraverso la compilazione della tabella sottostante evidenziare lo stato di avanzamento globale degli interventi in Accordo. Lo stato di attuazione relativo ad ogni singolo intervento dovrà, invece, essere prodotto attraverso l'aggiornamento delle schede intervento RENDIS e li, dove previsto, nella Banca Dati Unitaria del QSN.

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi al dicembre 2013</b>	<b>n. interventi al dicembre 2012</b>
Attesa di avvio	n. 0	n. 14 (slittamento dovuto ad assenza di fondi – riferimento Allegato "Slittamenti e ritardi")
Esecuzione studi ed indagini	n. 0	n. 14
In corso di progettazione	n. 2	n. 9
Progettazione ultimata	n. 13 (inclusi quelli aggiudicati, in esecuzione e ultimati, nonché quelli da affidare con appalto integrato)	n. 3
Lavori aggiudicati	n. 3 (inclusi quelli in esecuzione e ultimati)	n. 0
In esecuzione	n. 2	n. 0

Lavori ultimati (collaudati e non )	<i>n. 1</i>	<i>n. 0</i>
<b>Totale interventi finanziati</b>	<i>Dei 20 interventi complessivi imputati al Commissario nel 2012, 5 sono passati in gestione diretta della Regione Abruzzo, La copertura finanziaria è stata resa disponibile nel corso del 2013. Per i dettagli, si vedano i paragrafi 1.4, 1.6 e 1.7.</i>	

**1.7. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014***Compilare la tabella seguente*

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014</b>
Attesa di avvio	<i>n. 0</i>
Esecuzione studi ed indagini	<i>n. 0</i>
In corso di progettazione	<i>n. 0</i>
Progettazione ultimata	<i>n. 15</i>
Lavori aggiudicati	<i>n. 15</i>
In esecuzione	<i>n. 1</i>
Lavori ultimati (collaudati e non)	<i>n. 14</i>
<b>Totale interventi finanziati</b>	<b>15</b>

**1.8. CRITICITA'**

*Descrivere le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo.*

*Le più importanti criticità sopraggiunte nel corso dell'anno 2013 sono state dovute all'insorgenza di due eventi calamitosi su due distinti siti d'intervento:*

*il sito dell'intervento "Consolidamento Corona di Frana", posto nel Comune di Treglio (evento calamitoso registratosi nei primi giorni del mese di dicembre 2013, causante una frana importante, con conseguente compromissione di fabbricati posti in cima al versante franato);*

*il sito dell'intervento "Consolidamento Costone Orientale, zona Piazza Marconi/Loggia Amblingh", posto nel Comune di Vasto (evento calamitoso registratosi anch'esso nel mese di dicembre 2013, causante uno smottamento, con compromissione della sovrastante loggia pubblica).*

*Date le condizioni di allerta sopraggiunte con i citati eventi calamitosi, ho disposto lo stato di Somma Urgenza per ambedue gli interventi, ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010 e gli affidamenti in Somma Urgenza ai sensi dell'Art. 125 del Dlg. 163/2006.*

*D'altro canto, gli eventi sono sopraggiunti quando era stata eseguita la progettazione definitiva e si era in procinto di indire la procedura di gara pubblica tramite appalto integrato. Infatti, prima dell'anno 2013 (Rif. Precedente Relazione Annuale) non era stato possibile avanzare nell'attuazione di questi ed alcuni altri interventi, non essendo ancora stata resa disponibile la copertura finanziaria relativa, a valere sulla contabilità speciale aperta a mio nome. L'accreditamento pari a € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM è giunto solo dopo ventitré mesi dalla mia nomina, e precisamente in data 1 febbraio 2013.*

*Ogni maggiore approfondimento è rilevabile all'interno della descrizione degli interventi.*

*In definitiva e a maggiore dettaglio, questi eventi di origine naturale hanno determinato la mutazione delle relative procedure di avanzamento dei lavori di mitigazione del dissesto. Gli stati di allerta che sono sopraggiunti nei Comuni di Treglio e di Vasto (ambedue Interventi di Difesa del Suolo), hanno incitato gli stessi Sindaci a muovere verso la indizione degli stati di emergenza, tramite atti pubblici (Ordinanza n.8 del 9 dicembre 2013 del Sindaco del Comune di Treglio e seguente Ordinanza n.9 di sgombero cautelare di edifici interessati al dissesto; Segnalazione del 23 gennaio 2014 del Sindaco del Comune di Vasto per richiesta Interventi in regime di emergenza). Pertanto, stante la situazione di avanzamento delle procedure propedeutiche alla cantierizzazione degli interventi suddetti (ribadisco, come già segnalato, che dette opere rientrano in quelle che hanno subito un grave slittamento nell'avvio, a causa del ritardo con cui sono stati accreditati i relativi fondi alla contabilità speciale aperta a mio nome), ho disposto che sia adottata ogni misura legale per la velocizzazione di tali azioni, assumendo di fatto (e di concerto con i Sindaci) il necessario stato di somma urgenza.*



**1.9. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE**

*Annotazioni e precisazioni finali che si ritengono essenziali ad una esaustiva lettura della presente relazione*

*Allo scopo di fornire maggiore chiarezza in merito alle attività commissariali per l'anno 2013, di seguito si riportano gli schemi tabellari riguardanti le azioni di implementazione diretta del ReNDIS, quale sintesi degli stati d'avanzamento di ogni intervento al 31 dicembre 2013, cadenzati attraverso le informazioni più importanti, anche per confronto con le informazioni più dettagliate prima riportate.*

*Informo che, alla luce di quanto disposto dal I Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 16/09/2010, e visto che il Sistema RendisWeb non veniva implementato dai soggetti preposti riguardo i lavori da eseguirsi nei Comuni di Martinsicuro, Corfinio, Isola del Gran Sasso, Roseto degli Abruzzi e Francavilla al Mare (passati, come detto, alla gestione diretta della Regione Abruzzo), ho formalmente chiesto all'ISPRA di creare una sezione totalmente distinta da quella di mia competenza, la cui attribuzione risultasse – come necessario – in capo alla Regione Abruzzo.*

*Le azioni di implementazione diretta del ReNDIS, invece, per i lavori ascritti alla mia gestione, hanno sempre avanzato regolarmente. La risorsa umana da me delegata a tale operatività, col supporto dei tecnici dell'ISPRA, aggiorna i dati ogni qualvolta insorge un evento da registrare.*

**QUADRO D'ATTUAZIONE SINTETICO – RIF. RENDIS WEB**

DOCUMENTAZIONE	INTERVENTI DI DIFESA DEI FIUMI				
	Comune di Carsoli (AQ) - Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali - Comune di Carsoli (AQ);	Comune di L'Aquila (AQ) - Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno (AQ);	Comune Pescara (PE) - intervento per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo";	Provincia di Teramo (TE) - Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi;	Comuni di Francavilla al mare, Miglianico, Ortona (CH) "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo";
Codice Unico Progetto (CUP)	X	X	X	X	X
Dispositivo nomina del RUP	X	X	X	X	X
Atto di affidamento della progettazione (determina/delibera);	X		X	X	X
Atto di affidamento di eventuali studi (determina/delibera);					
Atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento (delibera);			X		
Atto di approvazione dell'aggiudicazione dei lavori e relativo quadro economico risultante (delibera);		X	X		
Verbale di consegna lavori;		X	X		
Verbali di sospensione/ripresa/proroga lavori;		X	X		
Perizie di variante;					

Comunicazione ultimazione lavori;					
Certificato di collaudo (o il CRE) con il quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie;					
Copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale (pdf);		X	X		

DOCUMENTAZIONE	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO (GRUPPO 1)				
	Comune di Caramanico (PE) - <i>Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme, (1° stralcio funzionale);</i>	Comune di Civitella del Tronto – <i>intervento di completamento per la messa in sicurezza del movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico a ridosso dell'abitato di Villa Carosi, (TE);</i>	Comune di Sant'Eufemia a Maiella - <i>Completamento risanamento idrogeologico Roccacaramanico – consolidamento/risanamento frazione San Giacomo Ambito: Difesa del suolo – (PE)</i>	Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore loc. Cerrone Solcano - <i>Consolidamento movimento franoso nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE);</i>	Comune di Raiano - <i>Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorio" Provincia di L'Aquila;</i>
Codice Unico Progetto (CUP)	X	X	X	X	X
Dispositivo nomina del RUP	X	X	X	X	X
Atto di affidamento della progettazione (determina/delibera);	X	X	X	X	X
Atto di affidamento di eventuali studi (determina/delibera);	X	X	X	X	X
Atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento (delibera);	X				
Atto di approvazione dell'aggiudicazione dei lavori e relativo quadro economico risultante (delibera);	X				
Verbale di consegna lavori;	X				
Verbali di sospensione/ripresa/proroga lavori;					
Perizie di variante;	X				
Comunicazione ultimazione lavori;	X				
Certificato di collaudo (o il CRE) con il quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie;					
Copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale (pdf);	X				

DOCUMENTAZIONE	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO (GRUPPO 2)				
	Comune di Aielli - Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Valone (AQ);	Comune di Roccacasale - Opere di consolidamento Sistemazione versanti del Centro Storico in Roccacasale (AQ);	Comune di Vasto - consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Amblygh (CH);	Comune di Castelli - consolidamento Ovest centro Castelli (TE);	Comune di Treglio - Consolidamento corona di frana, Provincia di Chieti (CH);
Codice Unico Progetto (CUP)	X	X	X	X	X
Dispositivo nomina del RUP	X	X	X	X	X
Atto di affidamento della progettazione (determina/delibera);	X	X	X	X	X
Atto di affidamento di eventuali studi (determina/delibera);	X	X	X	X	X
Atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento (delibera);					
Atto di approvazione dell'aggiudicazione dei lavori e relativo quadro economico risultante (delibera);					
Verbale di consegna lavori;					
Verbali di sospensione/ripresa/proroga lavori;					
Perizie di variante;					
Comunicazione ultimazione lavori;					
Certificato di collaudo (o il CRE) con il quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie;					
Copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale (pdf);					

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO A**

*Cronoprogramma al 31.12.2013*

**ALLEGATO B**

*Gantt Slittamenti e Ritardi al 31.12.2013*

PAGINA BIANCA

*Cronoprogramma – Diagramma di Gantt*

*A cura del Commissario Straordinario Delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Abruzzo*

**CRONOPROGRAMMA**

**TASK 1 - INVARIATA**

**MODIFICHE PREVISIONALI    TASK 1 bis – 30 Gennaio 2012**

**AGGIORNAMENTI    TASK 2 – 31 dicembre 2013**

*Cronoprogramma – Diagramma di Gantt*

### IL DIAGRAMMA DI GANTT (note per la lettura)

#### In generale

- ❖ Il **diagramma di Gantt** mette in relazione ogni progetto con il tempo disponibile per la sua attuazione.
- ❖ Il **mes** **I** corrisponde all'attivazione del procedimento Commissariale ( nomina Commissario 8 marzo 2011).
- ❖ E' un diagramma attivo, con due **Task** per ogni opera.
  - l'una di **previsione** (campita in sede di programmazione di virtuale obiettivo cioè di definizione del Cronoprogramma ufficiale di riferimento)
  - l'altra di **esecuzione** (questa viene campita in corso d'opera).

#### LEGGENDA

interventi di cui è pervenuta documentazione progettuale (parziale o complessiva)
tempi finora spesi per la ricezione del materiale (nella Task 2)
tempi di definizione progettuale (da disposizione progettuale commissariale). Nel caso di progettazioni definitive, la presenza dell'azzurro segnala la rilevazione di mancanze di documentazione da colmare.
tempi per gli espropri (e l'approvazione progettuale, qualora si necessitasse di ulteriore tempo da sovrapporre al precedente)
tempi per gli appalti (procedure di gara, pubblicazioni, aggiudicazioni e firma contratti)
tempi per l'esecuzione degli interventi, incluse l'inizio lavori (1 mese) e la consegna degli stessi (certificato di ultimazione)
tempi per la valutazione commissariale a seguito degli interventi e a seguito del collaudo. Momento che dispone di un tempo utile anche ad eventuali azioni correttive oggi non valutabili
ulteriore tempo a disposizione del Commissario, impiegabile o meno, per eventuali e approfondimenti – qualora necessari – sul lavoro svolto.
tempi per il collaudo
<b>Slitramento del Cronoprogramma</b>
<b>Ritardi nell'esecuzione delle opere</b>

- ❖ *La rappresentazione grafica è una semplificazione espositiva che non rispecchia la reale consecutività delle differenti fasi operative ma ne delimita i confini utili alla stima dei tempi complessivi di attuazione.*
- ❖ *Nel redigere i Gantt si è tenuto debito conto del grado di definizione del materiale progettuale finora pervenuto alla gestione commissariale e delle esigenze espresse da alcuni degli interlocutori diretti (E.F.L.L.).*
- ❖ *I lavori con caratteristiche di particolare urgenza (come da indicazioni emerse in fase organizzativa) sono segnalati con nota in testa ai diagrammi specifici.*
- ❖ *La Task I (bis) riguarda il rapporto tra la previsione generale del Cronoprogramma e la più recente previsione di quelle opere in avallimento o in via di avallimento. Le variazioni sostanzialmente scaturiscono dal confronto con le esigenze degli Enti attuatori.*


#### Gantt per ogni opera

I Gantt specifici sono suddivisi in **WPs (pacchetti di lavoro)**, a loro volta ripartiti in Task, ognuna delle quali è affidata ad uno o più soggetti attivi. In sede avanzata, ad ogni Gantt sarà associata la tabella relativa alle WPs, necessaria a dettagliare gli elementi fondamentali da estrarre dal Gantt, per una lettura più immediata. Ancora, vi sarà associata la tabella delle **Deliverables (momenti fissati per il raggiungimento di specifici obiettivi)**. I riferimenti saranno sempre estraibili nel Gantt relativo (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici). Per ultima, sarà associata la tabella delle **Milestones (o momenti di grande importanza)**, da intendersi orientate prevalentemente alle azioni di valutazione del programma e del percorso. Risulta fondamentale per esaminare, approvare e validare le azioni (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).





Cronoprogramma — Diagramma di Gantt

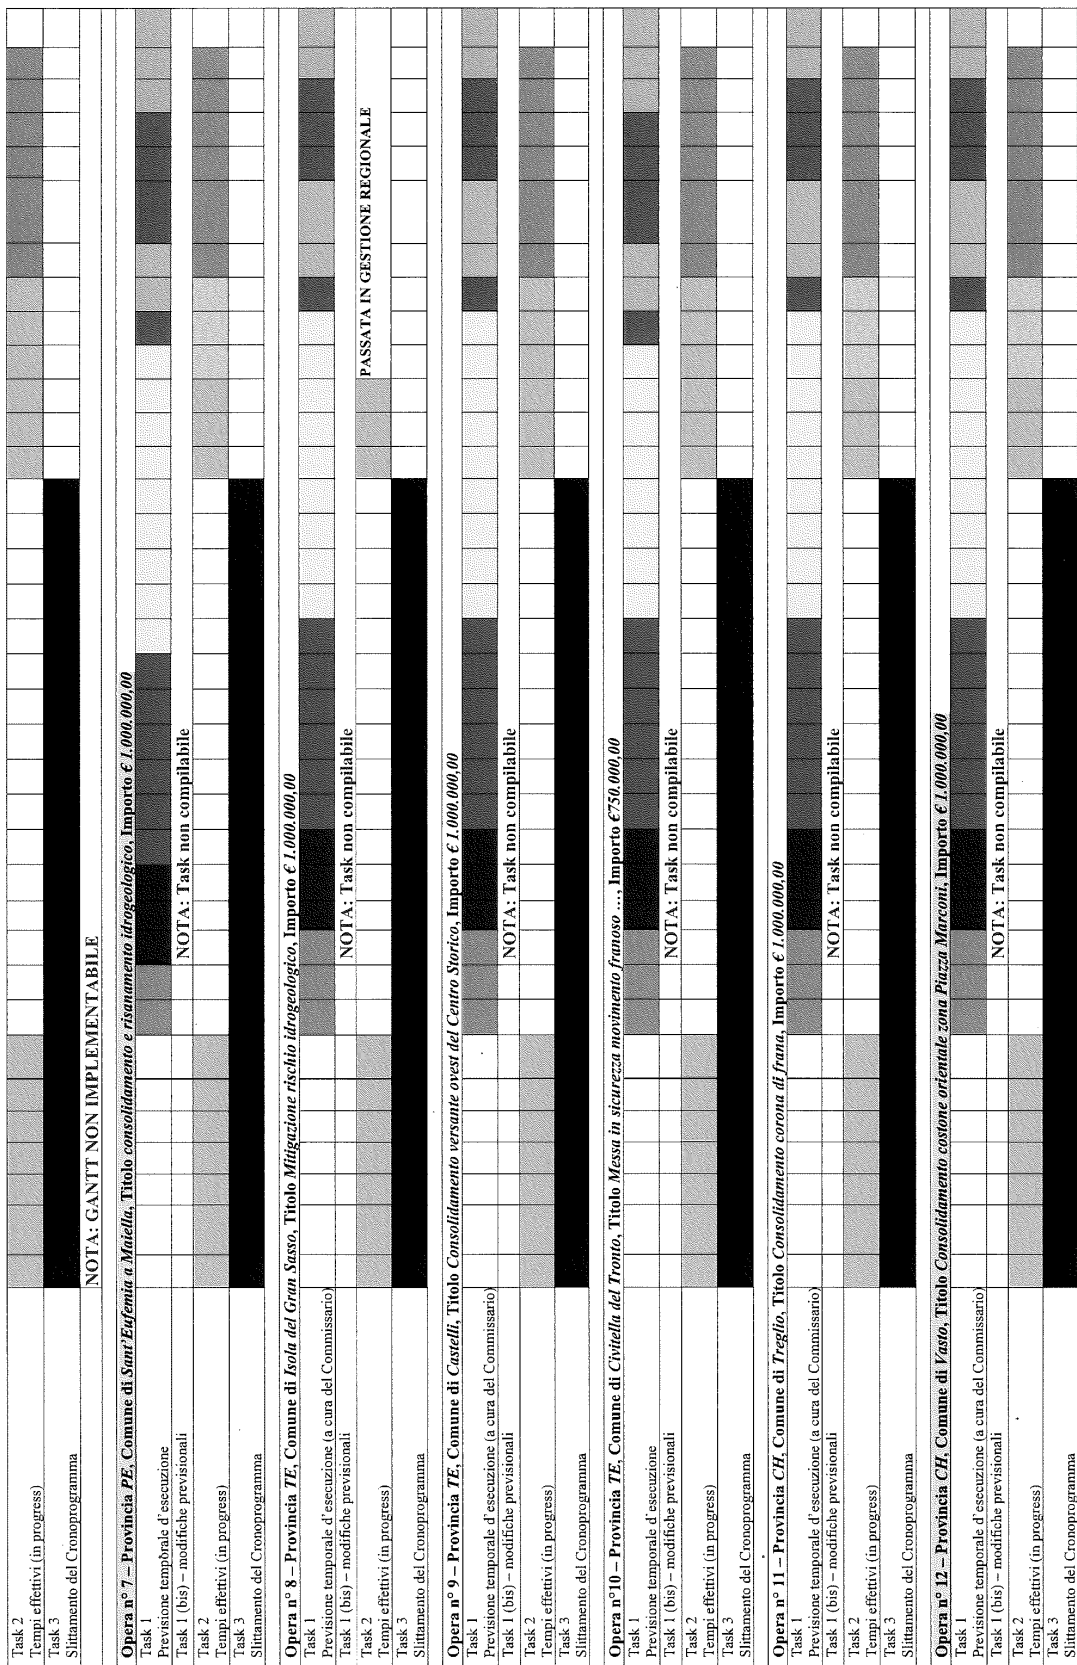



Cronoprogramma – Diagramma di Gantt

INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA																																																																																																											
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36		
Primo anno																		Secondo anno																		Terzo anno																																																																							
<b>Opera n° 1 – Provincia TE, Comune di Martinisicuro, Titolo Difesa della costa (barriere e rinascimento), Importo € 3.000.000,00</b>																																																																																																											
Task 1																																																																																																											
Previsione temporale d' esecuzione																																																																																																											
Task 1 (bis) – modifiche previsionali																																																																																																											
Task 2																																																																																																											
Tempi effettivi (in progress)																																																																																																											
Task 3																																																																																																											
Sfoltimento del Cronoprogramma																																																																																																											
NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE																																																																																																											
<b>Opera n° 2 – Provincia TE, Comune di Roseto degli Abruzzi, Titolo Difesa della costa (barriere e rinascimento), Importo € 3.000.000,00</b>																																																																																																											
Task 1																																																																																																											
Previsione temporale d' esecuzione																																																																																																											
Task 1 (bis) – modifiche previsionali																																																																																																											
Task 2																																																																																																											
Tempi effettivi (in progress)																																																																																																											
Task 3																																																																																																											
Sfoltimento del Cronoprogramma																																																																																																											
NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE																																																																																																											
<b>Opera n° 3 – Provincia CH, Comune di Francavilla al mare, Titolo Difesa della costa (barriere e rinascimento), Importo € 2.000.000,00</b>																																																																																																											
Task 1																																																																																																											
Previsione temporale d' esecuzione																																																																																																											
Task 1 (bis) – modifiche previsionali																																																																																																											
Task 2																																																																																																											
Tempi effettivi (in progress)																																																																																																											
Task 3																																																																																																											
Sfoltimento del Cronoprogramma																																																																																																											
NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE																																																																																																											

**RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 2 – "Consolidamento dei versanti rocciosi - Consolidamento zona in via Velone"**  
**Ambito: Difesa del suolo - Provincia di L'Aquila - Comune: Aelli - Importo complessivo 1.000.000 € (Progettazione definitiva)**  
 (Unità di mesi) (ripetizione anni)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
Primo anno												Secondo anno												Terzo anno												Quarto anno											
Cronoprogramma al 30 gennaio 2012																																															
Tempi effettivi in progress																																															
Riferimenti importanti																																															
Assenza fondi																																															
Condizioni meteo																																															
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A.U.P.																																															
Varianti in corso d'opera																																															
Sopravvenute disposizioni normative																																															
Cause impreviste e imprevedibili																																															

Ritardo	Note
1	<p>Silenziato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso l'IMEF, dei fondi affidati, nel 2010, dall'AMTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro);</li> <li>• condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione alle EMI.</li> </ul> <p>Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto, gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, e ha pervenire ogni atto progettuale utile.</p> <p>(All. Jn. 1, 1.a e 2.5)</p>
2	<p>Fondo dovuto ad una serie di atteggiamenti casativi e misive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo concernenti varie richieste, tra cui quella del trasferimento della ricerca necessaria per gli interventi della difesa del suolo, alla propria Direzione LL.PP., in virtù della L.R. 8/11/1998 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.</p> <p>(All. Jn. 2)</p>
3	<p>Fondo dovuto ad una serie di atteggiamenti casativi e misive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo concernenti varie richieste, tra cui quella del trasferimento della ricerca necessaria per gli interventi della difesa del suolo, alla propria Direzione LL.PP., in virtù della L.R. 8/11/1998 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.</p> <p>(All. Jn. 3.1 - 3.2)</p>

Data	Documento	Contenuto
18.10.2011	Progettazione preliminare.	Trasmissione all'ingegneriale dal Comune di Aelli.
06.10.2011	Comunicazione dalla Direzione Regionale d'Abruzzo	Nulla osta al trattamento complessivo dei fondi disponibili.
4.05.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo - accreditamento il tempo di inizio da parte della Regione Abruzzo.	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.572.939,93 (quale scatta ha € 20.727.770,78 in ordine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli necessariamente già accreditati, pari a € 02.181.851,22 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
01.02.2013	Nota prot. 9779, acquilata con prot. 32/CS del 07.02.2013.	Trasferimento fondi alla Contabilità Speciale n. 9531.
07.05.2013	Nota prot. RUP - Determinazione Commissariale n. 3 (All. B)	L'ing. Giuseppe Rizzo è nominato Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
24.05.2013	Nota prot. RUP - Inizio di supporto al Responsabile del Procedimento (All. B)	L'ing. Mauro Contababile, è incaricato, dal Responsabile del Procedimento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
24.06.2013	Inizio di collaborazione - attività di supporto al Responsabile del Procedimento e coordinamento dei Supporti al Responsabile del Procedimento.	Il Commissario Stipendiario conferisce all'ing. Francesco Savarò Migliorino l'incarico di collaborazione per l'implementazione dei compiti relativi alle attività di supporto ai Responsabili del Procedimento e per il coordinamento dei Supporti al Responsabile del Procedimento.
05.06.2013	DPP	Il RUP e il supporto al RUP redigono il DPP ai sensi degli artt. art 10 comma 1, lett. c) e 16, comma 5 e 6, dell' regolamento di esecuzione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
15.09.2013	Progetto Preliminare	L'ing. Biagio Massimo Cecconi, incaricato ai sensi dell'art. 126, c. 11, del D. Lgs. 163/2006 il giorno 26.09.2013 della programmazione preliminare e definitiva, consegna il progetto preliminare.
26.09.2013	Indagini geologiche	Lo stesso progettista, il giorno 04.10.2013, avendo acquisito il 02.10.2013 le indagini geologiche e rilevando opportuno, sulla base di questa, aggiornare il progetto preliminare trasmesso all'Ufficio Commissariale il 18.09.2013, consegna una aggiornata al progetto preliminare.
		Il progettista, Alessandro Caravita, incaricato ai sensi dell'art. 126, c. 11, del D. Lgs. 163/2006 il giorno 26.09.2013 delle indagini geologiche, consegna la relazione geologica come richiesto dal progettista.

M*	04.11.2013	Prospetto (04/18) (pg)	Successivamente al sopralluogo, il progettista ha dovuto apportare rilevanti modifiche e precisazioni alla natura geologica e paesistica dei luoghi attraverso ulteriori indagini. L'adattamento e l'esecuzione di tali indagini hanno portato nel necessario allungamento dei tempi previsti per la consegna delle progettazioni. Pertanto il RUP ha ritenuto opportuno assegnare al progettista una proroga di 10 gg per la redazione e consegna del progetto preliminare a far data dalla sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico. Il RUP ha ritenuto opportuno, per il necessario allungamento dei tempi previsti per la consegna delle progettazioni, prorogare il RUP di 10 gg per la consegna delle indagini geologiche e paesistiche. Pertanto la data di consegna del progetto definitivo è prorogata al 04.11.2013.
N	12.1.2013	Progetto Definitivo	
O	26.11.2013	1. Verifica tecnica del Progetto definitivo. (All. 7)	Durante la verifica tecnica è emersa la necessità di alcune modifiche ed integrazioni. Il RUP accetta la proposta e consegna entro il 18 dicembre 2013.
P	11.12.2013	Il Verifica tecnica del Progetto definitivo (All. 8)	Sulla base delle verifiche tecniche affidate il PO può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207.
Q	20.01.2014	Conferenza dei Servizi Decisionale.	Validata la specificità realizzativa emessa e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi del comma 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990 (o con modifica alla Legge 12/2010), ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque risulta partecipativa nei confronti degli altri soggetti coinvolti, ai sensi della "determinazione unica" di cui al comma 5, lettera "c" del d.lgs. n. 267 del 3 settembre 2000 (o con modifica alla Legge 12/2010).
<b>ALLEGATI AI RITARDI</b>			
<b>All. n°</b>	<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Contenuto</b>
1.1	18/07/2011	Nota prot. 056/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP. il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATM alla Regione (circa 20.000.000 di euro);
1.2	04/02/2011	Nota prot. 056/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo.	Il Commissario Straordinario chiede alla Regione Abruzzo per l'adempimento della comunicazione programmata riguardante gli interventi previsti;
1.3	04/02/2011	Nota prot. 058/918A – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	Il trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario Straordinario è stato autorizzato dalla Direzione Regionale LL.PP. (Decreto n. 100 del 12/02/2011) con la modalità di trasposizione dei fondi per la quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Strutturale, indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota il 60% alla pubblicazione dei bilanci di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori.
1.4	05/02/2011	Nota prot. 1658/918A – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del RUP.	La Direzione Regionale LL.PP. invia il Servizio di Difesa del Stato e proietta il trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10/02/2011	Nota prot. 086/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario sollecita:
1.6	30/02/2011	Nota prot. 1752/48A	• il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma. • la Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richieste: • accelerazione dei tempi; • l'adempimento dell'obbligo pubblico affidatario per l'esecuzione degli interventi.
2	12/2011 - 01/2012 - 02/2012	Bollettini mensili	Bollettini Mensili relativi all'archivio cartaceo ed al Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regionale Abruzzo (http://www.centrofunzionaleabruzzo.com/abruzzo)
3.1	28/12/2011	Nota prot. 055/918A – ammissione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. ha autorizzato il trasferimento delle somme ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. n. 277/99.
3.2	09/01/2012	Nota prot. 055/CS	Il Commissario Straordinario è stato informato che il trasferimento delle somme è stato convenuto con alcuni Trasferimenti alle risorse alla Direzione Generale del LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti;
4	01/02/2013	Nota prot. 57/9A, acquilata con prot. 520/CS del 07/02/2013	non è mai stato convenuto con alcuni Trasferimenti alle risorse alla Direzione Generale del LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; non è mai stato convenuto con alcuni Trasferimenti alle risorse alla Direzione Regionale LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti;
5	07/02/2013	Nota prot. 086/CS alla Regione Abruzzo	La Direzione Regionale LL.PP. ha autorizzato il trasferimento delle somme ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. n. 277/99. Il Commissario Straordinario è stato informato che il trasferimento delle somme è stato convenuto con alcuni Trasferimenti alle risorse alla Direzione Generale del LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti;
6	24/02/2013	Nota prot. 086/CS alla Regione Abruzzo	Il MATM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 57/9A, acquilata con prot. 520/CS del 07/02/2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.239,24 in nome di bilancio del RUP. Il Servizio di Difesa del Stato è stato informato che il trasferimento delle somme è stato convenuto con alcuni Trasferimenti alle risorse alla Direzione Generale del LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti;
7	28/11/2013	Verifica tecnica del Progetto definitivo, Verbale della prima seduta.	Il giorno 28 del mese di novembre dell'anno 2013 alle ore 10:30 presso l'Ufficio del Commissario Straordinario ha avuto luogo una riunione finalizzata alla verifica tecnica, alla presenza: ✓ per il Commissario Straordinario: dott. arch. Resai, dott. arch. Sara Francoson, dott. arch. Francesco Saverio Migliorini e della Sig.ra Anna Monti; ✓ per il RUP: ing. Giuseppe Rossi; ✓ per il progettista: ing. Mauro Contestabile; ✓ per il collaboratore: ing. Luca Capuano; ✓ per il professionista incaricato del Progetto: dott. Massimo Cerasci; ✓ per il professionista incaricato del Progetto: dott. Silvana Scudato, Antonio Procopio. Durante la verifica tecnica è stato approvato il progetto redatto e consegnato dall'arch. Massimo Cerasci sotto la supervisione del progettista. L'intervento, deve essere descritto in modo più puntuale, deve essere presa in considerazione una verifica preliminare della scelta progettuali individuali. 2. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 3. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 4. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 5. La documentazione economica deve essere rivista alla luce delle considerazioni fatte e in collaborazione con il coordinatore delle strutture, ricalcolando i costi per le occupazioni temporanee e le interferenze eventuali. Manca il censimento delle eventuali interferenze. 6. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 7. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 8. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 9. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 10. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 11. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 12. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 13. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 14. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 15. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 16. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 17. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 18. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 19. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 20. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 21. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 22. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 23. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 24. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 25. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 26. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 27. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 28. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 29. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 30. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 31. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 32. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 33. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 34. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 35. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 36. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 37. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 38. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 39. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 40. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 41. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 42. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 43. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 44. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 45. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 46. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 47. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 48. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 49. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 50. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 51. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 52. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 53. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 54. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 55. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 56. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 57. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 58. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 59. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 60. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 61. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 62. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 63. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 64. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 65. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 66. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 67. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 68. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 69. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 70. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 71. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 72. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 73. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 74. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 75. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 76. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 77. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 78. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 79. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 80. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 81. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 82. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 83. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 84. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 85. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 86. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 87. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 88. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 89. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 90. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 91. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 92. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 93. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 94. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 95. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 96. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 97. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 98. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 99. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali. 100. Il progetto deve essere approvato in relazione alle verifiche tecniche e paesistiche individuali.

✓	Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Ing. Antonio Presperi; Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 5 - "Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme (1° stralcio funzionale)"																																						
Ambito: Difesa del suolo - Provincia di Pescara – Comune: Caramanico – importo 1.000.000,00 € (progettazione esecutiva).																																						
(ripartizione mesi)			Primo anno						Secondo anno																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			Terzo anno																																			
Cronoprogramma al 30 gennaio 2012																																						
Aggiornamento Cronoprogramma al 24.12.2012 (come trasmesso dall'Ente prot. 380/CS)																																						
Riferimenti importanti			A B1 B2 C D E F1 F2 F3 G H I L M N O P Q R S T																																			
Assenza fondi																																						
Condizioni meteo			2 2 2																																			
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d P			1 1 3 3																																			
Impedimenti da parte di Enti avvalsi ed Enti Terzi			4 4 4 4 5 5 5 5 6 6																																			
Varianti in corso d'opera																																						
Sopravvenute disposizioni normative																																						
Cause impreviste e imprevedibili			7 7																																			

Ritardo	Note
<b>1</b>	Ritardo per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATM alla Regione (circa 20.000.000 di euro);</li> <li>• condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione edo Enti.</li> </ul> Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di risposta, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso contenzioso amministrativo, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli E.E.L.L. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6) Ritardo per avverse condizioni meteorologiche. (All. 2)
<b>2</b>	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e inasive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo contenenti varie richieste, tra cui quella del trasferimento delle risorse necessarie per gli interventi della difesa del suolo, alla propria Direzione LL.PP., in virtù della L.R. 81/1988 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (All. da 3.1 - 3.2)
<b>4</b>	Ritardo dovuto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse professionali in grado di svolgere la progettazione esecutiva e direzione lavori;</li> <li>• alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse professionali in grado di svolgere la progettazione esecutiva e direzione lavori;</li> </ul> Ritardo dovuto alla chiusura della Conferenza dei Servizi, a causa delle richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, avanzate da alcuni degli Enti invitati per l'acquisizione dei diversi pareri tra cui la Regione, il Genio Civile di Pescara, l'Ente Parco Nazionale della Majella, l'Ente - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE - PESCARA (Comando Provinciale di Pescara del Corpo Forestale dello Stato). La chiusura dei lavori, prevista per il giorno 04.07.2012, è avvenuta il 16.07.2012. (All. 5.1 – 5.5)
<b>6</b>	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Il cronoprogramma, su richiesta del Commissario, è stato rettificato dall'Ente e il ritardo precedentemente accumulato è stato gestito lasciando comunque invariata la durata complessiva dei lavori in 22 mesi, con utilizzazione prevista per novembre 2013.
<b>7</b>	Ritardo da imputare alla prima del Fiume Orta che non consente di procedere con i lavori di realizzazione delle briglie in alveo. In attesa di miglioramento IDL, ha proceduto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla consegna parziale dei lavori a norme delle prescrizioni degli artt. 153 e 154 (19.04.2013);</li> <li>• alla designazione dei lavori da eseguire (realizzazione pista d'accesso - preparazione del cantiere in generale);</li> </ul> Inoltre, il Comune ha richiesto all'Ente Parco Nazionale della Majella l'autorizzazione, durante la materiale esecuzione delle 4 briglie, a convogliare maggiore adduzione di acqua nel canale della SIA, società di gestione dell'impianto idroelettrico sul fiume Orta. L'acqua prelevata in più sarebbe successivamente reimmissa sull'Orta a valle. Si è pertanto in attesa di risposta. (All. 13 - 14)

RIFERIMENTI		
Data	Documento	Contenuto



<b>A</b>	13/22.09.2011	Progettazione preliminare/definitiva.	Trasmissione atti progettuali della Direzione Regionale e dal Comune di Caramanico Terme.
<b>B1</b>	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP. d'Abruzzo	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
<b>B2</b>	03.11.2011	Affidamento incarico progettazione definitiva - Determinazione del Servizio Tecnico Comunale n. 165 (All. 1.7)	Affidamento, mediante procedura in economia (ultimo fiduciario) all'ing. Alberto Incarico professionale per la progettazione definitiva per un corrispettivo nella misura di € 19.990,56 oltre IVA al 20%.
<b>C1</b>	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/160 del 18 agosto 2011 - accertamento e accreditamento il tracciato di fondi da parte della R. Unione.	Preso nota del trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
<b>D</b>	20.01.2012	Convenzione	Firma Convenzione tra Comitato Sizzardiano, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP. Cido Idico Integrato e Difesa del suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE). Con la firma della Convenzione, connotata dall'ordinanza di avvio, il Comitato ha dato formalmente avvio all'esecuzione dell'intervento.
<b>E</b>	17.03.2012	Progetto Definitivo - Nota prot. 1865, acquisita con prot. 120/CS del 28.03.2012.	La Convenzione viene sottoscritta in assenza (non giustificata) del conferenziario Generale del LL.PP. della Regione Abruzzo. Trasmissione progetto definitivo, ai fini della convocazione della Conferenza dei Servizi. Il progetto, dell'importo di 1.000.000,00 € è uno stralcio di un progetto generale <i>Risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme</i> , dell'importo complessivo di 6.900.000,00 €, redatto da un gruppo comunale di tecnici fra cui l'ing. Alberto Claudio (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 09.06.2011). Lo stesso presentava carenze in merito al Quadro Economico, elaborato quale parte di un più ampio programma d'interventi, dunque con costi progettuali non riferibili allo specifico stralcio di competenza Commissionaria. Tale ragione ha reso necessaria una verifica con conseguente rettifica del quadro economico in vista della prossima convocazione della Conferenza dei Servizi, prevista per il giorno 03.05.2012.
<b>F1</b>	14.05.2012 - 18.06.2012	Conferenza dei Servizi - Determinazione Dirigenziale n. 92 (All. 5.1 - 6.2)	Conferenza dei Servizi, presieduta dal Sindaco, con l'assistenza del progettista definitivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>con Delib. Dirigenziale n. 92 e affidato l'incarico, mediante procedura in economia (ultimo fiduciario) alla Società TECHNOSOL SRL di Spoltore, per sondaggi, prove e rilievi geologici dei lavori;</li> </ul>
<b>F2</b>	16.07.2012	Il Conferenza dei Servizi (All. 5.3 - 5.4 - 5.5)	Il giorno 16.07.2012 presso la sede Comunale de L'Aquila, alle ore 11:00, ha avuto luogo la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per l'intervento. Partecipano su delega Commissionaria, l'arch. Rossi e il rag. Antonelli.
<b>F3</b>	11.10.2012	Approvazione progetto definitivo - Deliberazione di Giunta Comunale n. (All. 3.6)	E' approvato il progetto definitivo con qualche modifica di lieve entità da apportare direttamente sul progetto esecutivo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,00.000,00 di cui € 622.294,97 per lavori, comprensivi di 16.123,34 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e di € 377.766,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;</li> <li>• Nomina a RUP del geom. Filippo De Ingenis;</li> </ul>
<b>G</b>	15.10.2012	Affidamento incarico progettazione esecutiva - Comunicazione Telefonica - RUP, geom. De Ingenis	si apprende che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la progettazione esecutiva è stata affidata direttamente ad un tecnico esterno al Comune (ai sensi del combinato disposto degli art. 91, c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006, i servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 € possono essere affidati direttamente alla Stazione Appaltante previa indicazione dei medesimi nel Regolamento Interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia);</li> <li>• la consegna del progetto esecutivo è prevista per il 26 ottobre p.v.;</li> <li>• la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori verrà selezionata entro dicembre mediante procedura negoziata con invito rivolto a 10 ditte, senza pubblicazione di bando (art. 122, c. 1, del D. Lgs 163/2006, importo superiore a 500.000,00 €).</li> </ul>
<b>H</b>	25.10.2012 29.10.2012	Progetto Esecutivo - Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 trasmissione (All. 6.1 - 6.2)	Con Delib. Dirigenziale n. 103, il progetto esecutivo è stato approvato. E' approvato il progetto esecutivo, di cui € 622.427,70 per lavori, comprensivi di 40.399,72 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e di € 377.572,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione; il geom. Filippo De Ingenis è nominato RUP; Trasmissione del progetto esecutivo approvato.
<b>I</b>	27.11.2012	Istituzione Ufficio Direzione Lavori e nomina Collaudatore - Determina 169 - 170 (All. 7.1 - 7.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituzione Ufficio Direzione Lavori e nomina Collaudatore.</li> <li>• Direttore dei Lavori ing. Di Giovanni Bartolomeo;</li> <li>• Collaudatore ing. Palumbo Paolo;</li> </ul>
<b>L</b>	28.11.2012 20.12.2012	Trasmissione inviti alle 10 Ditte per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata - Aggregazione provvisoria (All. 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura negoziata con invito rivolto a 10 ditte (art. 87, c. 6 del D. Lgs. 163/06), senza pubblicazione di bando (art. 122, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, importo superiore a 500.000,00 € e inferiore ad 1.000.000,00 €);</li> <li>• trasmissione inviti il 28.11.2012;</li> <li>• aggiudicazione provvisoria all'impresa Di Pesis Costruzioni Srl il giorno 20.12.2012;</li> </ul>
<b>M</b>	24.12.2012	Aggiornamento Cronoprogramma (All. 8)	L'Ente comunica che in data 20.12.2012 è stata espunta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. A partire da tale data viene rettificato il Cronoprogramma lavori.
<b>N</b>	23.01.2013	Aggiudicazione definitiva lavori - Determina Dirigenziale n. 35 (All. 9)	Aggiudicazione definitiva lavori all'impresa Di Pesis Costruzioni Srl di Montesilvano con Determina Dirigenziale n. 35 del Responsabile del Servizio Tecnico.
<b>O</b>	03.04.2013	Contratto d'appalto - Verbale di Sopralluogo n. 8 (All. 11)	Stipula del contratto d'appalto.
<b>P</b>	18.04.2013	Consegna parziale dei lavori - Verbale di Consegna Parziale dei Lavori (All. 12)	Il Direttore dei Lavori, in riferimento all'invito ricevuto dal RUP ha proceduto alla consegna parziale dei lavori a norma della prescrizione degli artt. 153 e 154, del DPR 207/2010 e del Contratto D'Appalto, constatato che l'area di intervento non è al momento disponibile nella sua interezza poiché la portata attuale del fiume non consente di operare in alveo. Pertanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il DL, ha designato i lavori da eseguite (realizzazione pista d'accesso 700m) - preparazione del cantiere in generale;</li> <li>• l'Appaltatore ha dichiarato di accettare i suoi obblighi e che presenterà un programma di esecuzione di lavori prioritari ex art. 154, c. 7 del DPR 207/2010;</li> </ul>
<b>Q</b>	09.07.2013	Consegna Definitiva dei lavori - Verbale di Sopralluogo n. 17 - (All. 14)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I lavori sono stati consegnati in via definitiva;</li> <li>• il DL, una volta acquisita l'autorizzazione all'Ente Parco della Majella per il prelievamento di un maggior quantitativo d'acqua dal Fiume Orta dal punto di presa della Centrale idroelettrica posta a monte del cantiere, per migliorare le condizioni di lavoro, procederà con la realizzazione delle briglie;</li> </ul>
<b>R</b>	21.10.2013	Perizia di variante (All. 15 - 16)	Perizia supplementare e di variante dovuta principalmente alle avverse condizioni atmosferiche del mese di giugno. (plogge a carattere temporalesco) che hanno determinato una portata del fiume superiore a quella normale con aggravio delle condizioni lavorative e la necessità di sospensione dei lavori per la redazione della perizia stessa (nota prot. n. 5803 del 21.10.2013, acquisita con prot. 284/CS del).

<b>S</b>	05.11.2013	Certificato ultimazione lavori (All. 17)	L'importo complessivo della perizia è di € 1.000.000,00 così distinto: l'importo netto dei lavori di perizia ammonta a € 605.482,80 (compresi oneri sicurezza € 43.538,04) e di € 394.517,20 per somme a disposizione dell'amministrazione con un incremento rispetto al progetto originario contenuto entro il 20 %, nel rispetto del c. 12 dell'art. 161 del Regolamento;
<b>T</b>	05.11.2013	Attività procedura di collaudo (All. 16)	Il DL, ing. Bartolomeo Di Giovanni, certifica che i lavori sono stati ultimati il giorno 5 novembre 2013 e quindi in tempo utile contrattuale;
			<ul style="list-style-type: none"> <li>prove di schiacciamento dei cubetti di c/s e prova a trazione dei ferri;</li> <li>in corso la predisposizione della Relazione di collaudo;</li> </ul>

**ALLEGATI AI RITARDI**

Al. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: <ul style="list-style-type: none"> <li>il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro);</li> <li>tutti i documenti progettuali assistenti e competenti l'Accordo di Programma;</li> </ul> Il Commissario Straordinario, affida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti;</li> <li>del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);</li> </ul>
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – affida per adempimenti Regione Abruzzo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nel corso di avanzata ai laghi e Roseto degli Abruzzi);</li> <li>conferma l'importo del 30% a seguito della redazione del Programma Straico, indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori);</li> </ul> La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.3	04.08.2011	Nota prot. 165979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Commissario Straordinario sollecita:</li> <li>il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma;</li> <li>la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;</li> <li>l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;</li> <li>accelerazione dei tempi;</li> </ul> La Direzione Regionale LL.PP. affida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede:
1.4	05.08.2011	Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> <li>il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> </ul>
1.5	10.08.2011	Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> <li>il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> </ul>
1.6	30.08.2011	Nota prot. 177524/RA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> <li>il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> </ul>
1.7	03.11.2011	Determinazione del Servizio Tecnico Comunale n. 165	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> <li>il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> </ul>
2	12.2011-01.2012 - 02.2012	Bolettinii meleo	Bolettinii Meleo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo <a href="http://www.serviziocentrofunzionale.abruzzo.org/meleo/">http://www.serviziocentrofunzionale.abruzzo.org/meleo/</a>
3.1	28.12.2011	Nota prot. 285648/RA – attivazione interventi	Il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;
3.2	08.01.2012	Nota prot. 008/CS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> <li>il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> </ul>
4.1	07.03.2012	Verbale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> <li>il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> </ul>
4.2	07.05.2012	Nota prot. 170/CS - Sollecito	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> <li>il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> </ul>
5.1	26.05.2012	Nota prot. 39011 - acquisita con prot. 189/CS - indicazione e convocazione Conferenza dei Servizi del giorno 14.05.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> <li>il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> </ul>
5.2	14.05.2012	Verbale Conferenza dei Servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> <li>il servizio di Difesa del Suolo ha provveduto a trasferire il 30% dei fondi disponibili;</li> </ul>

			manutenzione delle opere in progetto. Conferma, infine, la necessità della valutazione d'incidenza e chiede di verificare "in situ" la fattibilità della strada di accesso al cantiere.
5.3	15.06.2012	Nota prot. 4311 acquisita con prot. 203/CS del 15.06.2012 – convocazione riunione tecnica.	<p>Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta necessario per la valutazione d'incidenza ambientale ritiene opportuno sospendere i lavori e rinviare ad una successiva seduta (già ipotizzata per il giorno 4 luglio p.v.) il Comune di Caramanico indice un incontro tecnico, per il 19.06.2012 alle ore 10,00 presso la sede del Comune, per definire compiutamente le tipologie di alcuni interventi di progetto. Sono convocati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione,</li> <li>• Corpo Forestale,</li> <li>• Genio Civile,</li> <li>• Parco Nazionale della Matese,</li> <li>• Parco Nazionale della Mafella.</li> </ul> <p>Il Responsabile del Procedimento, Geom. De Ingenis, indice e convoca la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per il giorno 16.07.2012, alle ore 11,00, presso il Palazzo TAR all'Aquila. Viene trasmesso contestualmente il progetto definitivo unitamente alle integrazioni prodotte.</p> <p>Sono formalmente invitati a partecipare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissario Straordinario;</li> <li>• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;</li> <li>• Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo;</li> <li>• Regione Abruzzo – Ispettorato Dipartimentale delle Foreste;</li> <li>• Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo del Genio Civile, Regionale di Pescara;</li> <li>• Parco Nazionale della Mafella;</li> <li>• Regione Abruzzo – Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale;</li> </ul> <p>Transmissione copia conforme del 1° verbale della Conferenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.07.2012.</p> <p>Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro economico redatto dal professionista incaricato, ing. Claudio Alberico, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 622.234,67 per lavori, comprensivi di 18.123,34 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e di € 377.765,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione;</li> <li>• geom. Filippo De Ingenis è nominato RUP;</li> </ul>
5.4	05.07.2012	Nota prot. 4759 acquisita con prot. 217/CS del 17.07.2012	<p>Il Comune di Caramanico, in riferimento alla richiesta avanzata dal Commissario con nota prot. 374/CS del 13.09.2012, comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20.04.2012 – Conferenza dei Servizi;</li> <li>• 14.06.2012 – Conferenza dei Servizi;</li> <li>• 16.07.2012 – Conferenza dei Servizi;</li> <li>• 25.10.2012 – approvazione progetto esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103;</li> <li>• a breve sarà attivata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori;</li> </ul> <p>Transmissione progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale (delibera n. 103).</p> <p>E' affidato, mediante procedura in economia (coltino fiduciario), all'ing. Di Giovanni Bartolomeo, l'incarico professionale per la direzione dei lavori e contabilità per un corrispettivo nella misura di € 26.033,70 oltre Cassa al 4% e IVA al 21%;</p>
5.5	16.07.2012	Nota prot. 5049, acquisita con prot. 228 del 27.07.2012	
5.6	11.10.2012	Deliberazione di Giunta Comunale n. 102;	
6.1	26.10.2012	Nota prot. 7996, acquisita con prot. 322/CS	<p>Il Comune di Caramanico, in riferimento alla richiesta avanzata dal Commissario con nota prot. 374/CS del 13.09.2012, comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20.04.2012 – Conferenza dei Servizi;</li> <li>• 14.06.2012 – Conferenza dei Servizi;</li> <li>• 16.07.2012 – Conferenza dei Servizi;</li> <li>• 25.10.2012 – approvazione progetto esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103;</li> <li>• a breve sarà attivata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori;</li> </ul> <p>Transmissione progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale (delibera n. 103).</p> <p>E' affidato, mediante procedura in economia (coltino fiduciario), all'ing. Di Giovanni Bartolomeo, l'incarico professionale per la direzione dei lavori e contabilità per un corrispettivo nella misura di € 26.033,70 oltre Cassa al 4% e IVA al 21%;</p>
6.2	29.10.2012	Nota prot. 7985	
7.1	27.11.2012	Determinazione Dirigenziale n. 169	
7.2	27.11.2012	Determinazione Dirigenziale n. 170	
8	24.12.2012	Nota prot. 9503, acquisita con prot. 360/CS del 27.12.2012	<p>L'Ente comunica che in data 20.12.2012 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.</p> <p>Il conoprogramma viene rettificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26.12.2012 – gara per l'affidamento dei lavori;</li> <li>• 27.12.2012 – chiusura della gara;</li> <li>• 28.12.2012 – chiusura lavori e collaudo.</li> </ul> <p>La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013.</p>
9	23.01.2013	Determinazione Dirigenziale n. 35	<p>con Determinazione Dirigenziale n. 35 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• approvate le risultanze di gara ed il verbale della Commissione Giudicatrice, verbale redatto in data 20.12.2012, con cui è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori all'impresa DI PERSEO COSTRUZIONI srl, che ha offerto un ribasso d'asta del 15,08% con un importo di aggiudicazione per i lavori pari a € 534.657,89 compreso oneri sicurezza;</li> <li>• aggiudicati definitivamente i lavori alla stessa impresa;</li> </ul>
11	09.04.2013	Verbale di sopralluogo n. 11	<p>Il RUP riferisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In data 03.04.2013 è stato stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria ed entro 10 giorni è prevista la consegna dei lavori, almeno per tutto quel che concerne la preparazione del cantiere e le opere esterne al corso del fiume;</li> <li>• Per quanto riguarda la richiesta di ricompenzazione per il PAV/DS, trasmessa dal Commissario Sileudrini con nota prot. n. 048/CS, acquisita dal Comune di Caramanico al prot. n. 2285 del 22.02.2013, ha adempito alla suddetta richiesta in data 08.04.2013.</li> </ul>
12	18.04.2013	Verbale di Consegna Parziale dei Lavori	<p>Il Direttore dei Lavori, in ottemperanza all'ordine ricevuto dal RUP ha proceduto alla consegna parziale dei lavori a norma delle prescrizioni degli artt. 153 e 154, del DPR 2072/2010 e del Contratto D'Appalto, constatato che l'area di intervento non è al momento disponibile nella sua interezza poiché la portata attuale del fiume non consente di operare in altro. Pertanto.</p>

13	04.07.2013	con nota prot. 4548, acquisita con prot. 160/CS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il DL ha designato i lavori da eseguire;</li> <li>• l'Appaltatore ha dichiarato di accettare i suoi obblighi e che presenterà un programma di esecuzione di lavori prioritari ex art. 154, c. 7 del DPR 207/2010;</li> </ul> <p>Il Comune in riferimento all'esecuzione di una parte dei lavori espone, all'Ente Parco Nazionale della Majella (e.p.c. al CS) quanto segue: «Finoché la realizzazione degli interventi inerenti le gallerie di calcestruzzo, in corrispondenza di ciascuna delle 4 briglie in fase di ricostruzione, possa avvenire con il minor passaggio di acqua dal fiume Orta e quindi in totale sicurezza, si richiede l'autorizzazione, durante la materiale esecuzione degli stessi (1 giorno a briglia), a convogliare maggiore adduzione di acqua nel canale della SIA, società di gestione dell'impianto idroelettrico sul fiume Orta. L'acqua prelevata in più sarebbe reinmessa sull'Orta a valle.</p> <p>Il RUP riferisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I lavori, consegnati in via definitiva, stanno procedendo con la realizzazione delle briglie;</li> <li>• Come già comunicato al Commissario Straordinario, a mezzo fax in data 04.07.2013 con prot. n. 4548, è stata richiesta autorizzazione all'Ente Parco della Majella per consentire di prelevare un maggior quantitativo d'acqua dal Fiume Orta dal punto di presa della Centrale idroelettrica posta a monte del cantiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro; si è ancora in attesa di un riscontro in merito.</li> </ul>
14	09.07.2013	Verbale di Sopralluogo n. 17 – consegna definitiva del cantiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono in corso i lavori per la realizzazione delle rampe per la risalita dei pasco;</li> <li>• Nel corso di una visita in cantiere, tenutasi in data 19.10.2013, il Direttore Lavori e l'Impresa riferivano che i lavori sarebbero definitivamente ultimati entro la corrente settimana;</li> <li>• Si consegna "brevi manu" copia della Perizia di variante (prot. n. 6803 del 21.10.2013) redatta a seguito delle difficoltà riscontrate durante l'esecuzione dei lavori dovute principalmente alle cattive condizioni atmosferiche verificatesi durante i mesi di giugno e luglio 2013, come già riportato nei precedenti verbali;</li> </ul>
15	22.10.2013	Verbale di Sopralluogo (n. 23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Comune di Caranatico trasmette una copia della perizia di variante uniformemente alla Delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale. L'importo netto dei lavori di perizia ammonta a € 605.462,80 (compresi oneri sicurezza) con un incremento rispetto al progetto originario contenuto entro il 20 %, nel rispetto del c. 12 dell'art. 161 del Regolamento;</li> </ul>
16	30.10.2013	nota prot. 6803 del 21.10.2013, acquisita con prot. 284/CS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stata attivata la procedura del collaudo, si è in attesa dei risultati di laboratorio delle prove di schiacciamento dei cubetti di calce e della prova a trazione dei ferri; Si consegna il certificato di ultimazione dei lavori avvenuto in data 05.11.2013 in tempo utile contrattuale, si consegna "brevi manu" copia del suddetto certificato;</li> <li>• È in corso la predisposizione della Relazione di collaudo dell'intervento in oggetto che sarà trasmessa al Commissario Straordinario non appena acquisita;</li> </ul>
17	19.11.2013	Verbale di Sopralluogo (n. 25)	
18	17.12.2013	Verbale di Sopralluogo (n. 26)	





				- progettazione esecutiva e condizionamento della sicurezza in fase di progettazione; entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo;
<b>I</b>				Aggiornamento Prospettiva Lavori
<b>L1</b>				Prima convocazione in seduta pubblica della commissione giudicatrice di gara.
<b>L2</b>				Acqueduzione provvisoria della rete per l'adempimento dell'obbligo di progettazione e servizi connessi dei lavori derivanti - interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dell'abitato di Garsoli, all'RTT D) Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. (mandatario BETA Studio S.r.l. e mandataria CAS), per l'importo complessivo di 500.000,00 €, con un base: ✓ sul prezzo del 26%; ✓ sul tempo del 30%.
<b>L3</b>				Aggiudicazione definitiva all'RTT D) Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. (mandataria BETA Studio S.r.l. e mandataria CAS).
<b>M</b>				Il SUP - Un consorzio degli imprenditori agricoli, in forma di società a partecipazione paritetica, ha affidato i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di servizi idrici, in primis della sponda del canale. All'ATI partecipano Beta Studio SRL, mandataria CAS D) Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. che ha offerto un ribasso sull'importo di gara pari al 26%, ed un ribasso sul tempo d'esecuzione pari al 30%. ✓ 90 gg per la progettazione preliminare e definitiva. ✓ 30 gg per la progettazione esecutiva e definitiva.
<b>N</b>				Il Comitato Straordinario preso atto del notevole ritardo accumulato dall'Ente nell'adempimento delle funzioni svolte (verificabile anche dalle informazioni acquisite, con sopralluoghi condotti dalla ditta Seta Park), chiede allo stesso di motivare tale inaspribile lentezza. Informa inoltre che, in assenza di elementi incontestabilmente giustificativi di tale condotta, si procederà tempestivamente alla revoca dell'avvelamento.
<b>O</b>				Acquisione agli atti del Comune con prot. 7165. ✓ Acquisto di un terreno di proprietà di un'azienda agricola, in via S. Maria, n. 10, nel Comune di Garsoli, in primis della sponda del canale. ✓ Assegnati Sfr) in piano particolare di esproprio.
<b>P</b>				Acquisione agli atti del Comune con prot. 934. ✓ Copia cartaceo e carteggiata agli Uffici Commissariati il 08/10/2013.
<b>Q</b>				Avvio delle procedure relative agli esposti incidenti i relativi avvisi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (pubblicazioni su due quotidiani, nazionale e locale, mandati invariati e albo pretorio del Comune).
<b>R</b>				Prima convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione del PD di Incastrazione di tutti i pareri e nulla osta comunicati elettronicamente ai sensi degli artt. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
<b>S</b>				Conferenza dei Servizi disposta ✓ dalla Soprintendenza per i Beni Culturali, ✓ sulla base delle indicazioni della Regione Abruzzo e proceduta alla redazione di VA, ✓ nei tempi necessari per la suddetta valutazione di impatto ambientale si provvederà inoltre all'ottenimento dei pareri ancora mancanti ( paesaggistica, archeologica, etc.), utilizzando le procedure di tipo ordinario che sono state richieste da vari Enti competenti.
				<b>ALLEGATI AI RITARDI</b>
<b>All. n°</b>	<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Contenuto</b>	
1.1	19.07.2011	Nota prot. 050/CS alla Regione Abruzzo	Il Comitato Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: ✓ l'invio di un sopralluogo, ✓ tutti i documenti progettuali esposti e competenti (Accordo di Programma).	Il Comitato Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: ✓ invio di un sopralluogo, ✓ l'invio di un MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATM alla Regione (circa 20.000.000 di euro).
1.2	04.08.2011	Nota prot. 036/CS - diffida per adempimenti R.A.	Il Comitato Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: ✓ della documentazione programmata riguardante gli interventi previsti ✓ dalla Direzione Regionale del Commissario (comprensiva alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma).	Il Comitato Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: ✓ della documentazione programmata riguardante gli interventi previsti ✓ dalla Direzione Regionale del Commissario (comprensiva alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma).
1.3	04.09.2011	nota prot. 1893/9/RA - comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	La Direzione Regionale LL.PP. informa il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 50% dei fondi disponibili.	Definizione delle urgenze in merito ai lavori (onere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Eno) grazie all'offerta della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi).
1.4	05.09.2011	Nota prot. n. 16560/RA - risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.09.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. informa il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 50% dei fondi disponibili.	La Direzione Regionale LL.PP. informa il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 50% dei fondi disponibili.
1.5	10.09.2011	Nota prot. n. 09/CS	Il Comitato Straordinario sollecita che, nei limiti dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma: ✓ trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.	Il Comitato Straordinario sollecita che, nei limiti dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma: ✓ trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.
1.6	30.09.2011	Nota prot. n. 17524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. affida il Comitato Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: ✓ l'invio di un sopralluogo, ✓ l'invio di un MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATM alla Regione (circa 20.000.000 di euro).	La Direzione Regionale LL.PP. affida il Comitato Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: ✓ l'invio di un sopralluogo, ✓ l'invio di un MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATM alla Regione (circa 20.000.000 di euro).
2	12.2011-07.2012-02.2012	Bollettini in merito	Bollettini in merito all'invio ordine del Sita della Probazione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo <a href="http://www.abruzzo.com/centralita/abruzzo/centralita/abruzzo">http://www.abruzzo.com/centralita/abruzzo/centralita/abruzzo</a> .	Bollettini in merito all'invio ordine del Sita della Probazione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo <a href="http://www.abruzzo.com/centralita/abruzzo/centralita/abruzzo">http://www.abruzzo.com/centralita/abruzzo/centralita/abruzzo</a> .
3.1	08.12.2011	Nota prot. 2525/26/RA - acquista con prot. 133/CS del 12.12.2011 - proposta di intervento.	La Regione Abruzzo sollecita il trasferimento della somma delle somme alle proprie Direzioni LL.PP. per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: ✓ L'Aquila (AQ); ✓ Pescara (PE); ✓ Teramo (TE); ✓ Pescara (PE); ✓ Chieti (CH); ✓ Campobasso (CB).	La Regione Abruzzo sollecita il trasferimento della somma delle somme alle proprie Direzioni LL.PP. per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: ✓ L'Aquila (AQ); ✓ Pescara (PE); ✓ Teramo (TE); ✓ Pescara (PE); ✓ Chieti (CH); ✓ Campobasso (CB).
3.2	15.12.2011	Nota prot. 2514/20/RA - acquista con prot. 037/CS del 15.12.2011 - situazione interventi.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita urgentemente il trasferimento delle risorse alle proprie Direzioni Regionali.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita urgentemente il trasferimento delle risorse alle proprie Direzioni Regionali.
3.3	28.12.2011	nota prot. 2505/45/RA - attuazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita urgentemente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 2/7/99.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita urgentemente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 2/7/99.





9.1			<p>La prescrizione risulta sovradimensionata di almeno 7 mesi rispetto ai tempi commissariali e alla effettiva possibilità di esecuzione;</p> <p>Il RUP riferisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la Commissione risulta nominata, a far data dal 17.07.2013, e ha avuto la prima convocazione il giorno 19.07.2013 in seduta pubblica e nel corso della stessa seduta è stata avviata la fase di ammissione delle offerte richiedenti fino a completare tale fase per circa il 50% delle offerte presentate;</li> <li>• è stata già rinviata nella stessa sede la successiva seduta, che avverrà in forma privata, e che è stata convocata per il giorno 26.01.2013 alle ore 9.00;</li> <li>• si sono svolte le prime 7 riunioni di gruppo, come indicato nel precedente verbale del 03.07.2013;</li> <li>• il programma non è stato ancora approvato, entro la settima seduta si provvederà alla redazione ed invio della base.</li> </ul> <p>Il RUP riferisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavori della Commissione non sono ancora conclusi, contemporaneamente a quanto dichiarato nel verbale del 06.02.2013 nonché nell'aggiornamento del programma, trasmesso al Commissario Straordinario con PEC, in data 05.02.2013;</li> <li>• il bando pubblico è stato dovuto ad alcuni rinvii del calendario della Commissione causati dall'indisponibilità dei membri per motivi di salute e per motivi di sovrapposizione di impegni;</li> <li>• Sono state svolte n. 7 riunioni della Commissione e al momento è stata convocata per il giorno 21.03.2013 alle ore 16.00 (stavolta è stata espletata in forma pubblica); in tale seduta è prevista l'aggiudicazione provvisoria in relazione all'individuazione della migliore offerta selezionata;</li> <li>• I lavori della Commissione si sono svolti con la partecipazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Canoli, Ing. Quirino D'Avona in qualità di Presidente, come membri (Ing. Giuseppe Venturini, Dirigente del Ufficio Opere Pubbliche e Ing. Angelo Caracciolo, Responsabile del Servizio Tecnico);</li> <li>• L'incarico di redigere il bando pubblico è stato affidato ad un professionista che ha affidato per i relativi adempimenti ai propri collaboratori.</li> </ul> <p>Il RUP riferisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il CAS ha completato la redazione di tutte le documentazione necessaria, con delibera n.42 del 16.04.2013, sono stati affidati definitivamente al consorzio ATI Beta Studio s.r.l. con sede in Poggioreale (PD) con mandato CAS Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l., la sopracitata d.d.m. sarà acquisita non appena completata l'iter di pubblicazione; si provvederà, inoltre, a trasmettere la stessa nell'ambito dell'aggiornamento della documentazione richiesta per il REMDIS;</li> <li>• La Commissione di Gara ha svolto n. 7 sedute a partire dal 18.01.2013 al 21.03.2013;</li> <li>• Per concludere la procedura di gara si sta provvedendo alla pubblicazione degli avvisi di partecipazione e all'invio di gara;</li> <li>• in tale sede si sta ora in corso il processo di scelta con un'ultima rappresentanza dell'ATI (ing. Massimo Costato) al fine di procedere alla consegna, sotto rinvio di legge, dei servizi di ingegneria come da offerta presentata.</li> </ul> <p>Il RUP, alla presenza degli intervenuti, con la scelta degli atti di gara, effettuati i necessari riscontri ed esaminata tutta la documentazione, ha emanato una nota di incarico, in precedenza, in data 23.04.2013, con cui ha affidato al Consorzio di Ingegneri Ingegneri Associati S.r.l. che ha offerto un ribasso sull'importo di gara pari al 29% ed un ribasso sul tempo di esecuzione pari al 30%, il tempo utile per dare ulteriori servizi alleone dalla data del verbale per una tempistica complessiva di 128gg, così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 89gg per la progettazione esecutiva;</li> <li>• 39gg per la progettazione esecutiva;</li> </ul>
9.2	Verbale di Soprallocco n. 6		
9.2		13.07.2013	<p>Verbale di Soprallocco n. 3</p>
10	Verbale di Soprallocco n. 12 (completato debitamente)	23.04.2013	
11	Verbale di consegna sotto riserva di legge, dei servizi di ingegneria come da offerta presentata	23.04.2013	
12.1	Verbale di Soprallocco (n. 17)	09.07.2013	
12.2	Nota prot. 184/GCS	15.07.2013	
13.1	Verbale di Soprallocco (n. 21)	25.09.2013	
13.2	Verbale di Soprallocco (n. 22)	09.10.2013	
13.3	Nota Prot. 295/GCS	16.10.2013	
14	Nota prot. 108/2 del 25.11.2013, acquisita con prot. 319/GCS	22.11.2013	
15	Verbale Il CAS	18.07.2014	

PAGINA BIANCA



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

## **Accordo di Programma**

**“Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari  
per la mitigazione del rischio idrogeologico”**

tra il

**Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

e la

**Regione Basilicata**

sottoscritto in data 14 dicembre 2010

**Atto integrativo**

sottoscritto in data 14.06.2011

**Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012**

(G.U. n. 121 del 25.05.2012)

***RELAZIONE  
AL 31 DICEMBRE 2013***

---

PAGINA BIANCA



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## **INDICE**

1. INTRODUZIONE
2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2013
3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO
4. ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA' SPECIALE DEL COMMISSARIO
5. LA GESTIONE DEL PROGRAMMA AL 31 DICEMBRE 2013
6. QUESTIONI DI BILANCIO RELATIVE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE
7. GRAFICI DI SINTESI
8. CRITICITÀ

PAGINA BIANCA



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## 1. INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata hanno stipulato, in data il 14 dicembre 2011, un **Accordo di Programma** (allegato n. 1) finalizzato alla *"Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"* da effettuare nel territorio della Regione Basilicata nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In particolare gli interventi, da realizzare nell'ambito dell'AdP "Difesa del Suolo", rientrano nella proposta di programmazione regionale che tiene conto delle numerose richieste pervenute agli Uffici della Regione Basilicata oltre che di quelle pervenute direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale.

Sulla base di dette richieste sono stati selezionati e catalogati, in relazione alla priorità, oltre trecentotrenta interventi, per un fabbisogno totale di circa 300 milioni di Euro.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n.191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Basilicata e della Protezione Civile i primi 85 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato - elenco "A", come finanziabili, per un importo complessivo di € 26.935.000,00.

L'atto integrativo sottoscritto in data 14.06.2011 ha inteso inserire nella programmazione altri 21 interventi con la previsione di un ulteriore finanziamento di € 8.269.000,00 da gravare sull'art. 2 comma 240 della legge n. 191/2009.

L'accordo, all'art. 5, prevedeva che, per l'attuazione degli interventi, i sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Presidente della Regione Basilicata, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 21 gennaio 2011 (allegato n.2), il sottoscritto, ing. Francesco Saverio ACITO, "Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui all'allegato A dell'AdP della Regione Basilicata".

La Giunta Regionale di Basilicata, dal canto suo, con la deliberazione 12.07.2011 n.1013 ha, tra l'altro:

- a) preso atto dell'Accordo stipulato in data 14.12.2010;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

b) preso atto della nomina del Commissario Straordinario effettuato con DPCM 21.01.2011;

c) deliberato di ammettere a finanziamento i 33 interventi che l'Accordo pone a carico della Regione Basilicata inserendoli sulla Linea di intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013;

d) deliberato di fornire al Commissario supporto logistico con relativi servizi e materiali di consumo oltrech  di unit  di proprio personale per il tempo necessario alle effettive necessit , previa intesa con i Dirigenti dei Dipartimenti interessati.

Con deliberazione 22.12.2011, n.1943 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, stabilito:

a) che la Regione Basilicata funge da beneficiario di tutte le operazioni finanziate con il PO FESR Basilicata 2007/2013;

b) che il Commissario Straordinario ed il Responsabile della Linea di Intervento dovranno assicurare, ciascuno per le proprie competenze, la gestione, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicit  delle operazioni nel rispetto delle disposizioni regolamentare comunitarie;

c) di autorizzare l'Ufficio Difesa del suolo alla predisposizione degli atti per la approvazione dei quadri economici e della pista di controllo ed impegnare e disporre la liquidazione del contributo sulla contabilit  speciale n.5594 aperta in favore del Commissario Straordinario presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, nel rispetto delle disposizioni e secondo la tempistica degli articoli 22 e 20 della Direttiva OO.PP. (D.G.R. n.759/2011).

Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto integrativo intervenuto il 14.06.2011 la Giunta regionale con deliberazione n. 637 in data 22.05.2012 ha altresì:

a) preso atto dei 21 nuovi interventi;

b) ha confermato la nomina del Commissario quale soggetto attuatore degli interventi;

c) ha confermato la garanzia del supporto al Commissario.

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 121 del 25.05.2012 della delibera CIPE n.8 del 20.01.2012, la Giunta Regionale di Basilicata, con provvedimento del 4.07.2012 n.860, ha deliberato, tra l'altro:

a) di individuare il Commissario Straordinario Delegato di cui al DPCM 21.01.2011 quale "soggetto attuatore" degli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 8/2012;

b) ha demandato allo stesso Commissario l'attivit  di progettazione e di individuazione del contraente.





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## 2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2013

L'art. 2 del DPCM 21.01.2011 di nomina, ha definito puntualmente i compiti del Commissario:

- **attuare** gli interventi,
- **provvedere** alla opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,
- **emanare** gli atti e i provvedimenti
- **curare** tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.

Al Commissario sono state attestate, quindi, competenze *esclusivamente* di **attuazione** con **esclusione** delle attività di **programmazione**.

L'art. 4 del decreto di nomina ha individuato, poi, le possibili collaborazioni ed anche i limiti dei protagonismi:... *“Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente ... delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006”*...

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 si è provveduto, inizialmente, ad avviare le fasi propedeutiche a quella attuativa, individuando rapidamente i RUP (Responsabile Unici dei Procedimenti), dei singoli interventi inseriti nell'allegato 1 - elenco A dell'A.d.P., esclusivamente tra i dirigenti degli uffici tecnici comunali, o tra i tecnici regionali.

Si è poi verificata anche la possibilità di dare diretta attuazione alle fasi successive, quelle di progettazione e di direzione dei lavori, impegnando, inizialmente, esclusivamente le strutture pubbliche disponibili, ma riscontrando gravi difficoltà per la cronica carenza, “in organico”, in molte strutture comunali, di personale tecnico, in particolare ingegneri, strutturisti e geologi, indispensabili per le varie progettazioni.

Doverosamente, sono stati avviati, a tal fine, incontri e confronti con i responsabili politici ed amministrativi della Regione Basilicata e dei Comuni interessati dagli interventi.

E' stata riscontrata una incoraggiante immediata disponibilità per le più ampie forme di collaborazione: da quelle logistiche, alla fornitura di strumenti e mezzi ed alla messa a disposizione di qualificato personale tecnico ed amministrativo, in particolare da parte della Regione Basilicata.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Sono stati anche interessati, per possibili attività di collaborazione, il Provveditorato alle OO.PP. e la Soprintendenza regionale al paesaggio, oltre che la Presidenza del Dipartimento di Ingegneria della Università di Basilicata.

E' stata richiesta la collaborazione del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto che ha messo a disposizione del Commissario un proprio tecnico per due giorni alla settimana e della società di ricerca Agrobios S.p.A. , Società a totale capitale regionale, che ha messo a disposizione propri ricercatori per eventuali collaborazioni su singoli progetti. E' stata anche coinvolta l'Autorità di Bacino della Basilicata che ha messo a disposizione un Geologo per un giorno alla settimana e altri professionisti per eventuali collaborazioni a progetto.

Con il Provveditorato alle OO.PP. di Puglia e Basilicata è stato sottoscritto, in data 20 giugno 2012, un protocollo per la gestione di 6 interventi dell'Atto Integrativo all'Accordo.

Con la disponibilità di Amministratori e tecnici dei vari comuni interessati e con dirigenti e funzionari della Regione Basilicata, si è provveduto, come già detto, ad individuare i RUP ed i soggetti realizzatori degli interventi. A seguito di successivi aggiustamenti e modifiche risultano i seguenti:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Tabella 1 – Elenco interventi / Soggetti realizzatori / RUP**

Codice	Comune	Località	Titolo intervento	Ente realizzatore	RUP
MT001B/10	Accettura	Fosso delle Conche - Zona le Piagge	Lavori di sistemazione e consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ002A/10	Acerenza	Area urbana e limitrofe	Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a Valle Glinni	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ003B/10	Albano di Lucania	Strade Provinciali Sp. 13 e Sp 16	Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16	Ufficio tecnico Comune di Albano	Arch. Vito Stoppelli
MT004B/10	Aliano	Loc. Sant'Angelo	Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Aliano	Geom. Domenico Claps
PZ005B/10	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle della Chiesa del Carmelo- Pisciarelli	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ006A/10	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale-Viale della Vittoria	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ007A/10	Avigliano	Loc. Spinamara	Consolidamento loc. Spinamara	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ008A/10	Baragiano	Zona del versante comunale	Intervento di messa in sicurezza di alcuni versanti	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ009A/10	Bella	Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Lavori di consolidamento del Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Ufficio Tecnico del Comune di Bella	Geom. Donato Gamma
MT010A/10	Bernalda	Bacino del Fiume Basento - Località Mezzana in Agro di Bernalda	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
MT011B/10	Bernalda	Fosso Zingari	Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno	Area Programma Bradonica medio Basento	Dott. For. Giovanni Fiorentini
MT012A/10	Bernalda - Pisticci	Bacino del Fiume Basento	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
PZ013B/10	Brienza	Centro abitato - Zona Spineto	Consolidamento area a monte abitato zona Spineto	Ufficio Tecnico del Comune di Brienza	Arch. Giuseppe Michele Palladino
MT014B/10	Calciano	Località Laghi Parata - Località Cicchione	Lavori di ripristino delle c ondizioni di stabilità del versante	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

PZ015B/10	Calvello	Fosso Varcaturò	Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturò	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ016B/10	Calvera	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ017B/10	Campomaggiore	Centro abitato	Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ018B/10	Carbone	Centro abitato	Lavori di consolidamento centro abitato	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ019B/10	Castelmezzano	Località Paschiere, Mirutto e Castello	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ020A/10	Castelmezzano	Zona a valle strada comunale Cimitero e SP3	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ021B/10	Chiaromonte	Centro abitato	Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo	Ufficio Tecnico del Comune di Chiaromonte	Ing. Giovanni Pangaro
MT022B/10	Cirigliano	Valle Piano	Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta massi	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Pietro Perrone
PZ023A/10	Galicchio	Centro storico - Via Roma	Consolidamento e sistemazione idraulico forestale	Ufficio tecnico Comune di Galicchio	Dr. Rocco Balzano
MT024B/10	Garaguso	Contrada Pantoni	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico Comune di Garaguso	Ing. Angela Lisanti
PZ025A/10	Genzano di Lucania	Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ026B/10	Genzano di Lucania	Gaudemanno	Sistemazione fosso Gaudemanno	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT027B/10	Gorgoglione	Piazza Zanardelli	Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Geom. Donato Vincenzo Gagliardi
MT028B/10	Grassano	Via Tilea - Strettolone	Lavori di consolidamento del versante - area impianti sportivi	Ufficio tecnico Comune di Grassano	Arch. Pasquale Deniso
MT029A/10	Grottole	Centro abitato e aree limitrofe	Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole	Ufficio tecnico Comune di Grottole	Ing. Rocco Vitella
MT030A/10	Irsina		Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio	Ufficio Tecnico Comune di Irsina	Ing. Giuseppe Dicandia



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

PZ031C/10	Latronico	Latronico foglio 211 III° N.O.	Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato pericolante via Montegrappa	Ufficio Tecnico Comune di Latronico	Ing. Prosperino Suanno
PZ032B/10	Lauria	Lauria Inferiore	Lavori di messa in sicurezza in Vico IV Cerruto-Piede Costone Arno	Ufficio Tecnico Comune di Lauria	Ing. Biagio Papaleo
PZ033A/10	Lauria	Seta -Gremile	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico Comune di Lauria	Ing. Biagio Papaleo
PZ034B/10	Lavello	Centro abitato	Lavori di completamento consolidamento Rione Casale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ035A/10	Maschito	Centro abitato e frazioni	Consolidamento e difesa ambientale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT036A/10	Matera	Rione Sassi	Rione Sassi. Lavori di disaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù".	Ufficio Tecnico Comune di Matera	Arch. Giuseppe Gandi
PZ037A/10	Melfi	Versante a monte SS.401 Dir Km. 13+100- Km. 13+400	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Melfi	Ing. Gerardo Calvello
MT038B/10	Miglionico	Via Trinità	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ039A/10	Missanello	Fosso Creta	Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo	Ufficio Tecnico del Comune di Missanello	Geom. Domenico La Vecchia
PZ040A/10	Moliterno	Sp ex SS 103 Km. 8+400-8+500	Consolidamento frana e ripristino sede stradale	Chiesto devoluzione su altro intervento per finanziamento dell'opera con altre risorse	
MT041A/10	Montalbano Jonico	Coordinate: 40°17' 36 N 16°23' 38 E	Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico Area adiacente al centro urbano compresa tra piazza Cirillo e via Caracciolo	Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano	Ing. Michelina Larocca
PZ042B/10	Montemurro	Fosso Libritti	Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ043A/10	Muro Lucano	Rione San Nicola	Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano	Ufficio Tecnico del Comune di Muro Lucano	Arch. Francesco Cristiano
PZ044B/10	Nemoli	Vallone	Sistemazione idraulica	Ufficio Tecnico del Comune di Nemoli	Ing. Nicola Anania
MT045A/10	Nova Siri	Centro Storico	eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

MT046A/10	Oliveto Lucano	"Rupe - Vallone di Mezzo"	Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale)	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ047B/10	Oppido Lucano	Centro abitato	Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia - Terzillo	Ufficio Tecnico del Comune di Oppido	Ing. Donato Michele Ramunno
PZ048A/10	Oppido Lucano	Centro abitato e zone limitrofe	Mitigazione rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Oppido	Ing. Donato Michele Ramunno
PZ049A/10	Palazzo San Gervasio	Torrente Ginestrello	Lavori di ripristino dell'ufficiosità	Ufficio Tecnico Comune di Palazzo san Gervasio	Ing. Antonio Clinco
PZ050A/10	Picerno	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato nelle località Via Convento e Montagna (Torrente Braide)	Ufficio Tecnico del Comune di Picerno	Ing. Leonardo Zaccagnino
PZ051A/10	Picerno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Picerno	Ing. Leonardo Zaccagnino
PZ052A/10	Pignola	Piatamone	Lavori di consolidamento a valle della S.P.5	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT053A/10	Pomarico	Fosso Bordazzo e zone limitrofe	Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo	Ufficio Tecnico del Comune di Pomarico	Arch. Giacomo Pignatelli
PZ054B/10	Potenza	S. Luca Branca	Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ055A/10	Potenza	Costa della Gaveta	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Potenza	Ing. Giuseppe Lisi
PZ056B/10	Rapolla	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica torrente Melfia	Ufficio Tecnico del Comune di Rapolla	Geom. Eduardo Di Franco
PZ057B/10	Rionero in Vulture	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Ciaolino	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ058A/10	Ripacandida	Centro abitato	Lavori di consolidamento loc. San Pietro	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ059A/10	Rivello	Cammartino	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT060A/10	Rotondella	Coordinate: 40°10' 19 N 16°31' 22 E	Consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspromonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato.	Ufficio Tecnico del Comune di Rotondella	Ing. Nicola Castronuovo
PZ061B/10	San Costantino Albanese	Centro abitato	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

PZ062A/10	San Fele	Rione Pergola/Nocicchio	Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ063A/10	San Martino d'Agri	Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe	Completamento consolidamento loc. San Giovanni	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT064A/10	San Mauro Forte	Zona Campo Sportivo - Vico A. Diaz	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico zona "campo Sportivo vico Diaz	Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Forte	Geom. Egidio Cerabona
MT065A/10	San Mauro Forte	Località Garamme	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico "località Garamme" - 1° Stralcio.	Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Forte	Geom. Egidio Cerabona
PZ066A/10	Sant'Angelo Le Fratte	Costone in località Pescara	Intervento urgente per lavori di sistemazione, messa in sicurezza e risanamento del costone in località Pescara	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Le Fratte	Ing. Leonardo Calbi
PZ067A/10	Sant'Angelo Le Fratte	Coste-Cupa-Piazza dei Martiri	Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Le Fratte	Ing. Leonardo Calbi
PZ068A/10	Sant'Arcangelo	Rione Mauro	Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Arcangelo	Geom. Domenico Claps
PZ069A/10	Sarconi	Versante nord-est abitato - a valle della Chiesa Madre	Mitigazione rischio idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ070B/10	Sasso di Castalda	Calvario-Serrone	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ071B/10	Satriano di Lucania	Rione S. Martino	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT072B/10	Stigliano	Rione Casale e Sant'Antonio	Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Stigliano	Ing. Salvatore D'Ambrosio
PZ073A/10	Terranova di Pollino	Loc. Carolanza	Regimazione acque superficiali	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ074A/10	Tito	Via Gramsci-Via Roma	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Tito	Ing. Leonardo Calbi
PZ075A/10	Tolve	Selce	Lavori di rischio idrogeologico in Loc. Selce	Ufficio Tecnico del Comune di Tolve	Arch. Giuseppe Lo Tito
PZ076C/10	Trecchina	Zilona-SS.585	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ077A/10	Trecchina	SS.585 km 9+600	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte SS.585 all'altezza del km 9+600	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

MT078A/10	Tricarico	Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amm.va di Tricarico	Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT079A/10	Tricarico	Strada Comunale Alvanello-San Marco	Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco	Ufficio Programma Regione Basilicata	Arch. Enzo Paolo Petruzzi
PZ080A/10	Trivigno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Trivigno	Ing. Vito Ramunno
MT081A/10	Tursi	Rione Rabatana	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana	Ufficio Tecnico del Comune di Tursi	Dott. Giuseppe Veneziano
MT082A/10	Valsinni	Coordinate: 40°10'07 N 16°26'35 E	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato: intervento di consolidamento e messa in sicurezza della parete sovrastante e sottostante Piazza Melidoro	Ufficio Tecnico Comune di Valsinni	Ing. Francesco Tagliente
PZ083A/10	Venosa	Vallone Reale Vallone Ruscello	Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del centro storico	Ufficio Tecnico del Comune di Venosa	Arch. Elisabetta Pescuma
PZ084A/10	Viggianello	Località Gallizzi	Consolidamento versante a monte e a valle strada comunale	Ufficio Tecnico del Comune di Viggianello	Ing. Nicola Bencardino
MT085A/10	Bernalda	Spiaggia lido di Metaponto	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
PZ0086A/11	Castelluccio Inferiore	Contrada Amoroso	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0087A/11	Grassano	Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi)	Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini-Golfo	Provveditorato OO.PP.	Ing. Mario Martorano
MT0088A/11	Miglionico	Sotto le Vigne - Via Marconia	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di regimentazione idraulica del versante.	Provveditorato OO.PP.	Ing. Giuseppe Brandi
MT0089A/11	Nova Siri	Torrente Toccaciolo	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
PZ0090A/11	Pignola	Contrada Campo di Giorgio	Lavori di consolidamento in C.da Campo di Giorgio	Ufficio Tecnico del Comune di Tito	Ing. Donato Rosa
MT0091A/11	Bacino del Fiume Agri	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Pulizia, eliminazione di vegetazione in alveo, eliminazione di materiale alluvionale e ripristino arginature	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
PZ0092A/11	Chiaromonte	Valle dei Pastori	Lavori di sistemazione idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

MT0093A/11	Colobraro	Centro Abitato	Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato	Provveditorato OO.PP.	Ing. Vito Sivoletta
PZ0094A/11	Maratea	SS.18 intero tratto regionale	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte e a valle della S.S. 18	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ0095A/11	Melfi	Contrada Isca della Ricotta	Lavori di sistemazione idraulica Fiumara Ofanto	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0096A/11	Montalbano Jonico	Via Sant'Antuono	Eliminazione condizioni di rischio	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Clara Giordano
MT0097A/11	Pisticci	Versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di consolidamento e regimentazione idraulica del versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Salvatore Giannace
PZ0098A/11	Rapone	Mazzapone	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0099A/11	Salandra	Centro abitato - Zona Calvario	Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona Calvario	Ufficio Tecnico Comune di Salandra	Ing. Domenico Terranova
MT0100A/11	San Giorgio Lucano	Centro abitato - zona Timpa	Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano; zona Timpa.	Provveditorato OO.PP.	Ing. Mario Martorano
PZ0101A/11	Tito	Zona a valle di Via Settentrionale	Consolidamento dell'abitato di Tito del Capoluogo	Comune di Tito	Ing. Leonardo Calbi
PZ0102A/11	Vaglio	Cannitelli	Lavori di Ripristino officiosità	Provveditorato OO.PP.	Ing. Gennaro De Meo
PZ0103A/11	Vaglio	Via Ciro Menotti, Vico Diaz - Valle di Via Isonzo - Villa Comunale nel rione Paschiere	Consolidamento abitato e risanamento dissesto idrogeologico dell'abitato	Provveditorato OO.PP.	Ing. Vito Sivoletta
MT0104A/11	Provincia di Matera	Bacino del Fiume Bradano	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
MT0105A/11	Ferrandina, Salandra, Calciano	SS. 407 basentana	Sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
MT0106A/11	Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni	F.so Mortella; Confluenze Torrente Pescogrosso; F. Sinni-attraaversamento ss106.	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello

In verde gli interventi a cura dei Comuni; in azzurro quelli a cura degli Uffici regionali; in rosso l'intervento già finanziato con altre risorse e per il quale è stata avanzata proposta di devoluzione al progetto COD MT078A/10; in giallo gli interventi a cura del Provveditorato interregionale alle OO.PP.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Con il procedere delle attività e l'accumularsi delle incombenze connesse con la attuazione degli interventi, si sempre più evidenziata tutta la insufficienza organica della struttura del Commissario operante in una condizione di "dipendenza" dalle disponibilità di soggetti pubblici terzi. Il ricorso a incarichi di consulenza esterne previsti dal DPCM 20 luglio 2011 – art.1 comma 5 avrebbe potuto garantire migliori e più tempestivi risultati.

Ancora ora, l'Ufficio del Commissario opera con le seguenti, *preziose e qualificate*, collaborazioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa con le strutture di appartenenza:

-una unità tecnica, a tempo parziale (2 giorni alla settimana), posta a disposizione dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto di Matera, impegnata per rilievi, disegni, gestione informatica dei dati;

-un geologo, per un giorno alla settimana posto a disposizione dall'Autorità di Bacino della Basilicata, impegnato per seguire sotto l'aspetto geologico-tecnico, gli interventi più "delicati";

-una unità tecnica, a tempo parziale (3 giorni alla settimana), posta a disposizione dal Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata, che tutt'ora regge il gran peso di tutta la attività tecnica ed amministrativa;

-con le Direzioni Generali della Presidenza della Giunta Regionale e del Dipartimento regionale alle Infrastrutture sono attive *collaborazioni a progetto* e per la gestione del sito ufficiale del Commissario;

-continua e costante è, poi, la collaborazione, dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata per la gestione dei rapporti con la tesoreria provinciale della Banca d'Italia, presso la quale è acceso il conto, in contabilità speciale, del Commissario e per le attività di rendicontazione;

-una unità tecnica, per un giorno alla settimana, posta a disposizione dal Comune di Missanello, impegnata per attività di verifica progetti e dati;

-con il personale degli uffici del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio sono attive *collaborazioni a progetto* anche in orari eccedenti quello ordinario.

Ad oggi **non è stata** quindi **attivata alcuna collaborazione "esterna"** agli Enti pubblici o Enti e Società a capitale pubblico.

Pur nella limitata, numericamente, disponibilità di personale di supporto e soprattutto i ritardi nel trasferimento alla Contabilità speciale del Commissario delle somme programmate, l'attività del Commissario non ha subito soste ed allo stato è possibile certificare i dati di cui alle tabelle che seguono.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

### 3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA

Gli atti formali prodotti dal Commissario dal 21.01.2011 al 31 dicembre 2013 risultano i seguenti:

- **Ordinanze n.16**
- **Decreti n. 824**
- **Autorizzazioni ad attività propedeutiche n. 121**
- **Protocolli in entrata ed uscita: circa 13.000.**

Con i succitati atti risultano, tra l'altro, sviluppate le seguenti attività e provvedimenti, al 31 dicembre 2013:

1. **progetti approvati: n. 104** per complessivi **€ 33.904.000,00** dei quali:
  - 1.1. - n. 30 + 2 (cofinanziati fondo FESR) per € 6.735.000,00 sui fondi PO FESR Basilicata 2007-2013;
  - 1.2. - n. 9 + 1 (cofinanziato MATTM) per € 4.520.703,60 sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 o fondi del piano sud;
  - 1.3. - n. 60 + 1 (cofinanziato CIPE) per € 22.998.296,40 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

Come da Tabella n. 1 seguente

**Tabella n. 2 – Progetti approvati al 31/12/2013**

Numero	Codice Lavoro	Codice CIPE	Decreto di approvazione		Codice Finanziament	Comune	Importo intervento
			Numero	data			
1	MT001B/10		<u>153/2013</u>	21/05/2013	B	Accettura	€ 200.000,00
2	PZ002A/10	BASFV56	<u>114/2013</u>	22/04/2013	Cipe	Acerenza	€ 200.000,00
3	PZ003B/10		<u>219/2012</u>	18/12/2012	B	Albano di Lucania	€ 180.000,00
4	MT004B/10		<u>37/2012</u>	13/04/2012	B	Alliano	€ 60.000,00
5	PZ005B/10		<u>203/2012</u>	10/12/2012	B	Avigliano	€ 200.000,00
6	PZ006A/10	BASFV57	<u>517/2013</u>	28/11/2013	Cipe	Avigliano	€ 300.000,00
7	PZ007A/10	BASFV26	<u>345/2013</u>	03/09/2013	Cipe	Avigliano	€ 500.000,00
8	PZ008A/10	BASFV58	<u>91/2013</u>	04/04/2013	Cipe	Baragiano	€ 300.000,00
9	PZ009A/10	BASFV58	<u>96/2013</u>	09/04/2013	Cipe	Bella	€ 300.000,00
10	MT010A/10	BASFV02	<u>1/2012</u>	05/01/2012	A	Bernalda	€ 100.000,00
11	MT011B/10		<u>131/2013</u>	04/05/2013	B	Bernalda	€ 190.000,00
12	MT012A/10	BASFV03	<u>12/2012</u>	21/02/2012	A	Bernalda - Pisticci	€ 500.000,00
13	PZ013B/10		<u>110/2013</u>	16/04/2013	B	Brienza	€ 200.000,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

14	MT014B/10		<u>76/2012</u>	22/06/2012	B	Calciano	€ 190.000,00
15	PZ015B/10		<u>14/2012</u>	23/02/2012	B	Calvello	€ 190.000,00
16	PZ016B/10		<u>445/2013</u>	25/10/2013	B	Calvera	€ 330.000,00
17	PZ017B/10		<u>35/2012</u>	13/04/2012	B	Campomaggiore	€ 80.000,00
18	PZ018B/10		<u>10/2013</u>	23/01/2013	B	Carbone	€ 215.000,00
19	PZ019B/10		<u>229/2013</u>	01/07/2013	B	Castelmezzano	€ 100.000,00
20	PZ020A/10	BASFV27	<u>353/2013</u>	05/09/2013	Cipe	Castelmezzano	€ 150.000,00
21	PZ021B/10		<u>106/2013</u>	15/04/2013	B	Chiaromonte	€ 220.000,00
22	MT022B/10		<u>15/2012</u>	23/02/2012	B	Cirigliano	€ 190.000,00
23	PZ023A/10	BASFV60	<u>176/2013</u>	31/05/2013	Cipe	Gallicchio	€ 300.000,00
24	MT024B/10		<u>71/2012</u>	14/06/2012	B	Garaguso	€ 190.000,00
25	PZ025A/10	BASFV18	<u>495/2013</u>	20/11/2013	Cipe	Genzano di Lucania	€ 300.000,00
26	PZ026B/10		<u>36/2012</u>	13/04/2012	B	Genzano di Lucania	€ 140.000,00
27	MT027B/10		<u>466/2013</u>	05/11/2013	B	Gorgoglione	€ 190.000,00
28	MT028B/10		<u>516/2013</u>	28/11/2013	B	Grassano	€ 185.000,00
29	MT029A/10	BASFV28	<u>107/2013</u>	16/04/2013	Cipe	Grottole	€ 250.000,00
30	MT030A/10		<u>216/2012</u>	01/12/2012	A	Irsina	€ 31.703,60
		BASFV13	<u>216/2012</u>	01/12/2012	Cipe	Irsina	€ 168.296,40
31	PZ031C/10	BASFV17	<u>170/2012</u>	12/11/2012	Cipe	Latronico	€ 170.000,00
					B		€ 330.000,00
32	PZ032B/10		<u>45/2012</u>	30/04/2012	B	Lauria	€ 330.000,00
33	PZ033A/10	BASFV29	<u>152/2012</u>	19/10/2012	Cipe	Lauria	€ 450.000,00
34	PZ034B/10		<u>181/2013</u>	04/06/2013	B	Lavello	€ 330.000,00
35	PZ035A/10	BASFV62	<u>195/2013</u>	12/06/2013	Cipe	Maschito	€ 400.000,00
36	MT036A/10	BASFV04	<u>220/2012</u>	31/12/2012	A	Matera	€ 450.000,00
37	PZ037A/10	BASFV20	<u>573/2013</u>	09/12/2013	Cipe	Melfi	€ 400.000,00
38	MT038B/10		<u>212/2013</u>	20/06/2013	B	Miglionico	€ 80.000,00
39	PZ039A/10	BASFV61	<u>75/2012</u>	22/06/2012	Cipe	Missanello	€ 270.000,00
40	MT041A/10	BASFV63	<u>159/2013</u>	22/05/2013	Cipe	Montalbano Jonico	€ 350.000,00
41	PZ042B/10		<u>53/2012</u>	15/05/2012	B	Montemurro	€ 180.000,00
42	PZ043A/10	BASFV64	<u>436/2013</u>	21/10/2013	Cipe	Muro Lucano	€ 300.000,00
43	PZ044B/10		<u>73/2012</u>	20/06/2012	B	Nemoli	€ 130.000,00
44	MT046A/10	BASFV30	<u>372/2013</u>	13/09/2013	Cipe	Oliveto Lucano	€ 400.000,00
45	PZ047B/10		<u>366/2013</u>	11/09/2013	B	Oppido Lucano	€ 200.000,00
46	PZ048A/10	BASFV66	<u>369/2013</u>	12/09/2013	Cipe	Oppido Lucano	€ 200.000,00
47	PZ049A/10	BASFV21	<u>158/2013</u>	22/05/2013	Cipe	Palazzo San Gervasio	€ 100.000,00
48	PZ050A/10	BASFV31	<u>180/2013</u>	04/06/2013	Cipe	Picerno	€ 250.000,00
49	PZ051A/10	BASFV32	<u>113/2013</u>	19/04/2013	Cipe	Picerno	€ 400.000,00
50	PZ052A/10	BASFV33	<u>356/2013</u>	09/09/2013	Cipe	Pignola	€ 350.000,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

51	MT053A/10	BASFO8	<u>80/2012</u>	29/06/2012	A	Pomarico	€ 200.000,00
52	PZ054B/10		<u>31/2012</u>	05/04/2012	B	Potenza	€ 190.000,00
53	PZ055A/10	BASFO34	<u>263/2013</u>	18/07/2013	Cipe	Potenza	€ 450.000,00
54	PZ056B/10		<u>88/2013</u>	03/04/2013	B	Rapolla	€ 200.000,00
55	PZ057B/10		<u>577/2013</u>	14/12/2013	B	Rionero in Vulture	€ 340.000,00
56	PZ058A/10	BASFO67	<u>207/2013</u>	20/06/2013	Cipe	Ripacandida	€ 200.000,00
57	PZ059A/10	BASFO68	<u>213/2013</u>	21/06/2013	Cipe	Rivello	€ 350.000,00
58	MT060A/10	BASFO35	<u>327/2013</u>	23/08/2013	Cipe	Rotondella	€ 200.000,00
59	PZ061B/10		<u>85/2013</u>	29/03/2013	B	S. Costantino Albanese	€ 200.000,00
60	PZ062A/10	BASFO36	<u>157/2012</u>	23/10/2012	Cipe	San Fele	€ 350.000,00
61	PZ063A/10	BASFO69	<u>137/2012</u>	27/09/2012	Cipe	San Martino d'Agri	€ 300.000,00
62	MT064A/10	BASFO37	<u>65/2013</u>	18/03/2013	Cipe	San Mauro Forte	€ 400.000,00
63	MT065A/10	BASFO38	<u>92/2013</u>	05/04/2013	Cipe	San Mauro Forte	€ 400.000,00
64	PZ066A/10	BASFO39	<u>558/2013</u>	11/12/2013	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	€ 450.000,00
			<u>580/2013</u>	16/12/2013			€ 150.000,00
65	PZ067A/10	BASFO19	<u>146/2013</u>	15/05/2013	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	€ 100.000,00
66	PZ068A/10	BASFO70	<u>66/2013</u>	18/03/2013	Cipe	Sant'Arcangelo	€ 200.000,00
67	PZ069A/10	BASFO71	<u>80/2013</u>	28/03/2013	Cipe	Sarconi	€ 200.000,00
68	PZ070B/10		<u>17/2013</u>	30/01/2013	B	Sasso di Castalda	€ 200.000,00
69	PZ071B/10		<u>131/2012</u>	24/09/2012	B	Satriano di Lucania	€ 220.000,00
70	MT072B/10		<u>16/2012</u>	24/02/2012	B	Stigliano	€ 255.000,00
71	PZ073A/10	BASFO72	<u>591/2013</u>	24/12/2013	Cipe	Terranova di Pollino	€ 100.000,00
72	PZ074A/10	BASFO40	<u>81/2012</u>	30/06/2012	Cipe	Tito	€ 400.000,00
73	PZ075A/10	BASFO41	<u>228/2013</u>	28/06/2013	Cipe	Tolve	€ 350.000,00
74	PZ076C/10	BASFO14	<u>136/2012</u>	27/09/2012	Cipe	Trecchina	€ 200.000,00
					B		€ 300.000,00
75	PZ077A/10	BASFO25	<u>21/2012</u>	07/03/2012	Cipe	Trecchina	€ 80.000,00
76	MT078A/10	BASFO01	<u>1/2011</u>	13/07/2011	A	Tricarico	€ 800.000,00
			<u>151/2012</u>	12/10/2012			
77	MT079A/10	BASFO16	<u>161/2013</u>	22/05/2013	Cipe	Tricarico	€ 380.000,00
78	PZ080A/10	BASFO74	<u>216/2013</u>	21/06/2013	Cipe	Trivigno	€ 400.000,00
79	MT081A/10	BASFO05	<u>22/2013</u>	07/02/2013	A	Tursi	€ 700.000,00
80	MT082A/10	BASFO74	<u>101/2013</u>	12/04/2013	Cipe	Valsinni	€ 400.000,00
81	PZ083A/10	BASFO42	<u>250/2013</u>	13/07/2013	Cipe	Venosa	€ 350.000,00
82	PZ084A/10	BASFO43	<u>139/2013</u>	10/05/2013	Cipe	Viggianello	€ 250.000,00
83	MT085A/10	BASFO07	<u>260/2013</u>	18/07/2013	A	Bernalda - Metaponto	€ 300.000,00
		BASFO15			Cipe		€ 2.700.000,00
84	PZ086A/11	BASFO75	<u>502/2013</u>	22/11/2013	Cipe	Castelluccio Inferiore	€ 1.373.000,00
			<u>515/2013</u>	28/11/2013			€ 627.000,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

85	MT087A/11	BASFV44	<u>141/2013</u>	10/05/2013	Cipe	Grassano	€ 400.000,00
86	MT088A/11	BASFV45	<u>147/2013</u>	16/05/2013	Cipe	Miglionico	€ 200.000,00
87	MT089A/11	BASFV06	<u>192/2013</u>	11/06/2013	A	Nova Siri	€ 200.000,00
88	PZ090A/11	BASFV46	<u>462/2013</u>	04/11/2013	Cipe	Pignola	€ 150.000,00
89	MT091A/11	BASFV09	<u>143/2012</u>	04/10/2012	A	Bacino del fiume Agri	€ 500.000,00
90	PZ092A/11	BASFV24	<u>486/2013</u>	14/11/2013	Cipe	Chiaromonte	€ 150.000,00
91	MT093A/11	BASFV47	<u>322/2013</u>	22/08/2013	Cipe	Colobraro	€ 500.000,00
92	PZ094A/11	BASFV48	<u>227/2013</u>	28/06/2013	Cipe	Maratea	€ 700.000,00
93	PZ095A/11	BASFV22	<u>494/2013</u>	20/11/2013	Cipe	Melfi	€ 500.000,00
94	MT096A/11	BASFV49	<u>471/2013</u>	06/11/2013	Cipe	Montalbano Jonico	€ 200.000,00
95	MT097A/11	BASFV50	<u>572/2013</u>	13/12/2013	Cipe	Pisticci	€ 150.000,00
96	PZ098A/11	BASFV51	<u>581/2013</u>	16/12/2013	Cipe	Rapone	€ 180.000,00
97	MT099A/11	BASFV52	<u>79/2013</u>	28/03/2013	Cipe	Salandra	€ 100.000,00
98	MT0100A/11	BASFV53	<u>174/2013</u>	30/05/2013	Cipe	San Giorgio Lucano	€ 400.000,00
99	PZ0101A/11	BASFV54	<u>338/2013</u>	29/08/2013	Cipe	Tito	€ 400.000,00
100	PZ0102A/11	BASFV23	<u>104/2013</u>	15/04/2013	Cipe	Vaglio	€ 300.000,00
101	PZ0103A/11	BASFV55	<u>89/2013</u>	04/04/2013	Cipe	Vaglio	€ 500.000,00
102	MT0104A/11	BASFV10	<u>225/2013</u>	28/06/2013	A	Fiume Bradano	€ 339.000,00
103	MT0105A/11	BASFV11	<u>379/2013</u>	17/09/2013	A	Basentana	€ 200.000,00
104	MT0106A/11	BASFV12	<u>86/2013</u>	02/04/2013	A	Fiume Sinni	€ 200.000,00
Totale							<b>€ 34.254.000,00</b>

finanziamento codice A  
(MATTM)

11

€ 4.520.703,60

finanziamento Delibera  
CIPE

61

€ 22.998.296,40

finanziamento codice B  
(FESR)

32

€ 6.735.000,00

TOTALE

104

€ 34.254.000,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

1.1 **attività propedeutiche alle progettazioni** su progetti non ancora approvati: n. 3 incarichi per complessivi **€ 11.879,42** sui fondi delibera CIPE n.8/2012

La Tabella n.3 riporta l'elenco dei progetti per i quali le attività propedeutiche sopra indicate sono state avviate e gli importi programmati per gli interventi relativi:

**Tabella n. 3 – Progetti attivati escluso gli approvati al 31/12/2013**

Numero	Codice Lavoro	Codice CIPE	Codice finanziamento	Comune	Importo Intervento Euro		
					MATTM	CIPE	PO-FESR
1	MT045A/10	BASFV65	Cipe	Nova Siri		500.000,00	
<b>Totale</b>					<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabella n. 4 – Progetti con aggiudicazione definitiva/provvisoria al 31/12/2013**

Numero	Codice Lavoro	Codice finanziamento	Comune	Codice CIPE	Aggiudicazione		Importo Intervento Euro		
					tipo	data	MATTM	CIPE	PO-FESR
1	MT001B/10	B	Accettura		definitiva	15/07/2013			200.000
2	PZ002A/10	Cipe	Acerenza	BASFV56	definitiva	24/07/2013		200.000	
3	PZ003B/10	B	Albano di Lucania		definitiva	22/02/2013			180.000
4	MT004B/10	B	Aliano		definitiva	15/06/2012			60.000
5	PZ005B/10	B	Avigliano		definitiva	01/03/2013			200.000
6	PZ006A/10	Cipe	Avigliano	BASFV57	provvisoria	21/12/2013		300.000	
7	PZ007A/10	Cipe	Avigliano	BASFV26	definitiva	02/12/2013		500.000	
8	PZ008A/10	Cipe	Baragiano	BASFV58	definitiva	04/06/2013		300.000	
9	PZ009A/10	Cipe	Bella	BASFV59	definitiva	08/07/2013		300.000	
10	MT010A/10	A	Bernalda	BASFV02	definitiva	17/02/2012	100.000		
11	MT011B/10	B	Bernalda		definitiva	27/08/2013			190.000
12	MT012A/10	A	Bernalda - Pisticci	BASFV03	definitiva	18/05/2012	500.000		
13	PZ013B/10	B	Brienza		definitiva	19/07/2013			200.000
14	MT014B/10	B	Calciano		definitiva	03/09/2012			190.000
15	PZ015B/10	B	Calvello		definitiva	03/07/2012			190.000
16	PZ016B/10	B	Calvera		provvisoria	12/12/2013		330.000	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

17	PZ017B/10	B	Campomaggiore		definitiva	31/07/2012		80.000
18	PZ018B/10	B	Carbone		definitiva	12/04/2013		215.000
19	PZ019B/10	B	Castelmezzano		definitiva	27/08/2013		100.000
20	PZ020A/10	Cipe	Castelmezzano	BASFV27	definitiva	31/10/2013	150.000	
21	PZ021B/10	B	Chiaromonte		definitiva	03/07/2013		220.000
22	MT022B/10	B	Cirigliano		definitiva	13/07/2012		190.000
23	PZ023A/10	Cipe	Galicchio	BASFV60	definitiva	03/09/2013	300.000	
24	MT024B/10	B	Garaguso		definitiva	04/09/2012		190.000
25	PZ026B/10	B	Genzano di Lucania		definitiva	31/07/2012		140.000
26	MT027B/10	B	Gorgoglione		provvisoria	13/12/2013	190.000	
27	MT028B/10	B	Grassano		provvisoria	23/12/2013		
28	MT029A/10	Cipe	Grottole	BASFV28	definitiva	27/08/2013		250.000
29	MT030A/10	Cipe	Irsina	BASFV13	definitiva	24/06/2013		168.296,40
		A					31.703	
30	PZ031C/10	Cipe	Latronico	BASFV17	definitiva	03/05/2013		170.000
		B					330.000	
31	PZ032B/10	B	Lauria		definitiva	24/07/2012		330.000
32	PZ033A/10	Cipe	Lauria	BASFV29	definitiva	10/06/2013	450.000	
33	PZ034B/10	B	Lavello		definitiva	03/09/2013		330.000
34	PZ035A/10	Cipe	Maschito	BASFV62	definitiva	03/09/2013	400.000	
35	MT036A/10	A	Matera	BASFV04	definitiva	02/05/2013	450.000	
36	MT038B/10	B	Miglionico		definitiva	04/11/2013		80.000
37	PZ039A/10	Cipe	Missanello	BASFV61	definitiva	19/10/2012	270.000	
38	MT041A/10	Cipe	Montalbano Jonico	BASFV63	definitiva	16/10/2013	350.000	
39	PZ042B/10	B	Montemurro		definitiva	31/07/2012		180.000
40	PZ043A/10	Cipe	Muro Lucano	BASFV64	definitiva	01/10/2013	300.000	
41	PZ044B/10	B	Nemoli		definitiva	24/08/2012		130.000
42	MT046A/10	Cipe	Oliveto Lucano	BASFV30	definitiva	04/12/2013	400.000	
43	PZ047B/10	B	Oppido Lucano		provvisoria	07/12/2013		200.000
44	PZ048A/10	Cipe	Oppido Lucano	BASFV66	definitiva	12/12/2013	200.000	
45	PZ049A/10	Cipe	Palazzo S. Gervaso	BASFV21	definitiva	21/06/2013	100.000	
46	PZ050A/10	Cipe	Picerno	BASFV31	definitiva	03/09/2013	250.000	
47	PZ051A/10	Cipe	Picerno	BASFV32	definitiva	23/08/2013	400.000	
48	PZ052A/10	Cipe	Pignola	BASFV33	definitiva	20/12/2013	350.000	
49	MT053A/10	A	Pomarico	BASFV08	definitiva	09/10/2012	200.000	
50	PZ054B/10	B	Potenza		definitiva	13/07/2012		190.000
51	PZ055A/10	Cipe	Potenza	BASFV34	provvisoria	18/11/2013	450.000	
52	PZ056B/10	B	Rapolla		definitiva	18/07/2013		200.000
53	PZ058A/10	Cipe	Ripacandida	BASFV67	definitiva	27/08/2013	200.000	





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

54	PZ059A/10	Cipe	Rivello	BASFV68	definitiva	11/09/2013		350.000	
55	MT060A/10	Cipe	Rotondella	BASFV35	provvisoria	29/11/2013		200.000	
56	PZ061B/10	B	San Costantino Alb.		definitiva	27/05/2013			200.000
57	PZ062A/10	Cipe	San Fele	BASFV36	definitiva	21/01/2013		350.000	
58	PZ063A/10	Cipe	San Martino d'Agri	BASFV69	definitiva	10/12/2012		300.000	
59	MT064A/10	Cipe	San Mauro Forte	BASFV37	definitiva	26/06/2013		400.000	
60	MT065A/10	Cipe	San Mauro Forte	BASFV38	definitiva	30/09/2013		400.000	
61	PZ066A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	BASFV39	provvisoria	28/12/2013		450.000	
62	PZ067A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	BASFV19	definitiva	10/07/2013		100.000	
63	PZ068A/10	Cipe	Sant'Arcangelo	BASFV70	definitiva	11/09/2012		40.457	
					definitiva	03/06/2013		159.543	
64	PZ069A/10	Cipe	Sarconi	BASFV71	definitiva	04/06/2013		200.000	
65	PZ070B/10	B	Sasso di Castalda		definitiva	12/04/2013			200.000
66	PZ071B/10	B	Satriano di Lucania		definitiva	21/01/2013			220.000
67	MT072B/10	B	Stigliano		definitiva	05/07/2012			255.000
68	PZ074A/10	Cipe	Tito	BASFV40	definitiva	27/08/2012		400.000	
69	PZ075A/10	Cipe	Tolve	BASFV41	provvisoria	12/12/2013		350.000	
70	PZ076C/10	B	Trecchina	BASFV14	definitiva	10/12/2012		200.000	300.000
		Cipe							
71	PZ077A/10	Cipe	Trecchina	BASFV25	definitiva	13/07/2012		80.000	
72	MT078A/10	A	Tricarico	BASFV01	definitiva	13/07/2011	399.000		
					definitiva	20/11/2012	401.000		
73	MT079A/10	Cipe	Tricarico	BASFV16	definitiva	04/12/2013		380.000	
74	PZ080A/10	Cipe	Trivigno	BASFV73	definitiva	02/09/2013		400.000	
75	MT081A/10	A	Tursi	BASFV05	definitiva	04/01/2013	700.000		
76	MT082A/10	Cipe	Valsinni	BASFV74	definitiva	03/09/2013		400.000	
77	PZ083A/10	Cipe	Venosa	BASFV42	provvisoria	06/12/2013		350.000	
78	PZ084A/10	Cipe	Viggianello	BASFV43	provvisoria	23/12/2013		250.000	
79	MT085A/10	A	Metaponto	BASFV07	definitiva	18/03/2013	300.000	2.700.000	
		Cipe							
80	PZ086A/11	Cipe	Castelluccio Inferiore	BASFV75	provvisoria	06/12/2013		1.373.000	
81					provvisoria	06/12/2013		627.000	
82	MT087A/11	Cipe	Grassano	BASFV44	definitiva	18/07/2013		400.000	
83	MT088A/11	Cipe	Miglionico	BASFV45	definitiva	21/08/2013		200.000	
84	MT089A/11	A	Nova Siri	BASFV06	definitiva	18/09/2013	200.000		
85	MT091A/11	A	Agri	BASFV09	definitiva	14/12/2012	500.000		
86	PZ092A/11	Cipe	Chiaromonte	BASFV24	provvisoria	20/12/2013		150.000	
87	MT093A/11	Cipe	Colobraro	BASFV47	definitiva	11/11/2013		500.000	
88	PZ094A/11	Cipe	Maratea	BASFV48	definitiva	03/09/2013		700.000	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

89	PZ095A/11	Cipe	Melfi	BASFV22	provvisoria	16/12/2013		500.000	
90	MT096A/11	Cipe	Montalbano Jonico	BASFV49	provvisoria	05/12/2013		200.000	
91	MT097A/11	Cipe	Pisticci	BASFV50	provvisoria	30/12/2013		150.000	
92	MT099A/11	Cipe	Salandra	BASFV52	definitiva	11/11/2013		100.000	
93	MT0100A/11	Cipe	San Giorgio Lucano	BASFV53	definitiva	19/07/2013		400.000	
94	PZ0101A/11	Cipe	Tito	BASFV54	definitiva	04/11/2013		400.000	
95	PZ0102A/11	Cipe	Vaglio	BASFV23	definitiva	24/06/2013		300.000	
96	PZ0103A/11	A	Vaglio	BASFV55	definitiva	18/06/2013		500.000	
97	MT0104A/11	A	Fiume Bradano	BASFV10	definitiva	23/10/2013	339.000		
98	MT0105A/11	A	ss 407 Basentana	BASFV11	provvisoria	22/11/2013	200.000		
99	MT0106A/11	A	SS 106 - Fiume Sinni	BASFV12	definitiva	01/08/2013	200.000		
<b>Aggiudicazione definitiva</b>						<b>81</b>	<b>4.710.703</b>	<b>22.048.296</b>	<b>5.690.000</b>
<b>Aggiudicazione provvisoria</b>						<b>18</b>			

Totale progetti finanziamento tipo A (MATTM)

13

Totale progetti finanziamento CIPE

55

Totale progetti finanziamento PO-FESR

31



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Somme **spese**, al 31 dicembre 2013:

1. **LAVORI € 8.178.609,42**, di cui:
  - 1.1 € 2.823.581,49 sui fondi MATTM
  - 1.2 € 2.745.906,23 sui fondi PO FESR Basilicata
  - 1.3 € 2.609.121,70 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012
  
2. **ATTIVITA' PROPEDEUTICHE alla progettazione € 1.093.679,69** di cui:
  - 2.1 € 128.373,35 sui fondi MATTM
  - 2.2 € 168.425,96 sui fondi PO FESR Basilicata
  - 2.3 € 796.880,38 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012
  
3. **"SPESE GENERALI"** di funzionamento: (compenso al Commissario, missioni, straordinari, forniture, etc.) sono stati liquidati **€ 326.339,89** di cui:
  - 3.1 € 165.068,66 per compenso al Commissario
  - 3.2 € 18.859,61 per missioni e rimborsi al Commissario
  - 3.3 € 124.239,14 per lavoro straordinario al personale interno agli Enti pubblici di supporto al Commissario
  - 3.4 € 18.172,48 per forniture e servizi vari



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Tabella n. 5 – Spesa sostenuta su ciascun intervento e per tipologia**

Numero	Codice Lavoro	TIPO FINANZIAMENTO	Comune	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO SPESO (Euro)					
					Attività propedeut.	Importo SAL	AVCP	Attività interne	Oneri DPCM 21/01/2011	TOTALE
1	MT001B/10	B	Accettura	200.000	12.501,79	0,00	30,00	0,00		12.531,79
2	PZ002A/10	Cipe	Acerenza	200.000	1.153,13	0,00	225,00	0,00		1.378,13
3	PZ003B/10	B	Albano di Lucania	180.000	6.103,72	0,00	30,00	0,00		6.133,72
4	MT004B/10	B	Aliano	60.000	0,00	35.191,05	0,00	0,00		35.191,05
5	PZ005B/10	B	Avigliano	200.000	10.459,40	141.312,42	30,00	0,00	4.000,00	151.801,82
6	PZ006A/10	Cipe	Avigliano	300.000	3.441,64	0,00	0,00	0,00		3.441,64
7	PZ007A/10	Cipe	Avigliano	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	PZ008A/10	Cipe	Baragiano	300.000	4.944,94	279.479,22	225,00	6.251,49	6.000,00	290.900,65
9	PZ009A/10	Cipe	Bella	300.000	10.774,00	0,00	0,00	0,00		10.774,00
10	MT010A/10	A	Bernalda	100.000	9.627,47	84.231,34	30,00	1.788,94	2.000,00	95.677,75
11	MT011B/10	B	Bernalda	190.000	3.393,78	0,00	0,00	0,00		3.393,78
12	MT012A/10	A	Bernalda - Pisticci	500.000	17.283,08	369.223,91	225,00	3.833,94		390.565,93
13	PZ013B/10	B	Brienza	200.000	4.341,77	0,00	30,00	0,00		4.371,77
14	MT014B/10	B	Calciano	190.000	183,68	114.955,29	30,00	1.780,38		116.949,35
15	PZ015B/10	B	Calvello	190.000	0,00	178.523,69	30,00	4.355,31	3.800,00	182.909,00
16	PZ016B/10	B	Calvera	330.000	13.164,56	0,00	0,00	0,00		13.164,56
17	PZ017B/10	B	Campomaggiore	80.000	5.785,55	34.316,16	30,00	0,00		40.131,71
18	PZ018B/10	B	Carbone	215.000	7.396,35	165.912,98	30,00	1.820,81	4.300,00	175.160,14
19	PZ019B/10	B	Castelmezzano	100.000	9.196,91	0,00	30,00	0,00		9.226,91
20	PZ020A/10	Cipe	Castelmezzano	150.000	18.038,14	0,00	0,00	0,00		18.038,14
21	PZ021B/10	B	Chiaromonte	220.000	21.688,88	0,00	0,00	0,00		21.688,88
22	MT022B/10	B	Cirigliano	190.000	0,00	155.566,24	30,00	1.412,40	3.800,00	157.008,64
23	PZ023A/10	Cipe	Galicchio	300.000	21.217,15	0,00	225,00	0,00		21.442,15
24	MT024B/10	B	Garaguso	190.000	5.033,60	110.278,39	0,00	0,00		115.311,99
25	PZ025A/10	Cipe	Genzano di Lucania	300.000	5.548,14	0,00	0,00	0,00		5.548,14
26	PZ026B/10	B	Genzano di Lucania	140.000	301,36	120.301,38	30,00	0,00		120.632,74
27	MT027B/10	B	Gorgoglione	190.000	1.808,04	0,00	0,00	0,00		1.808,04
28	MT028B/10	B	Grassano	185.000	13.552,00	0,00	0,00	0,00		13.552,00
29	MT029A/10	Cipe	Grottole	250.000	30.280,46	0,00	0,00	0,00		30.280,46
30	MT030A/10	A	Irsina	31.703,60	12.720,02	161.264,00	0,00	0,00		173.984,02
		Cipe		168.296,40						
31	PZ031C/10	B	Latronico	330.000	21.600,32	181.344,93	225,00	0,00		203.170,25
		Cipe		170.000						
32	PZ032B/10	B	Lauria	330.000	0,00	190.271,35	225,00	0,00		190.496,35
33	PZ033A/10	A	Lauria	450.000	0,00	416.846,97	225,00	0,00		417.071,97
34	PZ034B/10	B	Lavello	330.000	4.334,16	118.239,96	225,00	0,00		122.799,12
35	PZ035A/10	Cipe	Maschito	400.000	188,72	0,00	225,00	0,00		413,72
36	MT036A/10	A	Matera	450.000	20.476,62	139.150,00	0,00	2.477,71		162.104,33
37	PZ037A/10	Cipe	Melfi	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38	MT038B/10	B	Miglionico	80.000	1.007,76	0,00	0,00	0,00		1.007,76
39	PZ039A/10	A	Missanello	270.000	6.795,36	158.643,10	225,00	1.710,79		167.374,25
40	PZ040A/10	Cipe	Moliterno	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

41	MT041A/10	Cipe	Montalbano Jonico	350.000	0,00	0,00	225,00	0,00		<b>225,00</b>
42	PZ042B/10	B	Montemurro	180.000	8.203,35	113.460,71	30,00	2.775,59	3.600,00	<b>124.469,65</b>
43	PZ043A/10	Cipe	Muro Lucano	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
44	PZ044B/10	B	Nemoli	130.000	3.311,18	118.675,46	0,00	0,00		<b>121.986,64</b>
45	MT045A/10	Cipe	Nova Siri	500.000	7.138,62	0,00	0,00	0,00		<b>7.138,62</b>
46	MT046A/10	Cipe	Oliveto Lucano	400.000	8.590,11	0,00	0,00	0,00		<b>8.590,11</b>
47	PZ047B/10	B	Oppido Lucano	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
48	PZ048A/10	Cipe	Oppido Lucano	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
49	PZ049A/10	Cipe	Palazzo San Gervasio	100.000	2.522,97	56.956,91	0,00	1.198,75	2.000,00	<b>60.678,63</b>
50	PZ050A/10	Cipe	Picerno	250.000	36.368,39	158.624,45	0,00	0,00		<b>194.992,84</b>
51	PZ051A/10	Cipe	Picerno	400.000	70.369,55	0,00	0,00	0,00		<b>70.369,55</b>
52	PZ052A/10	Cipe	Pignola	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
53	MT053A/10	A	Pomarico	200.000	8.229,31	179.540,85	0,00	2.579,89	4.000,00	<b>190.350,05</b>
54	PZ054B/10	B	Potenza	190.000	5.000,00	125.435,03	30,00	3.053,08	3.800,00	<b>133.518,11</b>
55	PZ055A/10	Cipe	Potenza	450.000	33.782,57	0,00	0,00	0,00		<b>33.782,57</b>
56	PZ056B/10	B	Rapolla	200.000	12.348,51	73.453,76	0,00	0,00		<b>85.802,27</b>
57	PZ057B/10	B	Rionero in Vulture	340.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00		<b>8.000,00</b>
58	PZ058A/10	Cipe	Ripacandida	200.000	13.799,32	66.803,54	30,00	0,00		<b>80.632,86</b>
59	PZ059A/10	Cipe	Rivello	350.000	6.626,59	0,00	225,00	2.627,14		<b>9.478,73</b>
60	MT060A/10	Cipe	Rotondella	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
61	PZ061B/10	B	San Costantino Albanese	200.000	4.668,69	185.848,74	30,00	1.782,50	4.000,00	<b>192.329,93</b>
62	PZ062A/10	Cipe	San Fele	350.000	3.524,06	329.392,25	225,00	3.068,10	7.000,00	<b>336.209,41</b>
63	PZ063A/10	Cipe	San Martino d'Agri	300.000	7.493,09	79.142,11	225,00	2.603,21		<b>89.463,41</b>
64	MT064A/10	Cipe	San Mauro Forte	400.000	24.435,84	248.582,41	0,00	0,00		<b>273.018,25</b>
65	MT065A/10	Cipe	San Mauro Forte	400.000	26.910,23	0,00	0,00	0,00		<b>26.910,23</b>
66	PZ066A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	600.000	38.332,42	0,00	0,00	0,00		<b>38.332,42</b>
67	PZ067A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	100.000	4.722,91	0,00	0,00	0,00		<b>4.722,91</b>
68	PZ068A/10	Cipe	Sant'Arcangelo	200.000	0,00	159.094,49	30,00	1.952,56	4.000,00	<b>165.077,05</b>
69	PZ069A/10	Cipe	Sarconi	200.000	4.581,48	111.143,34	30,00	0,00		<b>115.754,82</b>
70	PZ070B/10	B	Sasso di Castalda	200.000	5.406,89	74.804,30	30,00	0,00		<b>80.241,19</b>
71	PZ071B/10	B	Satriano di Lucania	220.000	0,00	163.779,32	30,00	0,00		<b>163.809,32</b>
72	MT072B/10	B	Stigliano	255.000	0,00	243.563,10	225,00	4.171,00	5.100,00	<b>247.959,10</b>
73	PZ073A/10	Cipe	Terranova di Pollino	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
74	PZ074A/10	Cipe	Tito	400.000	9.953,79	366.000,15	0,00	6.993,97		<b>382.947,91</b>
75	PZ075A/10	Cipe	Tolve	350.000	9.961,46	0,00	0,00	0,00		<b>9.961,46</b>
76	PZ076C/10	B	Trecchina	300.000	1.773,64	270.548,74	225,00	4.359,88		<b>276.907,26</b>
		Cipe		200.000						
77	PZ077A/10	Cipe	Trecchina	80.000	0,00	68.795,45	30,00	1.583,03	1.600,00	<b>70.408,48</b>
78	MT078A/10	A	Tricarico	800.000	6.347,36	392.907,01	30,00	6.790,00	5.754,83	<b>406.074,37</b>
		A			7.852,42	150.857,46	225,00	5.649,97		<b>164.584,85</b>
79	MT079A/10	Cipe	Tricarico	380.000	25.241,57	0,00	0,00	0,00		<b>25.241,57</b>
80	PZ080A/10	Cipe	Trivigno	400.000	28.844,01	0,00	225,00	0,00		<b>29.069,01</b>
81	MT081A/10	A	Tursi	700.000	23.280,28	604.389,68	225,00	15.825,29	14.000,00	<b>643.720,25</b>
82	MT082A/10	Cipe	Valsinni	400.000	22.555,95	0,00	0,00	0,00		<b>22.555,95</b>
83	PZ083A/10	Cipe	Venosa	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
84	PZ084A/10	Cipe	Viggianello	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
85	MT085A/10	A	Bernalda	300.000	21.127,39	178.189,25	600,00	13.162,39		<b>213.079,03</b>



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

		Cipe		2.700.000	141.171,41	21.296,00	225,00	0,00		<b>162.692,41</b>	
86	PZ086A/11	Cipe	Castelluccio Inferiore	2.000.000	20.891,47	0,00	0,00	0,00		<b>20.891,47</b>	
87	MT087A/11	Cipe	Grassano	400.000	2.064,74	0,00	0,00	802,05		<b>2.866,79</b>	
88	MT088A/11	Cipe	Miglianico	200.000	8.081,72	0,00	0,00	58,97		<b>8.140,69</b>	
89	MT089A/11	A	Nova Siri	200.000	906,40	0,00	30,00	0,00		<b>936,40</b>	
90	PZ090A/11	Cipe	Pignola	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
91	MT091A/11	A	Bacino del Fiume Agri	500.000	523,00	0,00	225,00	0,00		<b>748,00</b>	
92	PZ092A/11	Cipe	Chiaromonte	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
93	MT093A/11	Cipe	Colobraro	500.000	28.044,38	0,00	0,00	143,71		<b>28.188,09</b>	
94	PZ094A/11	Cipe	Maratea	700.000	0,00	0,00	375,00	0,00		<b>375,00</b>	
95	PZ095A/11	Cipe	Melfi	500.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00		<b>6.000,00</b>	
96	MT096A/11	Cipe	Montalbano Jonico	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
97	MT097A/11	Cipe	Pisticci	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
98	PZ098A/11	Cipe	Rapone	180.000	9.106,45	0,00	0,00	0,00		<b>9.106,45</b>	
99	MT099A/11	Cipe	Salandra	100.000	0,00	82.572,93	0,00	0,00		<b>82.572,93</b>	
100	MT100A/11	Cipe	San Giorgio Lucano	400.000	21.320,20	0,00	0,00	113,19		<b>21.433,39</b>	
101	PZ101A/11	Cipe	Tito	400.000	20.875,48	0,00	0,00	0,00		<b>20.875,48</b>	
102	PZ102A/11	Cipe	Vaglio	300.000	10.757,97	140.554,00	0,00	87,10		<b>151.399,07</b>	
103	PZ103A/11	Cipe	Vaglio	500.000	18.290,02	135.104,02	0,00	131,73		<b>153.525,77</b>	
104	MT104A/11	A	Provincia di Matera	339.000	0,00	124.041,58	225,00	0,00		<b>124.266,58</b>	
105	MT105A/11	A	Ferrandina, Salandra, Calciano	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
106	MT106A/11	A	Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni	200.000	0,00	0,00	225,00	0,00		<b>225,00</b>	
				<b>Totale Euro</b>	<b>1.093.679,69</b>	<b>8.178.609,42</b>	<b>6.840,00</b>	<b>106.944,87</b>	<b>78.754,83</b>		<b>9.390.073,98</b>



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

#### 4. ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA' SPECIALE DEL COMMISSARIO

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 - elenco "A" dell'accordo di programma, ammontavano complessivamente ad €. 26.935.000,00 di cui:

- €. 20.200.000,00 con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191
- €. 6.735.000,00 del P.O. FERS Basilicata 2007-2013

L'Atto integrativo ha previsto un ulteriore impegno di €. 8.269.000,00 da finanziare con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012 ha poi indicato come nuova fonte di finanziamento il FSC ed i programmi PAN e PAIN.

I primi accreditamenti da parte del **MATTM** sono intervenuti a partire da fine giugno del 2011, e sono avvenuti come segue:

- 1° accreditamento: di €. 501.378,98 in data 29.06.2011
- 2° accreditamento: di €. 3.356.186,08 in data 15.12.2011
- 3° accreditamento: di €. 960.361,88 in data 19.09.2012 (CIPE)
- 4° accreditamento: di €. 663.138,54 in data 19.09.2012
- 5° accreditamento : di €. 663.138,54 in data 10.12.2012 (CIPE)
- 6° accreditamento : di €. 541.166,81 in data 10.12.2012 (CIPE)

per un totale di €. 6.685.370,83 di cui €. 2.164.667,23 derivante dalla delibera CIPE n. 8/2012 e pari all'intero finanziamento programmato a carico del MATTM.

La **Regione Basilicata** ha effettuato il suo primo accreditamento in data 17.02.2012 per €. 371.574,00, in data 11.09.2012 ha provveduto ad effettuare un secondo accreditamento di €. 638.676,00, in data 25.02.2013 ha provveduto ad accreditare il terzo di €. 918.593,60, in data 29.11.2013 ha infine accreditato €. 1.038.214,47 per un totale di €. **2.967.058,07** sui fondi FESR a fronte di €. **6.735.000,00**.

Mentre il MATTM, come sopra riportato, ha tempestivamente accreditato €. 2.164.667,26, la **Regione Basilicata** solo in data 30.09.2013 ha provveduto ad accreditare un primo importo di €. 1.000.000,00 sui fondi CIPE ed in data 27.11.2013 un secondo importo di €. 400.000,00 a fronte di € 23.948.296,40 previsto ed assegnato con la citata delibera CIPE n. 8/2012 anche in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione n. 286 in data 12 marzo 2013 avente ad oggetto: "Piano Nazionale per il sud - Delibera CIPE n. 8/2012. ASSEGNAZIONE DI RISORSE A INTERVENTI DI CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE NEL MEZZOGIORNO.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

DGR 860.2012- Art. 6 e 7. Modalità di trasferimento delle risorse”, con la quale la stessa Giunta della Regione Basilicata aveva, tra l’altro:

- *preso atto della Relazione Annuale aggiornata al 31.12.2012 redatta dal Commissario Straordinario delegato da cui si evince la situazione finanziaria degli interventi e l’impegno a soddisfare la prescrizione dell’art. 6 della delibera CIPE 8/2012 nell’ipotesi di copertura delle necessità finanziarie di € 10.000.000,00 nel corso dell’anno 2013 e i restanti fondi pari ad € 11.783.629,18 nel primo semestre del 2014;*

**e deliberato**

- *di dare atto che con successivo provvedimento sarà trasferito sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario l’importo di € 10.000.000,00 nel corso dell’anno 2013 e i restanti fondi pari ad € 11.783.629,18 nel primo semestre dell’anno 2014.*

**Tabella 5 – Riepilogo somme accreditate al 31/12/2013**

Numero	Data	MATTM	CIPE/Regione	Regione Basilicata PO-FESR 07/13	Importo
		codice A		codice B	
1	29/06/2011	€ 501.378,98			€ 501.378,98
2	15/12/2011	€ 3.356.186,08			€ 3.356.186,08
3	17/02/2012			€ 371.574,00	€ 371.574,00
4	11/09/2012			€ 638.676,00	€ 638.676,00
5	19/09/2012		€ 960.361,88		€ 960.361,88
6	19/09/2012	€ 663.138,54			€ 663.138,54
7	10/12/2012		€ 663.138,54		€ 663.138,54
8	10/12/2012		€ 541.166,81		€ 541.166,81
9	25/02/2013			€ 918.593,60	€ 918.593,60
10	30/09/2013		€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
11	27/11/2013		€ 400.000,00		€ 400.000,00
12	29/11/2013			€ 1.038.214,47	€ 1.038.214,47
		<b>€ 4.520.703,60</b>	<b>€ 3.564.667,23</b>	<b>€ 2.967.058,07</b>	<b>€ 11.052.428,90</b>





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## 5. LA GESTIONE DEL PROGRAMMA AL 31 dicembre 2013

In merito allo stato di attuazione dell'A.d.P. e quindi della delibera CIPE n. 8 sopra richiamata che ha recepito e confermato la programmazione dei due atti sottoscritti dal MATTM e dalla Regione Basilicata, si è riferito tempo per tempo al Ministero con relazioni trimestrali e con la Relazione annuale al Parlamento.

La deliberazione n. 8 in data 20 gennaio 2012 ha approvato il programma di seguito riportato al netto degli interventi finanziati con il P.O. FESR Basilicata 2007/2013.

Da detta deliberazione si rileva sostanzialmente quanto segue:

1. gli interventi da finanziare con fondi regionali mantengono inalterata la fonte di finanziamento che è il PO-FESR Basilicata 2007-2013 per complessivi €. 6.735.000,00;
2. gli interventi che trovano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 sono i primi 12 e parzialmente il 13° per un importo complessivo di €. 6.685.370,83 tutti accreditati;
3. Tutti gli altri interventi, già programmati con copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovano ora copertura sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per €. 23.948.296,40 rinvenienti dai PAR e dai PAIN;
4. Detti fondi, come riportato al punto 7.2 della deliberazione, saranno accreditati alla Regione Basilicata per essere da questa poi, nel rispetto del patto di stabilità, trasferiti al Commissario con le modalità e secondo le quote richiamati al punto 7.3;
5. L'intero programma costruttivo doveva definire obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30 giugno 2013, successivamente prorogato al 31 dicembre 2013 ed ulteriormente prorogato, nella seduta del 17 dicembre u.s. del Comitato, al 31 dicembre 2014, pena la revoca dei finanziamenti!

La delibera di G.R. n.286/2013 e la nota del Direttore generale del MISE n.1859 in data 11.02.2013, che chiarisce che: "...non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento...", hanno consentito pur in attesa del trasferimento delle risorse, l'approvazione di nuovi progetti anche oltre le somme effettivamente accreditate.

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori, diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la G.R. si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti e che le normative europee sanciscono a carico delle Amministrazioni.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Effettuata la aggiudicazione degli appalti le spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve , massimo sei mesi e quindi l'obbligo a "pagare" si concentra in un arco di tempo ridotto, non in "anni".

Al rischio di determinare condizioni di "debito" per l'Amministrazione, se non venisse garantito il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, con la necessaria tempestiva copertura con l'accreditamento preventivo delle somme si aggiungerebbe il danno, per l'economia reale del territorio, l'accrescersi del "costo" delle opere per gli appaltatori in conseguenza dei ritardi nei pagamenti.

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che comincia ad assumere caratteri "concreti" in quanto, ad oggi, risulta pervenuto solo un parziale modesto accredito pari ad € 1.400.000,00 da parte della Regione Basilicata, a fronte degli impegni assunti con la richiamata D.G.R. n. 286 del 12.03.2013. Ove non dovesse verificarsi una immediata e tempestiva modifica di comportamento si sarà costretti a sospendere le attività.

Di non minore importanza è la definizione della eventuale proroga dell'incarico a Commissario Straordinario delegato, la cui scadenza è fissata al 20 gennaio prossimo.

A fronte della necessità ed obbligo di dare sollecita attuazione degli interventi programmati, permangono situazioni di evidente contrasto:

- Ritardo nel trasferimento delle risorse da parte della Regione Basilicata;
- Scadenza dell'incarico senza alcuna indicazione per una eventuale proroga;
- Mancata risposta alla richiesta di devoluzione delle risorse programmate per Moliterno;
- Rischio di non poter disporre più delle pur modeste collaborazioni poste a disposizione da Enti pubblici quali l'Autorità di Bacino della Basilicata ed il Consorzio di Bonifica.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## 6. BILANCIO ECONOMICO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE

La complessiva gestione della programmazione è, come ovvio, fortemente influenzata dalla effettiva **disponibilità** delle risorse oltre che dalla organizzazione funzionale a disposizione, necessaria, per garantire una puntuale ed efficace spesa.

Quanto alle risorse, la loro messa a disposizione, del tutto indipendente dalla volontà del Commissario, si è verificata con entità e tempi ad esso estranee condizionandone non poco decisioni e scelte.

Solo dopo il primo accreditamento di fondi, infatti, è stato possibile procedere all'avvio concreto delle attività ed alle prime spese indispensabili per dare un senso all'attuazione.

Dopo il secondo accreditamento da parte del MATTM, è stato possibile autorizzare indagini ed incarichi propedeutici per le progettazioni ed alle progettazioni stesse e procedere di conseguenza all'approvazione dei primi progetti individuati come prioritari o, dopo quello della Regione Basilicata, approvare i progetti finanziati dai fondi PO FESR 2006 2013 Basilicata.

La TABELLA RIASSUNTIVA sullo stato di attuazione della spesa sugli interventi previsti dall'A.d.P. al 31 dicembre 2013, evidenzia il succedersi temporale della "spesa" e la disponibilità di cassa. Preme evidenziare che, negli ultimi mesi ed in relazione alla esecuzione degli interventi, la spesa è notevolmente cresciuta e, ove non dovessero determinarsi nuovi accreditamenti, potrebbe verificarsi il temuto spostamento in negativo tra disponibilità e spesa.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Tabella 6 – Riepilogo attuazione della spesa al 31/12/2013**

ordinativo	data	Decreto Comm.	Creditore	Codice Intervento	Codice CIPE	MATTM	Regione PO-FESR	CIPE	Totale progressivo (Euro)	DISPONIBILITÀ DI CASSA (Euro)
	29/06/2011		Direzione generale MATTM						0,00	501.378,98
1	20/10/2011	4	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01	155.269,33			155.269,33	346.109,65
2	21/10/2011	5	Petrocelli Costruttori s.r.l.	MT010A/10	BASFV02	9.627,47			164.896,80	336.482,18
3	01/12/2011	6	Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	225,00			165.121,80	336.257,18
4	02/12/2011	7	Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	5.936,77			171.058,57	330.320,41
5	13/12/2011	8	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01	195.137,91			366.196,48	135.182,50
	15/12/2011		Direzione generale MATTM						366.196,48	3.491.368,58
1	03/02/2012	2	Negrone Key Engineering	MT012A/10	BASFV03	14.108,60			380.305,08	3.477.259,98
2	03/02/2012	3	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	2.405,64			382.710,72	3.474.854,34
3	03/02/2012	3	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	615,29			383.326,01	3.474.239,05
4	03/02/2012	4	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07	2.281,77			385.607,78	3.471.957,28
5	03/02/2012	4	Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07	2.280,32			387.888,10	3.469.676,96
6	03/02/2012	4	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	MT085A/10	BASFV07	253,51			388.141,61	3.469.423,45
7	03/02/2012	5	Studio Tecnico Geom. Giuseppe Buonsanti - Via V.zo Caropreso, 9 - 75100 Matera	PTSG		2.600,00			390.741,61	3.466.823,45
8	03/02/2012	6	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		3.898,76			394.640,37	3.462.924,69
	17/02/2012		Regione Basilicata						394.640,37	3.834.498,69
9	21/02/2012	9	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	PTSG		268,14			394.908,51	3.834.230,55
10	21/02/2012	10	Timbro Print di Patruno Anna	PTSG		216,00			395.124,51	3.834.014,55
11	23/02/2012	13	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		52.174,00			447.298,51	3.781.840,55
12	23/02/2012	13	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		37.917,07			485.215,58	3.743.923,48
13	08/03/2012	17	Geological & Geophysical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza	PZ054B/10			5.000,00		490.215,58	3.738.923,48
14	08/03/2012	18	Edil Geo S.a.s. di Grieco Claudio & C	PZ057B/10			8.000,00		498.215,58	3.730.923,48



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

			Via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)						
15	08/03/2012	20	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01	1.642,77		499.858,35	3.729.280,71
16	03/04/2012	24	Regione Basilicata	PTSG		2.116,12		501.974,47	3.727.164,59
17	03/04/2012	26	Regione Basilicata	PTSG		14.260,85		516.235,32	3.712.903,74
18	03/04/2012	27	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	PTSG		1.895,39		518.130,71	3.711.008,35
19	06/04/2012	28	Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	853,23		518.983,94	3.710.155,12
20	17/04/2012	29	Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	524,88		519.508,82	3.709.630,24
21	17/04/2012	33	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera	PTSG		379,34		519.888,16	3.709.250,90
22	23/04/2012	34	Kreade - Inno S.r.l. - Via Matteo Cosentino, 20 - 85034 Francavilla in Sinni (PZ)	PZ063A/10	BASFV69		5.000,00	524.888,16	3.704.250,90
23	23/04/2012	39	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		1.964,52		526.852,68	3.702.286,38
24	27/04/2012	40	Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera	MT053A/10	BASFV08	2.722,50		529.575,18	3.699.563,88
25	27/04/2012	41	Validaprogetti -Via T. Sigliani, 72 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07	3.359,93		532.935,11	3.696.203,95
26	27/04/2012	42	Laser Graphic di Alliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07	1.126,13		534.061,24	3.695.077,82
27	27/04/2012	43	Lazzari Maurizio	MT081A/10	BASFV05	12.058,80		546.120,04	3.683.019,02
28	27/04/2012	43	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT081A/10	BASFV05	2.941,20		549.061,24	3.680.077,82
29	16/05/2012	49	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01	5.705,86		554.767,10	3.674.371,96
30	16/05/2012	50	Il Sole 24ore S.p.A. - Milano Filiale sud	PTSG		2.420,00		557.187,10	3.671.951,96
31	16/05/2012	51	Agebas S.r.l. - Agenzia di informazione multimediale - 85025 Melfi (PZ)	PTSG		1.452,00		558.639,10	3.670.499,96
32	23/05/2012	52	Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03	2.696,49		561.335,59	3.667.803,47
33	23/05/2012	52	Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03	111,12		561.446,71	3.667.692,35
34	23/05/2012	52	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	433,36		561.880,07	3.667.258,99
35	23/05/2012	52	Dott.ssa Teresa Trabaci - Ill Vico Ferri, 41 - Bernalda (MT)	MT012A/10	BASFV03	340,77		562.220,84	3.666.918,22
36	23/05/2012	52	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	85,19		562.306,03	3.666.833,03
37	23/05/2012	54	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c.	PZ020A/10	BASFV27		3.250,00	565.556,03	3.663.583,03



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

38	23/05/2012	55	Geom. Contristano Alessandro - Via Sardegna, 5 - 85100 Potenza	PZ018B/10			2.112,00	567.668,03	3.661.471,03	
39	23/05/2012	55	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ018B/10			398,00	568.066,03	3.661.073,03	
40	23/05/2012	56	Geom. Contristano Alessandro - Via Sardegna, 5 - 85100 Potenza	PZ016B/10			3.493,00	571.559,03	3.657.580,03	
41	23/05/2012	56	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ016B/10			660,00	572.219,03	3.656.920,03	
42	23/05/2012	59	Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 84 - 85100 Potenza	PZ063A/10	BASFV69			1.450,00	573.669,03	3.655.470,03
43	23/05/2012	58	Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 64 - 85100 Potenza	PZ042B/10			2.111,00	575.780,03	3.653.359,03	
44	04/06/2012	60	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alghieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	153,55		575.933,58	3.653.205,48	
45	04/06/2012	61	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c.	PZ019B/10			3.375,00	579.308,58	3.649.830,48	
46	18/06/2012	29	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02	164,29		579.472,87	3.649.666,19	
47	18/06/2012	62	Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ)	PZ067A/10	BASFV19		4.722,91	584.195,78	3.644.943,28	
48	18/06/2012	64	Geom. Francesco Antonio Vigna - Castelmezzano (PZ)	PZ005B/10			3.920,00	588.115,78	3.641.023,28	
49	18/06/2012	66	Studio Geologico di Dilucchio Gennaro - Via Galliano, 31 - 85028 Rionero (PZ)	PZ005B/10			3.457,01	591.572,79	3.637.566,27	
50	18/06/2012	66	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ005B/10			668,54	592.241,33	3.636.897,73	
51	18/06/2012	67	La Stamperia S.n.c. di Gaetano e Rosalba Liantonio	PTSG		2.364,34		594.605,67	3.634.533,39	
52	18/06/2012	63	Ing. Gianluca Rospi - Via Dante, 9 - 75100 Matera	PZ024B/10			4.233,60	598.839,27	3.630.299,79	
53	18/06/2012	69	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ024B/10			800,00	599.639,27	3.629.499,79	
54	21/06/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ062A/10	BASFV36		2.987,04	602.626,31	3.626.512,75	
55	21/06/2012	74	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ062A/10	BASFV36		512,95	603.139,26	3.625.999,80	
	05/07/2012		Storno ordinario n. 54 del 21/06/12	PZ062A/10	BASFV36		- 2.987,04	600.152,22	3.628.986,84	
56	06/07/2012	77	Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera	PZ042B/10			6.092,35	606.244,57	3.622.894,49	
57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ054B/10			30,00	606.274,57	3.622.864,49	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT085A/10	BASFV07	600,00			606.874,57	3.622.264,49
57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT012A/10		225,00			607.099,57	3.622.039,49
57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ015B/10			30,00		607.129,57	3.622.009,49
57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ077A/10	BASFV25			30,00	607.159,57	3.621.979,49
58	06/07/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ062A/10	BASFV36			2.987,04	610.146,61	3.618.992,45
	19/07/2012		Storno ordinativo n. 58 del 06/07/12	PZ062A/10	BASFV36			- 2.987,04	607.159,57	3.621.979,49
59	10/07/2012	85	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		14.487,00			621.646,57	3.607.492,49
60	10/07/2012	85	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		10.490,36			632.136,93	3.597.002,13
61	12/07/2012	86	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ005B/10			1.518,44		633.655,37	3.595.483,69
62	12/07/2012	87	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	PZ014B/10			183,68		633.839,05	3.595.300,01
63	12/07/2012	89	Comune di Tursi (MT)	MT081A/10	BASFV05	2.988,92			636.827,97	3.592.311,09
64	12/07/2012	90	M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT)	MT010A/10	BASFV02	83.810,19			720.638,16	3.508.500,90
65	19/07/2012	91	Timbro Print di Patruno Anna	PTSG		40,20			720.678,36	3.508.460,70
66	19/07/2012	91	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PTSG		84,99			720.763,35	3.508.375,71
67	19/07/2012	92	Comune di Missanello (PZ)	PTSG		700,00			721.463,35	3.507.675,71
68	26/07/2012	97	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		2.113,90			723.577,25	3.505.561,81
69	26/07/2012	99	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	PZ050A/10	BASFV31			23.375,01	746.952,26	3.482.186,80
70	26/07/2012	100	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	PZ051A/10	BASFV32			55.268,75	802.221,01	3.426.918,05
71	10/08/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ062A/10	BASFV36			2.987,04	805.208,05	3.423.931,01
	11/09/2012		Regione Basilicata						805.208,05	4.062.607,01
73	18/09/2012	115	Geotest S.a.s. di Carbone Andrea - Via Lucca 55 A/B - Melfi (PZ)	PZ016B/10			8.957,67		814.165,72	4.053.649,34
74	18/09/2012	116	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	MT078A/10	BASFV01	703,74			814.869,46	4.052.945,60
75	18/09/2012	117	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ062A/10	BASFV36			330,21	815.199,67	4.052.615,39
	19/09/2012		Direzione generale MATTM						815.199,67	5.012.977,27



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

	19/09/2012		Direzione generale MATTM					815.199,67	5.676.115,81
	04/10/2012		Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	PTSG		- 597,65		814.602,02	5.676.713,46
72	18/09/2012	102	Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	30,00		814.632,02	5.676.683,46
76	21/09/2012	120	Angelone geom. Domenico - Via Longarone, 35 - 75025 Policoro (MT)	MT004B/10			10.513,09	825.145,11	5.666.170,37
77	21/09/2012	120	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT004B/10			2.081,80	827.226,91	5.664.088,57
78	28/09/2012	129	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	PTSG		99,22		827.326,13	5.663.989,35
79	28/09/2012	133	De Nicola Teodosio - Via Lamarmora, 11 - 85100 Potenza	MT078A/10	BASFV01	3.179,00		830.505,13	5.660.810,35
81	28/09/2012	134	Ripullone Gaetano - C.so Umberto I, 60 - 75018 Stigliano (MT)	MT001B/10			1.111,32	831.616,45	5.659.699,03
82	28/09/2012	134	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT001B/10			210,00	831.826,45	5.659.489,03
83	09/10/2012	135	Gaia Emprise S.r.l. - Area industriale - 85059 Viggiano (PZ)	PZ059A/10	BASFV68		3.500,00	835.326,45	5.655.989,03
84	09/10/2012	140	Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ)	PZ013B/10			4.341,77	839.668,22	5.651.647,26
85	09/10/2012	141	Geotest S.a.s. di Carbone Andrea - Via Lucca 55 A/B - Melfi (PZ)	PZ034B/10			3.404,89	843.073,11	5.648.242,37
86	09/10/2012	142	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c.	PZ025A/10	BASFV18		4.780,00	847.853,11	5.643.462,37
87	17/10/2012	146	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT036A/10	BASFV04	11.203,36		859.056,47	5.632.259,01
88	17/10/2012	146	INAIL - Via Lucania, 144 - 75100 Matera	MT036A/10	BASFV04	3.427,85		862.484,32	5.628.831,16
89	17/10/2012	146	Cassa Edile Provinciale - Viale Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera	MT036A/10	BASFV04	985,41		863.469,73	5.627.845,75
90	18/10/2012	144	Comune di Missanello (PZ)	PTSG		925,02		864.394,75	5.626.920,73
91	18/10/2012	149	Comune di Missanello (PZ)	PZ039A/10	BASFV61		950,44	865.345,19	5.625.970,29
92	18/10/2012	149	Comune di Sant'Arcangelo (PZ)	PZ039A/10	BASFV61		760,35	866.105,54	5.625.209,94
93	18/10/2012	133	De Nicola Giuseppe - Via Lamarmora, 11 - 85100 Potenza	MT078A/10	BASFV01	3.179,00		869.284,54	5.622.030,94
94	05/11/2012	154	Kartos di Giacommo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ063A/10	BASFV69		929,51	870.214,05	5.621.101,43
95	05/11/2012	156	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	PTSG		3.725,64		873.939,69	5.617.375,79
96	05/11/2012	164	Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pisticci (MT)	MT012A/10	BASFV03	92.175,77		966.115,46	5.525.200,02





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

97	05/11/2012	163	Impresa Sinisgalli S.r.l. - Via Pantoni di Freda, 6 - 85100 Potenza	PZ054B/10			124.850,22	1.090.965,68	5.400.349,80	
98	05/11/2012	162	Fantini Ing. Roberto - Vico Il Roma, 31 - 75010 Aliano (MT)	PZ039A/10	BASFV61			5.715,36	1.096.681,04	5.394.634,44
99	05/11/2012	162	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ039A/10	BASFV61			1.080,00	1.097.761,04	5.393.554,44
	06/11/2012		Storno ordinativo n. del				- 20.562,69		1.077.198,35	5.414.117,13
100	12/11/2012	166	Engineering Geology S.r.l. - Via del Galtillo, 90/A - 85100 Potenza	PZ020A/10	BASFV27			14.343,34	1.091.541,69	5.399.773,79
101	15/11/2012	171	La Torre Luciano - C.da Spinette, 4 - 85050 Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40			224.818,00	1.316.359,69	5.174.955,79
102	15/11/2012	172	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	PZ077A/10			41.390,47		1.357.750,16	5.133.565,32
103	15/11/2012	173	Pepe S.r.l. - Viale Italia - San Brancato di Sant'Arcangelo - 85037 Sant'Arcangelo (PZ)	PZ068A/10			38.464,39		1.396.214,55	5.095.100,93
104	21/11/2012	175	Geomonitor S.n.c. - Viale I Maggio - 85020 Filiano (PZ)	PZ074A/10	BASFV40			9.953,79	1.406.168,34	5.085.147,14
105	21/11/2012	178	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ017B/10			30,00		1.406.198,34	5.085.117,14
105	21/11/2012	178	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ026B/10			30,00		1.406.228,34	5.085.087,14
105	21/11/2012	178	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ042B/10			30,00		1.406.258,34	5.085.057,14
105	21/11/2012	178	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ039A/10	BASFV61			225,00	1.406.483,34	5.084.832,14
106	21/11/2012	179	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	PZ015B/10			177.630,42		1.584.113,76	4.907.201,72
107	28/11/2012	181	Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40			3.335,37	1.587.449,13	4.903.866,35
108	28/11/2012	181	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ074A/10	BASFV40			266,59	1.587.715,72	4.903.599,76
109	28/11/2012	181	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	PZ074A/10	BASFV40			355,44	1.588.071,16	4.903.244,32
110	28/11/2012	181	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ074A/10	BASFV40			230,06	1.588.301,22	4.903.014,26
111	28/11/2012	183	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ032B/10			225,00		1.588.526,22	4.902.789,26
112	28/11/2012	184	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	PTSG			2.180,71		1.590.706,93	4.900.608,55
113	28/11/2012	184	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	PTSG			1.594,18		1.592.301,11	4.899.014,37
114	28/11/2012	184	D'Andrea Giovanni Salvatore - Dipendente Regione Basilicata	PTSG			2.087,86		1.594.388,97	4.896.926,51
115	28/11/2012	184	Iannello Giuseppina - Dipendente Regione Basilicata	PTSG			893,52		1.595.282,49	4.896.032,99



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

116	28/11/2012	184	D'Andrea Carmine - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		3.083,14		1.598.365,63	4.892.949,85	
117	28/11/2012	184	Grippa Vito - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		3.039,98		1.601.405,61	4.889.909,87	
118	28/11/2012	184	Cancelliere Bruna - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		874,80		1.602.280,41	4.889.035,07	
119	28/11/2012	184	Giordano Ciara - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		3.059,56		1.605.339,97	4.885.975,51	
120	28/11/2012	184	Cavallo Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.540,82		1.606.880,79	4.884.434,69	
121	28/11/2012	184	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		387,95		1.607.268,74	4.884.046,74	
122	28/11/2012	184	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		687,13		1.607.955,87	4.883.359,61	
123	28/11/2012	184	Tolve Salvatore - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		2.986,28		1.610.942,15	4.880.373,33	
124	28/11/2012	184	Olita Antonio - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.227,63		1.612.169,78	4.879.145,70	
125	28/11/2012	184	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PTSG		278,92		1.612.448,70	4.878.866,78	
126	28/11/2012	184	Maio Salvatore - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		252,64		1.612.701,34	4.878.614,14	
127	28/11/2012	184	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		10.951,04		1.623.652,38	4.867.663,10	
128	05/12/2012	185	G.A.T. Geologia Ambiente Territorio del geol. Donato Lacava - Via Sicilia, 43 - 85100 PZ	PZ070B/10			3.751,94	1.627.404,32	4.863.911,16	
129	05/12/2012	186	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ035A/10	BASFV62			146,76	1.627.551,08	4.863.764,40
130	05/12/2012	187	Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ061B/10			2.943,74	1.630.494,82	4.860.820,66	
131	05/12/2012	187	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ061B/10			556,26	1.631.051,08	4.860.264,40	
132	05/12/2012	188	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ076C/10			493,61	1.631.544,69	4.859.770,79	
132	05/12/2012	188		PZ076C/10	BASFV14			740,42	1.632.285,11	4.859.030,37
133	05/12/2012	189	Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto, 56 - 75018 Stigliano (MT)	MT072B/10			142.296,00	1.774.581,11	4.716.734,37	
134	05/12/2012	190	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	PTSG		76,60		1.774.657,71	4.716.657,77	
135	05/12/2012	191	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 - 75100 Matera	MT091A/11	BASFV09	523,00		1.775.180,71	4.716.134,77	
136	05/12/2012	192	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)	PZ075A/10	BASFV41			8.232,61	1.783.413,32	4.707.902,16
137	05/12/2012	194	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	MT022B/10			73.371,81	1.856.785,13	4.634.530,35	
138	05/12/2012	195	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	45,73		1.856.830,86	4.634.484,62	
139	05/12/2012	195	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	193,11		1.857.023,97	4.634.291,51	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

140	05/12/2012	195	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	119,93			1.857.143,90	4.634.171,58
141	05/12/2012	195	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	24,39			1.857.168,29	4.634.147,19
142	05/12/2012	195	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02	141,72			1.857.310,01	4.634.005,47
143	05/12/2012	195	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02	164,29			1.857.474,30	4.633.841,18
144	05/12/2012	196	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03	243,35			1.857.717,65	4.633.597,83
145	05/12/2012	196	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03	829,69			1.858.547,34	4.632.768,14
146	05/12/2012	196	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03	316,35			1.858.863,69	4.632.451,79
147	05/12/2012	196	Antonuci Francesca - Dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03	340,77			1.859.204,46	4.632.111,02
148	05/12/2012	196	Cocca Carmine - Dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03	266,69			1.859.471,15	4.631.844,33
149	05/12/2012	196	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03	106,67			1.859.577,82	4.631.737,66
150	05/12/2012	196	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	592,97			1.860.170,79	4.631.144,69
151	05/12/2012	196	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	MT012A/10	BASFV03	111,12			1.860.281,91	4.631.033,57
152	05/12/2012	196	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03	433,36			1.860.715,27	4.630.600,21
153	05/12/2012	197	De Carlo Luigi - Via Sotto Le Mura, 31 - 85046 Ruoti (PZ)	PZ044B/10			37.723,95		1.898.439,22	4.592.876,26
154	06/12/2012	193	Soc. Coop Alphegeo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)	PZ017B/10			5.718,79		1.904.158,01	4.587.157,47
	10/12/2012		Direzione generale MATTM						1.904.158,01	5.250.296,01
	10/12/2012		Direzione generale MATTM						1.904.158,01	5.791.462,82
155	11/12/2012	199	Agrello Geol. Domenico - Via dell'Arancio, 16 - 85044 Lauria (PZ)	PZ044B/10			1.535,79		1.905.693,80	5.789.927,03
156	11/12/2012	199	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ044B/10			297,00		1.905.990,80	5.789.630,03
157	11/12/2012	201	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PTSG		190,62			1.906.181,42	5.789.439,41
158	11/12/2012	205	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	PTSG		4.351,20			1.910.532,62	5.785.088,21
159	12/12/2012	202	Valbasento Lavori S.r.l. - C.da Parata, 1 - 75010 Calciano (MT)	PZ042B/10			54.751,29		1.965.283,91	5.730.336,92
160	12/12/2012	206	Pastore Giovanni - Via Sant'Anna, 32 - 85050 Tito (PZ)	PZ070B/10			1.248,00		1.966.531,91	5.729.088,92



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

161	12/12/2012	207	D'Andrea Giovanni Salvatore - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.004,62		1.967.536,53	5.728.084,30	
162	12/12/2012	207	Iannello Giuseppina - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		202,37		1.967.738,90	5.727.881,93	
163	12/12/2012	207	Antonuci Francesca - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		281,80		1.968.020,70	5.727.600,13	
164	12/12/2012	207	Rivello Rocco - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		665,06		1.968.685,76	5.726.935,07	
165	12/12/2012	207	Cocca Carmine - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		248,64		1.968.934,40	5.726.686,43	
166	12/12/2012	207	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		1.118,35		1.970.052,75	5.725.568,08	
167	13/12/2012	208	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)	PZ023A/10	BASfv60			9.467,77	1.979.520,52	5.716.100,31
168	14/12/2012	209	Costruzioni Generali Infrastrutture Generali Sri C.da Piagge ss. 598 Km. 70 85010 Gallicchio (PZ)	PZ062A/10	BASfv36			22.545,93	2.002.066,45	5.693.554,38
169	14/12/2012	211	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ016B/10				1.352,53	2.003.418,98	5.692.201,85
170	14/12/2012	212	La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'oro - 85051 Bella (PZ)	PZ032B/10				190.271,35	2.193.690,33	5.501.930,50
171	14/12/2012	213	Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pistici (MT)	MT012A/10	BASfv03	92.150,33			2.285.840,66	5.409.780,17
172	14/12/2012	214	Spilotro Giuseppe - Viale della resistenza, 48 G2 - 70125 Bari	MT078A/10	BASfv01	6.604,42			2.292.445,08	5.403.175,75
173	14/12/2012	214	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT078A/10	BASfv01	1.248,00			2.293.693,08	5.401.927,75
	21/12/2012		Storno ordinativo n. del (Comune di Tito)	PZ074A/10	BASfv40			- 3.335,37	2.290.357,71	5.405.263,12
									2.290.357,71	5.405.263,12
1	29/01/2013	9	Truncellito Pasquale - Via Carlo Levi, 3 - 75029 Valsinni (MT)	MT046A/10	BASfv30			1.789,59	2.292.147,30	5.403.473,53
2	29/01/2013	9	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT046A/10	BASfv30			290,00	2.292.437,30	5.403.183,53
3	29/01/2013	11	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)	PZ075A/10	BASfv41			1.728,85	2.294.166,15	5.401.454,68
4	29/01/2013	12	Gaia Emprise S.r.l. - Area Industriale - 85059 Viggiano (PZ)	PZ069A/10	BASfv71			4.149,59	2.298.315,74	5.397.305,09
5	29/01/2013	14	Calbi Leonardo - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASfv40			1.395,13	2.299.710,87	5.395.909,96
6	29/01/2013	14	Scavone Nicola Carmine - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASfv40			213,27	2.299.924,14	5.395.696,69
7	29/01/2013	14	Oddone Benito - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASfv40			213,27	2.300.137,41	5.395.483,42
8	29/01/2013	14	Dolce Antonio - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASfv40			613,15	2.300.750,56	5.394.870,27



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

9	29/01/2013	15	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		4.000,00		2.304.750,56	5.390.870,27
10	29/01/2013	14	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ074A/10	BASFV40		909,55	2.305.660,11	5.389.960,72
11	06/02/2013	18	Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07	2.903,70		2.308.563,81	5.387.057,02
12	12/02/2013	21	M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT)	MT010A/10	BASFV02	421,15		2.308.984,96	5.386.635,87
13	12/02/2013	21	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	197,39		2.309.182,35	5.386.438,48
14	12/02/2013	21	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	288,77		2.309.471,12	5.386.149,71
15	12/02/2013	21	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	166,61		2.309.637,73	5.385.983,10
16	12/02/2013	21	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02	21,62		2.309.659,35	5.385.961,48
17	12/02/2013	21	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02	212,23		2.309.871,58	5.385.749,25
18	12/02/2013	21	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02	48,86		2.309.920,44	5.385.700,39
19	12/02/2013	23	Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ)	MT053A/10	BASFV08	116.580,67		2.426.501,11	5.269.119,72
20	12/02/2013	25	Grieco Donato	MT081A/10	BASFV05	1.460,00		2.427.961,11	5.267.659,72
21	12/02/2013	25	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT081A/10	BASFV05	1.460,00		2.429.421,11	5.266.199,72
22	12/02/2013	25	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT081A/10	BASFV05	1.080,00		2.430.501,11	5.265.119,72
23	12/02/2013	25	Comune di Tursi (MT)	MT081A/10	BASFV05	578,70		2.431.079,81	5.264.541,02
24	12/02/2013	27	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		271,81		2.431.351,62	5.264.269,21
25	13/02/2013	28	Daimar Opere Generali S.r.l. - Via Giollitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pistici (MT)	MT012A/10	BASFV03	92.591,75		2.523.943,37	5.171.677,46
26	13/02/2013	28	Regalgas di Grasso Concetto & C. S.a.s. - frazione Valle del Dittaino - Assoro (EN)	MT012A/10	BASFV03	785,20		2.524.728,57	5.170.892,26
27	13/02/2013	29	De Stefano Salvatore & C. S.n.c. - Viale del Basento, 244 - 85100 Potenza	PZ080A/10	BASFV73		21.423,98	2.546.152,55	5.149.468,28
28	13/02/2013	30	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		11.635,00		2.557.787,55	5.137.833,28
29	13/02/2013	30	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		13.365,10		2.571.152,65	5.124.468,18
30	15/02/2013	31	Valbasento Lavori S.r.l. - C.da Parata, 1 - 75010 Calciano (MT)	PZ042B/10			58.207,45	2.629.360,10	5.066.260,73



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

31	18/02/2013	32	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	PZ021B/10			14.381,27		2.643.741,37	5.051.879,46
32	18/02/2013	33	Smeda S.r.l. - Zona P.I. - Lotto n. 2 - 75028 Tursi (MT)	MT014B/10			56.846,01		2.700.587,38	4.995.033,45
33	18/02/2013	34	La Torre Luciano - C.da Spinette, 4 - 85050 Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40			135.399,00	2.835.986,38	4.859.634,45
	14/03/2013		Regione Basilicata - II Acconto						2.835.986,38	5.778.228,05
34	07/03/2013	36	Bartolomeo Giuseppe - C.so Vittorio Emanuele II, 108 - 85043 Latronico (PZ)	PZ031C/10	BASFV17			1.993,43	2.837.979,81	5.776.234,62
34	07/03/2013	36					3.869,60		2.841.849,41	5.772.365,02
35	07/03/2013	36	Bartolomeo Maria Rosaria - Via Arno, 34 - 59100 Prato	PZ031C/10	BASFV17			1.533,00	2.843.382,41	5.770.832,02
35	07/03/2013	36					2.975,82		2.846.358,23	5.767.856,20
36	07/03/2013	36	Gesualdi Mario - Via Roma, 108 - 85043 Latronico (PZ)	PZ031C/10	BASFV17			2.015,54	2.848.373,77	5.765.840,66
36	07/03/2013	36					3.912,53		2.852.286,30	5.761.928,13
37	07/03/2013	36	De Luca Egidio e Fittipaldi Isabella - Via Crocevia, 4/A - 85043 Latronico (PZ)	PZ031C/10	BASFV17			2.081,10	2.854.367,40	5.759.847,03
37	07/03/2013	36					4.039,78		2.858.407,18	5.755.807,25
38	07/03/2013	41	Caivello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	271,60			2.858.678,78	5.755.535,65
39	07/03/2013	41	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	375,02			2.859.053,80	5.755.160,63
40	07/03/2013	41	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT078A/10	BASFV01	206,61			2.859.260,41	5.754.954,02
41	07/03/2013	43	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	MT078A/10	BASFV01	416,50			2.859.676,91	5.754.537,52
42	07/03/2013	44	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	MT065A/10	BASFV38			12.115,97	2.871.792,88	5.742.421,55
43	07/03/2013	45	PA.E.CO S.r.l. - C.da Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT)	MT078A/10	BASFV01	117.011,42			2.988.804,30	5.625.410,13
44	08/03/2013	59	D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.048,30			2.989.852,60	5.624.361,83
45	08/03/2013	59	D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata	PTSG		2.515,17			2.992.367,77	5.621.846,66
46	08/03/2013	59	Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.013,33			2.993.381,10	5.620.833,33
47	08/03/2013	59	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PTSG		2.118,17			2.995.499,27	5.618.715,16
48	08/03/2013	59	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		892,44			2.996.391,71	5.617.822,72
49	08/03/2013	59	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		527,65			2.996.919,36	5.617.295,07
50	08/03/2013	59	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		284,70			2.997.204,06	5.617.010,37
51	08/03/2013	59	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PTSG		534,59			2.997.738,65	5.616.475,78
52	08/03/2013	59	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		264,67			2.998.003,32	5.616.211,11
53	08/03/2013	59	Abbruzzese Luciano - dipendente Regione Basilicata	PTSG		338,16			2.998.341,48	5.615.872,95



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

54	08/03/2013	59	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		363,01			2.998.704,49	5.615.509,94
55	08/03/2013	59	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	PTSG		469,52			2.999.174,01	5.615.040,42
56	08/03/2013	59	Cancelliere Bruna - dipendente Regione Basilicata	PTSG		237,31			2.999.411,32	5.614.803,11
57	08/03/2013	59	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		4.756,06			3.004.167,38	5.610.047,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT022B/10			30,00		3.004.197,38	5.610.017,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT014B/10			30,00		3.004.227,38	5.609.987,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT091A/11	BASFV24			225,00	3.004.452,38	5.609.762,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma		BASFV14			90,00	3.004.542,38	5.609.672,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ076C/10			135,00		3.004.677,38	5.609.537,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ063A/10	BASFV69			225,00	3.004.902,38	5.609.312,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT078A/10	BASFV01	225,00			3.005.127,38	5.609.087,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ071B/10			30,00		3.005.157,38	5.609.057,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ062A/10	BASFV36			225,00	3.005.382,38	5.608.832,05
59	13/03/2013	55	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	PZ015B/10			893,27		3.006.275,65	5.607.938,78
60	13/03/2013	55	Caivello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10			507,77		3.006.783,42	5.607.431,01
61	13/03/2013	55	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10			248,04		3.007.031,46	5.607.182,97
62	13/03/2013	55	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10			527,08		3.007.558,54	5.606.655,89
63	13/03/2013	55	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10			930,15		3.008.488,69	5.605.725,74
64	13/03/2013	55	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10			899,14		3.009.387,83	5.604.826,60
65	13/03/2013	55	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10			62,01		3.009.449,84	5.604.764,59
66	13/03/2013	55	Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10			62,01		3.009.511,85	5.604.702,58
67	13/03/2013	55	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10			62,01		3.009.573,86	5.604.640,57
68	13/03/2013	55	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ015B/10			1.057,10		3.010.630,96	5.603.583,47



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

69	13/03/2013	56	Impresa Sinisgalli S.r.l. - Via Pantoni di Freda, 6 - 85100 Potenza	PZ054B/10			584,81	3.011.215,77	5.602.998,66
70	13/03/2013	56	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10			390,46	3.011.606,23	5.602.608,20
71	13/03/2013	56	Onorati Rocco - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10			106,88	3.011.713,11	5.602.501,32
72	13/03/2013	56	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ054B/10			192,38	3.011.905,49	5.602.308,94
73	13/03/2013	56	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10			342,00	3.012.247,49	5.601.966,94
74	13/03/2013	56	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10			662,63	3.012.910,12	5.601.304,31
75	13/03/2013	56	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10			491,63	3.013.401,75	5.600.812,68
76	13/03/2013	56	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10			42,75	3.013.444,50	5.600.769,93
77	13/03/2013	56	Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10			42,75	3.013.487,25	5.600.727,18
78	13/03/2013	56	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10			42,75	3.013.530,00	5.600.684,43
79	13/03/2013	56	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ054B/10			738,87	3.014.268,87	5.599.945,56
80	13/03/2013	57	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36		517,68	3.014.786,55	5.599.427,88
81	13/03/2013	57	Vaccaro Franco - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36		201,75	3.014.988,30	5.599.226,13
82	13/03/2013	57	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36		484,20	3.015.472,50	5.598.741,93
83	13/03/2013	57	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36		524,55	3.015.997,05	5.598.217,38
84	13/03/2013	57	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36		363,15	3.016.360,20	5.597.854,23
85	13/03/2013	57	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36		80,70	3.016.440,90	5.597.773,53
86	13/03/2013	57	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36		80,70	3.016.521,60	5.597.692,83
87	13/03/2013	57	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36		80,70	3.016.602,30	5.597.612,13
88	13/03/2013	57	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ062A/10	BASFV36		734,67	3.017.336,97	5.596.877,46
89	13/03/2013	58	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14		300,76	3.017.637,73	5.596.576,70
89	13/03/2013	58					451,14	3.018.088,87	5.596.125,56
90	13/03/2013	58	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ076C/10	BASFV14		114,00	3.018.202,87	5.596.011,56
90	13/03/2013	58					171,00	3.018.373,87	5.595.840,56
91	13/03/2013	58	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14		228,00	3.018.601,87	5.595.612,56
91	13/03/2013	58					342,00	3.018.943,87	5.595.270,56
92	13/03/2013	58	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14		296,40	3.019.240,27	5.594.974,16





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

92	13/03/2013	58	Basilicata				444,60		3.019.684,87	5.594.529,56
93	13/03/2013	58	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14			205,20	3.019.890,07	5.594.324,36
93	13/03/2013	58						307,80		3.020.197,87
94	13/03/2013	58	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14			45,60	3.020.243,47	5.593.970,96
94	13/03/2013	58						68,40		3.020.311,87
95	13/03/2013	58	Galliani Romina - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14			45,60	3.020.357,47	5.593.856,96
95	13/03/2013	58						68,40		3.020.425,87
96	13/03/2013	58	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14			45,60	3.020.471,47	5.593.742,96
96	13/03/2013	58						68,40		3.020.539,87
97	13/03/2013	58	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14			45,60	3.020.585,47	5.593.628,96
97	13/03/2013	58						68,40		3.020.653,87
98	13/03/2013	58	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ076C/10	BASFV14			417,19	3.021.071,06	5.593.143,37
98	13/03/2013	58						625,79		3.021.696,85
99	20/03/2013	62	Sinigalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	PZ077A/10	BASFV25			21.836,87	3.043.533,72	5.570.680,71
100	20/03/2013	67	Spilotro Giuseppe - Viale della Resistenza, 48 G2 - 70125 Bari	MT085A/10	BASFV15			4.579,62	3.048.113,34	5.566.101,09
101	20/03/2013	67	Tomasicchio Giuseppe Roberto - Via De Rossi, 32 - 70122 Bari	MT085A/10	BASFV15			3.300,00	3.051.413,34	5.562.801,09
102	20/03/2013	67	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15			2.665,38	3.054.078,72	5.560.135,71
103	20/03/2013	68	Laboratorio Terre S.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera	MT064A/10	BASFV37			10.890,00	3.064.968,72	5.549.245,71
104	20/03/2013	69	Comune di Missanello (PZ)	PTSG			822,38		3.065.791,10	5.548.423,33
105	20/03/2013	70	Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata	MT022B/10			404,45		3.066.195,55	5.548.018,88
106	20/03/2013	70	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT022B/10			206,21		3.066.401,76	5.547.812,67
107	20/03/2013	70	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT022B/10			259,88		3.066.661,84	5.547.552,79
108	20/03/2013	70	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT022B/10			74,23		3.066.735,87	5.547.478,56
109	20/03/2013	70	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT022B/10			54,24		3.066.790,11	5.547.424,32
110	20/03/2013	70	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT022B/10			413,39		3.067.203,50	5.547.010,93
111	20/03/2013	70	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	MT022B/10			282,48		3.067.485,98	5.546.728,45
112	20/03/2013	71	Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata	MT014B/10			443,74		3.067.929,72	5.546.284,71



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

113	20/03/2013	71	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT014B/10			304,34		3.068.234,06	5.545.980,37
114	20/03/2013	71	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT014B/10			245,70		3.068.479,76	5.545.734,67
115	20/03/2013	71	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT014B/10			45,49		3.068.525,25	5.545.689,18
116	20/03/2013	71	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	MT014B/10			237,38		3.068.762,63	5.545.451,80
117	20/03/2013	71	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT014B/10			503,73		3.069.266,36	5.544.948,07
118	03/04/2013	72	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	PTSG		1.706,40			3.070.972,76	5.543.241,67
119	08/04/2013	81	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15			727,50	3.071.700,26	5.542.514,17
120	08/04/2013	82	Vigoriti Giuseppe - Via Nazionale, 153 - 75010 Grottole (MT)	MT079A/10	BASFV16			1.905,12	3.073.605,38	5.540.609,05
121	08/04/2013	82	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT079A/10	BASFV16			360,00	3.073.965,38	5.540.249,05
122	08/04/2013	83	Comune di Pomarico	MT053A/10	BASFV08	818,07			3.074.783,45	5.539.430,98
123	08/04/2013	83	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT053A/10	BASFV08	172,95			3.074.956,40	5.539.258,03
124	08/04/2013	83	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT053A/10	BASFV08	43,24			3.074.999,64	5.539.214,79
125	08/04/2013	84	Popolizio Antonio	MT053A/10	BASFV08	4.233,60			3.079.233,24	5.534.981,19
126	08/04/2013	84	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT053A/10	BASFV08	800,00			3.080.033,24	5.534.181,19
127	08/04/2013	87	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ061B/10			1.168,69		3.081.201,93	5.533.012,50
128	08/04/2013	90	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ069A/10	BASFV71			431,89	3.081.633,82	5.532.580,61
129	10/04/2013	93	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	PTSG		799,20			3.082.433,02	5.531.781,41
130	10/04/2013	94	Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ058A/10	BASFV67			5.046,41	3.087.479,43	5.526.735,00
131	10/04/2013	94	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ058A/10	BASFV67			953,59	3.088.433,02	5.525.781,41
132	12/04/2013	97	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ008A/10	BASFV58			410,84	3.088.843,86	5.525.370,57
133	17/04/2013	98	Geologia Energia Ambiente S.r.l. - Vico Conche, 12/13 - 75100 Matera	PZ019B/10			4.840,00		3.093.683,86	5.520.530,57
134	17/04/2013	99	Del Gaudio Nicola Pompeo - Largo Bonifacio de Luca, 20 - 85043 Latronico (PZ)	PZ031C/10	BASFV17			1.102,70	3.094.786,56	5.519.427,87
							2.140,53		3.096.927,09	5.517.287,34



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

135	17/04/2013	99	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ031C/10	BASFV17			213,25	3.097.140,34	5.517.074,09
							413,95		3.097.554,29	5.516.660,14
136	17/04/2013	100	Cartolaro Margherita - Viale Marotta, 3 - Trecchina (PZ)	PZ033A/10	BASFV29			1.166,67	3.098.720,96	5.515.493,47
137	17/04/2013	100	Cartolaro Maria Alessandra - Via Tolero, 11 - Roma	PZ033A/10	BASFV29			1.166,67	3.099.887,63	5.514.326,80
138	17/04/2013	100	Cartolaro Francesco - Via Santeramo, 23 - Roma	PZ033A/10	BASFV29			388,89	3.100.276,52	5.513.937,91
139	17/04/2013	100	Cartolaro Elena - Via G. B. Martini, 6 - Roma	PZ033A/10	BASFV29			388,89	3.100.665,41	5.513.549,02
140	17/04/2013	100	Cartolaro Pier Paolo - Via G. Ricci Curbastro, 34 - Roma	PZ033A/10	BASFV29			388,89	3.101.054,30	5.513.160,13
141	19/04/2013	111	Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto, 56 - 75018 Stigliano (MT)	MT072B/10		99.946,00			3.201.000,30	5.413.214,13
142	19/04/2013	105	Validaprogetti -Via T. Stigliani, 72 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15			3.919,92	3.204.920,22	5.409.294,21
143	24/04/2013	115	Comune di Tursi (MT)	MT081A/10	BASFV05	747,23			3.205.667,45	5.408.546,98
144	24/04/2013	116	G.A.P. Consulting S.a.s. di Bianchi Remo & C. - Via Padre Pio da Pietralcina - Castrovillari (CS)	PZ0103A/1 1	BASFV55			3.758,93	3.209.426,38	5.404.788,05
145	24/04/2013	117	Santorsoia Cosimo - Via Anacreonte, 9 - 75012 Bernalda (MT)	MT011B/10			2.854,40		3.212.280,78	5.401.933,65
146	24/04/2013	117	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT011B/10			539,38		3.212.820,16	5.401.394,27
147	24/04/2013	118	Giuloco Prospezioni S.a.s. del Dott. Geol. Giuseppe Locorotolo - Via Dante, 65 - 75100 Matera	PZ008A/10	BASFV58			2.138,30	3.214.958,46	5.399.255,97
148	02/05/2013	122	Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pisticci (MT)	MT012A/10	BASFV03	92.306,06			3.307.264,52	5.306.949,91
149	02/05/2013	121	Laborgeo S.r.l. - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera	MT001B/10			9.329,17		3.316.593,69	5.297.620,74
150	06/05/2013	124	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera				523,00		3.317.116,69	5.297.097,74
151	06/05/2013	125	Kartos di Giacommo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ070B/10			406,95		3.317.523,64	5.296.690,79
152	06/05/2013	126	Kartos di Giacommo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ019B/10			349,22		3.317.872,86	5.296.341,57
153	10/05/2013	130	Kreade - Inno S.r.l. - Via Matteo Cosentino, 20 - 85034 Francavilla in Sinni (PZ)	PZ031C/10	BASFV17			5.965,30	3.323.838,16	5.290.376,27
							11.579,70		3.335.417,86	5.278.796,57
154	15/05/2013	136	Kartos di Giacommo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ005B/10			666,83		3.336.084,69	5.278.129,74
155	15/05/2013	137	Polidoro Francesco - Via Turati, 12/5 - 75018 Stigliano (MT)	PZ072B/10			1.054,50		3.337.139,19	5.277.075,24
156	15/05/2013	138	Comune di Stigliano - Via Zanardelli, 33 - 75018 Stigliano (MT)	PZ072B/10			225,00		3.337.364,19	5.276.850,24
157	20/05/2013	142	Publifast S.r.l. - Via Rossini, 2 - 87040 Castrolibero (CS)	MT085A/10	BASFV15			346,67	3.337.710,86	5.276.503,57



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

158	20/05/2013	145	Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. - P.zza dei Carbonari, 3 - 20125 Milano	MT085A/10	BASFV15		542,08	3.338.252,94	5.275.961,49
159	20/05/2013	149	Russo Biagio - Vico I Maturò, 1 - Agromonte Magnono - 85043 Latronico (PZ)	PZ0103A/1 1	BASFV55		7.493,47	3.345.746,41	5.268.468,02
160	20/05/2013	149	Malinata Vincenzo - Vico Bovio, 1 - 85043 Latronico (PZ)	PZ0103A/1 1	BASFV55		4.219,54	3.349.965,95	5.264.248,48
161	20/05/2013	149	Messuti Domenico - C.da pecorone, 62 - 85044 Lauria (PZ)	PZ0103A/1 1	BASFV55		401,28	3.350.367,23	5.263.847,20
162	20/05/2013	149	Studio Sasanio - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ0103A/1 1	BASFV55		2.332,32	3.352.699,55	5.261.514,88
163	21/05/2013	151	Leone Mario Rosario - Via A. De Gasperi, 6 - Sant'Arcangelo (PZ)	PZ062A/10	BASFV36		176.244,97	3.528.944,52	5.085.269,91
164	21/05/2013	152	Sileo Rocco - Via Adriatico, 10 - 85100 Potenza	PZ098A/11	BASFV51		3.364,27	3.532.308,79	5.081.905,64
165	21/05/2013	152	Studio Sasanio - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ098A/11	BASFV51		635,73	3.532.944,52	5.081.269,91
166	21/05/2013	154	Simeone Vincenzo - Via Mare degli Umori, 98 - Castellaneta Marina (TA)	MT036A/10	BASFV04	3.960,00		3.536.904,52	5.077.309,91
167	21/05/2013	154	Studio Sasanio - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT036A/10	BASFV04	900,00		3.537.804,52	5.076.409,91
168	21/05/2013	155	Laborgo S.r.l. - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera	MT082A/10	BASFV74		22.555,95	3.560.360,47	5.053.853,96
169	21/05/2013	156	Bauwerk S.r.l. - Via Napoli, 6 - 85100 Potenza	MT029A/10	BASFV28		30.280,46	3.590.640,93	5.023.573,50
170	21/05/2013	157	Laborgo S.r.l. - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera	MT045A/10	BASFV65		7.138,62	3.597.779,55	5.016.434,88
	10/06/2013		Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	PTSG		- 597,65		3.597.181,90	5.017.032,53
171	28/05/2013	160	Guglielmo Luigi - Viale della Pineta, 4/3 - 75029 Valsinni (MT9)	MT001B/10			1.551,30	3.598.733,20	5.015.481,23
172	28/05/2013	160	Studio Sasanio - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT001B/10			300,00	3.599.033,20	5.015.181,23
173	28/05/2013	163	Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15		196,02	3.599.229,22	5.014.985,21
174	28/05/2013	164	Calbi Leonardo - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40		604,26	3.599.833,48	5.014.380,95
175	28/05/2013	164	Scavone Nicola Carmine - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40		53,32	3.599.886,80	5.014.327,63
176	28/05/2013	164	Oddone Benito - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40		53,32	3.599.940,12	5.014.274,31
177	28/05/2013	164	Dolce Antonio - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40		319,90	3.600.260,02	5.013.954,41
178	28/05/2013	164	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ074A/10	BASFV40		279,26	3.600.539,28	5.013.675,15
179	28/05/2013	168	D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.048,30		3.601.587,58	5.012.626,85



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

180	28/05/2013	168	D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.127,94			3.602.715,52	5.011.498,91
181	28/05/2013	168	Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.013,33			3.603.728,85	5.010.485,58
182	28/05/2013	168	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.346,07			3.605.074,92	5.009.139,51
183	28/05/2013	168	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		299,30			3.605.374,22	5.008.840,21
184	28/05/2013	168	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		907,60			3.606.281,82	5.007.932,61
185	28/05/2013	168	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		825,63			3.607.107,45	5.007.106,98
186	28/05/2013	168	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PTSG		704,46			3.607.811,91	5.006.402,52
187	28/05/2013	168	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		593,28			3.608.405,19	5.005.809,24
188	28/05/2013	168	Rolli Michele - dipendente Regione Basilicata	PTSG		176,51			3.608.581,70	5.005.632,73
189	28/05/2013	168	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		492,66			3.609.074,36	5.005.140,07
190	28/05/2013	168	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.120,64			3.610.195,00	5.004.019,43
191	28/05/2013	168	Cancelliere Bruna - dipendente Regione Basilicata	PTSG		303,23			3.610.498,23	5.003.716,20
192	28/05/2013	168	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		4.500,82			3.614.999,05	4.999.215,38
193	28/05/2013	164	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ074A/10	BASFV40			588,90	3.615.587,95	4.998.626,48
194	29/05/2013	171	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	MT022B/10				82.194,43	3.697.782,38	4.916.432,05
195	31/05/2013	172	Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Policoro (MT)	MT081A/10	BASFV05	231.103,95			3.928.886,33	4.685.328,10
196	07/06/2013	184	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				310,00	3.929.196,33	4.685.018,10
197	07/06/2013	184	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				325,50	3.929.521,83	4.684.692,60
198	07/06/2013	184	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				204,60	3.929.726,43	4.684.488,00
199	07/06/2013	184	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				209,25	3.929.935,68	4.684.278,75
200	07/06/2013	184	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				34,10	3.929.969,78	4.684.244,65
201	07/06/2013	184	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				46,50	3.930.016,28	4.684.198,15
202	07/06/2013	184	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				23,25	3.930.039,53	4.684.174,90
203	07/06/2013	184	Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				23,25	3.930.062,78	4.684.151,65
204	07/06/2013	184	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	PZ061B/10				124,00	3.930.186,78	4.684.027,65
205	07/06/2013	184	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100	PZ061B/10				482,05	3.930.668,83	4.683.545,60



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Matera									
206	07/06/2013	185	De Carlo Luigi - Via sotto le mura, 31 - 85046 Ruoti (PZ)	PZ044B/10			43.358,44	3.974.027,27	4.640.187,16
207	07/06/2013	186	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ019B/10			105,81	3.974.133,08	4.640.081,35
208	07/06/2013	187	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ026B/10			160,23	3.974.293,31	4.639.921,12
209	07/06/2013	191	M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT)	MT024B/10			80.223,00	4.054.516,31	4.559.698,12
210	13/06/2013	194	Sicolo Giuseppe - Via de Viti de Marco, 9 - 75100 Matera	MT088A/11	BASFV45		2.540,16	4.057.056,47	4.557.157,96
211	13/06/2001	194	Capodilupo Angelo - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera	MT088A/11	BASFV45		1.861,56	4.058.918,03	4.555.296,40
212	13/06/2013	194	Guerrichio Angela Rosa - C.da Giardinelle - 75100 Matera	MT088A/11	BASFV45		1.440,00	4.060.358,03	4.553.856,40
213	13/06/2013	194	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT088A/11	BASFV45		1.200,00	4.061.558,03	4.552.656,40
214	13/06/2013	196	Geological & Geophysical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza	PZ003B/10			5.104,02	4.066.662,05	4.547.552,38
	26/06/2013		Truncellito Pasquale - Via Papa Giovanni XXIII - Valsinni (MT)	MT046A/10	BASFV30		- 290,00	4.066.372,05	4.547.842,38
	01/07/2013		Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02		- 48,86	4.066.323,19	4.547.891,24
215	26/06/2013	208	Giosa Paola - Via Ponte Nove Luci, 46 - 85100 Potenza	PZ003B/10			837,70	4.067.160,89	4.547.053,54
216	26/06/2013	208	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ003B/10			162,00	4.067.322,89	4.546.891,54
217	26/06/2013	209	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58		453,57	4.067.776,46	4.546.437,97
218	26/06/2013	209	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58		352,50	4.068.128,96	4.546.085,47
219	26/06/2013	209	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58		336,05	4.068.465,01	4.545.749,42
220	26/06/2013	209	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58		376,78	4.068.841,79	4.545.372,64
221	26/06/2013	209	Gerardo Colangelo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ008A/10	BASFV58		141,00	4.068.982,79	4.545.231,64
222	26/06/2013	209	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58		70,50	4.069.053,29	4.545.161,14
223	26/06/2013	209	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58		70,50	4.069.123,79	4.545.090,64
224	26/06/2013	209	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58		35,25	4.069.159,04	4.545.055,39
225	26/06/2013	209	Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58		35,25	4.069.194,29	4.545.020,14
226	26/06/2013	209	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro	PZ008A/10	BASFV58		810,56	4.070.004,85	4.544.209,58



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

			- Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera						
227	26/06/2013	210	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69		430,66	4.070.435,51	4.543.778,92
228	26/06/2013	210	Loperte Guido - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69		585,05	4.071.020,56	4.543.193,87
229	26/06/2013	210	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69		585,05	4.071.605,61	4.542.608,82
230	26/06/2013	210	Gerardo Colangelo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ063A/10	BASFV69		172,07	4.071.777,68	4.542.436,75
231	26/06/2013	210	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69		68,83	4.071.846,51	4.542.367,92
232	26/06/2013	210	Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69		68,83	4.071.915,34	4.542.299,09
233	26/06/2013	210	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69		68,83	4.071.984,17	4.542.230,26
234	26/06/2013	210	Studio Sasanliello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ063A/10	BASFV69		623,89	4.072.608,06	4.541.606,37
235	26/06/2013	211	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	794,76		4.073.402,82	4.540.811,61
236	26/06/2013	211	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	875,93		4.074.278,75	4.539.935,68
237	26/06/2013	211	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	550,58		4.074.829,33	4.539.385,10
238	26/06/2013	211	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	412,94		4.075.242,27	4.538.972,16
239	26/06/2013	211	Gerardo Colangelo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	MT078A/10	BASFV01	250,27		4.075.492,54	4.538.721,89
240	26/06/2013	211	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	125,13		4.075.617,67	4.538.596,76
241	26/06/2013	211	Potenza Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	62,57		4.075.680,24	4.538.534,19
242	26/06/2013	211	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	93,85		4.075.774,09	4.538.440,34
243	26/06/2013	211	Meduri Antonio - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	31,28		4.075.805,37	4.538.409,06
244	26/06/2013	211	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01	62,57		4.075.867,94	4.538.346,49
245	26/06/2013	211	Studio Sasanliello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT078A/10	BASFV01	1.536,89		4.077.404,83	4.536.809,60
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PTSG		915,00		4.078.319,83	4.535.894,60
247	03/07/2013	222	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	PZ077A/10	BASFV25		2.204,26	4.080.524,09	4.533.690,34
248	03/07/2013	223	Moretti Luca - Via Goidoni, 23 - 58100 Grosseto	MT081A/10	BASFV05	6.964,28		4.087.488,37	4.526.726,06
249	03/07/2013	223	Studio Sasanliello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT081A/10	BASFV05	1.316,00		4.088.804,37	4.525.410,06
250	03/07/2013	224	Angeione geom. Domenico - Via Longarone, 35 -	MT004B/10			10.419,16	4.099.223,53	4.514.990,90







COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

85100 Potenza									
272	19/07/2013	259	Sengreen Italia di Bizzarro Franco - Via Dante, 13-3 - 75100 Matera	PTSG		278,50		4.739.863,30	3.874.551,13
273	23/07/2013	269	Vigoriti Giuseppe - Via Nazionale, 153 - 75010 Grottole (MT)	MT079A/10	BASFV16		9.493,85	4.749.157,15	3.865.057,28
274	23/07/2013	269	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT079A/10	BASFV16		1.794,00	4.750.951,15	3.863.263,28
275	23/07/2013	270	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	MT079A/10	BASFV16		11.688,60	4.762.639,75	3.851.574,68
276	24/07/2013	271	Gaia Emprise S.r.l. - Area industriale - 85059 Viggiano (PZ)	PZ018B/10			4.650,01	4.767.289,76	3.846.924,67
277	24/07/2013	272	Geological & Geophysical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucalotto, 32/C - 85100 Potenza	PZ098A/11	BASFV51		5.106,45	4.772.396,21	3.841.818,22
278	24/07/2013	273	Studio Tecnico Manollo A.T.P. - Via Eraclea, 16 - 75020 Nova Siri Scalo	MT038B/10			847,60	4.773.243,81	3.840.970,62
279	24/07/2013	273	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT038B/10			160,16	4.773.403,97	3.840.810,46
280	24/07/2013	274	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 - 75100 Matera	PTSG		1.160,80		4.774.564,77	3.839.649,66
281	24/07/2013	275	Validaprogetti - Via T. Stigliani, 72 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15	3.919,92		4.778.484,69	3.835.729,74
282	24/07/2013	276	Smeda S.r.l. - Zona P.I. - Lotto n. 2 - 75028 Tursi (MT)	MT014B/10			58.109,28	4.836.593,97	3.777.620,46
283	24/07/2013	278	Festa Rocco Studio Tecnico - Via Dante, 105 - 75100 Matera	MT046A/10	BASFV30			5.348,20	4.841.942,17
284	24/07/2013	278	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT046A/10	BASFV30			850,00	4.842.792,17
285	24/07/2013	280	Edil Geo S.a.s. di Grieco Claudio & C Via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ018B/10			94.275,94	4.937.068,11	3.677.146,32
286	24/07/2013	281	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	MT028B/10			13.552,00	4.950.620,11	3.663.594,32
287	25/07/2013	277	Sileo Rocco - Via Adriatico, 10 - 85100 Potenza	PZ086A/11	BASFV75			17.571,15	4.968.191,26
288	25/07/2013	277	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ086A/11	BASFV75			3.320,32	4.971.511,58
289	31/07/2013	287	Derario S.r.l. - Via Raffaello, 2/A - 75012 Bernalda	MT085A/10	BASFV15			21.296,00	4.992.807,58
290	31/07/2013	288	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	MT093A/11	BASFV47			14.758,66	5.007.566,24
291	31/07/2013	289	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	MT087A/11	BASFV44			2.064,74	5.009.630,98



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

292	31/07/2013	293	Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto, 56 - 75018 Stigliano (MT)	MT072B/10			1.321,10		5.010.952,08	3.603.262,35
293	31/07/2013	293	Comune di Stigliano - Via Zanardelli, 33 - 75018 Stigliano (MT)	MT072B/10			3.705,40		5.014.657,48	3.599.556,95
294	31/07/2013	293	Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata	MT072B/10			116,40		5.014.773,88	3.599.440,55
295	31/07/2013	293	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT072B/10			217,28		5.014.991,16	3.599.223,27
296	31/07/2013	293	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT072B/10			131,92		5.015.123,08	3.599.091,35
297	31/07/2013	294	Kartos di Giacommo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ035A/10	BASFV62			188,72	5.015.311,80	3.598.902,63
298	31/07/2013	295	Kartos di Giacommo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ019B/10			526,88		5.015.838,68	3.598.375,75
299	31/07/2013	298	Nolè Angelo - C.da Giuliano, 52 - 85100 Potenza	PZ059A/10	BASFV68			2.063,88	5.017.902,56	3.596.311,87
300	31/07/2013	298	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ059A/10	BASFV68			390,00	5.018.292,56	3.595.921,87
301	05/08/2013	299	Fumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	PZ066A/10	BASFV39			23.082,40	5.041.374,96	3.572.839,47
302	05/08/2013	300	Colasuonno Antonio - Via E. Mattei, 25 - 75022 Irsina (MT)	MT030A/10	BASFV13			1.693,36	5.043.068,32	3.571.146,11
303	05/08/2013	300	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT030A/10	BASFV13			319,98	5.043.388,30	3.570.826,13
304	05/08/2013	301	Caldone Donato - Viale Kennedy, 19 - 75016 Pomarico	MT030A/10	BASFV13			1.566,43	5.044.954,73	3.569.259,70
305	05/08/2013	301	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT030A/10	BASFV13			296,00	5.045.250,73	3.568.963,70
306	05/08/2013	302	Fumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	MT030A/10	BASFV13			8.844,25	5.054.094,98	3.560.119,45
307	05/08/2013	306	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	PZ077A/10	BASFV25			5.568,11	5.059.663,09	3.554.551,34
308	05/08/2013	306	Caivello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25			155,29	5.059.818,38	3.554.396,05
309	05/08/2013	306	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25			286,12	5.060.104,50	3.554.109,93
310	05/08/2013	306	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25			221,38	5.060.325,88	3.553.888,55
311	05/08/2013	306	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25			139,87	5.060.465,75	3.553.748,68
312	05/08/2013	306	Gerardo Colangelo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ077A/10	BASFV25			57,18	5.060.522,93	3.553.691,50
313	05/08/2013	306	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25			17,74	5.060.540,67	3.553.673,76
316	05/08/2013	306	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25			17,74	5.060.558,41	3.553.656,02
317	05/08/2013	306	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100	PZ077A/10	BASFV25			669,99	5.061.228,40	3.552.986,03



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Matera										
318	05/08/2013	307	Edil Strade S.n.c. dei F.lli Donnoli - Zona P.I.P. - 85010 Guardia Perticara (PZ)	MT064A/10	BASFV37			189.976,05	5.251.204,45	3.363.009,98
319	05/08/2013	308	Leone Vincenzo - Via Alcide De Gasperi s.n.c. - 75010 Gorgoglione (MT)	MT064A/10	BASFV37			11.392,97	5.262.597,42	3.351.617,01
320	05/08/2013	308	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT064A/10	BASFV37			2.152,87	5.264.750,29	3.349.464,14
321	05/08/2013	309	Martino Giovanni - Via San Giovanni Bosco - 75020 Marconia di Pisticci (MT)	MT064A/10	BASFV37			12.442,98	5.277.193,27	3.337.021,16
322	05/08/2013	309	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT064A/10	BASFV37			2.351,28	5.279.544,55	3.334.669,88
323	05/08/2013	310	Comune di Missanello (PZ)	PTSG		2.467,13			5.282.011,68	3.332.202,75
324	27/08/2013	328	La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'Oro 85051 Bella (PZ)	PZ008A/10	BASFV58			130.742,92	5.412.754,60	3.201.459,83
325	27/08/2013	329	D'Amato Giuseppe - Via Siris, 14 - 75025 Policoro (MT)	PZ076C/10	BASFV14			52.941,37	5.465.695,97	3.148.518,46
							79.412,06		5.545.108,03	3.069.106,40
326	27/08/2013	330	Agrelli Antonio - C.da Caporotondo, 19 - 85049 Trecchina (PZ)	PZ076C/10	BASFV14			2.000,00	5.547.108,03	3.067.106,40
							3.000,00		5.550.108,03	3.064.106,40
327	03/09/2013	332	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ034B/10			929,27		5.551.037,30	3.063.177,13
328	03/09/2013	333	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ018B/10			72,96		5.551.110,26	3.063.104,17
329	03/09/2013	341	Angelo Rinaidi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ095A/11	BASFV22			5.046,41	5.556.156,67	3.058.057,76
330	03/09/2013	341	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ095A/11	BASFV22			953,59	5.557.110,26	3.057.104,17
331	03/09/2013	342	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ076C/10	BASFV14			125,83	5.557.236,09	3.056.978,34
							188,75		5.557.424,84	3.056.789,59
332	03/09/2013	344	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	PTSG		1.030,08			5.558.454,92	3.055.759,51
333	11/09/2013	354	Martorano Mario Pasquale - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata	PTSG		61,50			5.558.516,42	3.055.698,01
334	11/09/2013	354	Pace Domenico - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata	PTSG		258,38			5.558.774,80	3.055.439,63
335	11/09/2013	354	Morese Maria Chiara - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata	PTSG		110,74			5.558.885,54	3.055.328,89
336	11/09/2013	354	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		107,66			5.558.993,20	3.055.221,23



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

337	11/09/2013	357	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ059A/10	BASFV68			672,71	5.559.665,91	3.054.548,52
338	11/09/2013	358	Comune di Matera - Via Aldo Moro - 75100 Matera	MT036A/10	BASFV04	2.046,20			5.561.712,11	3.052.502,32
339	11/09/2013	358	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	MT036A/10	BASFV04	431,51			5.562.143,62	3.052.070,81
340	11/09/2013	360	Santarsiero Giovanni - C.da Macchia Marcone, 1/B - 85100 Potenza	PZ051A/10	BASFV32			12.700,80	5.574.844,42	3.039.370,01
341	11/09/2013	360	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ051A/10	BASFV32			2.400,00	5.577.244,42	3.036.970,01
342	11/09/2013	361	Gesuai di Elio Walter - Via Po, 17 - 85043 Latronico (PZ)	PZ006A/10	BASFV57			2.287,73	5.579.532,15	3.034.682,28
343	11/09/2013	361	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ006A/10	BASFV57			432,30	5.579.964,45	3.034.249,98
344	11/09/2013	362	Perrone Luisa - Corso Trieste, 76 - 85050 Satriano di Lucania (PZ)	PZ071B/10			1.874,58		5.581.839,03	3.032.375,40
345	11/09/2013	363	Ruscigno Michele - Via A. Pecci, 14/B - 75100 Matera	MT093A/11	BASFV47			5.476,09	5.587.315,12	3.026.899,31
346	11/09/2013	363	Cristallo Filippo Maurizio - P.zza Cesare Firrao, 26 - 75100 Matera	MT093A/11	BASFV47			3.080,88	5.590.396,00	3.023.818,43
347	11/09/2013	363	Paradiso Tiziana - Via Dante, 9/BIS/A - 75100 Matera	MT093A/11	BASFV47			3.098,16	5.593.494,16	3.020.720,27
348	11/09/2013	363	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT093A/11	BASFV47			1.630,59	5.595.124,75	3.019.089,68
349	11/09/2013	364	Telesca Francesco Rosario - Via V. Verrastro, 29 - 85100 Potenza	PZ080A/10	BASFV73			3.806,43	5.598.931,18	3.015.283,25
350	11/09/2013	364	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ080A/10	BASFV73			719,28	5.599.650,46	3.014.563,97
351	11/09/2013	366	Ciaglia Costruzioni S.r.l. - Via Zanardelli, 7 - 85021 Frazione di San Cataldo di Bella	PZ063A/10	BASFV69			66.750,86	5.666.401,32	2.947.813,11
352	16/09/2013	368	Valbasento Lavori S.r.l. - C.da Parata, 1 - 75010 Calciano (MT)	PZ042B/10			501,97		5.666.903,29	2.947.311,14
353	16/09/2013	368	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10			262,81		5.667.166,10	2.947.048,33
354	16/09/2013	368	Loperte Guido - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10			779,18		5.667.945,28	2.946.269,15
355	16/09/2013	368	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10			759,71		5.668.704,99	2.945.509,44
356	16/09/2013	368	Gerardo Colangelo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ042B/10			97,40		5.668.802,39	2.945.412,04
357	16/09/2013	368	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10			38,96		5.668.841,35	2.945.373,08
358	16/09/2013	368	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10			47,83		5.668.889,18	2.945.325,25
359	16/09/2013	368	Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10			47,83		5.668.937,01	2.945.277,42



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

360	16/09/2013	368	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ042B/10			759,61		5.669.696,62	2.944.517,81
361	17/09/2013	376	Gaudioso Lavori S.r.l. - C.da Torre snc - 85043 Latronico (PZ)	PZ039A/10	BASFV61			158.643,10	5.828.339,72	2.785.874,71
362	17/09/2013	378	Pellegrini Giuseppe - Via Il Torchiano, 19 - 75010 Miglionico (MT)	MT088A/11	BASFV45			874,71	5.829.214,43	2.785.000,00
363	17/09/2013	378	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT088A/11	BASFV45			165,29	5.829.379,72	2.784.834,71
	30/09/2013		Regione Basilicata - Acconto CIPE						5.829.379,72	3.784.834,71
364	19/09/2013	382	Rizzoni S.r.l. - Via Pretoria, 197 - 85100 Potenza	PZ055A/10	BASFV34			33.782,57	5.863.162,29	3.751.052,14
365	24/09/2013	385	Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ)	PZ061B/10			67.985,06		5.931.147,35	3.683.067,08
366	24/09/2013	386	Leone Mario Rosario - Via A. De Gasperi, 6 - Sant'Arcangelo (PZ)	PZ062A/10	BASFV36			153.147,28	6.084.294,63	3.529.919,80
367	24/09/2013	387	De Carlo Luigi - Via sotto le mura, 31 - 85046 Ruoti (PZ)	PZ044B/10			37.593,07		6.121.887,70	3.492.326,73
368	27/09/2013	389	Panio Luigi - P.zza Municipio, 3 - 75027 San Giorgio Lucano (MT)	MT0100A/11	BASFV53			3.175,20	6.125.062,90	3.489.151,53
369	27/09/2013	389	Santamaria Pietro - Viale Sant'Anna, 35 - 75028 Tursi (MT)	MT0100A/11	BASFV53			3.175,20	6.128.238,10	3.485.976,33
370	27/09/2013	389	Fucci Pietro Francesco - Corso Garibaldi, 294 - 85038 Senise (PZ)	MT0100A/11	BASFV53			3.175,20	6.131.413,30	3.482.801,13
371	27/09/2013	389	Disummo Leonardo - Corso Umberto 83 - 75012 Bernalda (MT)	MT0100A/11	BASFV53			3.102,60	6.134.515,90	3.479.698,53
372	27/09/2013	389	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT0100A/11	BASFV53			2.400,00	6.136.915,90	3.477.298,53
373	27/09/2013	390	Vecchione S.r.l. - Via Siris, 36 - 85033 Episcopia (PZ)	PZ031C/10	BASFV17			61.657,28	6.198.573,18	3.415.641,25
							119.687,65		6.318.260,83	3.295.953,60
374	03/10/2013	391	Martone Carmen - Via Vespuci, 9 - 85100 Potenza	PZ050A/10	BASFV31			3.120,00	6.321.380,83	3.292.833,60
375	03/10/2013	391	Cassese Umberto - Via Appia - 85050 Baragiano (PZ)	PZ050A/10	BASFV31			1.572,88	6.322.953,71	3.291.260,72
376	03/10/2013	391	Lotito Gaetano - Via Appia, 137 - 85100 Potenza	PZ050A/10	BASFV31			2.085,50	6.325.039,21	3.289.175,22
377	03/10/2013	391	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ050A/10	BASFV31			640,00	6.325.679,21	3.288.535,22
378	03/10/2013	395	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ005B/10			228,58		6.325.907,79	3.288.306,64
379	03/10/2013	396	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ062A/10	BASFV36			537,02	6.326.444,81	3.287.769,62
380	03/10/2013	397	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ058A/10	BASFV67			316,68	6.326.761,49	3.287.452,94
381	03/10/2013	398	Creged di Massimo Mitidieri - via Duca d'Aosta, 16 - 85043 Latronico (PZ)	PZ031C/10	BASFV17			62,86	6.326.824,35	3.287.390,08
							122,03		6.326.946,38	3.287.268,05



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

382	03/10/2013	399	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ020A/10	BASFV27			444,80	6.327.391,18	3.286.823,25
383	03/10/2013	400	Computer Assistance s.a.s. - Via delle Mattine, 134 - 85100 Potenza	PTSG		229,90			6.327.621,08	3.286.593,35
384	03/10/2013	402	Cappeton S.r.l. - C.da Terzo Monsignore - 75022 Irsina (MT)	MT030A/10	BASFV13			88.991,99	6.416.613,07	3.197.601,36
						16.762,01			6.433.375,08	3.180.839,35
385	03/10/2013	403	Scarano Donato - Via Anzio, 14 - 85100 Potenza	PZ0102A/1 1	BASFV23			3.810,24	6.437.185,32	3.177.029,11
386	03/10/2013	403	Ungaro Andrea - C.da Caira, 12/C - 85100 Potenza	PZ0102A/1 1	BASFV23			2.340,00	6.439.525,32	3.174.689,11
387	03/10/2013	403	Colucci Alessandra - Via della Tecnica, 24 - 85100 Potenza	PZ0102A/1 1	BASFV23			2.627,73	6.442.153,05	3.172.061,38
388	03/10/2013	403	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ0102A/1 1	BASFV23			1.350,00	6.443.503,05	3.170.711,38
389	03/10/2013	404	Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Pollicoro (MT)	MT081A/10		370.238,22			6.813.741,27	2.800.473,16
390	03/10/2013	405	Costruzioni Carlomagno Francesco S.r.l. - Via C. Alberto, 165/B - 85044 Lauria (PZ)	PZ033A/10	BASFV29			316.432,00	7.130.173,27	2.484.041,16
392	08/10/2013	407	Delvecchio Antonio - Via Cavour, 24 - 85030 Terranova di Pollino (PZ)	PZ021B/10			3.261,04		7.133.434,31	2.480.780,12
393	08/10/2013	407	Delvecchio Giuseppe - Via Cavour, 24 - 85030 Terranova di Pollino (PZ)	PZ021B/10			529,20		7.133.963,51	2.480.250,92
394	08/10/2013	407	Studio Tecnico Manolio A.T.P. - Via Eraclea, 16 - 75020 Nova Siri Scalo	PZ021B/10			1.058,40		7.135.021,91	2.479.192,52
395	08/10/2013	407	Di Girolamo Giuseppe - Via Dante, 211 - 85030 Terranova di Pollino (PZ)	PZ021B/10			1.034,20		7.136.056,11	2.478.158,32
396	08/10/2013	407	Panzardi Pietro - C.so Vittorio Emanuele, 118 - 85038 Senise (PZ)	PZ021B/10			258,55		7.136.314,66	2.477.899,77
397	08/10/2013	407	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ021B/10			1.166,22		7.137.480,88	2.476.733,55
398	08/10/2013	413	Bruscella Antonio - Via Caserma Lucana, 48 - 85100 Potenza	PZ008A/10	BASFV58			1.999,80	7.139.480,68	2.474.733,75
399	08/10/2013	414	Co.Ge.Ci.S. S.r.l. - C.da Serra - 75100 Matera	MT036A/10		139.150,00			7.278.630,68	2.335.583,75
400	08/10/2013	415	D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		995,88			7.279.626,56	2.334.587,87
401	08/10/2013	413	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ008A/10	BASFV58			396,00	7.280.022,56	2.334.191,87
402	08/10/2013	415	D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.474,08			7.281.496,64	2.332.717,79
403	08/10/2013	415	Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.013,33			7.282.509,97	2.331.704,46
404	08/10/2013	415	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.050,23			7.283.560,20	2.330.654,23



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

405	08/10/2013	415	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		760,86			7.284.321,06	2.329.893,37
406	08/10/2013	415	Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		709,85			7.285.030,91	2.329.183,52
407	08/10/2013	415	Petruzzi Enzo Paolo - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		529,54			7.285.560,45	2.328.653,98
408	08/10/2013	415	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		951,35			7.286.511,80	2.327.702,63
409	08/10/2013	415	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.223,64			7.287.735,44	2.326.478,99
410	08/10/2013	415	Olifa Antonio - dipendente Regione Basilicata	PTSG		768,69			7.288.504,13	2.325.710,30
411	08/10/2013	415	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		453,77			7.288.957,90	2.325.256,53
412	08/10/2013	415	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	PTSG		896,51			7.289.854,41	2.324.360,02
413	08/10/2013	415	Cancelliere Bruna - dipendente Regione Basilicata	PTSG		303,23			7.290.157,64	2.324.056,79
414	08/10/2013	415	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		6.291,77			7.296.449,41	2.317.765,02
391	08/10/2013	408	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ0103A/1 1	BASFV55			84,48	7.296.533,89	2.317.680,54
415	21/10/2013	418	Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera	MT046A/10	BASFV30			312,32	7.296.846,21	2.317.368,22
416	21/10/2013	421	Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato interregionale OO.PP. Puglia e Basilic.	PTSG		644,65			7.297.490,86	2.316.723,57
417	21/10/2013	423	Angelone geom. Domenico - Via Longarone, 35 - 75025 Policoro (MT)	MT004B/10				8.455,80	7.305.946,66	2.308.267,77
418	21/10/2013	423	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT004B/10				1.658,00	7.307.604,66	2.306.609,77
419	21/10/2013	424	Geotec S.r.l. - Via Collodi, 5/B - 75100 Matera	PZ066A/10	BASFV39			15.250,00	7.322.854,66	2.291.359,77
420	21/10/2013	425	Marchetta Filomena - Via Roma, 100 - 75014 Grassano (MT)	MT087A/11	BASFV44			6.873,39	7.329.728,05	2.284.486,38
421	21/10/2013	425	Falotico Nicola - Via Capolegrotte, 71 - 75014 Grassano (MT)	MT087A/11	BASFV44			2.314,35	7.332.042,40	2.282.172,03
422	21/10/2013	425	Caiciano Maddalena Maria - Rione Gramsci palazzina 1B, 4 - 75014 Grassano (MT)	MT087A/11	BASFV44			1.870,95	7.333.913,35	2.280.301,08
423	21/10/2013	427	Eredi Pepe Salvatore S.n.c. - Via Leonardo da Vinci, 40 - 85040 Sarconi (PZ)	PZ069A/10	BASFV71			111.143,34	7.445.056,69	2.169.157,74
424	29/10/2013	432	Maggi Ing. Armando - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ)	PZ023A/10	BASFV29			2.690,45	7.447.747,14	2.166.467,29
425	29/10/2013	432	Maggi geol. Tommaso - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ)	PZ023A/10	BASFV29			1.314,47	7.449.061,61	2.165.152,82
426	29/10/2013	432	Notarfrancesco Ing. Antonello - Via Pionello, 45 - 85050 Paterno (PZ)	PZ023A/10	BASFV29			1.321,84	7.450.383,45	2.163.830,98



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

427	29/10/2013	432	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ023A/10	BASFV29		762,60	7.451.146,05	2.163.068,38
428	29/10/2013	437	PA.E.CO. S.r.l. - C.da Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT)	MT078A/10	BASFV16		33.846,04	7.484.992,09	2.129.222,34
429	29/10/2013	438	M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT)	MT024B/10			30.055,39	7.515.047,48	2.099.166,95
430	29/10/2013	440	Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ)	PZ023A/10	BASFV29		74.031,38	7.589.078,86	2.025.135,57
431	29/10/2013	441	Impresa Forastire Romeo Costruzioni - Via Kennedy, 4 - 85043 Latronico (PZ)	PZ017B/10			34.316,16	7.623.395,02	1.990.819,41
432	29/10/2013	442	Co.E.ST. Costruzioni Strade S.r.l.	PZ0103A/1 1	BASFV55		135.104,02	7.758.499,04	1.855.715,39
433	29/10/2013	446	Comune di Tursi (MT)	MT081A/10	BASFV05	7.000,77		7.765.499,81	1.848.714,62
434	29/10/2013	446	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	MT081A/10	BASFV05	382,25		7.765.882,06	1.848.332,37
435	29/10/2013	446	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT081A/10	BASFV05	127,42		7.766.009,48	1.848.204,95
436	29/10/2013	448	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ063A/10	BASFV69		113,58	7.766.123,06	1.848.091,37
437	29/10/2013	450	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	PZ026B/10			83.173,50	7.849.296,56	1.764.917,87
438	29/10/2013	450	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ016B/10			53,89	7.849.350,45	1.764.863,98
439	31/10/2013	454	L.D.A. S.r.l. - Via Culture, 26 - 85020 Atella (PZ)	PZ005B/10			101.079,64	7.950.430,09	1.663.784,34
440	31/10/2013	455	AM Costruzioni S.r.l.	PZ070B/10			74.804,30	8.025.234,39	1.588.980,04
441	31/10/2013	456	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ018B/10			101,28	8.025.335,67	1.588.878,76
442	31/10/2013	459	Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ)	PZ023A/10	BASFV29		72.350,71	8.097.686,38	1.516.528,05
443	13/11/2013	464	Edil Geo S.a.s. di Grieco Claudio & C Via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ018B/10			71.637,04	8.169.323,42	1.444.891,01
444	13/11/2013	468	Acquatecno S.r.l.	MT085A/10	BASFV15		124.059,81	8.293.383,23	1.320.831,20
445	13/11/2013	470	Pace Domenico - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata	MT087A/11		303,14		8.293.686,37	1.320.528,06
446	13/11/2013	470	Morese Maria Chiara - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata	MT087A/11		221,47		8.293.907,84	1.320.306,59
447	13/11/2013	470	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT087A/11		167,49		8.294.075,33	1.320.139,10
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma			2.775,00		8.296.850,33	1.317.364,10
449	13/11/2013	474	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15		1.463,37	8.298.313,70	1.315.900,73





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

450	13/11/2013	474	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15			1.759,04	8.300.072,74	1.314.141,69
451	13/11/2013	474	Chiarella Francesco - Dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15			109,76	8.300.182,50	1.314.031,93
452	13/11/2013	474	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15			123,77	8.300.306,27	1.313.908,16
453	13/11/2013	474	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15			329,26	8.300.635,53	1.313.578,90
454	13/11/2013	474	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15			173,20	8.300.808,73	1.313.405,70
455	13/11/2013	474	Antonucci Francesca	MT085A/10	BASFV15			336,78	8.301.145,51	1.313.068,92
456	13/11/2013	474	Palma Achille	MT085A/10	BASFV15			294,68	8.301.440,19	1.312.774,24
457	13/11/2013	474	Trabace Terasa	MT085A/10	BASFV15			261,00	8.301.701,19	1.312.513,24
458	13/11/2013	474	Casamassima Michela	MT085A/10	BASFV15			120,28	8.301.821,47	1.312.392,96
459	13/11/2013	474	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15			1.845,77	8.303.667,24	1.310.547,19
460	13/11/2013	474	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	MT085A/10	BASFV15			431,51	8.304.098,75	1.310.115,68
461	13/11/2013	476	Prete Antonio	MT0105A/1 1	BASFV11	3.806,00			8.307.904,75	1.306.309,68
462	13/11/2013	477	Liscio Pompeo e Lattuchella Giuseppina	PZ052A/10	BASFV33			14.846,90	8.322.751,65	1.291.462,78
463	15/11/2013	478	La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'Oro 85051 Bella (PZ)	PZ008A/10	BASFV58			148.736,30	8.471.487,95	1.142.726,48
464	15/11/2013	479	Ditta Liantonio Adriano di Liantonio Sebastiano	PTSG		142,31			8.471.630,26	1.142.584,17
465	15/11/2013	480	Adone Giorgio	MT027B/10			1.523,04		8.473.153,30	1.141.061,13
466	15/11/2013	480	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT027B/10			285,00		8.473.438,30	1.140.776,13
467	15/11/2013	488	LA.I.M.T. S.r.l.	PZ0102A/1 1	BASFV23			140.554,00	8.613.992,30	1.000.222,13
	27/11/2013		Regione Basilicata - Acconto CIPE						8.613.992,30	1.400.222,13
	29/11/2013		Regione Basilicata - Acconto PO-FESR						8.613.992,30	2.438.436,60
468	25/11/2013	493	SIN.TE.S.I. S.c.a.r.l	PZ049A/10	BASFV21			56.956,91	8.670.949,21	2.381.479,69
469	25/11/2013	493	Rago Antonio	PZ049A/10	BASFV21			2.116,80	8.673.066,01	2.379.362,89
470	25/11/2013	493	Società Cooperativa sociale Linea Digitale	PZ049A/10	BASFV21			406,17	8.673.472,18	2.378.956,72
471	25/11/2013	493	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PZ049A/10	BASFV21			43,15	8.673.515,33	2.378.913,57
472	25/11/2013	493	Comune di Palazzo San Gervasio	PZ049A/10	BASFV21			1.096,00	8.674.611,33	2.377.817,57
473	25/11/2013	493	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ049A/10	BASFV21			459,60	8.675.070,93	2.377.357,97
474	25/11/2013	500	D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata	PTSG		589,63			8.675.660,56	2.376.768,34



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

475	25/11/2013	500	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PTSG		630,14		8.676.290,70	2.376.138,20	
476	25/11/2013	500	Petruzzi Enzo Paolo - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		235,35		8.676.528,05	2.375.902,85	
477	25/11/2013	500	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PTSG		483,99		8.677.010,04	2.375.418,86	
478	25/11/2013	500	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		518,08		8.677.528,12	2.374.900,78	
479	25/11/2013	500	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		543,84		8.678.071,96	2.374.356,94	
480	25/11/2013	500	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.033,47		8.679.105,43	2.373.323,47	
481	25/11/2013	500	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		807,97		8.679.913,40	2.372.515,50	
482	25/11/2013	500	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		3.319,24		8.683.232,64	2.369.196,26	
483	27/11/2013	503	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10			226,44	8.683.459,08	2.368.969,82	
484	27/11/2013	503	Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10			433,03	8.683.892,11	2.368.536,79	
485	27/11/2013	503	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10			282,27	8.684.174,38	2.368.254,52	
486	27/11/2013	503	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10			48,11	8.684.222,49	2.368.206,41	
487	27/11/2013	503	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10			48,11	8.684.270,60	2.368.158,30	
488	27/11/2013	503	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10			48,11	8.684.318,71	2.368.110,19	
489	27/11/2013	503	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	PZ018B/10			160,38	8.684.479,09	2.367.949,81	
490	27/11/2013	503	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ018B/10			574,36	8.685.053,45	2.367.375,45	
491	27/11/2013	504	Colucci Alessandra - Via della Tecnica, 24 - 85100 Potenza	PZ0102A/1 1	BASFV23			630,00	8.685.683,45	2.366.745,45
492	27/11/2013	506	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	PZ026B/10			14.581,95	8.700.265,40	2.352.163,50	
493	27/11/2013	507	Schillizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ)	MT053A/10		62.960,18		8.763.225,58	2.289.203,32	
494	27/11/2013	507	Cirella Domenico	MT053A/10		493,32		8.763.718,90	2.288.710,00	
495	27/11/2013	507	Cirella Onofrio	MT053A/10		493,32		8.764.212,22	2.288.216,68	
496	27/11/2013	507	Dicanio Donato Giulio	MT053A/10		493,32		8.764.705,54	2.287.723,36	
497	27/11/2013	507	ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Ente Economico di diritto pubblico	MT053A/10		362,70		8.765.068,24	2.287.360,66	
498	27/11/2013	507	Comune di Pomarico	MT053A/10		241,80		8.765.310,04	2.287.118,86	
499	27/11/2013	507	Comune di Pomarico	MT053A/10		68,68		8.765.378,72	2.287.050,18	
500	27/11/2013	507	Comune di Pomarico	MT053A/10		1.401,50		8.766.780,22	2.285.648,68	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

501	27/11/2013	507	Figliolo Giuseppe	MT053A/10		404,53		8.767.184,75	2.285.244,15	
502	27/11/2013	507	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	MT053A/10		43,15		8.767.227,90	2.285.201,00	
503	27/11/2013	507	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT053A/10		87,92		8.767.315,82	2.285.113,08	
504	27/11/2013	508	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ018B/10			72,10	8.767.387,92	2.285.040,98	
505	27/11/2013	509	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ017B/10			66,76	8.767.454,68	2.284.974,22	
506	27/11/2013	510	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ026B/10			141,13	8.767.595,81	2.284.833,09	
507	27/11/2013	505	Falotico Nicola - Via Capolegrotte, 71 - 75014 Grassano (MT)	MT087A/11	BASFV44			881,33	8.768.477,14	2.283.951,76
508	28/11/2013	511	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ025A/10	BASFV18			768,14	8.769.245,28	2.283.183,62
509	28/11/2013	512	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58			350,72	8.769.596,00	2.282.832,90
510	28/11/2013	512	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58			564,30	8.770.160,30	2.282.268,60
511	28/11/2013	512	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58			746,35	8.770.906,65	2.281.522,25
512	28/11/2013	512	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58			305,25	8.771.211,90	2.281.217,00
513	28/11/2013	512	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58			35,25	8.771.247,15	2.281.181,75
514	28/11/2013	512	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ008A/10	BASFV58			1.567,66	8.772.814,81	2.279.614,09
515	28/11/2013	513	Impresa Fiore Angelo	MT099A/11	BASFV52			82.572,93	8.855.387,74	2.197.041,16
516	28/11/2013	514	Vazza Antonio	PZ0101A/1 1	BASFV54			6.626,56	8.862.014,30	2.190.414,60
517	28/11/2013	514	Tortora Alfonso	PZ0101A/1 1	BASFV54			1.879,92	8.863.894,22	2.188.534,68
518	28/11/2013	514	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ0101A/1 1	BASFV54			1.600,00	8.865.494,22	2.186.934,68
519	29/11/2013	522	Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ)	PZ023A/10	BASFV60			76.583,34	8.942.077,56	2.110.351,34
520	03/12/2013	526	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ076C/10	BASFV14			90,01	8.942.167,57	2.110.261,33
521	03/12/2013	527	Capbeton S.r.l. - C.da Terzo Monsignore - 75022 Irsina (MT)	MT030A/10		55.510,00		8.997.812,59	2.054.616,31	
522	03/12/2013	529	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	PZ056B/10			4.496,09	9.002.308,68	2.050.120,22	
523	03/12/2013	530	Giuloco Prospezioni S.a.s. del Dott. Geol. Giuseppe Locorotolo - Via Dante, 65 - 75100 Matera	MT0100A/1 1	BASFV53			6.292,00	9.008.600,68	2.043.828,22
524	03/12/2013	531	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10			136,50	9.008.737,18	2.043.691,72	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

525	03/12/2013	531	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10			289,51	9.009.026,69	2.043.402,21	
526	03/12/2013	531	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10			347,73	9.009.374,42	2.043.054,48	
527	03/12/2013	531	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10			160,11	9.009.534,53	2.042.894,37	
528	03/12/2013	531	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ061B/10			629,40	9.010.163,93	2.042.264,97	
529	05/12/2013	532	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		1.670,29		9.011.834,22	2.040.594,68	
530	05/12/2013	533	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68			157,63	9.011.991,85	2.040.437,05
531	05/12/2013	533	Rivello Rocco - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68			709,33	9.012.701,18	2.039.727,72
532	05/12/2013	533	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68			462,37	9.013.163,55	2.039.265,35
533	05/12/2013	533	Vaccaro Franco - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68			197,03	9.013.360,58	2.039.068,32
534	05/12/2013	533	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68			78,82	9.013.439,40	2.038.989,50
535	05/12/2013	533	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68			57,80	9.013.497,20	2.038.931,70
536	05/12/2013	533	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68			78,82	9.013.576,02	2.038.852,88
537	05/12/2013	533	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ059A/10	BASFV68			885,35	9.014.461,37	2.037.967,53
538	05/12/2013	535	Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Pollicoro (MT)	MT081A/10		3.047,51		9.017.508,88	2.034.920,02	
539	05/12/2013	535	Comune di Tursi (MT)	MT081A/10		225,00		9.017.733,88	2.034.695,02	
540	05/12/2013	539	So.Lav.Ed. S.n.c.	MT0104A/1 1		124.041,58		9.141.775,46	1.910.653,44	
541	11/12/2013	540	Kartos di Giacomo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ006A/10	BASFV57			721,61	9.142.497,07	1.909.931,83
542	11/12/2013	541	Arcasensa Agostino S.a.s. da Avigliano	PZ071B/10			61.598,36	9.204.095,43	1.848.333,47	
543	11/12/2013	543	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziata, 64 - 75100 Matera	PTSG		3.432,15		9.207.527,58	1.844.901,32	
544	11/12/2013	544	Comune di Missanello (PZ)	PTSG		1.130,77		9.208.658,35	1.843.770,55	
545	11/12/2013	547	SAPE S.r.l.	PZ056B/10			73.453,76	9.282.112,11	1.770.316,79	
546	11/12/2013	554	Ditta Lucia Arcieri	PZ050A/10	BASFV31			720,00	9.282.832,11	1.769.596,79
547	11/12/2013	555	Oddone Attilio	PZ009A/10	BASFV59			3.740,80	9.286.572,91	1.765.855,99
548	11/12/2013	555	Pignataro Carmine	PZ009A/10	BASFV59			2.600,00	9.289.172,91	1.763.255,99
549	11/12/2013	555	Pace Andrea	PZ009A/10	BASFV59			3.133,20	9.292.306,11	1.760.122,79
550	11/12/2013	555	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ009A/10	BASFV59			1.300,00	9.293.606,11	1.758.822,79



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

551	11/12/2013	556	Maggi Armando	PZ023A/10	BASFV60			2.389,21	9.295.995,32	1.756.433,58
552	11/12/2013	556	Maggi Tommaso	PZ023A/10	BASFV60			1.271,79	9.297.267,11	1.755.161,79
553	11/12/2013	556	Notarfrancesco Antonello	PZ023A/10	BASFV60			1.316,00	9.298.583,11	1.753.845,79
554	11/12/2013	556	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ023A/10	BASFV60			683,02	9.299.266,13	1.753.162,77
555	11/12/2013	557	Claglia Costruzioni S.r.l.	PZ063A/10	BASFV69			12.391,25	9.311.657,38	1.740.771,52
556	13/12/2013	563	La Cartoplastica di Antonio Maragno	PTSG		570,00			9.312.227,38	1.740.201,52
557	13/12/2013	564	AM Costruzioni S.r.l.	PZ058A/10	BASFV67			66.803,54	9.379.030,92	1.673.397,98
558	13/12/2013	558	Impresa Mauro Mario Savino	PZ034B/10			118.239,96		9.497.270,88	1.555.158,02
559	13/12/2013	567	La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo	PZ050A/10	BASFV31			158.624,45	9.655.895,33	1.396.533,57
560	13/12/2013	568	Edilia Costruzioni S.r.l.	PZ068A/10	BASFV70			120.630,10	9.776.525,43	1.275.903,47
561	13/12/2013	568	Comune di Sant'Arcangelo	PZ068A/10	BASFV70			1.952,56	9.778.477,99	1.273.950,91
562	16/12/2013	571	Le Rendez-vous S.r.l.	PTSG		473,20			9.778.951,19	1.273.477,71
563	16/12/2013	574	Martone Carmen	PZ050A/10	BASFV31			4.855,00	9.783.806,19	1.268.622,71
564	16/12/2013	575	Costruzioni Carlomagno Francesco S.r.l.	PZ033A/10	BASFV29			100.414,97	9.884.221,16	1.168.207,74
565	16/12/2013	578	Edil Strade snc dei F.lli Donnoli	MT064A/10	BASFV37			58.606,36	9.942.827,52	1.109.601,38
								<b>2.702.799,92</b>	<b>2.854.203,64</b>	<b>4.385.823,96</b>
									<b>9.942.827,52</b>	<b>1.109.601,38</b>




COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## 7. GRAFICI DI SINTESI

Al fine di rendere meglio visibile l'attività della struttura del Commissario si riportano di seguito n. 4 rappresentazioni grafiche relative a :

Grafico n. 1: Fonti di finanziamento e percentuali di incidenza


**Grafico 1 - Fonti di finanziamento**

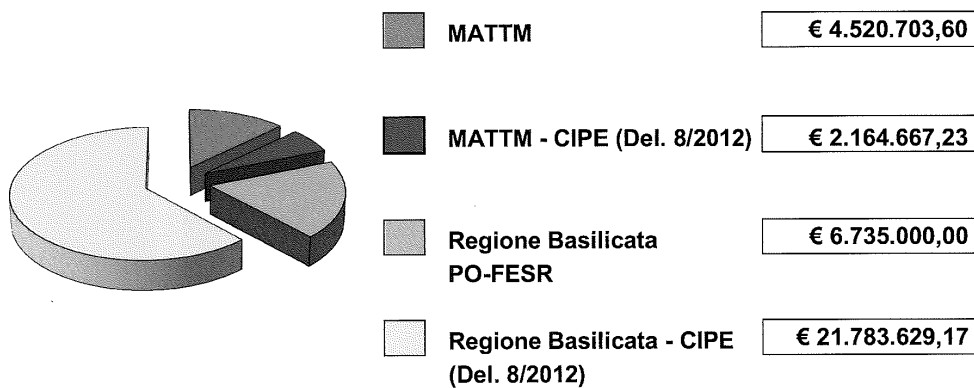



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)



**Grafico 2 - Rapporto percentuale tra somme programmate ed accreditate**

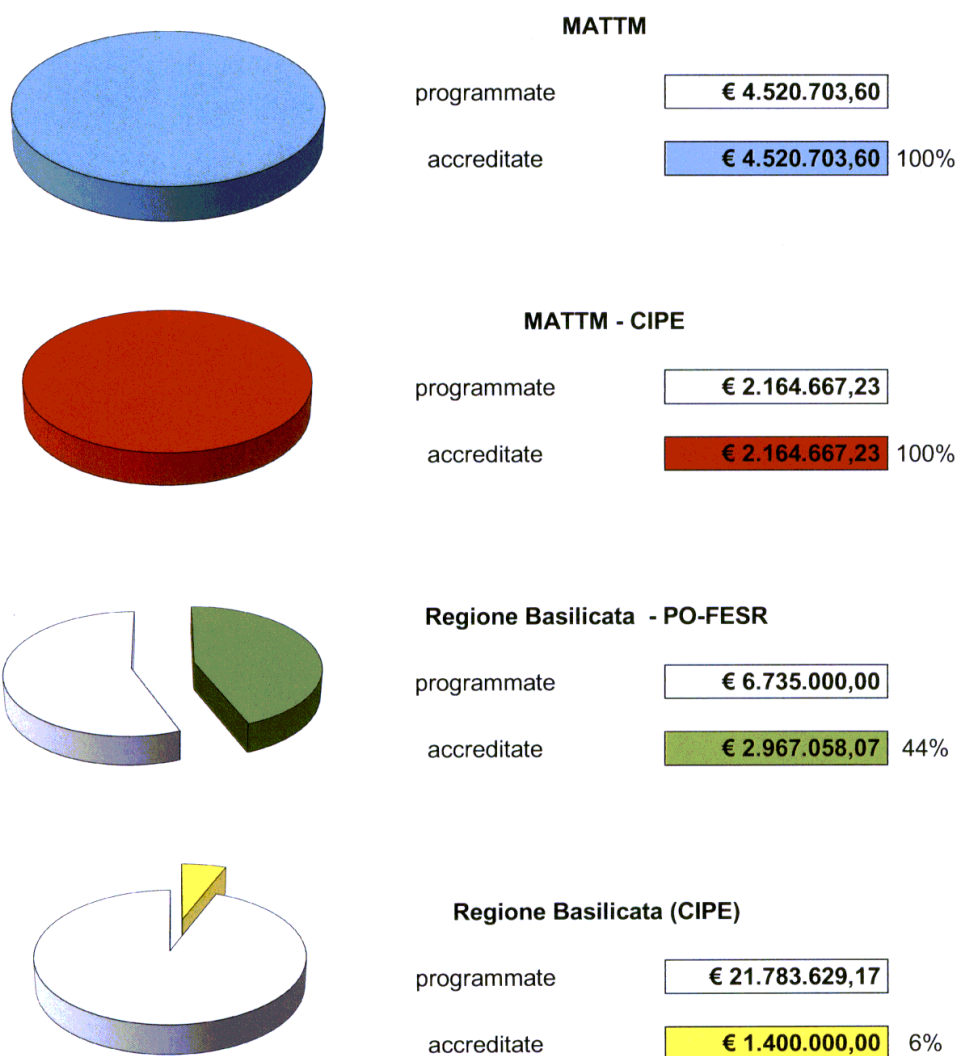



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Grafico 3 - Rapporto percentuale tra somme programmate ed impegnate**

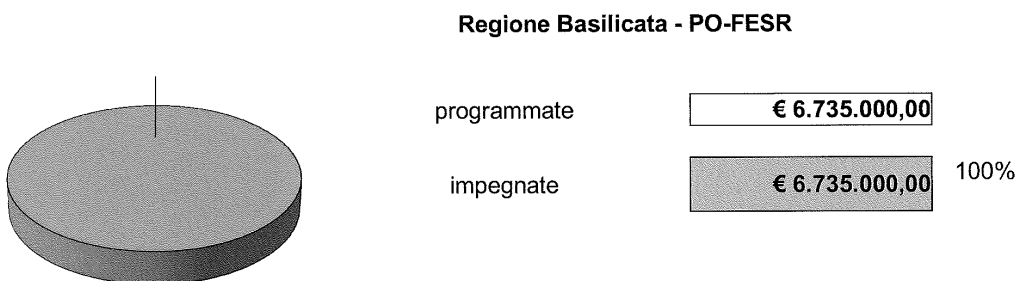






COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Grafico 4 - Rapporto percentuale tra somme accreditate e spese**

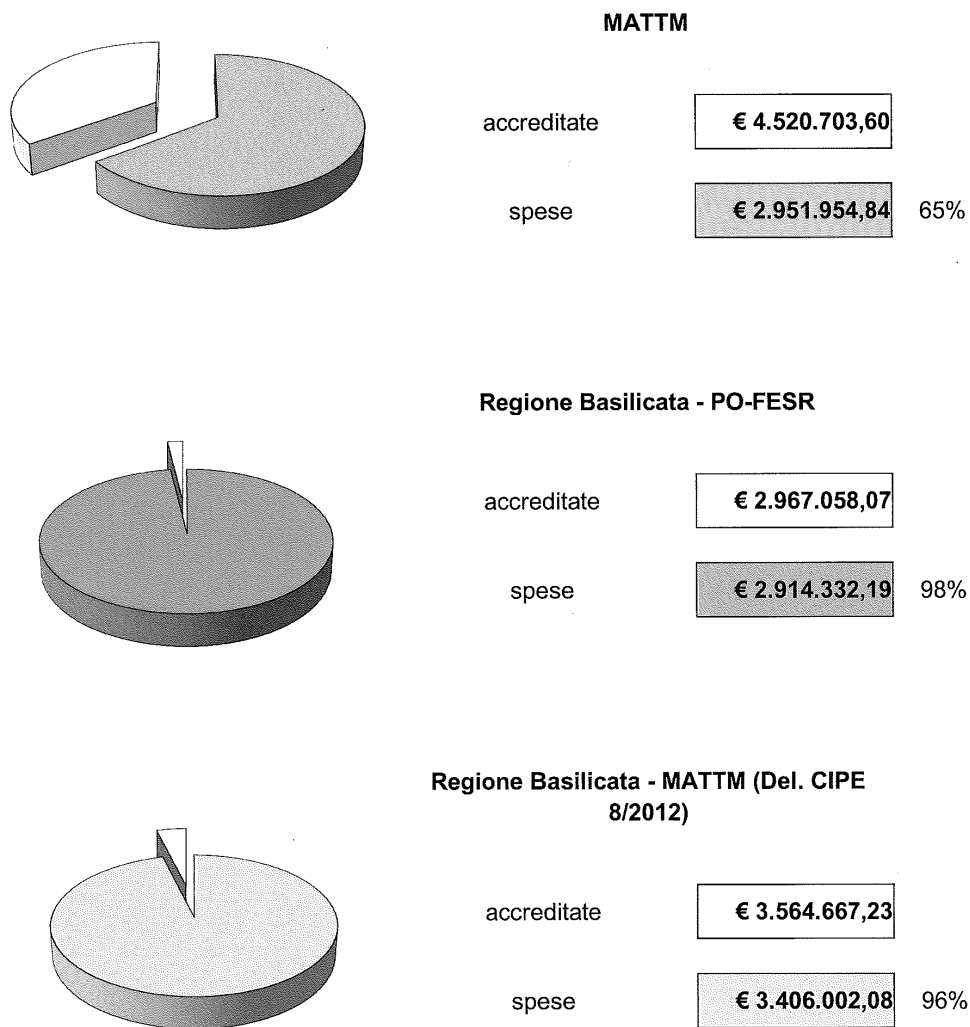



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## 8. CRITICITÀ

8.1 Tutta l'attività sino ad ora svolta potrebbe essere compromessa dal mancato accreditamento tempestivo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 8/2012 che, sono state fatte transitare attraverso la Regione Basilicata per essere trasferite alla contabilità straordinaria del Commissario, inopinatamente sottoposte anch'esse al "patto di stabilità"! Peccato che il fragile sistema idrogeologico della Basilicata, come delle altre regioni, non si confronta con il patto di stabilità né i dissesti ed i conseguenti danni, di gran lunga più costosi in termini di successivi rimedi, per non parlare di pericoli per la vita umana il cui valore non è in alcun modo misurabile, si attivano in relazione alle esigenze contabili della Regione. L'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, con il riconoscimento di urgenza e priorità per gli interventi in esso previsti, non consente, in termini di cosciente responsabilità, alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle opere.

I danni verificati nel recente passato **nuovamente** anche in Basilicata, dovrebbero far "diversamente" valutare i costi del rispetto di alcune decisioni assunte a livello europeo!

La "difesa del suolo", per evitare il costante aggravamento dei rischi idrogeologici, non può sottostare al "patto di stabilità", perché ... è una **contraddizione in termini**: *non si può stabilizzare la spesa se non si stabilizza il suolo*, a meno che non si è disposti a pagarne il prezzo altissimo in termini di vittime e danni ... e, a quel punto verrebbe da dire: basta ipocrisie e smettiamola di piangere su ...

Con riferimento all' AdP, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato ed a rischio per il ritardo nella messa a disposizione di somme previste, accreditate alla Regione, ma solo molto limitatamente accreditate alla contabilità speciale del Commissario, che dopo aver operato, con la approvazione dei progetti e l'affidamento dei relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte della Giunta regionale, corre, ora, il rischio di non poter onorare gli impegni assunti e soprattutto garantire la realizzazione delle opere!

8.2 A questa situazione, di imprevedibilità della **disponibilità reale** delle risorse per garantire il pagamento delle opere appaltate, si aggiunge ora anche la mancata decisione da parte del Governo nazionale della "sorte" dei Commissari: **proroga o non proroga**.

Se i ritardi sono universalmente riconosciuti in capo alla responsabilità del mancato accreditamento delle risorse, a sommosso parere dello scrivente, gli incarichi dovrebbero essere tempestivamente prorogati sino al compimento delle opere o sino al termine dei



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

tempi necessari per completare le opere, a decorrere dall'avvenuto accreditamento di tutte le risorse.

Ove i pareri, nei luoghi delle scelte, siano diversi da quello ora espresso sarebbe opportuno dare adeguate direttive per il trasferimento di atti, risorse, se disponibili, responsabilità sulle delicate fasi di realizzazione, completamenti, collaudi, consegna delle opere ai soggetti beneficiari.

8.3 In merito poi al **progetto**, mai avviato, codice **PZ040A/10** che interessa il Comune di Moliterno, il Commissario non ha potuto attivare alcuna iniziativa, avendo richiesto, al Comitato di indirizzo e controllo, a far data dal 27 maggio 2011, senza alcuna risposta, l'autorizzazione a destinare ad altro intervento le somme programmate per l'"Intervento di consolidamento frana e ripristino sede stradale SP ex SS 103 Km. 8+400-8+500". Codice "PZ040A/10".

8.4 Il Commissario ha potuto sino ad ora operare con il supporto di poche ma preziose ed indispensabili collaborazioni nell'ambito delle disponibilità, a titolo gratuito, di Enti, Strutture Pubbliche e Società pubbliche. Al Personale impegnato è stato unicamente riconosciuto il lavoro straordinario prestato, in coerenza con quanto previsto dal decreto di nomina del Commissario. L'auspicio è che queste collaborazioni siano ancora possibili, sia in conseguenza della disponibilità di Enti a confermarle anche per il 2014, sia per il permanere della norma che le rende possibili.

Matera, 31 dicembre 2013

Il Commissario straordinario delegato  
f.to Ing. Francesco Saverio ACITO

m\_ante.TRI.REGISTRO UFFICIALE (I) .0055268.14-11-2013



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE CALABRIA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Prot. n.1502/UC

Catanzaro, li 14 novembre 2013

**c.a. Avv. Maurizio PERNICE**

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse  
idriche

Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 Roma

Pec: [DGTri@pec.minambiente.it](mailto:DGTri@pec.minambiente.it)**c.a. Dott. Franco GABRIELLI**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

Via Vitorchiano, 2

00189 Roma

Pec: [protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it)

e p.c.

**c.a. On. Andrea ORLANDO**

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare  
Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 - Roma

Pec: [segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)**c.a. On. Giuseppe SCOPELLITI**

Presidente Regione Calabria

Via Sensales n. 20

88100 Catanzaro

Fax: 0961.702322

e-mail: [presidentescopelliti@regcal.it](mailto:presidentescopelliti@regcal.it)**c.a. Assessore Giuseppe GENTILE**

Assessorato LL.PP. Regione Calabria

Via Francesco Crispi, 33

88100 Catanzaro

e-mail: [giuseppe.gentile@regcal.it](mailto:giuseppe.gentile@regcal.it)**OGGETTO: Relazione sulle attività svolte nel periodo 15.05.2013 – 14.11.2013**

In allegato alla presente si trasmette la Relazione di dettaglio, relativa al periodo:

15.05.2013 – 14.11.2013 sulle attività svolte da questo Commissario Delegato, come previsto all'art. 2, comma 3,  
del D.P.C.M. 21.01.2011.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Domenico Pervolla)





## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

### **ALLEGATO**

#### **RELAZIONE DI DETTAGLIO**

- **15.05.2013 - 14.11.2013**

**Catanzaro, 15.11.2013**

#### **Allegati:**

- Allegato 1: Lista degli interventi e sintesi stato delle singole attività;
- Allegato 2: Mappe "Categorie di rischio PAI associato all'intervento";

PAGINA BIANCA



## *Al Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

### **Premessa**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Calabria nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In particolare gli interventi, da realizzare nell'ambito dell'AdP "Difesa del Suolo", rientrano nella proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che tiene conto delle numerose richieste pervenute agli Uffici della Regione Calabria oltre che di quelle trasmesse, dagli Enti interessati, direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale.

L'accordo, tra l'altro, prevedeva, art. 5, che per l'attuazione degli interventi i sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Presidente della Regione Calabria, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 21 gennaio 2011 il sottoscritto, dott. Domenico Percolla, "Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui all'allegato A dell'AdP della Regione Calabria".

Facendo seguito alle precedenti Relazioni relative alle attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Calabria (ex DPCM 21.01.2011) del periodo 10.06.2012 – 10.12.2012, trasmessa in data 15.01.2013 con nota prot. 62/UC e del periodo 10.12.2012 - 14.05.2013, trasmessa con nota 756/UC del 15.05.2013, con la presente si illustrano le attività svolte da questo Ufficio nel periodo 15.05.2013 – 14.11.2013.



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

### **1. Incarico di progettazione ad INVITALIA / Invitalia Attività Produttive S.p.A.**

Come specificatamente previsto all'art. 4 del D.P.C.M. del 21 gennaio 2011, con il quale veniva decretata la nomina del Dott. Domenico Percolla a Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria, potendo lo stesso Commissario avvalersi per la realizzazione degli interventi anche di società specializzate a totale capitale pubblico, così come già rappresentato nella relazione annuale del 2011 e nella successiva relazione relativa ai primi due trimestri del 2012, ha stipulato in data 06 luglio 2011 una specifica convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia S.p.A.<sup>1</sup> [Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. di seguito denominata "INVITALIA" o Agenzia], riguardante attività funzionali e/o di assistenza tecnico – amministrativa - e specialistica.

Durante il periodo di riferimento (15 maggio 2013 - 14 agosto 2013), ai sensi dell'art. 2 della Convenzione e del relativo Piano esecutivo Invitalia, tramite la sua controllata invitalia Attività Produttive (IAP) (già Sviluppo Italia Aree Produttive), attraverso il Gruppo di Lavoro (GdL) composto da personale tecnico specialistico interno ed esterno, ha fornito l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa.

Nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa e di progettazione, con nota prot. 98/UC del 27 febbraio 2012, il Commissario ha comunicato ad Invitalia una prima di lista di interventi per i quali ha richiesto le attività di progettazione, finalizzate allo svolgimento delle successive gare di appalto, in particolare gli interventi affidati sono i seguenti:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
CS 019A/10	Bisignano	Interventi di messa in sicurezza del Santuario	Definitiva/Esecutiva

<sup>1</sup> società a totale capitale pubblico, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari. L'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate





## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

		di Sant'Umile	
CS 020A/10	Bisignano	Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria	Definitiva/Esecutiva
VV 043A/10	Polia	Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trecroci	Definitiva/Esecutiva
CZ 079A/10	S. Andrea Apostolo dello Ionio	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro	Definitiva/Esecutiva

In considerazione delle urgenze ed al fine di definire nel modo migliore tempi e contenuti dei progetti sopra riportati, nonché di acquisire la documentazione esistente ed ogni altra informazione utile ai fini della progettazione, sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei tecnici di Invitalia presso i siti oggetto degli interventi e sono iniziate le propedeutiche attività di rilievo topografico e di definizione dei necessari piani di indagini geognostiche.

Inoltre con nota prot. 314/UC del 06 giugno 2012, il Commissario ha comunicato ad Invitalia un ulteriore intervento:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
RC 024A/10	Marina di Gioiosa Ionica	Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi	Definitiva/Esecutiva

per il quale ha richiesto le attività di progettazione, finalizzate allo svolgimento delle successive gare di appalto.

Ulteriori richieste sono state comunicate con note prot. n. 698/UC del 6 settembre 2012 e n. 1049/UC del 22 novembre 2012, relative ai seguenti interventi:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
---------------	--------	------------------------	-------------------------



## *Al Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

CZ 002A/10	Catanzaro	Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche.	Definitiva/Esecutiva
CZ 054A/10	Catanzaro	Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)*	Definitiva/Esecutiva
CS 040A/10	Lungro	Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo	Preliminare
CS 154B/10	Morano Calabro	Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito	Preliminare
CZ 042A/10	Cardinale	Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico	Preliminare

Inoltre con nota prot. 300/UC del 22.02.2013, è stata richiesta una ulteriore progettazione Definitiva/Esecutiva e precisamente:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
CS 003A/10	Rogliano	Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi - Balzata	Definitiva/Esecutiva



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

Infine, con nota prot. 1213/UC del 18 settembre 2013, è stata richiesta altresì la progettazione Definitiva/Esecutiva di:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
CS 106B/10	Corigliano e Cassano	Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati	Definitiva/Esecutiva

### **2. Convenzione con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo**

In data 23 maggio 2012 è stato sottoscritto con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), sulla base del decreto commissariale n. 23 del 23 maggio 2012 di approvazione e finanziamento di tale Accordo, ed avvalendosi di quanto disposto dal DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico-specialistica nell'ambito dell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nella Regione Calabria.

Infatti in relazione alla natura geomorfologica dei siti ed alle specifiche problematiche connesse con l'attuazione degli interventi tesi alla riduzione del rischio idrogeologico in essere, l'esistente cartografia regionale, generalmente restituita alle scale 1:5.000, non risulta pienamente idonea ed adeguatamente dettagliata per le finalità delle progettazioni di livello definitivo ed esecutivo. Si è pertanto avuta la necessità di dotarsi di specifici rilievi topografici di dettaglio delle aree di intervento sin dalla prima fase connessa con l'attuazione dei piani recanti le indagini geognostiche ed, ancor di più, nella successiva fase progettuale connessa con l'analisi dello stato di fatto e la modellazione idraulica e strutturale delle opere di progetto.

Sulla base dell'accordo con CGIAM, e facendo seguito ad incontri tecnici avuti presso la struttura commissariale, il Commissario Delegato ha successivamente trasmesso al CGIAM una lista di 32 "punti di intervento", compresi tra i 185 di cui all'Elenco A dell'Accordo di Programma del 25.11.2010, su cui il centro ha avviato i rilievi mediante piattaforme aerotrasportate e delle quali ha iniziato a restituire e rappresentare i dati all'ufficio del Commissario, secondo le priorità da questi stabilite. Di seguito la lista dei 32 "punti di intervento":



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

<b>CODICE RENDIS</b>	<b>ENTE BENEFICIARIO</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>LOCALITA'</b>
VV 033A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Torrente S. Anna
VV 034A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Torrente Antonucci
VV 035A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Torrente Candrilli
VV 036A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Fosso Libanio
RC 028A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Gallico
RC 029A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Annunziata
RC 030A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara D'armo
RC 031A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Menga
RC 032A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Valanidi
RC 052A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Rete Idrografica Minore Nelle Frazioni Archi, Catona E Gallico
CS 019A/10	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Pendici Santuario Di Sant'Umile Da Bisignano
CS 020A/10	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Contrade Cretarossa E Fria
CS 065A/10	Provincia di CS	CS	Corigliano	Torrente Leccalardo
CS 069A/10	Provincia di CS	CS	Vari	Corsi D'acqua Minori
CS106B/10	Provincia di CS	CS	Cassano / Corigliano	Fiume Crati
CS 127B/10	Provincia di CS	CS	Corigliano	Torrente San Mauro
CS 182B/10	Provincia di CS	CS	Corigliano	Torrente Malfrancato
CZ 027A/10	Provincia di CZ	CZ	Cardinale	Fiume Ancinale
CZ 041A/10	Provincia di CZ	CZ	San Mango D'Aquino / Nocera Terinese	Fiume Savuto, Tratto Medio - Basso Fino alla Foce
CZ 045A/10	Provincia di CZ	CZ	Simeri Crichi / Soveria Simeri	Fiume Simeri
CZ 066A/10	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro	Fiume Corace
CZ 073A/10	Provincia di CZ	CZ	Vari	Corsi D'acqua Minori
CZ 086A/10	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	T. Patella



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

<b>CZ 094B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	Guardavalle Marina, Centro Abitato - Località Borgorosso
<b>CZ 107B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro / Simeri Crichi	Fiume Alli
<b>CZ 132B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Badolato	Torrente Barone
<b>CZ 176B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Maida	Fiume Pesipe
<b>CZ 177B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Lamezia Terme	Torrente S. Ippolito
<b>CZ 178B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Botricello	Torrente Crocchio
<b>CZ 181B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Soverato	Fiume Beltrame
<b>CZ 183B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Curinga	Torrenti Randace, Turrina E La Grazia
<b>CZ 184B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Sellia Marina	Torrente Scilotraco

Tra il mese di febbraio e marzo 2013, CGIAM ha trasmesso i seguenti "punti di intervento" rilevati:

<b>CODICE RENDIS</b>	<b>ENTE BENEFICIARIO</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>LOCALITA'</b>
<b>CS 019A/10</b>	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Pendici Santuario Di Sant'Umile Da Bisignano
<b>CS 020A/10</b>	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Contrade Cretarossa E Fria
<b>CS106B/10</b>	Provincia di CS	CS	Cassano / Corigliano	Fiume Crati
<b>CZ 027A/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Cardinale	Fiume Ancinale
<b>CZ 041A/10</b>	Provincia di CZ	CZ	San Mango D'Aquino / Nocera Terinese	Fiume Savuto, Tratto Medio - Basso Fino alla Foce
<b>CZ 045A/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Simeri Crichi / Soveria Simeri	Fiume Simeri
<b>CZ 066A/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro	Fiume Corace
<b>CZ 073A/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Vari	Corsi D'acqua Minori
<b>CZ 086A/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	T. Patella
<b>CZ 094B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	Guardavalle Marina, Centro Abitato - Località Borgorosso
<b>CZ 107B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro / Simeri Crichi	Fiume Alli
<b>CZ 132B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Badolato	Torrente Barone



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

<b>CZ 176B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Maida	Fiume Pesipe
<b>CZ 177B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Lamezia Terme	Torrente S. Ippolito
<b>CZ 178B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Botricello	Torrente Crocchio
<b>CZ 181B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Soverato	Fiume Beltrame
<b>CZ 183B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Curinga	Torrenti Randace, Turrina E La Grazia
<b>CZ 184B/10</b>	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Sellia Marina	Torrente Scilotraco

Inoltre, in data 25 settembre 2013, per tutte le aree rilevate ha trasmesso le schede di caratterizzazione geologica generale.



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

### **3. Sintesi delle attività svolte**

In particolare, suddividendo le attività per periodi:

#### **A. Gennaio 2011 – Luglio 2011**

In tale periodo, nel quale il Commissario Delegato in epigrafe non aveva alcuna disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 4 del DPCM di nomina, ha individuato le possibili collaborazioni, infatti ...*“Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006”* ...

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 e per la assenza iniziale di risorse, si è provveduto ad operare esclusivamente usufruendo di alcune risorse tecnico-operative della Regione Calabria. In attesa del trasferimento delle risorse economiche specifiche, sono state svolte:

- i. definizione di una scheda “istruttoria” finalizzata a raccogliere in maniera sintetica, ma esaustiva, tutti i dati di base degli interventi compresi nell'Accordo di Programma, del 25.11.2010;
- ii. trasmissione della scheda a tutti i Comuni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da attuare, nonché alle provincie anch'esse interessate e beneficiari di alcuni interventi;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

### **B. Luglio 2011 – Dicembre 2011**

In tale periodo, a valle dell'erogazione di una prima parte di risorse economiche da parte del Ministero dell'Ambiente, avvenuta il 23.06.2011 per un importo pari ad € 2.339.261,85, è stata di fatto avviata la struttura operativa dell'Ufficio, avvalendosi, con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, di personale proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 Assessorato ai LL.PP., costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative e sono state svolte le seguenti attività:

- i. istruttoria preliminare delle schede ricevute;
- ii. prima fase di istruttoria di dettaglio, anche tramite incontri diretti con i primi Comuni interessati dagli interventi;
- iii. definizione di un cronoprogramma preliminare e della ripartizione annuale delle risorse;
- iv. la seconda fase dell'istruttoria di dettaglio, anche attraverso ulteriori incontri con i Comuni;
- v. la ricerca, acquisizione e costituzione dell'Ufficio della struttura commissariale;
- vi. la definizione della Lista degli Interventi Prioritari secondo delle "indicizzazioni" basate sui tempi di cantierabilità degli interventi, sullo stato della progettazione, sul numero di persone potenzialmente sposte al rischio e sulla periodicità/frequenza degli eventi che innescano il suddetto rischio;
- vii. stipula Convenzioni con le Province di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per la progettazione di alcuni interventi e precisamente:
  - Provincia di Cosenza: In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10;
  - Provincia di Reggio Calabria: In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato





## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- “Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello” da realizzare nel comune di Gioia Tauro Codice Rendis RC068A/10;
- Provincia di Catanzaro: in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n. 2 interventi: “Interventi di sistemazione idraulica dei fossi Valeo I e II nel bacino del fosso Pia Lupia” da realizzare nel Comune di Falerna Codice Rendis CZ081A/10; “Interventi di sistemazione idraulica dei bacini dei Valloni Sciabica, Chioccia e Marevitano” da realizzare nel comune di Nocera Terinese Codice Rendis CZ082A/10
  - Provincia di Crotona: In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di Crotona” da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa” Codice Rendis KR071A/10;
  - Provincia di Vibo Valentia: In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia” da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa” Codice Rendis VV072A/10; “Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato” Codice Rendis VV005A/10.
- viii. stipula Convenzione con il Dipartimento alle Infrastrutture della Regione Calabria ed il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria per la progettazione preliminare dell’intervento Codice Rendis CS003A/10 “Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata” nel Comune di Rogliano (CS)



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

Avendo costituito l'Ufficio commissariale, in termini di sede operativa e di strumentazione d'ufficio, hardware e software, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

- i. numerosi incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- ii. nomina di n. **4 RUP**, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011, attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;
- iii. istituzione, tramite specifici bandi di gara, dell'elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara - e dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
- iv. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS014A/10 Comune di Firmo ", per € 600.000,00, gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.09.2012 ed consegna dei lavori in data 28.09.2012;
- v. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. KR 021A/10 Comune di Santa Severina, per € 600.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.10.2012 e consegna dei lavori in data 21.11.2012;
- vi. espletamento gara per l'affidamento dell'Incarico di Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante il centro storico in rione Grecia" nel Comune di S. Severina (KR) - Codice Intervento KR 021A/10;
- vii. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS 004A/10 Comune di Acri, per € 1.500.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 19.12.2012, si è in attesa della consegna dei lavori;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- viii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS025A/10 - Provincia di Cosenza ", per € 1.500.000,00,
- ix. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 019A/10 – Comune di Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile", lavori aggiudicati e realizzati;
- x. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro", lavori aggiudicati in corso di realizzazione;
- xi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod VV043A/10- Polia- "Interventi di mitigazione rischio frana e idraulico nella frazione Trecroci", lavori aggiudicati e realizzati;
- xii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. RC 024A/10 – Marina di Gioiosa Jonica – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione lunchi";
- xiii. svolgimento di sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :
  - Bisignano, Polia, Sant'Adrea Apostolo dello Jonio, Marina di Gioiosa ionica e Catanzaro.
- xiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell'Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:
  - CS 019A/10 – Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile";
  - CS 020A/10 – Bisignano "Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria";
  - VV 043A/10 – Polia – "Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trecroci"



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro”
  - RC 024A/10 - Marina di Gioiosa Ionica – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione lunchi”;
  - CZ 002A/10 “Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche” nel Comune di Catanzaro;
  - CZ 054A/10 “Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)” nel Comune di Catanzaro
- xv. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto;
- xvi. predisposizione della documentazione necessaria da porre a base di gara, per i servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, in tutti quei casi dove gli Enti beneficiari del finanziamento (Comuni), non hanno le competenze interne ai propri uffici tecnici per procedere alla progettazione e non hanno le risorse per gestire in modo diretto tale fase, gli interventi per i quali si sta procedendo a gare di progettazione sono i seguenti:
- CZ 067A/10 – Comune di Tiriolo “Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace”;
  - CS 003A/10 – Comune di Rogliano “Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata”;
  - VV 033A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Torrente S. Anna a monte della SS 522”;
  - VV 034A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica a monte della Variante alla SS 522 (Antonucci e affluente)”;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- VV 035A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Torrente Trainiti a monte della SP n° 11 (Torrente Candrilli)”;
- VV 036A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Fosso Tomarchiello o Libanio”;
- CS 065A/10 - Provincia di CS “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Leccalardo”;
- CS 069A/10 - Provincia di CS “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Cosenza”;
- CS106B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano”;
- CS 127B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica del Torrente San Mauro”;
- CS 182B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Malfrancato”;

### **D. Dicembre 2012 – Maggio 2013**

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

- xvii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- xviii. nomina di ulteriori n. **17 RUP**, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 , attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;
- xix. specifico avviso per l’aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, dell’elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara – e dell’elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
- xx. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS025A/10 – “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto - **Provincia di Cosenza**”, per € 1.300.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 14.02.2013 e consegna dei lavori in data 27.02.2013;
- xxi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. RC 024A/10 – **Marina di Gioiosa Jonica** – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione lunchi” lavori aggiudicati in corso di realizzazione;
- xxii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina” nel **Comune di Zumpano**, per € 1.100.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxiii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence “ nel **Comune di Zumpano**, per € 900.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxiv. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello” nel **Comune di Scalea**, per € 800.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxv. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS056A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli” nel **Comune di Villapiana**, per € 800.000,00 gara in corso;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- xxvi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 026A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tacina" **Provincia di Crotona** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxvii. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 037A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello" **Provincia di Crotona** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxviii. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 163B/10 – "Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del t. satanasso" **Provincia di Cosenza** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxix. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 038A/10 – "Interventi in alveo sul fiume Esaro" **Provincia di Crotona** gara in corso;
- xxx. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 039A/10 – "Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro" **Provincia di Crotona** gara in corso;
- xxxi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 122B/10 – "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquaniti" **Provincia di Cosenza** gara in corso;
- xxxii. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace" cod. intervento CZ 067A/10 **Comune di Tiriolo**;
- xxxiii. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :
- Lungro, Cardinale, Morano Calabro, Cassano allo Jonio, Corigliano e Catanzaro.



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- xxxiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell'Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:
- CS 040A/10 – Lungro “Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo”;
  - CS 154B/10 – Morano Calabro “Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito”;
  - CZ 042A/10 – Cardinale – “Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico”;
  - CS 003A/10 – Rogliano “Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata”;
  - CS 106B/10 – Cassano/Corigliano “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano”;
- xxxv. Redazione del Progetto Preliminare intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano” trasmesso a tutti gli Enti interessati in data 28/03/2013;
- xxxvi. Avvio della Progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano” con l'approfondimento e la rielaborazione degli elaborati grafici recanti lo stato di fatto dei luoghi in rapporto al regime vincolistico per poter compiutamente individuare gli Enti e le Amministrazioni preposte al rilascio di autorizzazioni, pareri e n.o.;
- xxxvii. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni.

### **E. Maggio 2013 – Novembre 2013**

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:





## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- xxxviii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- xxxix. aggiornamento con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013 dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
- xl. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS052A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Santa Maria degli Angeli in **Comune di Villapiana (CS)**”, per € 800.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 19.06.2013 e consegna dei lavori in data 02.10.2013;
- xli. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina” nel **Comune di Zumpano**, per € 1.100.000,00 stipula del contratto in data 31.05.2013;
- xlii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence “ nel **Comune di Zumpano**, per € 900.000,00 stipula del contratto in data 19.06.2013;
- xliii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello” nel **Comune di Scalea**, per € 800.000,00 stipula del contratto in data 29.05.2013;
- xliv. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 026A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tacina” **Provincia di Crotona** stipula del contratto in data 11.06.2013;
- xlv. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 037A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello” **Provincia di Crotona** stipula del contratto in data 17.06.2013;
- xlvi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 163B/10– “Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del t. satanasso” **Provincia di Cosenza** stipula del contratto in data 19.06.2013;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- xlvi. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 038A/10 – "Interventi in alveo sul fiume Esaro" **Provincia di Crotona** stipula del contratto in data 10.09.2013;
- xlvi. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 039A/10 – "Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro" **Provincia di Crotona** stipula del contratto in data 10.09.2013;
- xlix. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 122B/10 – "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquaniti" **Provincia di Cosenza** stipula del contratto in data 19.09.2013;
- i. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace" cod. intervento CZ 067A/10 **Comune di Tiriolo** stipula del contratto in data 29.05.2013;
- ii. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :
- Cassano allo Jonio, Corigliano e Catanzaro.
- lii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 040A/10 – Lungro "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo" trasmesso al Comune con nota 1060/2013 del 23 luglio 2013;
- liii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 154B/10 – Morano Calabro "Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito";
- liv. Redazione del Progetto Preliminare intervento CZ 042A/10 – Cardinale – "Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico" trasmesso al Comune con nota 1235/2013 del 20 settembre 2013;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- iv. Redazione del Progetto definitivo dell'intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano" trasmesso al RUP dell'intervento in data 8/11/2013, per la verifica e la validazione;
- lvi. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico" nel **Comune di Maierà (CS)** cod. intervento CS057A/10, aggiudicazione definitiva in data 8 novembre 2013 in attesa della stipula del contratto;
- lvii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori di: "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico" nel **Comune di Maierà (CS)** cod. intervento CS057A/10, importo finanziamento € 800.000,00, aggiudicazione provvisoria del 13 novembre 2013;
- lviii. definizione e stipula della relativa convenzione, in data 30 ottobre 2013, dei rapporti convenzionali con la Regione Calabria per la regolamentazione delle modalità di finanziamento e rendicontazione dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 8/2012;
- lix. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni.

#### **4. Incontri con Comuni - Proseguimento istruttoria di dettaglio**

Come già rappresentato nelle precedenti relazioni, nel periodo settembre-dicembre 2011, sono stati convocati e svolti incontri diretti tra il Commissario e tutti i Comuni, per poter iniziare la predisposizione di eventuali atti e documentazione, necessari per un rapido avvio delle attività operative nel momento in cui si fossero rese disponibili le risorse economiche previste.



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

**Successivamente agli incontri con tutti i Comuni presenti nell'accordo di programma, si è entrati nel merito del proseguimento delle attività, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici relativi ad elaborati progettuali trasmessi al Commissario Delegato, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi connessi alle procedure di gara da intraprendere e/o già espletate dalle singole amministrazioni.**

Nel periodo in oggetto sono proseguiti gli incontri con molti Comuni, negli uffici di Reggio Calabria e/o di Catanzaro, facenti parte dell'Elenco A e B di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010, ed è stata definita con gli stessi Comuni una procedura di attuazione operativa delle fasi di progettazione che ha portato ad avere, per la quasi totalità degli interventi, almeno un livello di progettazione (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo).

A tal proposito si riporta in modo sintetico, la situazione aggiornata ad oggi: degli 88 interventi di cui all'allegato A quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 64, per 63 Comuni esistono elaborati progettuali già esitati positivamente dall'ufficio del Commissario e si trovano dunque o nella fase di esecuzione dei lavori o in un avanzata fase progettuale in ciò costantemente supportati e monitorati da parte di questo ufficio da un punto di vista sia tecnico che amministrativo attraverso il supporto costante agli uffici tecnici comunali. In particolare n. 8 interventi sono nella fase di esecuzione dei lavori, n. 3 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutiva e n. 16 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. Preme evidenziare che su 44 Amministrazioni Comunali, che stanno portando avanti la progettazione, n. 31 hanno richiesto e sono stati autorizzati, a seguito di numerosi incontri ed istruttorie amministrative, a procedere con l'affidamento all'esterno dei servizi di progettazione Def/Esec e dei servizi di Indagine Geognostiche.

Dei 97 interventi di cui all'Allegato B quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 61, di questi 37 comuni hanno presentato il progetto preliminare e sono in corso da parte di questo ufficio le istruttorie tecniche. Inoltre n. 5 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutiva e n. 9 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. Anche in questo caso va ricordato che su 60 Amministrazioni Comunali, n. 42 hanno richiesto e



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

sono stati autorizzati a procedere con l'affidamento all'esterno dei servizi di progettazione Def/Esec dei servizi di Indagine Geognostiche.

**In tal modo, a breve, la quasi totalità degli interventi previsto nell'Accordo di Programma sarà dotato di un livello di progettazione Definitiva e/o Esecutiva.**

### 5. Nomina RUP

In parallelo agli incontri con i Comuni, di cui al punto precedente, come previsto dalla procedura definita con gli stessi in base a quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 (registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 3439), con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", e tenuto conto delle procedure indicate dal D.lgs 163/06 e s.m.i. in materia di "contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il Commissario delegato sta provvedendo ad integrare nella propria struttura, tramite specifici decreti Commissariali di nomina, i Responsabili del Procedimento (RUP) già nominati dai Comuni/Province relativamente agli interventi da attuare.

Allo stato risultano già nominati i RUP dei seguenti interventi:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento
CS 014A/10	Comune di Firmo	Interventi di consolidamento in Via Sparadei e Via della Repubblica
KR 021A/10	Comune di Santa Severina	Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante centro storico
CS 004A/10	Comune di Acri	Interventi di consolidamento in loc. Serricelle
CS 025A/10	Provincia di Cosenza	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

CS 016A/10	Comune di Zumpano	Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina
CS 017A/10	Comune di Zumpano	Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence
CZ 067A/10	Comune di Tiriolo	Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace
CS062A/10	Comune di Scalea	Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello
CS106B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano
CS 056A/10	Comune di Villapiana	Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli
KR 026A/10	Provincia di KR	Interventi di sistemazione idraulica alla foce del Fiume Tacina
KR 037A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo / Migliarello
KR 038A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Fiume Esaro
KR 039A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Vallone Lamps Papaniciaro
CS 122B/10	Provincia di CS	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Acquaniti
CS 124B/10	Provincia di CS	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Pagliaro
CS 125B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente fiumarella
CS 163B/10	Provincia di CS	Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del T. Satanasso
CS 166B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Catocastro



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

CS 168B/10	Provincia di CS	Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica con pulizia in alveo del Torrente Grammisato
CS 173B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Colognati
CS 057A/10	Comune di Maierà	Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico"
CZ 079A/10	S. Andrea Apostolo dello Ionio	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro

### **6. Istituzione degli elenchi di Imprese e Professionisti**

Con propri decreti n. 25 e n. 26 del 22.06.2012, Il Commissario Delegato ha emanato due bandi di gara, regolarmente pubblicati su GURI e Bollettino ufficiale Regione Calabria, per l'istituzione, rispettivamente:

- dell'elenco imprese, per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara;
- dell'elenco professionisti, cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i.

Alla data del 03.10.2012 i due Elenchi in oggetto sono stati pubblicati nel sito web del Commissario Delegato, a valle delle procedure di verifica della documentazione richiesta e trasmessa dalle Imprese e dai Professionisti, dopo aver prorogato i termini per l'iscrizione (originariamente previsti per il 31 luglio 2012) fino al 14 settembre 2012.

A tale data risultano iscritti in tali elenchi:

- 243 imprese,
- 502 professionisti.



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

Inoltre con proprio decreto n. 83 del 29.11.2012, il Commissario Delegato ha emanato un ulteriore bando di gara per procedere all'aggiornamento del suddetto elenco delle imprese, anche per poter soddisfare le condizioni previste dal comma 2 dell'art.123 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., relativamente alle procedure da espletare nel corso dell'anno 2013.

Con decreto n. 2 del 08.01.2013, il Commissario Delegato ha approvato l'elenco imprese per inviti a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

A tale data risultano iscritte in tale elenco:

- 352 imprese

Mentre con proprio decreto n. 71 del 5 Aprile 2013 ha proceduto a richiedere l'aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;

L'aggiornamento dell'elenco professionisti è stato pubblicato con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013.

A tale data risultano iscritti in tale elenco:

- 456 professionisti

### **7. Conclusione espletamento gare di appalto per affidamento lavori interventi cod. CS062A/10 Comune di Scalea, cod. CS016A/10 e cod. CS017A/10 Comune di Zumpano e cod. CS056A/10 Comune di Villapiana ed espletamento gara di appalto in corso cod CS057A/10 Comune di Maierà**

Come sinteticamente riportato nei paragrafi 3D e 3E, nel periodo di riferimento (maggio 2013 ad oggi) sono terminate le procedure di gara per n. 4 interventi per l'affidamento dei lavori.





## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

In particolare:

- 1) Con specifico decreto Commissariale n. 74 del 15 aprile 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Scalea:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS062A/10 - Comune di Scalea "Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con decreto Commissariale n. 108 del 08.05.2013, ed il relativo contratto è stato stipulato a Catanzaro in data 29 maggio 2013.

- 2) Con specifico decreto Commissariale n. 48 del 26 febbraio 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Zumpano:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS016A/10 - Comune di Zumpano "Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina"**;



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con decreto Commissariale n. 105 del 03.05.2013, ed il relativo contratto è stato stipulato a Catanzaro in data 31 maggio 2013.

3) Con specifico decreto Commissariale n. 84 del 18 aprile 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Zumpano:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. C017A/10 - Comune di Zumpano "Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese, non inferiori a 15, scelte tra quelle iscritte nell'Albo delle



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con decreto Commissariale n. 118 del 22.05.2013, ed il relativo contratto è stato stipulato a Catanzaro in data 19 giugno 2013.

4) Con specifico decreto Commissariale n. 103 del 02 maggio 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Villapiana:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. C056A/10 - Comune di Villapiana "Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese, scelte tra quelle iscritte nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con decreto Commissariale n. 133 del 30.05.2013, ed il relativo contratto è stato stipulato a Catanzaro in data 19 giugno 2013.



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

5) Con specifico decreto Commissariale n. 368 del 31 ottobre 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Maierà:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS057A/10 - Comune di Maierà "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via provvisoria in data 13 novembre 2013.

### **8. Convenzioni con le Province**

A valle delle Convenzioni stipulate con le Province e alle azioni connesse all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari il Commissario ha affidato a ciascun Ente, ai sensi degli artt. 2 e 3 delle citate Convenzioni, alcune attività di progettazione riferite a specifici interventi, in particolare:

- ✓ **Provincia di Cosenza:** In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10; il cui progetto



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

definitivo è stato esitato, positivamente, da parte dell' Autorità di bacino Regionale, ed il Progetto esecutivo esitato positivamente da questo ufficio ed avviato le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. Per effetto della sopra citata convenzione, sono state affidate in data 1 agosto 2012 le progettazioni di ben altri 9 interventi (codice rendis CS134B/10; CS167B/10; CS122B/10; CS124B/10; CS125B/10 ;CS168B/10; CS173B/10; CS163B/10; CS166B/10) rispetto ai quali la Provincia ha già provveduto a trasmettere i progetti Preliminari al momento al vaglio istruttorio di compatibilità ai requisiti previsti dall'Accordo di Programma. Infine con nota 1414/UC del 24.10.2013, sono state affidate alla Provincia di Cosenza le attività di progettazione relative ai seguenti interventi: CS 065A/10; CS069A/10, CS 127A/10 e CS 182A/10. Inoltre come richiesto dalla Provincia di Cosenza, sono state affidati i servizi di indagini per gli interventi con codice ReNDIS CS122B/10 e CS163B/10;

- ✓ **Provincia di Reggio Calabria:** In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello" da realizzare nel comune di Gioia Tauro Codice Rendis RC068A/10; il progetto preliminare di tale intervento è stato esitato, positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia sta procedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali;
- ✓ **Provincia di Catanzaro:** in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 oltre all'affidamento della progettazione dei primi due interventi (cod. CZ081A/10 e CZ082A/10), tra dicembre 2012 e marzo 2013, sono stati autorizzati alla progettazione di ulteriori n. 12 interventi tramite l'affidamento dei soli servizi specialistici.
- ✓ **Provincia di Crotona:** In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotona" da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa" Codice Rendis KR071A/10; il progetto preliminare è stato esitato positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia ha proceduto all'elaborazione delle successive fasi progettuali ed ha



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

trasmesso il progetto Definitivo all'Autorità di bacino Regionale per il nullaosta di competenza a valle del quale si procederà con l'espletamento delle gara per l'affidamento dei lavori. Per effetto della Convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 con la Provincia di Crotona sono state affidate in data 11 dicembre 2012 le progettazioni di altri 5 interventi (codice Rendis KR121B/10, KR126B/10; KR165B/10, KR171B/10 e KR172B/10) rispetto ai quali la Provincia ha provveduto a trasmettere alcuni dei progetti preliminari già stati esitati positivamente da questo ufficio con contestuale autorizzazione a proseguire nelle successive fasi progettuali.

- ✓ **Provincia di Vibo Valentia:** In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia" da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa" Codice Rendis VV072A/10; "Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato" Codice Rendis VV005A/10. I progetti preliminari di ambedue gli interventi son stati esitati positivamente da parte di questo ufficio e la Provincia sta provvedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali. Per effetto della sopra citata convenzione, in data 10 ottobre 2012, sono state affidate le progettazioni di altri 4 interventi, (codice rendis VV033A/10; VV034A/10; VV035A/10; VV036A/10) rispetto ai quali la Provincia ha provveduto a trasmettere i progetti Preliminari e questi sono già stati esitati positivamente da parte di questo ufficio con contestuale autorizzazione a proseguire nelle successive fasi progettuali. A seguito della manifestata impossibilità da parte della Provincia di Vibo Valentia a proseguire con le attività di progettazione, per carenza di risorse interne all'ufficio, il Commissario Straordinario sta provvedendo all'affidamento dei servizi di progettazione per alcuni degli interventi previsti. Inoltre per l'intervento cod. VV072A/10, la Provincia è stata autorizzata, con nota prot. n. 618/UC del 18.04.2013, a far ricorso alle procedure per l'affidamento di servizi professionali esterni.

### 9. Sede tecnica Ufficio del Commissario Delegato



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

Così come rappresentato nella relazioni precedenti, il Commissario ha stipulato un contratto di affitto con decorrenza dal 1 dicembre 2011 di un immobile nel Comune di Reggio Calabria, al termine della ristrutturazione dello stesso, da parte della proprietà, sono state avviate le attività necessarie per completamento ad ufficio:

- a) arredi per le risorse tecniche, direttamente tramite le Convenzioni Consip;
- b) fornitura di arredi e complementi non previsti nelle Convenzioni Consip;
- c) fornitura dei servizi e degli strumenti di telefonia e trasmissione/ricezione dati;
- d) fornitura di energia elettrica.

A tal riguardo si rappresenta che dalla terza decade di marzo 2012 gli uffici sono a tutti gli effetti operativi.

L'Ufficio è dotato di n. 1 ufficio riservato al Commissario e di n. 13 postazioni operative, tutte dotate di Pc, oltre ad una stanza "tecnica" (con plotter, stampante multifunzione e fotocopiatrice/scanner), altre strumentazioni operative (server, rete telefoni/dati) ed una stanza archivio per i progetti e la documentazione tecnica ricevuta e prodotta.

Riguardo la sede di Reggio Calabria, si evidenzia che nell'ambito della Convenzione con Invitalia era prevista a carico della medesima l'individuazione e l'affitto, di un locale avente caratteristiche idonee per la costituzione di un ufficio a Reggio Calabria. Invitalia ha proceduto ad una ricerca di mercato per individuare tale locale. Su tale indagine sono state basate anche le stime economiche per quantificare i costi della struttura di Reggio Calabria direttamente ricadenti sulla Convenzione.

Successivamente il Commissario Straordinario Delegato, avendo individuato autonomamente l'immobile da affittare, procedeva alla locazione (poi avvenuta in data 04/11/2011) di un immobile da destinare quale propria nuova sede, di caratteristiche tecniche tali da poter destinare parte dello stesso a ufficio del costituendo GdL di IAP, invitando Invitalia a soprassedere all'individuazione di una propria sede presso la città di Reggio Calabria e di provvedere



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

esclusivamente all'installazione dei beni hardware e software previsti per il GdL esterno IAP. Chiaramente tutte le spese relative all'affitto ed al completamento degli uffici (arredi e complementi, telefonia ecc) si intendevano stralciate dalla Convenzione con Invitalia.

Nello stesso tempo Invitalia ha provveduto a fornire i seguenti beni:

- postazioni pc fisse e ulteriore hardware (stampanti, scanner, fax), con estensioni garanzia e start-up;
- software per applicazioni tecniche (pacchetto geotecnico, topografico, grafico, contabilità e calcolo).

### **10. Personale utilizzato**

Con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, è stata costituita la Struttura di supporto dell'Ufficio commissariale, composta:

- da personale in avvalimento, proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai LL.PP, costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, tutti sotto forma di collaborazione in forma non continuativa come disposto dal DPCM 20.07.2011, e per i quali viene corrisposto un compenso corrispondente alle sole ore di straordinario volte presso l'Ufficio del Commissario, nel limite mensile di 30 ore.

In aggiunta a tale personale operano, a seconda delle necessità, presso gli Uffici di questo Commissario, tecnici facenti parte dei Gruppi di Lavoro specifici costituiti da Invitalia e dal CGIAM, non in rapporto di dipendenza, pertanto, del Commissario, contrattualizzati dalle stesse Società/Amministrazioni, a seguito di selezione pubblica, sulla base delle esigenze manifestate dallo stesso Commissario Delegato.

Non sono state affidate consulenze, né incarichi professionali, da parte dell'Ufficio del Commissario delegato in oggetto.





## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

### 11. Risorse finanziarie

La fonte finanziaria dell'Ufficio del Commissario deriva da:

- 1) € 39.071.177,08 trasferiti dal Ministero dell'Ambiente nella contabilità speciale dell'Ufficio Commissariale;
- 2) Risorse regionali rinvenienti dai PAIN e dai PAR, per € 180.928.822,24, ai sensi della Deliberazione CIPE n. 8/2012 (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno) del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;

Stante la previsione della Delibera CIPE 8/2012, a modifica di quanto previsto originariamente dall'Accordo di Programma, la copertura finanziaria degli interventi è quindi così garantita:

Accordo di Programma MATTM - Regione Calabria del 25 novembre 2010 - Ripartizione finanziaria					
Fonte finanziaria	MATTM	MATTM (L.266/2005 e L. 183/2011)	Regione Calabria Riduzione PAIN	Regione Calabria Riduzione PAR	TOTALE
Importo	€ 21.092.048,16	€ 17.979.129,60	€ 70.928.822,24	€ 110.000.000,00	€ 220.000.000,00
Percentuale	9,59%	8,17%	32,24%	50,00%	100,00%
	17,76%		82,24%		

In ragione delle decisioni assunte dalla Regione Calabria, in data 30 ottobre 2013 è stata sottoscritta una Convenzione tra la medesima Regione e l'Ufficio del Commissario per disciplinare le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie. Ad oggi non risultano trasferite risorse finanziarie riconducibili a tale fonte di finanziamento.



*Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

**Il Commissario Straordinario Delegato**

(Dott. Domenico Perolla)





*Al Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

**ALLEGATO 1**

**Lista degli interventi e sintesi stato delle singole attività**

PAGINA BIANCA



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

### **ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MATTM E REGIONE CALABRIA DEL 25.11.2010 E DELIBERA CIPE N. 8 DEL 20.01.2012 "FRANE E VERSANTI"**

Code Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
CZ 001A/10	Comune di Gimigliano	2.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	20/04/2014	1
CZ 002A/10	Comune di Catanzaro	2.100.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CS 003A/10	Comune di Rogliano	2.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	28/02/2014	1
CS 004A/10	Comune di Acri	1.500.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	06/12/2012	1
VV 005A/10	Provincia di VV	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
VV 006A/10	Comune di Vibo Valentia	2.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	30/01/2014	1
VV 007A/10	Comune di Vibo Valentia	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 008A/10	Comune di Aprigliano	1.400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 009A/10	Comune di Verbicaro	1.200.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 010A/10	Comune di Longobucco	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CZ 011A/10	Comune di Lamezia Terme	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 012A/10	Comune di Soveria Simeri	800.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 013A/10	Comune di Cosenza	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 014A/10	Comune di Firmo	600.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	29/08/2012	1
RC 015A/10	Comune di Oppido Mamertina	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 016A/10	Comune di Zumpano	1.100.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	22/03/2013	1
CS 017A/10	Comune di Zumpano	900.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	03/05/2013	1
RC 018A/10	Comune di Montebello Jonico	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 019A/10	Comune di Bisignano	1.100.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	10/01/2014	1
CS 020A/10	Comune di Bisignano	500.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	30/04/2014	1
KR 021A/10	Comune di Santa Severina	600.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	13/09/2012	1
RC 022A/10	Comune di Monasterace	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
KR 023A/10	Comune di Cutro	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

Codice Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
RC 024A/10	Comune di Marina di Gioiosa Ionica	800.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	15/05/2014	1
CS 025A/10	Provincia di CS	1.300.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	09/01/2013	1
KR 026A/10	Provincia di KR	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	31/01/2014	1
CZ 027A/10	Provincia di CZ	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 028A/10	Comune di Reggio Calabria	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 029A/10	Comune di Reggio Calabria	1.800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 030A/10	Comune di Reggio Calabria	1.800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 031A/10	Comune di Reggio Calabria	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 032A/10	Comune di Reggio Calabria	2.600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/07/2014	1
VV 033A/10	Provincia di VV	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
VV 034A/10	Provincia di VV	1.900.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
VV 035A/10	Provincia di VV	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
VV 036A/10	Provincia di VV	1.900.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
KR 037A/10	Provincia di KR	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
KR 038A/10	Provincia di KR	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	31/01/2014	1
KR 039A/10	Provincia di KR	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 040A/10	Comune di Lungro	2.300.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 041A/10	Provincia di CZ	2.800.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	30/06/2014	1
CZ 042A/10	Comune di Cardinale	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
VV 043A/10	Comune di Polia	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/01/2014	1
CS 044A/10	Comune di Cerisano	800.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
CZ 045A/10	Provincia di CZ	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 046A/10	Comune di Oriolo	1.100.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
KR 047A/10	Comune di Casabona	900.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CS 048A/10	Comune di Fagnano Castello	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 049A/10	Comune di Falconara Albanese	1.100.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1



## *Al Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

<b>Codice Rendis</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo Finanziato (€)</b>	<b>Tipo strumento</b>	<b>Stato procedurale</b>	<b>Tipo fase</b>	<b>Data prevista per OGV</b>	<b>Grado di priorità</b>
CS 050A/10	Comune di Fiumefreddo Bruzio	1.200.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 051A/10	Comune di Pedivigliano	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 052A/10	Comune di Reggio Calabria	4.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/07/2014	1
KR 053A/10	Comune di Rocca di Neto	300.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/03/2014	1
CZ 054A/10	Comune di Catanzaro	1.200.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	15/05/2014	1
CS 055A/10	Comune di Trebisacce	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 056A/10	Comune di Villapiana	800.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	23/05/2013	1
CS 057A/10	Comune di Maierà	800.000,00	SAD	affidamento	Conclusa	25/11/2013	1
CS 058A/10	Comune di Grisolia	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 059A/10	Comune di Tortora	600.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CZ 060A/10	Comune di Curinga	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 061A/10	Comune di Cardeto	400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 062A/10	Comune di Scalea	800.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	03/05/2013	1
CS 063A/10	Comune di San Giovanni in Fiore	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 064A/10	Comune di Careri	600.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	10/01/2014	1
CS 065A/10	Provincia di CS	3.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CZ 066A/10	Provincia di CZ	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CZ 067A/10	Comune di Tiriolo	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/03/2014	1
RC 068A/10	Provincia di RC	4.500.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	30/03/2014	1
CS 069A/10	Provincia di CS	4.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
RC 070A/10	Provincia di RC	3.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
KR 071A/10	Provincia di KR	2.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	31/01/2014	1
VV 072A/10	Provincia di VV	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 073A/10	Provincia di CZ	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CS 074A/10	Comune di Paola	900.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
VV 075A/10	Comune di Parghelia	900.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

<b>Codice Rendis</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo Finanziato (€)</b>	<b>Tipo strumento</b>	<b>Stato procedurale</b>	<b>Tipo fase</b>	<b>Data prevista per OGV</b>	<b>Grado di priorità</b>
VV 076A/10	Comune di Tropea	700.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
VV 077A/10	Comune di Zambrone	900.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
VV 078A/10	Comune di Drapia	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 079A/10	Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	900.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	10/01/2014	1
KR 080A/10	Comune di San Nicola dell'Alto	600.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
CZ 081A/10	Provincia di CZ	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CZ 082A/10	Provincia di CZ	800.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
RC 083A/10	Comune di Villa San Giovanni	500.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
RC 084A/10	Comune di Cinquefrondi	400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 085A/10	Comune di Varapodio	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 086A/10	Provincia di CZ	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 087A/10	Comune di San Pietro di Caridà	400.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
VV 088A/10	Comune di Dinami	400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 089B/10	Comune di Antonimina	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 090B/10	Comune di Santa Caterina Albanese	900.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 091B/10	Comune di Martirano	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
VV 092B/10	Comune di Drapia	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 093B/10	Comune di Rota Greca	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CZ 094B/10	Provincia di CZ	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 095B/10	Comune di Grotteria	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 096B/10	Comune di San Martino di Finita	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CZ 097B/10	Comune di Badolato	400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 098B/10	Comune di Mongrassano	1.000.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
RC 099B/10	Comune di Galatro	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 100B/10	Comune di Maida	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 101B/10	Comune di Benestare	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1





## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

Codice Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
RC 102B/10	Comune di Locri	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 103B/10	Comune di San Vincenzo La Costa	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 104B/10	Comune di Mammola	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 105B/10	Comune di Roggiano Gravina	500.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 106B/10	Provincia di CS	4.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CZ 107B/10	Provincia di CZ	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 108B/10	Comune di Verbicaro	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 109B/10	Comune di Longobucco	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 110B/10	Comune di Castrolibero	800.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 111B/10	Comune di Cetraro	800.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
CS 112B/10	Comune di Rende	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
KR 113B/10	Comune di Petilia Policastro	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 114B/10	Comune di Carolei	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
KR 115B/10	Comune di Verzino	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 116B/10	Comune di Mendicino	800.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
KR 117B/10	Comune di Mesoraca	1.000.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	20/01/2014	1
CS 118B/10	Comune di Trenta	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 119B/10	Comune di Serra Pedace	400.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
RC 120B/10	Comune di San Luca	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
KR 121B/10	Provincia di KR	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 122B/10	Provincia di CS	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 123B/10	Provincia di RC	2.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	01/05/2014	1
CS 124B/10	Provincia di CS	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 125B/10	Provincia di CS	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
KR 126B/10	Provincia di KR	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 127B/10	Provincia di CS	700.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

<b>Codice Rendis</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo Finanziato (€)</b>	<b>Tipo strumento</b>	<b>Stato procedurale</b>	<b>Tipo fase</b>	<b>Data prevista per OGV</b>	<b>Grado di priorità</b>
RC 128B/10	Provincia di RC	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
KR 129B/10	Comune di Cotronei	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 130B/10	Comune di Pedace	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 131B/10	Comune di Parenti	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 132B/10	Provincia di CZ	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CZ 133B/10	Comune di Santa Caterina dello ionio	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 134B/10	Provincia di CS	700.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CZ 135B/10	Comune di Falerna	1.000.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
CS 136B/10	Comune di Lappano	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 137B/10	Comune di Luzzi	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 138B/10	Provincia di RC	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 139B/10	Comune di Caloveto	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 140B/10	Comune di Caraffa del Bianco	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 141B/10	Comune di Civita	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 142B/10	Comune di Laino Castello	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 143B/10	Comune di Malito	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 144B/10	Comune di Malvito	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 145B/10	Comune di Mendicino	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 146B/10	Comune di Moloquio	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 147B/10	Comune di Papisidero	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 148B/10	Comune di San Donato di Ninea	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 149B/10	Comune di San Pietro a Maida	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 150B/10	Comune di San Sosti	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 151B/10	Comune di Sant'Agata di Esaro	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 152B/10	Comune di Scala Coeli	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 153B/10	Comune di Siderno	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

<b>Codice Rendis</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo Finanziato (€)</b>	<b>Tipo strumento</b>	<b>Stato procedurale</b>	<b>Tipo fase</b>	<b>Data prevista per OGV</b>	<b>Grado di priorità</b>
CS 154B/10	Comune di Morano Calabro	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 155B/10	Comune di San Basile	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 156B/10	Comune di San Cosmo Albanese	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 157B/10	Comune di Castroregio	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CZ 158B/10	Comune di San Floro	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 159B/10	Comune di San Pietro in Guarano	600.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 160B/10	Comune di Longobardi	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CZ 161B/10	Comune di Squillace	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 162B/10	Comune di Bagnara Calabra	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 163B/10	Provincia di CS	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 164B/10	Provincia di RC	2.600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	01/05/2014	1
KR 165B/10	Provincia di KR	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 166B/10	Provincia di CS	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 167B/10	Provincia di CS	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CS 168B/10	Provincia di CS	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 169B/10	Provincia di RC	2.400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 170B/10	Provincia di RC	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
KR 171B/10	Provincia di KR	6.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
KR 172B/10	Provincia di KR	1.700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 173B/10	Provincia di CS	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
VV 174B/10	Provincia di VV	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
VV 175B/10	Provincia di VV	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CZ 176B/10	Provincia di CZ	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 177B/10	Provincia di CZ	600.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CZ 178B/10	Provincia di CZ	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
VV 179B/10	Provincia di VV	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1



## *Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

<b>Codice Rendis</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo Finanziato (€)</b>	<b>Tipo strumento</b>	<b>Stato procedurale</b>	<b>Tipo fase</b>	<b>Data prevista per OGV</b>	<b>Grado di priorità</b>
RC 180B/10	Provincia di RC	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 181B/10	Provincia di CZ	2.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 182B/10	Provincia di CS	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CZ 183B/10	Provincia di CZ	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 184B/10	Provincia di CZ	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 185B/10	Comune di Belvedere Marittimo	700.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1



*Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

**ALLEGATO 2**

**Mappe “Categorie di rischio PAI associato all’intervento”**


PAGINA BIANCA



*Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

AP del 25/11/2010  
classificazione per rischio

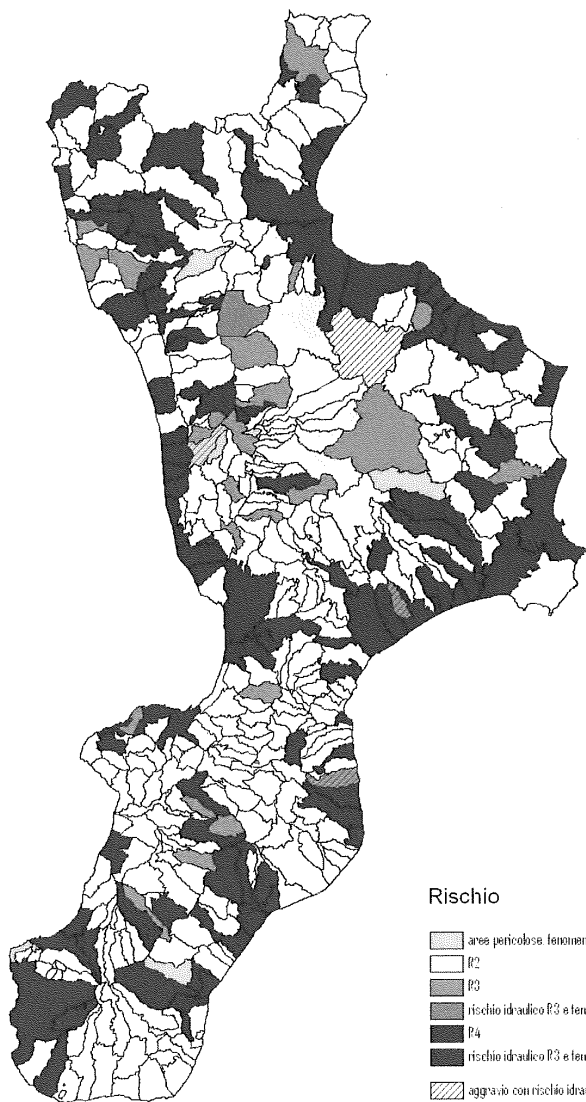

Rischio

- aree pericolose fenomeni di nuova genesi
- P2
- P3
- rischio idraulico P3 e fenomeni di nuova genesi
- P4
- rischio idraulico P3 e fenomeni di nuova genesi
- aggravio con rischio idraulico P4






*Il Commissario Straordinario Delegato*

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria  
ex DPCM 21.01.2011

**AP del 25/11/2010  
classificazione per tipologia di rischio**

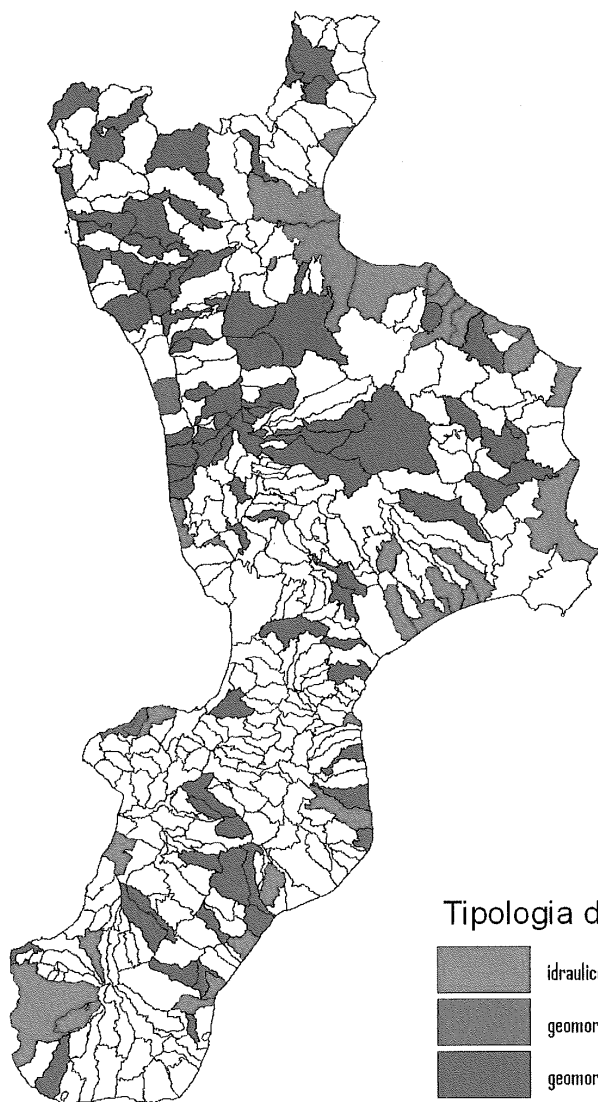

1:750000





*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio*

# Relazione annuale anno 2013

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 21 gennaio 2011

20/01/2014  
Commissario Straordinario Delegato  
Prof. ing. Giuseppe De Martino

PAGINA BIANCA

**1.1 ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA***( Compilare i campi sottostanti)*

<b>Regione</b>	CAMPANIA
<b>Commissario straordinario delegato</b>	Prof. ing. Giuseppe De Martino
<b>Decreto nomina</b>	D.P.C.M. 21 gennaio 2011
<b>Data sottoscrizione Accordo</b>	12/11/10
<b>Data sottoscrizione Accordo Integrativo</b>	Allegato 1 in data 26 aprile 2012
<b>Importo complessivo assentito in Accordo</b>	€ 220.000.000,00
<b>Importo programmato per il periodo (anno 2013)</b>	€ 43.730.189,00
<b>Importo speso per il periodo (anno 2013)</b>	€ 120.426,64

**1.2 CRICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE***Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.*

Le attività commissariali interessano interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in aree classificate a rischio 'elevato' e 'molto elevato' da frane o alluvione.

La classificazione delle aree è stata eseguita dalle Autorità di Bacino territorialmente competenti (Nazionale Liri-Garigliano e Volturno, Regionale della Campania Centrale, Regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, Regionale della Puglia e Interregionale del fiume Fortore) nell'ambito della redazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Gli interventi interessano tutte e cinque le provincie della Campania ed oltre cento comuni.

**1.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI***Descrivere la struttura commissariale sia dal punto di vista logistico sia come risorse umane.*

Dal punto di vista logistico, la struttura commissariale è ubicata al secondo piano dell'edificio sito in Nalpoli alla via De Gasperi 28, sede degli Assessorati ai Lavori Pubblici, dell'Ambiente e del Capo Area del Settore Difesa Suolo della Regione Campania (dott. Italo Giulivo).

L'ufficio messo a disposizione del Commissario fin dal gennaio 2011, risulta costituito da due soli vani adiacenti:

- il primo, di circa 15 mq, ubicato proprio di fronte ai servizi igienici sia femminili che maschili, è adibito a studio del Commissario;
- il secondo, attiguo al precedente, di circa 12 mq, è impegnato dal marzo 2012 (nell'anno 2011 e fino a febbraio 2012, il Commissario venne aiutato a titolo grazioso da suoi ex allievi,

attualmente docenti universitari) dai due collaboratori con contratti CO.CO.PRO.. I primi, con scadenza febbraio 2013, registrati alla Corte dei Conti Registro n. 06, Foglio 81 (CDC 14626/1012) e Foglio 82 (CDC 14627/1012); i secondi, con scadenza 20 gennaio 2014, registrati al n. 04 - Foglio n. 387 e 388 in data 24/05/2013.

Gli arredi, in entrambi i due vani, sono costituiti da scrivanie (una per lo studio del Commissario e due per lo studio dei collaboratori), armadi, computer di vecchio tipo, stampanti laser a solo colore nero e formato A4, due telefoni (uno in ogni stanza) e un fax. Nell'anno 2013 il Commissario è stato costretto ad acquistare un nuovo fax per sostituire quello precedente non più funzionante.

I due collaboratori, di adeguate capacità professionali, selezionati, a seguito di avviso pubblico, da apposita Commissione costituita da tre docenti universitari, a titolo grazioso, svolgono anche le funzioni di usciere, segretari, telefonisti, redazione decreti e ordinanze, digitazione, oltre ad essere adibiti alle funzioni per le quali furono selezionati.

Lo scrivente Commissario è stato costretto a ricorrere ai due collaboratori esterni in quanto la Regione Campania, l'ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo), le Autorità di Bacino ed altri enti pubblici non hanno mai ritenuto possibile affiancare al lavoro del Commissario propri dipendenti, atteso il 'sottodimensionamento del loro personale'.

Gli incontri con gli Enti (sempre numerosi e continui) si svolgono in un terzo studio (accanto a quello dei collaboratori), quando disponibile, perchè è spesso occupato dalle strutture regionali. Pertanto, più volte, il Commissario è costretto a ricevere presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università di Napoli Federico II.

Spesso, per l'esame dei vari livelli progettuali ricevuti dagli enti proponenti, il Commissario è costretto a ricorrere al proprio studio professionale!

Nonostante tutte le deficienze logistiche, il Commissario (che usa il proprio telefonino ed i mezzi pubblici a sue spese, ed acquista spesso anche la carta igienica) ritiene di avere finora svolto un ottimo lavoro, come di seguito illustrato nei successivi punti della presente nota.

Perché il Commissario accettò di fissare il proprio ufficio a via De Gasperi 28 pur se con le deficienze accennate?

Perché il suo compito prevedeva di interagire con la Regione Campania ed in particolare con il Capo Area del Settore Difesa Suolo.

Ritenne, inoltre, che i due vani assegnatigli erano solo provvisori e quindi in attesa di uffici più appropriati e dignitosi.

Purtroppo il provvisorio è diventato definitivo e il Commissario non ritiene di fissare, ora, la sua sede di ufficio presso altro Ente pubblico, perchè il trasferimento comporterebbe lavori onerosi, attesi i tanti e tanti fascicoli prodotti, le note degli enti, i progetti (originali e nelle edizioni aggiornate/integrate) e così via.

Perché il Commissario continua ad esercitare il proprio ruolo pur con le deficienze accennate?

Perché accettò la nomina solo per rendere un servizio al Paese e lo ha reso e lo rende ancora.

**1.4 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE**

Dichiarare quanto è stato versato sulla c.s. dal Ministero dell' Ambiente, dalla Regione, o da altre fonti sia con importo corrente che cumulato, lo speso, i relativi residui.

<b>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell' Ambiente</b>			
<b>Importo corrente</b> (per l'anno 2013)	<b>Importo cumulato</b> (anno 2013 + precedente periodo)	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
€ 36.465.532,33	€ 36.465.532,33	€ 409.508,23 *	€ 36.056.024,10

<b>Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti</b> (precisare: Regione Campania, importo ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico)			
<b>Importo corrente</b> (per l'anno 2013)	<b>Importo cumulato</b> (anno 2013 + precedente periodo)	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
€ 5.800.735,62	€ 5.800.735,62	€ 0,00	€ 5.800.735,62

**1.5 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA**

Indicare per ciascuna delle attività indicate nella seguente tabella il relativo stato di rendicontazione della spesa, considerando esclusivamente quanto effettivamente pagato.

<b>Descrizione attività</b>	<b>Importo speso corrente</b> (per l'anno 2013)	<b>Importo speso cumulato</b> (anno 2013 + precedente periodo)
struttura commissariale	€ 120.426,64	€ 409.508,23
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	€ 0,00 *	€ 0,00 *

\* Si evidenzia che non è stata finora pagata alcuna progettazione, in quanto il Commissario ha collaborato con i vari enti ed ha consentito la redazione di livelli progettuali di dettaglio (preliminare, definitivo, esecutivo) per molti degli interventi che inizialmente erano dotati di progetti ancor meno che preliminare e, in numerosi casi, carenti sia dal punto di vista tecnico che normativo.

**1.6 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE**

Allegare il prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013.

Prospetto riepilogativo entrate dal 1° gennaio 2013 a 31 dicembre 2013 - Contabilità Speciale 5586  
DataEntrataFonte Finanziaria22/11/13€ 5.800.735,62  
Regione Campania **Totale€ 5.800.735,62**

**Prospetto contabile riepilogativo uscite dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 – Contabilità speciale 5586**

Data	Uscite	Casuale
27/03/13	€ 15.730,00	Ordinativi n. 1 e 2 – Pagamento compenso Commissario periodo dal 1° Dicembre 2012 – 28 Febbraio 2013 – Decreto n. 30 del 01/03/2013
27/03/13	€ 9.000,00	Ordinativi nn. 3 e 4 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 8 del 02/03/2012, all'ing. Agostino Santillo – Liquidazione fattura n. 2/2013 relativa al periodo 1° Dicembre 2012 – 28 Febbraio 2013 - Decreto n. 29 del 01/03/2012
03/04/13	€ 7.500,00	Ordinativi nn. 5 e 6 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 9 del 05/03/2012, Dott. Giovanni Palmiero – Liquidazione fattura n. 2/2013 relativa al periodo 1° Dicembre 2012 – 28 Febbraio 2013 - Decreto n. 39 del 27/03/2012
01/08/13	€ 9.166,65	Ordinativi nn. 7 e 8 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 69 del 06/06/2013, Dott. Giovanni Palmiero – Liquidazione fattura n. 2/2013 relativa al periodo 22 Aprile 2013 – 21 Luglio 2013 - Decreto n. 88 del 24/07/2013
01/08/13	€ 11.000,00	Ordinativi nn. 9 e 10 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 68 del 03/06/2013, Ing. Agostino Santillo – Liquidazione fattura n. 6/2013 relativa al periodo 22 Aprile 2013 – 21 Luglio 2013 - Decreto n. 89 del 24/07/2013
01/08/13	€ 26.216,66	Ordinativi n. 11 e 12 – Pagamento compenso Commissario periodo dal 1° marzo 2013 – 31 luglio 2013 – Decreto n. 90 del 01/08/2013
20/11/13	€ 11.000,00	Ordinativi nn. 13 e 14 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 68 del 03/06/2013, Ing. Agostino Santillo – Liquidazione fattura n. 7/2013 relativa al periodo 22 Luglio 2013 – 21 ottobre 2013 - Decreto n. 114 del 07/11/2013
20/11/13	€ 9.166,66	Ordinativi nn. 15 e 16 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 69 del 06/06/2013, Dott. Giovanni Palmiero – Liquidazione fattura n. 7/2013 relativa al periodo 22 Luglio 2013 – 21 ottobre 2013 - Decreto n. 115 del 07/11/2013
09/12/13	€ 21.146,67	Ordinativi n. 17 e 18 – Pagamento compenso Commissario periodo dal 1° agosto 2013 – 31 novembre 2013 – Decreto n. 125 del 02/12/2013
12/12/13	€ 500,00	Ordinativo n. 19 – Fondo piccola cassa - Decreto n. 127 del 06/12/2013
<b>Totale</b>	<b>€ 120.426,64</b>	

J

Nelle seguenti tabelle A, B e C, allegate sono rispettivamente riportate:

Tab. A - Spese autorizzate per rilievi ed indagini;

Tab. B - Spese autorizzate per consulenze;

Tab. C - Spese autorizzate per progettazioni.

Cod. ISTAT	Cod. CIPE	Ente proponente	Comune interessato	Soggetto attuatore	Importo intervento	Importo indagini e rilievi
1	20	AdB Campania Centrale	Arienzo	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.100.000,00	€ 33.306,00
2	19	AdB Campania Centrale	Arienzo	Commissario Straordinario Delegato	€ 3.100.000,00	€ 46.360,00
7	27	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Airola	Commissario Straordinario Delegato	€ 3.000.000,00	€ 36.539,09
8	9	AdB Interregionale Fortore	Baselice	Commissario Straordinario Delegato	€ 80.000,00	€ 18.117,00
13	28	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Foglianise	Commissario Straordinario Delegato	€ 2.500.000,00	€ 47.925,98
25	33	AdB Campania Centrale	Carbonara di Nola	Commissario Straordinario Delegato	€ 8.326.621,32	€ 238.841,86
29	2	AdB Campania Centrale	Gragnano	Commissario Straordinario Delegato	€ 4.000.000,00	€ 44.698,66
39	52	Comune di Ariano Irpino	Ariano Irpino	Commissario Straordinario Delegato	€ 416.721,24	€ 8.000,00
43	4	Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro	Cervinara	AdB Fiumi Liri-Garigliano e Voltumo (Ordinanza n. 1 del 19/02/2013)	€ 3.000.000,00	€ 60.394,33
51	38	Comune di Ospedaletto d'Alpinolo	Ospedaletto d'Alpinolo	Commissario Straordinario Delegato	€ 5.000.000,00	€ 70.463,82
59	29	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Rotondi	Commissario Straordinario Delegato	€ 2.000.000,00	€ 73.200,00
62	30	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Serino	Commissario Straordinario Delegato	€ 4.000.000,00	€ 97.600,00
63	31	Comune di Amalfi	Amalfi	Comune di Amalfi (Ordinanza n. 5 del 08/03/2013)	€ 980.000,00	€ 4.148,00
68	53	Comune di Auletta	Auletta	Commissario Straordinario Delegato	€ 9.688.000,00	€ 174.932,86
74	43	Comune di Centola	Centola	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.500.000,00	€ 49.253,23
76	8	Comune di Fuore	Fuore	AdB Campania Sud	€ 5.400.000,00	€ 21.610,86
80	44	Comune di Novi Velia	Novi Velia	Commissario Straordinario Delegato	€ 2.500.000,00	€ 31.922,46
83	40	Comune di Pisciolta	Pisciolta	ARCADIS (Ordinanza n. 9 del 26/07/12)	€ 7.000.000,00	€ 82.994,64
84	48	Comune di Sala Consilina	Sala Consilina	Commissario Straordinario Delegato	€ 3.408.620,00	€ 24.073,04
85	56	Comune di Salerno	Salerno	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.000.000,00	€ 15.419,41
93	49	Comune di Torre Orsaia	Torre Orsaia	Commissario Straordinario Delegato	€ 9.500.000,00	€ 65.678,70
95		Autorità di Bacino Campania SUD	Amalfi, Conca dei Marini, Fuore e Positano	Commissario Straordinario Delegato	€ 6.648.951,38	€ 312.776,81
96	16	ARCADIS	San Felice a Cancelli, Quindici, Bracigliano, Samo e Stiano	ARCADIS (Ordinanza n. 1 del 06/02/12)	€ 1.476.000,00	€ 5.294,36
97	37	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Vari comuni	Commissario Straordinario Delegato	€ 5.000.000,00	€ 36.600,00
					<b>Importo totale</b>	<b>€ 1.600.149,12</b>

TABELLA A - Spese autorizzate per rilievi ed indagini

Cod ISTAT	Cod CIPE	Ente proponente	Comune interessato	Soggetto attuatore	Importo intervento	Consulenza ingegneristica	Consulenza geologica	Totale
1	20	AdB Campania Centrale	Arienzo	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.100.000,00		€ 8.710,80	€ 8.710,80
2	19	AdB Campania Centrale	Arienzo	Commissario Straordinario Delegato	€ 3.100.000,00		€ 12.444,00	€ 12.444,00
3	17	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Castelvotumo	AdB Fiumi Liri-Garigliano e Voltumo	€ 6.500.000,00	€ 48.214,40		€ 48.214,40
4	12	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Piedimonte Matese	Commissario Straordinario Delegato	€ 2.000.000,00	€ 19.032,00	€ 12.444,00	€ 31.476,00
7	27	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Airola	Commissario Straordinario Delegato	€ 3.000.000,00		€ 18.666,00	€ 18.666,00
8	9	AdB Interregionale Fortore	Baselice	Commissario Straordinario Delegato	€ 80.000,00	€ 4.500,00		€ 4.500,00
13	28	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Foglianise	Commissario Straordinario Delegato	€ 2.500.000,00		€ 18.666,00	€ 18.666,00
25	33	AdB Campania Centrale	Carbonara di Nola	Commissario Straordinario Delegato	€ 8.326.621,32		€ 18.666,00	€ 18.666,00
31	24	AdB Campania Centrale	Liverni	Commissario Straordinario Delegato	€ 3.300.000,00		€ 14.932,80	€ 14.932,80
34	25	AdB Campania Centrale	Roccarainola	Commissario Straordinario Delegato	€ 8.326.621,32	€ 12.688,00		€ 12.688,00
40	26	AdB Campania Centrale	Avella	Commissario Straordinario Delegato	€ 8.326.621,32	€ 44.408,00	€ 19.910,40	€ 64.318,40
43	4	Comunità Montana Pattenio Vallo di Lauro	Cervinara	AdB Fiumi Liri-Garigliano e Voltumo (Ordinanza n. 1 del 19/02/2013)	€ 3.000.000,00	€ 47.732,26		€ 47.732,26
51	38	Comune di Ospedaletto d'Alpinolo	Ospedaletto d'Alpinolo	Commissario Straordinario Delegato	€ 5.000.000,00	€ 25.376,00	€ 18.666,00	€ 44.042,00
55	34	Comune di Pago del Vallo di Lauro	Pago del Vallo di Lauro	Commissario Straordinario Delegato	€ 4.500.000,00	€ 25.376,00	€ 12.444,00	€ 37.820,00
59	29	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Rotondi	Commissario Straordinario Delegato	€ 2.000.000,00	€ 44.408,00		€ 44.408,00
60	50	Comune di Sant'Angelo a Scala	Sant'Angelo a Scala	Commissario Straordinario Delegato	€ 2.310.000,00	€ 19.032,00	€ 19.910,40	€ 38.942,40
62	30	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Serino	Commissario Straordinario Delegato	€ 4.000.000,00	€ 44.408,00		€ 44.408,00
74	43	Comune di Centola	Centola	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.500.000,00		€ 12.444,00	€ 12.444,00
80	44	Comune di Novi Velia	Novi Velia	Commissario Straordinario Delegato	€ 2.500.000,00		€ 14.932,80	€ 14.932,80
82	47	Comune di Perdifumo	Perdifumo	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.200.000,00	€ 19.032,00		€ 19.032,00
83	40	Comune di Pisciotta	Pisciotta	ARCADIS (Ordinanza n. 9 del 26/07/12)	€ 7.000.000,00		€ 22.399,20	€ 22.399,20
84	48	Comune di Sala Consilina	Sala Consilina	Commissario Straordinario Delegato	€ 3.408.620,00		€ 14.932,80	€ 14.932,80
85	56	Comune di Salerno	Salerno	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.000.000,00	€ 19.032,00		€ 19.032,00
89	36	Autorità di Bacino Campania Centrale	San Egidio Monte Albino	Commissario Straordinario Delegato	€ 5.350.847,01		€ 14.932,80	€ 14.932,80
93	49	Comune di Torre Orsaia	Torre Orsaia	Commissario Straordinario Delegato	€ 9.500.000,00	€ 6.344,00	€ 6.222,00	€ 12.566,00
94	7	Comune di Tramonti	Tramonti	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.236.396,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
97	37	AdB Liri-Garigliano Voltumo	Vari comuni	Commissario Straordinario Delegato	€ 5.000.000,00	€ 22.838,40		€ 22.838,40
<b>Importo totale</b>					<b>€ 407.421,06</b>	<b>€ 266.324,00</b>	<b>€ 673.745,06</b>	

TABELLA B - Spese autorizzate per consulenze



Cod. ISTAT	Cod. CIPE	Ente proponente	Comune interessato	Soggetto attuatore	Importo intervento	Importo
1	20	AdB Campania Centrale	Arienzo	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.100.000,00	€ 26.644,80
2	19	AdB Campania Centrale	Arienzo	Commissario Straordinario Delegato	€ 3.100.000,00	€ 46.945,60
25	33	AdB Campania Centrale	Carbonara di Nola	Commissario Straordinario Delegato	€ 8.326.621,32	€ 42.700,00
63	31	Comune di Amalfi	Amalfi	Comune di Amalfi (Ordinanza n. 5 del 06/03/2013)	€ 980.000,00	€ 37.810,24
74	43	Comune di Centola	Centola	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.500.000,00	€ 19.032,00
80	44	Comune di Novi Vella	Novi Vella	Commissario Straordinario Delegato	€ 2.500.000,00	€ 44.408,00
83	40	Comune di Pisciotta	Pisciotta	ARCADIS (Ordinanza n. 9 del 26/07/12)	€ 7.000.000,00	€ 49.483,20
94	7	Comune di Tramonti	Tramonti	Commissario Straordinario Delegato	€ 1.238.396,00	€ 15.927,13
					<b>Importo totale</b>	<b>€ 282.950,97</b>

TABELLA C - Spese autorizzate per progettazioni



## 1.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

### 1.7.1 Descrizione delle attività

*Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti realizzatori e rilevare gli eventuali ritardi/criticità rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento.*

Ai successivi punti da 1 a 92 è sintetizzata l'attività svolta dal Commissario nell'anno 2013.

1. In data 4 febbraio 2013 il Commissario ha partecipato, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, su convocazione del Direttore avv. Maurizio Pernice, ad un incontro con gli altri Commissari e le Regioni.

2. In data 8 gennaio 2013 il Commissario ha trasmesso la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno 2012, poi aggiornata secondo il format inviato dal MATTM, e quindi trasmessa nuovamente il 27 febbraio 2013.

3. In data 5 aprile 2013 su invito dell'ing. Luciani, dell'Ispettorato Generale il Commissario ha partecipato ad un incontro a Roma, presso il MATTM, per illustrare lo stato di avanzamento degli interventi di cui all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma.

4. In data 23 maggio 2013 su invito del dott. Donato, il Commissario ha partecipato ad un incontro presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, presente anche la dott.ssa Labonia, per discutere le conclusioni della nota inviata al MISE in data 12/04/2013.

5. In data 26 settembre 2013, il Commissario ha partecipato ad un incontro con il dott. Maurizio Pernice, Dirigente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per discutere sullo stato degli interventi all'approssimarsi della scadenza della nomina commissariale.

6. Nei giorni del 23 ottobre e 26 novembre 2013, il Commissario è stato sentito, quale persona informata dei fatti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, per l'intervento n. 16 della Delibera CIPE n. 8/2012 (interessante i comuni di San Felice a Cancelli, Quindici, Bracigliano, Sarno e Siano, ed avente l'ARCADIS quale ente proponente).

7. Come già comunicato nella precedente relazione annuale, si riporta, al fine di agevolare i riscontri successivi, lo stato progettuale per i 97 interventi (di cui n. 34 su FAS Statali, n. 23 su FAS Regionali, e n. 40 su bilancio gestionale regionale) desunto dall'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania:

- Stima dei costi - SC - n. 59,
- Studio di fattibilità - SF - n. 14,
- Progetto preliminare - PP - N. 14,
- Progetto definitivo - PD - N. 3,
- Progetto esecutivo - PE - n. 7

Nella quasi totalità dei casi la documentazione esistente trasmessa dagli enti presentava un livello progettuale differente da quello riportato nell'Allegato 1.

8. Non c'era sempre corrispondenza tra l'ente proponente riportato nell'Allegato 1 e quello effettivo.

9. Nell'Allegato 1 non sempre è riportato il livello di rischio (manca in n. 36 interventi) e la tipologia di fenomeno (manca in n. 5 interventi).

Praticamente, occorreva ripartire da zero.

10. Dall'utilizzo del sistema di protocollo definito in uscita (Com/Stra num/anno) ed in ingresso (Com/Stra IN num/anno), risulta che nell'anno 2013 sono stati protocollati in uscita 795 documenti, ed acquisiti 656.

11. Con Deliberazione del 20 gennaio 2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, la copertura finanziaria del fabbisogno occorrente per attuare i 57 interventi (previsti nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma con fonte finanziaria FAS), è assicurata con € 19.793.139,59 di risorse disponibili, e con le seguenti assegnazioni per il fabbisogno residuo:

- € 16.672.392,74 a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- € 75.534.467,67 fondi Riduzione PAIN;

- € 94.244.309,65 fondi PAR;

(di cui € 5.800.735,62 trasmessi dalla Regione Campania sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Delegato solo in data 22/11/2013);

mentre i restanti 40 interventi di cui all'Allegato 1 al citato Accordo di Programma sono previsti con fondi Regionali (residui ex leggi: n. 183/89, n. 267/89, n. 179/02 e cap 1137 Bilancio Gestionale) per un importo pari a € 15.755.690,35.

Nonostante vari solleciti, al 31 dicembre 2013 la Regione Campania non ha ancora reso disponibile al Commissario alcuna risorsa.

12. Relatore, su invito della Università della Calabria, nella 'Giornata della Difesa del suolo: La mitigazione del rischio idrogeologico', tenutasi a Rende (CS) il 20/11/2013, con intervento dal titolo: 'L'esperienza del Commissario Straordinario Delegato per il dissesto idrogeologico in Campania. Quali prospettive'. L'esposizione della relazione è stata svolta dal Commissario e dall'ing. Agostino Santillo.

13. Nei giorni del 28, 29 e 30 ottobre 2013, partecipazione alle visite di controllo dei funzionari dell'UVER, dott. Fabio Tocci Lucio Assogna, volte ad accertare lo stato attuativo di alcuni interventi. In particolare, nei primi due giorni sono stati incontrati, presso gli uffici del Commissario, i RUP di alcuni interventi, mentre il giorno 20 ottobre sono stati eseguiti sopralluoghi presso le aree interessate dagli interventi siti nel Comune di Buonalbergo (BN), intervento n. 11 della Delibera CIPE n. 8/2012, e nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), int. n. 13, della Delibera CIPE n. 8/2012.

14. Incontri con i Commissari Straordinari delegati per altre Regioni, a Napoli e a Roma (più volte).

15. Contatti con l'Ufficio di Controllo Legittimità per contratti CO.CO.PRO..

16. Sono stati effettuati gli incontri con i seguenti Enti:

Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici (geol. Italo Giulivo, Dirigente) (più volte);

Regione Campania, Assessorato ai Lavori Pubblici (prof. ing. Edoardo Cosenza) (più volte);

Regione Campania settore Ciclo Integrato delle Acque (ing. Martone);

Regione Campania settore Difesa Suolo (geol. Esposito);

Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno (dott.ssa Corbelli, ing. Velardo, geol. Capasso) (più volte);

Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale (ing. Marrazzo) (più volte);

Autorità di Bacino Regionale Campania Sud e Interregionale del Fiume Sele (avv. Sorvino, geol. Grimaldi, ing. Romano) (più volte);

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (più volte);

Provveditorato Opere Pubbliche Regione Campania (ing. Guglielmi, Provveditore);

Provincia di Benevento;

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;

Genio Civile di Napoli;

Comune di Andretta (AV);

Comune di Arienzo (CE) (più volte);  
Comune di Auletta (SA) (più volte);  
Comune di Avella (AV);  
Comune di Baselice (BN) (più volte);  
Comune di Campagna (SA) (più volte);  
Comune di Carbonara di Nola (NA) (più volte);  
Comune di casalbora (AV);  
Comune di Casamiciola Terme (NA);  
Comune di Castellammare di Stabia (NA) (più volte);  
Comune di Centola (SA) (più volte);  
Comune di Contursi Terme (SA);  
Comune di Foglianise (BN) (più volte);  
Comune di Liveri (NA) (più volte);  
Comune di Mercogliano (AV) (più volte);  
Comune di Novi Velia (SA);  
Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV) (più volte);  
Comune di Padula (SA);  
Comune di Pago del Vallo di Lauro (NA) (più volte);  
Comune di Paolisi (BN);  
Comune di Perdifumo (SA);  
Comune di Piedimonte Matese (CE);  
Comune di Pisciotta (SA) (più volte);  
Comune di Pratola Serra (AV);  
Comune di Roccarainola (NA) (più volte);  
Comune di Sala Consilina (SA);  
Comune di Sant'Angelo a Scala (AV);  
Comune di Torre Orsaia (SA);  
Comune di Tramonti (SA) (più volte).

17. Contatti con il Provveditorato delle Opere Pubbliche delle Regioni Campania e Molise.

18. Sono stati eseguiti vari sopralluoghi su larga scala e i seguenti puntuali sopralluoghi nei comuni interessati dagli interventi riportati nell'Allegato 1 (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nella Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012):

Comune di Baselice (BN), intervento n. 9, in data 09.04.2013;  
Comune di Pisciotta (SA), intervento n. 40, in data 29.05.2013;  
Comune di Buonalbergo (BN), intervento n. 11, in data 30.10.2013;  
Comune di Monteforte Irpino (AV), int. n. 41, in data 05.12.2013;  
Comune di Mercogliano (AV), int. n. 42, in data 05.12.2013;  
Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), int. n. 13, in data 30.10.2013.

19. Nel contempo, sono stati esaminati preliminarmente, dal sottoscritto Commissario e da suoi collaboratori, gli studi/progetti e redatte le relative note di sintesi degli interventi proposti dai seguenti Enti (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma):

- ARCADIS, progetto preliminare e progetto esecutivo int. n. 64 (Angri, integrazioni), perizia di variante int. 6 (San Felice a Cancellò), progetto esecutivo int. 96 e progetto preliminare int. 66;
- Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno, progetto preliminare int. 43 (Cervinara);
- Autorità di Bacino Campania Centrale, progetto preliminare int. 34 (Roccarainola);
- Autorità di Bacino Campania Centrale, progetto preliminare int. 89 (Sant'Egidio del Monte Albino);
- Genio Civile di Avellino, progetto definitivo int. n. 48 (Lioni, integrazioni) e progetto preliminare int. n. 61 (Santo Stefano del Sole);

- Genio Civile di Ariano Irpino, aggiornamenti progetti esecutivi intt. n. 38 (Ariano Irpino), 44 (Fontanarosa), 46 (Grottaminarda) e 52 (Montecalvo Irpino);
- Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, progetto esecutivo int. 89 (Sant'Egidio del Monte Albino, intervento parziale);
- Comunità Montana Vallo di Diano, progetto definitivo int. n. 87 (San Rufo) (e successivo aggiornamento);
- Comune di Amalfi (SA), progetto preliminare e progetto esecutivo int. n. 63 (e integrazioni/aggiornamenti);
- Comune di Arienzo (CE), progetto preliminare intt. nn. 1 e 2 (e successivo aggiornamento);
- Comune di Ascea (SA), progetto preliminare int. n. 65 (aggiornamento);
- Comune di Auletta (SA), progetto preliminare int. n. 68 (e successivo aggiornamento);
- Comune di Battipaglia (SA), progetto preliminare intt. nn. 69 e 70 (integrazioni);
- Comune di Campagna (SA), progetto definitivo int. n. 72 (aggiornamento e successivo);
- Comune di Carbonara di Nola (NA), progetto preliminare int. 25 (e aggiornamento);
- Comune di Casalbore (AV), progetto preliminare e progetto definitivo int. n. 41 (aggiornamento);
- Comune di Castellammare di Stabia (NA), progetto preliminare int. 27 (e successivo aggiornamento);
- Comune di Centola (SA), progetto preliminare int. n. 74 (e successivo aggiornamento);
- Comune di Contursi Terme (SA), progetto preliminare int. n. 75 (aggiornamento);
- Comune di Foglianise, progetto preliminare int. 13 (aggiornamento);
- Comune di Mercogliano (AV), progetto preliminare int. n. 49 (aggiornamento);
- Comune di Monteforte Irpino (AV), progetto preliminare (aggiornamento) e progetto definitivo int. n. 50;
- Comune di Novi Velia, progetto preliminare int. 80;
- Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), progetto preliminare int. n. 51 (aggiornamento);
- Comune di Perdifumo (SA), progetto definitivo int. n. 82 (e aggiornamento);
- Comune di Pago del Vallo di Lauro (NA), progetto preliminar int. 55 (e aggiornamento);
- Comune di Pratola Serra, progetto esecutivo int. n. 57 (integrazioni);
- Comune di Roccarainola, progetto preliminare int. 34;
- Comune di Sala Consilina (SA), progetto preliminare int. 84 (e successivi aggiornamenti).
- Comune di Salerno (SA), progetto preliminare int. 85 (aggiornamento);
- Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), progetto preliminar int. 60;
- Comune di Tramonti, progetto definitivo int. n. 94 (integrazione e successivo aggiornamento).

20. Per i seguenti 5 interventi aventi quali ente proponente il Genio Civile di Napoli, l'ente, anche a seguito di più solleciti da parte dello scrivente, non ha ancora provveduto alla comunicazione di informazioni in merito (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP): intt. nn. 28, 32, 33, 35 e 36.

21. Solo in data 26/06/2013 si è presentato l'ing. Magliulo, che ha comunicato al Commissario che il suo ufficio avrebbe provveduto. Ma alla data odierna nulla è pervenuto.

22. Agli enti che hanno provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, successivamente esaminata, sono state comunicate le risultanze dell'esame preliminare effettuato dal sottoscritto e dai suoi collaboratori, principalmente conclusosi con la richiesta di aggiornamento/correzione/integrazione degli elaborati ai dettami delle seguenti norme e ordinanze:

- DPR 207/2010;

- D.Lgs. 81/2008;

- Ordinanza Commissariale n. 1 (con cui i prezzi unitari di riferimento per l'aggiornamento della stima dei lavori sono individuati sulla base dei prezzi unitari del Prezzario Regionale della Campania anno 2010, con l'applicazione del ribasso del 20%).

23. Sono state preliminarmente esaminate nuove richieste di inserimento al finanziamento, pervenute alla Regione Campania e trasmesse per conoscenza al Commissario.

24. È stata eseguita la verifica tecnica dei progetti relativi ai seguenti interventi:

- progetto esecutivo intervento n. 8 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 9 della Delibera CIPE n. 8/2012 - Comune di Baselice);
- progetto esecutivo intervento n. 37 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 51 della Delibera CIPE n. 8/2012 - Comune di Andretta);
- progetto esecutivo intervento n. 48 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Avellino, interessante in Comune di Lioni);
- progetto esecutivo intervento n. 55 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Avellino, interessante in Comune di Montemiletto);
- progetto esecutivo intervento n. 56 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Avellino, interessante in Comune di Paternopoli);
- progetto esecutivo intervento n. 63 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 31 della Delibera CIPE n. 8/2012 - Comune di Amalfi);
- progetto esecutivo intervento n. 64 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 51 della Delibera CIPE n. 8/2012 - ARCADIS, interessante in Comune di Angri);
- progetto definitivo intervento n. 76 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 8 della Delibera CIPE n. 8/2012 - Autorità di Bacino Campania Sud, interessante in Comune di Furore);
- progetto esecutivo intervento n. 86 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 57 della Delibera CIPE n. 8/2012 - Comune di San Giovanni a Piro).

25. Con Decreto Commissariale n. 40 del 27 marzo 2013, il Commissario ha nominato la Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa dei soli titoli per le candidature che perverranno agli avvisi "Monitoraggio ed elaborazioni informatiche di supporto al Commissario straordinario relative agli interventi dell'Accordo di Programma" e "Monitoraggio tecnico e amministrativo di supporto al Commissario Straordinario delegato".

26. Con Decreto Commissariale n. 45 del 19 aprile 2013, sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa delle candidature relative all'avviso "Monitoraggio ed elaborazioni informatiche di supporto al Commissario straordinario relative agli interventi dell'Accordo di Programma", da cui risulta vincitore l'ing. Agostino Santillo.

27. Con Decreto Commissariale n. 45 del 19 aprile 2013, sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa delle candidature relative all'avviso "Monitoraggio tecnico e amministrativo di supporto al Commissario Straordinario delegato", da cui risulta vincitore il dott. Giovanni Palmiero.

28. Con nota in data 22/04/2013 il Commissario ha richiesto alla Corte dei Conti, Ufficio di Controllo sugli atti Ministeriali, il parere di legittimità sui due contratti di lavoro CO.CO.PRO. predisposti con i due collaboratori risultati vincitori della procedura pubblica di selezione (ing. Agostino Santillo e dott. Giovanni Palmiero), a far data dal 22 aprile 2013 e fino al 21 gennaio 2014.

29. Con nota anticipata via fax in data 24/05/2013, il predetto Ufficio di Controllo sugli atti Ministeriali ha comunicato che i contratti dell'ing. Agostino Santillo e del dott. Giovanni Palmiero sono stati registrati al n. 04 - foglio n. 387 e 388 in data 24/05/2013.

30. Con Decreto Commissariale n. 68 del 3 giugno 2013, è stato approvato il contratto di lavoro a progetto firmato in data 22/04/2013, tra il Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 21/01/2011 e l'ing. Agostino Santillo.

31. Con Decreto Commissariale n. 69 del 3 giugno 2013, è stato approvato il contratto di lavoro a progetto firmato in data 22/04/2013, tra il Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 21/01/2011 e il dott. Giovanni Palmiero.

32. Poiché gli uffici tecnici di più enti proponenti gli interventi di cui alla Deliberazione del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 e all'Allegato 1 all'Accordo di Programma, si sono dichiarati non in grado di provvedere alla redazione delle varie fasi progettuali con le proprie risorse tecniche, con Decreto Commissariale n. 36 del 18 marzo 2013, il Commissario ha disposto di formare un



elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.), mediante avviso pubblico.

33. Con Decreto Commissariale n. 47 del 6 maggio 2013, il Commissario ha approvato l'elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.).

34. Con Avviso Pubblico in data 28 maggio 2013 (pubblicato su B.U.R.C., S.I.T.A.R., e sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato), il Commissario ha disposto di riaprire i termini relativi all'avviso pubblico in data 28/03/2013 per la formazione di un elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed ulteriori servizi accessori e specialistici di importo inferiore a € 100.000,00 (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Il termine ultimo per la presentazione delle domande di inserimento nella short-list è fissato per il 28/06/2013.

35. Sono stati individuati i soggetti attuatori per gli interventi di cui ai seguenti interventi:

- \* n. 4 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 43 dell'Allegato 1 all'AdP): Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno con Ordinanza n. 1 del 19 febbraio 2013
- \* n. 8 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 76 dell'Allegato 1 all'AdP): Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele con Ordinanza n. 2 del 20 febbraio 2013
- \* n. 10 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 95 dell'Allegato 1 all'AdP): Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele con Ordinanza n. 3 del 21 febbraio 2013
- \* accorpamento degli intt. nn. 1 e 2 della Delibera CIPE n. 8/2012 (nn. 5 e 6 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 4 del 27 febbraio 2013
- \* n. 31 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 63 dell'Allegato 1 all'AdP): Comune di Amalfi con Ordinanza n. 5 del 6 marzo 2013
- \* n. 45 dell'Allegato 1 all'AdP: Genio Civile di Avellino con Ordinanza n. 6 del 12 aprile 2013
- \* n. 47 dell'Allegato 1 all'AdP: Genio Civile di Avellino con Ordinanza n. 7 del 12 aprile 2013
- \* n. 7 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 94 dell'Allegato 1 all'AdP): Comune di Tramonti con Ordinanza n. 8 del 25 novembre 2013

36. A seguito della comunicazione del Comune di Quadrelle (NA) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 35 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 58 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 37 del 25 marzo 2013 è stato nominato il Comune di Quadrelle (NA) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 35 della Delibera CIPE.

37. A seguito della comunicazione del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise di essere disponibile a progettare l'intervento n. 24 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 31 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 49 del 7 maggio 2013 è stato nominato il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise ente preposto alla progettazione dell'int. n. 24 della Delibera CIPE, col supporto di funzionari dell'Autorità di Bacino.

38. A seguito della comunicazione del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise di essere disponibile a progettare l'intervento n. 26 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 40 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 50 del 7 maggio 2013 è stato nominato il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise ente preposto alla progettazione dell'int. n. 26 della Delibera CIPE, col supporto di funzionari dell'Autorità di Bacino.

39. A seguito della comunicazione del Comune di Airola (BN) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 27 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 7 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al

gh

relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con Decreto Commissariale n. 70 del 12 giugno 2013 è stato nominato il Comune di Airola (BN) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 27 della Delibera CIPE.

40. A seguito della comunicazione del Comune di Foglianise (BN) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 28 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 13 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con Decreto Commissariale n. 71 del 14 giugno 2013 è stato nominato il Comune di Foglianise (BN) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 27 della Delibera CIPE.

41. A seguito della comunicazione del Comune di Liveri (NA) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 24 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 31 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 79 del 5 luglio 2013 è stato nominato il Comune di Liveri (NA) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 24 della Delibera CIPE.

42. A seguito della comunicazione del Comune di Casamicciola Terme (NA) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 18 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 26 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 96 del 20 agosto 2013 è stato nominato il Comune di Casamicciola Terme (NA) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 18 della Delibera CIPE.

43. A seguito della comunicazione del Comune di Piedimonte Matese (CE) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 12 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 4 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con Decreto Commissariale n. 103 del 25 agosto 2013 è stato nominato il Comune di Piedimonte Matese (CE) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 12 della Delibera CIPE.

44. A seguito della comunicazione del Comune di Avella (AV) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 26 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 40 dell'Allegato 1 all'AdP), ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 112 del 4 novembre 2013 è stato nominato il Comune di Avella (AV) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 26 della Delibera CIPE.

45. Sono stati nominati i Responsabili del Procedimento dei seguenti interventi, con riferimento al n. Progr. Cod. ISTAT dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma:

- int. n. 63, RUP ing. Aristide Marini - Decreto n. 6 del 10 gennaio 2013;
- int. n. 81, RUP geom. Angelo D'Aniello - Decreto n. 12 del 22 gennaio 2013;
- int. n. 51, RUP arch. Vincenzo Gargano - Decreto n. 13 del 24 gennaio 2013;
- int. n. 71, RUP ing. Mariano Serra - Decreto n. 14 del 24 gennaio 2013;
- int. n. 23, RUP ing. Gennaro Fusco - Decreto n. 16 del 30 gennaio 2013;
- int. n. 85, RUP ing. Massimo Natale - Decreto n. 20 del 13 febbraio 2013;
- int. n. 50, RUP ing. Raffaele Monaco - Decreto n. 22 del 18 febbraio 2013;
- int. n. 74, RUP geom. Remo Fedullo - Decreto n. 24 del 19 febbraio 2013;
- int. n. 75, RUP arch. Nicola Vitolo - Decreto n. 26 del 28 febbraio 2013;
- int. n. 29, RUP arch. Marina La Greca - Decreto n. 27 del 28 febbraio 2013;
- int. n. 89, RUP ing. Domenico D'Alterio - Decreto n. 28 dell'1 marzo 2013;
- int. n. 68, RUP geom. L. Michele Soldovieri - Decreto n. 34 del 6 marzo 2013;
- int. n. 27, RUP ing. Giovanni Angellotto - Decreto n. 35 del 6 marzo 2013;
- int. n. 65, RUP dott. Giuseppe Criscuolo - Decreto n. 41 del 10 aprile 2013;
- int. n. 87, RUP ing. Michele Rienzo - Decreto n. 42 del 10 aprile 2013;
- int. n. 17, RUP arch. Aniello Perone - Decreto n. 43 dell'11 aprile 2013;
- int. n. 84, RUP ing. Attilio De Nigris - Decreto n. 48 del 6 maggio 2013;
- int. n. 83, RUP geom. Marcello Saturno - Decreto n. 51 dell'8 maggio 2013;
- int. n. 90, RUP ing. Salvatore Iozzino - Decreto n. 52 del 13 maggio 2013;
- int. n. 91, RUP ing. Salvatore Iozzino - Decreto n. 53 del 13 maggio 2013;
- int. n. 92, RUP ing. Salvatore Iozzino - Decreto n. 54 del 13 maggio 2013;
- int. n. 54, RUP ing. Salvatore Iozzino - Decreto n. 55 del 13 maggio 2013;



- int. n. 11, RUP arch. Domenico Itri - Decreto n. 56 del 14 maggio 2013;
- int. n. 12, RUP arch. Domenico Itri - Decreto n. 57 del 14 maggio 2013;
- int. n. 14, RUP arch. Domenico Itri - Decreto n. 58 del 14 maggio 2013;
- int. n. 15, RUP ing. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 59 del 14 maggio 2013;
- int. n. 19, RUP ing. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 60 del 14 maggio 2013;
- int. n. 20, RUP ing. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 61 del 14 maggio 2013;
- int. n. 21, RUP arch. Domenico Itri - Decreto n. 62 del 14 maggio 2013;
- int. n. 66, RUP ing. Roberto Vacca - Decreto n. 63 del 20 maggio 2013;
- int. n. 67, RUP ing. Roberto Vacca - Decreto n. 64 del 20 maggio 2013;
- int. n. 89, RUP arch. Marina Scala in sostituzione dell'ing. Domenico D'Alterio - Decreto n. 67 del 3 giugno 2013;
- int. n. 60, RUP geom. Alfonso Pellegrino - Decreto n. 74 del 20 giugno 2013;
- int. n. 1, RUP ing. Gianfranco Belcuore - Decreto n. 76 del 26 giugno 2013;
- int. n. 2, RUP ing. Gianfranco Belcuore - Decreto n. 77 del 26 giugno 2013;
- int. n. 3, RUP dott. geol. Gennaro Capasso - Decreto n. 80 dell'8 luglio 2013;
- int. n. 39, RUP ing. Raffaele Ciasullo - Decreto n. 81 dell'8 luglio 2013;
- int. n. 75, RUP arch. Gabriella Landi - Decreto n. 84 del 12 luglio 2013;
- int. n. 13, RUP geom. Cosimo Mazzone - Decreto n. 87 del 23 luglio 2013;
- int. n. 80, RUP geom. Mario De Cesare - Decreto n. 91 dell'1 agosto 2013;
- int. n. 58, RUP arch. Alfonso Fiordelisi - Decreto n. 94 del 9 agosto 2013;
- int. n. 7, RUP ing. Luigi Rianna - Decreto n. 95 del 19 agosto 2013;
- int. n. 26, RUP ing. Gaetano Grasso - Decreto n. 97 del 21 agosto 2013;
- int. n. 59, RUP dott. geol. Gennaro Capasso - Decreto n. 98 del 28 agosto 2013;
- int. n. 62, RUP dott. geol. Gennaro Capasso - Decreto n. 99 del 29 agosto 2013;
- int. n. 97, RUP ing. Massimo Morea - Decreto n. 100 del 30 agosto 2013;
- int. n. 31, RUP dott. Raffaele Quindici - Decreto n. 101 del 10 settembre 2013;
- int. n. 8, RUP geom. Leonardo Parisi in sostituzione del dott. Leonardo Bianco - Decreto n. 102 del 10 settembre 2013;
- int. n. 4, RUP ing. Pietro Terrevi - Decreto n. 104 del 27 settembre 2013;
- int. n. 31, RUP arch. Anna Maria Pandico in sostituzione del dott. Raffaele Quindici - Decreto n. 106 del 9 ottobre 2013;
- int. n. 50, RUP geom. Antonio Riccio in sostituzione dell'ing. Raffaele Monaco - Decreto n. 108 del 23 ottobre 2013;
- int. n. 40, RUP ing. Sebastiano Mario Napolitano - Decreto n. 113 del 5 novembre 2013;
- int. n. 94, RUP ing. Gaetano Francese in sostituzione dell'ing. Mario Gaeta - Decreto n. 123 del 27 novembre 2013;
- int. n. 89, RUP geom. Giovanfiore Catalano in sostituzione dell'arch. Marina Scala - Decreto n. 126 del 4 dicembre 2013.

46. Sono stati approvati i progetti preliminari dei seguenti interventi (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):

- int. n. 41 (interessante il Comune di Casalbore (AV) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 300.000,00 - Decreto n. 11 del 22 gennaio 2013;
- int. n. 64 (interessante il Comune di Angri (SA) ed avente l'ARCADIS quale soggetto attuatore), per l'importo complessivo di € 2.200.000,00 - Decreto n. 15 del 29 gennaio 2013;
- int. n. 56 (interessante il Comune di Salerno ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 - Decreto n. 21 del 14 febbraio 2013;
- int. n. 50 (interessante il Comune di Monteforte Irpino ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 - Decreto n. 23 del 19 febbraio 2013;

- int. n. 51 (interessante il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 4.137.454,18 - Decreto n. 25 del 27 febbraio 2013;
  - int. n. 63 (interessante il Comune di Amalfi ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 980.000,00 - Decreto n. 33 del 5 marzo 2013;
  - int. n. 68 (interessante il Comune di Auletta ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 9.599.862,51 - Decreto n. 38 del 26 marzo 2013;
  - int. n. 69 (interessante il Comune di Battipaglia (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.120.000,00 - Decreto n. 72 del 17 giugno 2013;
  - int. n. 70 (interessante il Comune di Battipaglia (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 - Decreto n. 73 del 17 giugno 2013;
  - int. n. 49 (interessante il Comune di Mercogliano (AV) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.563.700,00 - Decreto n. 75 del 26 giugno 2013;
  - int. n. 63 (interessante il Comune di Amalfi (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 2.487.667,00 - Decreto n. 78 del 5 luglio 2013;
  - int. n. 55 (interessante il Comune di Pago del Vallo di Lauro (NA), ed avente l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 4.500.000,00 - Decreto n. 83 del 9 luglio 2013;
  - int. n. 29 (interessante il Comune di Gragnano (AV), ed avente l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 - Decreto n. 82 dell'8 luglio 2013;
  - int. n. 74 (interessante il Comune di Centola (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 - Decreto n. 93 del 5 agosto 2013;
  - int. n. 13 (interessante il Comune di Foglianise (BN) ed avente lo stesso Comune quale ente preposto alla progettazione), per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 - Decreto n. 116 del 18 novembre 2013;
  - int. n. 84 (interessante il Comune di Sala Consilina (SA), ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), con osservazioni, per l'importo complessivo di € 3.408.620,00 - Decreto n. 131 del 10 dicembre 2013;
  - int. n. 1 (interessante il Comune di Arienzo (CE), ed avente lo stesso Comune quale ente preposto alla progettazione), per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 - Decreto n. 133 del 16 dicembre 2013;
  - int. n. 66 (interessante il Comune di Atrani (SA) ed avente l'ARCADIS quale ente proponente), con osservazioni, per l'importo complessivo di € 900.000,00 - Decreto n. 134 del 19 dicembre 2013.
47. Sono stati approvati i progetti definitivi dei seguenti interventi (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):
- int. n. 61 (interessante il Comune di Santo Stefano del Sole (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 722.998,56 - Decreto n. 10 del 15 gennaio 2013;
  - int. n. 48 (interessante il Comune di Lioni (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 622.500,00 - Decreto n. 44 del 16 aprile 2013;
  - int. n. 56 (interessante il Comune di Paternopoli (AV), ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 70.000,00 - Decreto n. 119 del 29 ottobre 2013;
  - int. n. 94 (interessante il Comune di Tramonti (SA), ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.234.329,10 - Decreto n. 130 del 9 dicembre 2013.

48. Sono stati approvati i progetti esecutivi dei seguenti interventi (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):

- int. n. 57 (interessante il Comune di Pratola Serra (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 80.000,00 - Decreto n. 18 del 31 gennaio 2013;
- int. n. 63 (interessante il Comune di Amalfi (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 980.000,00 - Decreto n. 107 del 16 ottobre 2013;
- int. n. 48 (interessante il Comune di Lioni (AV), ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 622.500,00 - Decreto n. 109 del 28 ottobre 2013;
- int. n. 53 (interessante il Comune di Montemiletto (AV), ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 23.999,23 - Decreto n. 110 del 29 ottobre 2013;
- int. n. 61 (interessante il Comune di Santo Stefano del Sole (AV), ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 723.000,00 - Decreto n. 117 del 20 novembre 2013;
- int. n. 38 (interessante il Comune di Ariano Irpino (AV), ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 91.204,31 - Decreto n. 118 del 20 novembre 2013;
- int. n. 44 (interessante il Comune di Fontanarosa (AV), ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 148.690,78 - Decreto n. 119 del 20 novembre 2013;
- int. n. 46 (interessante il Comune di Grottaminarda (AV), ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 74.356,99 - Decreto n. 120 del 21 novembre 2013;
- int. n. 52 (interessante il Comune di Montecalvo Irpino (AV), ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 182.537,02 - Decreto n. 121 del 21 novembre 2013;
- int. n. 96 (interessante i Comuni di San Felice a Cancelli, Quindici, Bracigliano, Sarno e Siano, ed avente l'ARCADIS quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.476.000,00 - Decreto n. 128 del 6 dicembre 2013.

49. Con Decreto Commissariale n. 17 del 31 gennaio 2013, è stato approvato, in linea tecnica, il quadro economico riepilogativo dell'intervento riportato al n. 13 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 64 dell'Allegato 1 all'AdP), per un importo complessivo di € 14.825.247,41, di cui solo € 10.000.000,00 finanziati dalle risorse PAR quale contributo straordinario.

50. Con Decreto Commissariale n. 123 del 27 novembre 2013, il Commissario ha accorpato in un unico intervento i due riportati ai nn. 54 e 55 della Deliberazione CIPE n. 8/2012 (nn. 69 e 70 dell'Allegato 1 all'AdP).

51. Ai fini del monitoraggio RENDIS, sono state comunicate all'ISPRA, tramite le modalità telematiche del sistema ReNDIS-web, le seguenti informazioni (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP): decreto di nomina dei R.U.P. degli interventi 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 39, 40, 50, 51, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 75, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 97; decreto di approvazione di progetti preliminari degli interventi 1, 3, 29, 41, 49, 50, 51, 55, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 74, 84 e 85; decreto di approvazione dei progetti definitivi degli interventi 48, 61 e 94; decreto di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi 38, 44, 46, 48, 52, 53, 56, 57, 61, 63 e 96; decreto di approvazione della perizia di variante dell'intervento 24; comunicazione dei CUP degli interventi 41, 54, 90, 91 e 92; comunicazione dell'autorizzazione ad indagini e studi degli interventi 8, 39, 63, 84 e 85.



52. Con Decreto Commissariale n. 3 del 10 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 62.900,00 per il compenso del Commissario Straordinario relativo al periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013.
53. Con Decreto Commissariale n. 4 del 10 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 6.000,00 per il compenso del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo relativo al periodo dal 01/01/2013 al 28/02/2013.
54. Con Decreto Commissariale n. 5 del 10 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 5.000,00 per il compenso del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero relativo al periodo dal 01/01/2013 al 28/02/2013.
55. Con Decreto Commissariale n. 29 dell'1 marzo 2013, è stato disposto il pagamento del quarto acconto (saldo) del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo, per un importo complessivo di € 9.000 (trimestre dicembre 2012 - febbraio 2013).
56. Con Decreto Commissariale n. 30 dell'1 marzo 2013, è stato disposto il pagamento della somma complessiva a favore del Commissario, per il periodo 1 dicembre 2012 - 28 febbraio 2013, per un importo lordo pari ad € 15.730,00.
57. Con Decreto Commissariale n. 39 del 27 marzo 2013, è stato disposto il pagamento del quarto acconto (saldo) del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero, per un importo complessivo di € 7.500 (trimestre dicembre 2012 - febbraio 2013).
58. Con Decreto Commissariale n. 88 del 24 luglio 2013, è stato disposto il pagamento del primo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero, per un importo complessivo di € 9166,67 (trimestre aprile 2013 - giugno 2013).
59. Con Decreto Commissariale n. 89 del '1 marzo 2013, è stato disposto il pagamento del primo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo, per un importo complessivo di € 11.000,00 (trimestre aprile 2013 - giugno 2013).
60. Con Decreto Commissariale n. 90 dell'1 agosto 2013, è stato disposto il pagamento della somma complessiva a favore del Commissario, per il periodo 1 marzo 2013 - 31 luglio 2013, per un importo lordo pari ad € 26216,66.
61. Con Decreto Commissariale n. 114 del 7 novembre 2013, è stato disposto il pagamento del primo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo, per un importo complessivo di € 11.000,00 (trimestre luglio 2013 - settembre 2013).
62. Con Decreto Commissariale n. 115 dell'8 novembre luglio 2013, è stato disposto il pagamento del primo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero, per un importo complessivo di € 9166,67 (trimestre luglio 2013 - settembre 2013).
63. Con Decreto Commissariale n. 125 del 2 dicembre 2013, è stato disposto il pagamento della somma complessiva a favore del Commissario, per il periodo 1 agosto 2013 - 30 settembre 2013, per un importo lordo pari ad € 26216,66.
64. Con Decreto Commissariale n. 1 del 7 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 3.000.000,00 per l'attuazione dell'intervento n. 4 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 43 dell'Allegato 1 all'AdP).
65. Con Decreto Commissariale n. 2 dell'8 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 5.400.000,00 per l'attuazione dell'intervento n. 8 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 76 dell'Allegato 1 all'AdP).
66. Con Decreto Commissariale n. 7 dell'11 gennaio 2013 è stata impegnata la somma complessiva di € 15.888.000,00, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione degli interventi nn. 38, 53 e 47 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (rispettivamente nn. 51, 68 e 82 dell'Allegato 1 all'AdP).
67. Con Decreto Commissariale n. 8 del 14 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 980.000,00 per l'attuazione dell'intervento n. 31 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 63 dell'Allegato 1 all'AdP).
68. Con Decreto Commissariale n. 9 del 15 gennaio 2013 è stata impegnata la somma di € 1.446.080,00 per l'attuazione dell'intervento n. 32 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 72 dell'Allegato 1 all'AdP).

69. Con Ordinanza Commissariale n. 1 del 19 febbraio 2013 è stata impegnata la somma complessiva di € 3.000.000,00, per l'attuazione dell'intervento n. 4 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 43 dell'Allegato 1 all'AdP).

70. Con Ordinanza Commissariale n. 2 del 20 febbraio 2013 è stata impegnata la somma complessiva di € 5.400.000,00, per l'attuazione dell'intervento n. 8 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 76 dell'Allegato 1 all'AdP).

71. Con Ordinanza Commissariale n. 3 del 21 febbraio 2013 è stata impegnata la somma complessiva di € 6.648.951,38, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione dell'intervento n. 10 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 95 dell'Allegato 1 all'AdP)

72. Con Ordinanza Commissariale n. 4 del 27 febbraio 2013:

- sono state accorpate le somme previste per l'attuazione degli interventi nn. 1 e 2 della Deliberazione n. 8 del 20 gennaio 2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012 (NN° progr. Cod. ISTAT 5 e 6 dell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma) per consentire l'attuazione del solo intervento n. 2 della Deliberazione n. 8/2012 del CIPE (N° progr. Cod. ISTAT 6 dell'Allegato 1 al citato AdP);

- è stata impegnata la somma complessiva di € 2.283.204,20, per l'attuazione dell'intervento n. 2 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 6 dell'Allegato 1 all'AdP).

73. Con Ordinanza Commissariale n. 5 del 6 marzo 2013 è stata impegnata la somma complessiva di € 980.000,00, per l'attuazione dell'intervento n. 31 della Delibera CIPE del 20/01/2012 (n. 63 dell'Allegato 1 all'AdP).

74. Con Ordinanza Commissariale n. 6 del 12 aprile 2013 è stata impegnata la somma complessiva di € 656.735,64, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione dell'intervento n. 45 dell'Allegato 1 all'AdP.

75. Con Ordinanza Commissariale n. 7 del 12 aprile 2013 è stata impegnata la somma complessiva di € 167.500,00, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione dell'intervento n. 47 dell'Allegato 1 all'AdP.

76. Con Decreto Commissariale n. 19 del 12 febbraio 2013, è stato nominato il prof. Maurizio Giugni, presidente della commissione giudicatrice la gara d'appalto dell'int. n. 11 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 9 dell'Allegato 1 all'AdP).

77. A seguito di richieste formulate da vari enti preposti alla progettazione degli interventi, con riferimento a quanto sinteticamente contenuto nella precedente 'Tabella A', sono state autorizzate le seguenti somme preventive per rilievi ed indagini ritenuti propedeutici per la redazione dei progetti (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nella Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012):

- n. 9 (ente preposto: Comune di Baseliace) - € 17.968,50;

- n. 25 (ente preposto: Comune di Carbonara di Nola) - € 238.841,86;

- n. 28 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 47.533,16;

- n. 29 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 72.600,00;

- n. 30 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 96.800,00;

- n. 31 (ente preposto: Comune di Amalfi) - € 6.050,00;

- n. 37 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 36.300,00;

- n. 40 (ente preposto: Comune di Pisciotta) - € 75.112,42;

- n. 43 (ente preposto: Comune di Centola) - € 49.253,23.

- n. 48 (ente preposto: Comune di Sala Consilina) - € 23.876,45;

- n. 52 (ente preposto: Comune di Ariano Irpino) - € 8.000,00;

- n. 56 (ente preposto: Comune di Salerno) - € 15.419,41;

- n. 80 (ente preposto: Comune di Novi Velia) - € 31.922,46.

78. A seguito di richieste formulate da vari enti preposti alla progettazione degli interventi, con riferimento a quanto sinteticamente contenuto nella precedente 'Tabella B', sono state autorizzate le seguenti somme preventive per consulenze ritenute indispensabili per la redazione dei progetti (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nella Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012):

- n. 3 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 48.214,40;
- n. 4 (ente preposto: Comune di Piedimonte Matese) - € 31.476,00;
- n. 7 (ente preposto: Comune di Airola) - € 18.666,00;
- n. 25 (ente preposto: Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale) - € 12.584,00;
- n. 26 (ente preposto: Comune di Avella) - € 19.910,40;
- n. 29 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 44.408,00;
- n. 30 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 44.408,00;
- n. 31 (ente preposto: Comune di Amalfi) - € 28.439,84;
- n. 33 (ente preposto: Comune di Carbonara di Nola) - € 18.666,00;
- n. 34 (ente preposto: Comune di Pago del Vallo di Lauro) - € 37.510,00;
- n. 37 (ente preposto: Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno) - € 22.838,40;
- n. 38 (ente preposto: Comune di Ospedaletto d'Alpinolo) - € 43.681,00;
- n. 40 (ente preposto: Comune di Pisciotta) - € 71.728,80;
- n. 42 (ente preposto: Comune di Mercogliano) - € 12.342,00;
- n. 43 (ente preposto: Comune di Centola) - € 31.218,00;
- n. 45 (ente preposto: Comune di Ascea) - € 12.444,00;
- n. 47 (ente preposto: Comune di Perdifumo) - € 18.876,00;
- n. 48 (ente preposto: Comune di Sala Consilina) - € 39.005,84;
- n. 50 (ente preposto: Comune di S. Angelo a Scala) - € 19.032,00;
- n. 56 (ente preposto: Comune di Salerno) - € 19.032,00.

79. Con Decreto Commissariale n. 65 del 22 maggio 2013, il Commissario ha designato l'ing. Michele Brigante, per le attività di progettazione preliminare dell'intervento di cui al n. 40 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 83 dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 39.000 oltre oneri di previdenza ed IVA).

80. Con Decreto Commissariale n. 66 del 22 maggio 2013, il Commissario ha designato il dott. Geol. Silvio Di Nocera, per le attività di redazione dello studio geologico di supporto alla progettazione dell'intervento di cui al n. 40 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 83 dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 18.000 oltre oneri di previdenza ed IVA).

81. Con Decreto Commissariale n. 85 del 19 luglio 2013, il Commissario ha designato l'ing. Claudio Mastronardi, per le attività di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di cui al n. 20 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 1 dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 21.000 oltre oneri di previdenza ed IVA).

82. Con Decreto Commissariale n. 86 del 19 luglio 2013, il Commissario ha designato l'ing. Paolo Esposito, per le attività di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di cui al n. 19 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 2 dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione,



all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 37.000 oltre oneri di previdenza ed IVA).

83. Con Decreto Commissariale n. 92 del 2 agosto 2013, il Commissario ha designato l'ing. Manfredo D'Onofrio, per le attività di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di cui al n. 44 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 80 dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 35.000 oltre oneri di previdenza ed IVA).

84. Con Decreto Commissariale n. 105 dell'1 ottobre 2013, il Commissario ha designato la Società 'Tecnodaf Ingegneria S.r.l.', per le attività di revisione della progettazione preliminare, e di redazione della progettazione definitiva e del piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento di cui al n. 33 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 25 dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 35.000 oltre oneri di previdenza ed IVA).

85. Con Decreto Commissariale n. 124 del 27 novembre 2013, il Commissario ha designato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 'ingg. Riboldi, Trassari e Salomone', per le attività di progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento scaturente dall'accorpamento dei due di cui ai nn. 54 e 55 della Delibera CIPE n. 8/2012, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 35.000 oltre oneri di previdenza ed IVA).

86. Con Decreto Commissariale n. 129 del 9 dicembre 2013, il Commissario ha designato l'ing. Raffaele Affinita, per le attività di revisione della progettazione preliminare, e di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento di cui al n. 45 della Deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE e riportato al N. cod. Istat. n. 65 dell'Allegato 1 all'AdP, e dato mandato al R.U.P. di procedere, previa verifica e condivisione, all'affidamento dell'incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, ultima parte del D.Lgs. n. 163/2006 (per un importo di € 15.000 oltre oneri di previdenza ed IVA).

87. Con Decreto Commissariale n. 132 del 12 dicembre 2013, il Commissario ha approvato la Determina Dirigenziale U.TC. Area LL.PP. del Comune di Amalfi n. 288 del 17/04/2013, con cui è stato affidato l'incarico per le attività di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento riportato al n. 31 della Deliberazione CIPE N. 8/2012 del 20 gennaio 2012 (cod. Istat n. 63 dell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma).

88. Con Decreto Commissariale n. 135 del 30 dicembre 2013, il Commissario ha approvato i contenuti del determina del Commissario ARCADIS n. 648 del 17/12/2013, e liquidato a favore di ARCADIS la predetta somma di € 3.004,87 oltre Iva quale credito dell'impresa esecutrice Geo-Service srl.

89. Con Decreto Commissariale n. 136 del 30 dicembre 2013, il Commissario ha approvato i contenuti del Decreto Ufficio Espropri dell'ARCADIS n. 56 del 26/11/2013, e liquidato a favore di ARCADIS la somma di € 17.482,80 corrispondente all'acconto dell'80% (ottantapercento) dell'indennità provvisoria determinata con Decreto Ufficio Espropri dell'ARCADIS n. 34 del 06/08/2013.

90. Nel primo trimestre del 2013 il Commissario ha comunicato al dott. Donato del M.I.S.E. (in data 11/02/2013 e 27/05/2013) e al dott. Pernice del M.A.T.T.M. (in data 18/06/2013) di ritenersi autorizzato ad assumere ulteriori impegni di spesa per progettazioni, rilievi e indagini ed avviare in gara altri interventi, oltre i 13 dei cui all'Allegato 1, sulla scorta delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale.

91. Su richiesta del dott. Pernice, in data 18/06/2013 il Commissario ha trasmesso al M.A.T.T.M. la tabella dei dati aggiornati al 17 giugno 2013, distinguendo tra la disponibilità di



cassa e competenza, ed ha comunicato che in data 03/06/13 ha scritto al Dirigente del Settore Difesa Suolo della Regione Campania (dott. Giulivo) per ribadire che gli impegni assunti entro il termine della nomina Commissariale (21/01/2014), *'devono ritenersi successivamente ed automaticamente assunti dalla Regione Campania o dall'eventuale nuovo Commissario'*. Copia della predetta nota è stata trasmessa anche il 25/06/2013 al dott. Perrone.

92. Su richiesta dell'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER), in data 18/09/2013 il Commissario ha trasmesso le seguenti informazioni per ognuno degli interventi riportati nella Delibera CIPE n. 8/2012:

- Soggetto attuatore
- Costo aggiornato
- Fase attuale in corso
- Ultima fase conclusa
- Data di approvazione ultima fase conclusa
- Data pubblicazione bando
- Data aggiudicazione
- Data fine lavori.

*Le predette informazioni sono state trasmesse in pari data anche all'Assessore Regionale ai LL.PP. prof. ing. Edoardo Cosenza e al Dirigente del Settore Regionale Difesa Suolo dott. Italo Giulivo.*

*L'attività del Commissario e dei due collaboratori ha consentito di liquidare gli uffici tecnici del Genio Civile, dei Comuni e delle stesse Autorità di Bacino a pervenire a progetti preliminari, definitivi ed anche esecutivi senza che sia stato speso alcun euro per tali attività.*

*All'uopo, lo scrivente Commissario ritiene che siano state risparmiate allo Stato spese per circa tre milioni di euro per le spese di progettazione.*

ln



**1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi**

Attraverso la compilazione della tabella sottostante evidenziare lo stato di avanzamento **globale** degli interventi in Accordo. Lo stato di attuazione relativo ad ogni singolo intervento dovrà, invece, essere prodotto attraverso l'aggiornamento delle schede intervento RENDIS e li, dove previsto, nella Banca Dati Unitaria del QSN.

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi al dicembre 2013</b>	<b>n. interventi al dicembre 2012</b>
Attesa di avvio	n. 28	n. 41
Esecuzione studi ed indagini	n. 29 (tutti compresi tra quelli in corso di progettazione)	n. 4 (di cui 2 sono compresi tra quelli in attesa di avvio e 2 in corso di progettazione)
In corso di progettazione	n. 49	n. 46
Progettazione ultimata	n. 15	n. 6
Lavori aggiudicati	n. 1 (aggiudicazione provvisoria)	n. 0
In esecuzione	n. 1 (a seguito dell'accorpamento degli intt. nn. 1 e 2 della Delibera CIPE n. 8/2012 (nn. 5 e 6 dell'Allegato 1 all'AdP), da n. 2 interventi in stato 'perizia di variante', si è passati a n. 1 intervento 'in progettazione')	n. 3
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 1	n. 1
<b>Totale interventi finanziati</b>	95. Dei 97 iniziali, sono stati accorpati gli intt. nn. 1 e 2 della Delibera CIPE n. 8/2012 (nn. 5 e 6 dell'Allegato 1 all'AdP) con Ordinanza Commissariale n. 4 del 27 /02/2013, e gli nn. 54 e 55 della Deliberazione CIPE n. 8/2012 (nn. 69 e 70 dell'Allegato 1 all'AdP) con Decreto Commissariale n. 123 del 27 /11/2013	

A seguire si riporta la tabella con solo gli interventi di cui alla Delibera CIPE 8/2012

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi al dicembre 2013</b>
Attesa di avvio	n. 6
Esecuzione studi ed indagini	n. 29 (tutti compresi tra quelli in corso di progettazione)
In corso di progettazione	n. 42
Progettazione ultimata	n. 15
Lavori aggiudicati	n. 1 (aggiudicazione provvisoria)
In esecuzione	n. 1 (a seguito dell'accorpamento degli intt. nn. 1 e 2 della Delibera CIPE n. 8/2012, da n. 2 interventi in stato 'perizia di variante', si è passati a n. 1 intervento 'in progettazione')
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 1
	55 Dei 97 iniziali, sono stati accorpati gli intt. nn. 1 e 2 della Delibera CIPE n. 8/2012, con Ordinanza Commissariale n. 4 del 27 /02/2013, e gli nn. 54 e 55 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, con Decreto Commissariale n. 123 del 27 /11/2013

**1.8 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013**

Compilare la tabella seguente

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014</b>
Attesa di avvio	n. 19
Esecuzione studi ed indagini	n. 10 (compresi tra quelli in corso di progettazione)
In corso di progettazione	n. 16
Progettazione ultimata	n. 10
Lavori aggiudicati	n. 33
In esecuzione	n. 16
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 1
<b>Totale interventi finanziati</b>	95

A seguire si riporta la tabella con solo gli interventi di cui alla Delibera CIPE 8/2012 per il 2014

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014</b>
Attesa di avvio	n. 0
Esecuzione studi ed indagini	n. 10 (compresi tra quelli in corso di progettazione)
In corso di progettazione	n. 16
Progettazione ultimata	n. 10
Lavori aggiudicati	n. 12
In esecuzione	n. 16
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 1
<b>Totale interventi finanziati</b>	55

**1.9 CRITICITA'**

Descrivere le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo.

La principale criticità consiste nella mancata disponibilità dei fondi della Regione (Riduzione PAIN, PAR e 'residui ex leggi: n. 183/89, n. 267/89, n. 179/02 e cap 1137 Bilancio Gestionale), che non consente di poter avviare la progettazione di numerosi interventi, né di mandare in gara intervebt per cui è già approvata la progettazione esecutiva.

Con nota prot. Com/Stra 212/2012 del 13/09/2012 (allegata alla presente relazione), indirizzata al Presidente della Giunte Regionale, all'Assessore LL.PP. e al Dirigente del Settore Difesa Suolo della Campania, lo scrivente Commissario ha sollecitato le predette Autorità affinché comunicassero 'per le proprie competenze, quale sia la disponibilità finanziaria che potrà essere accreditata in tempi brevi sulla contabilità speciale intestata al sottoscritto, rimettendo ogni responsabilità per eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi per la mancata realizzazione degli interventi'.

Ulteriore criticità è dovuta alla dichiarata incapacità di alcuni enti a redigere, con i propri uffici tecnici, le varie fasi progettuali o ad aggiornare le progettazioni a loro disposizione. Nel caso di Buonalbergo (int. cod. Istat 9 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, e n. 11 della Deliberazione n. 8/2012 del CIPE), ad esempio, dalla trasmissione del progetto definitivo inizialmente disponibile al Comune (aprile 2011) è trascorso quasi un anno affinché gli elaborati venissero aggiornati per ottemperare ai dettami normativi (D.Lgs. 81/2008 e D.P.R. 207/2010) e si potesse procedere dapprima alla validazione del progetto e successivamente alla sua approvazione da parte del Commissario Straordinario Delegato (giugno 2012).

Per far fronte alle predette insufficienze tecniche degli uffici degli enti preposti alla progettazione degli interventi, il Commissario ha utilizzato costantemente la propria struttura.

Solo in data 22/11/2013 la Banca d'Italia ha comunicato al Commissario, l'accredito di € 5.800.735,62 da parte della Regione.

#### **1.10 ANNOTAZIONI CONCLUSIVE**

Annotazioni e precisazioni finali che si ritengono essenziali ad una esaustiva lettura della presente relazione

Lo scrivente Commissario Straordinario delegato si auspica che la presente relazione venga puntualmente commentata.



PAGINA BIANCA



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione annuale anno 2013

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Febbraio 2014

Commissario Straordinario Delegato

***Prefetto Vincenzo Grimaldi***

PAGINA BIANCA

## 1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Tabella 1: situazione complessiva al 31/12/2013.

<b>Regione</b>	Emilia-Romagna
<b>Commissario straordinario delegato</b>	Prefetto Vincenzo Grimaldi
<b>Decreto nomina</b>	D.P.C.M. 10 dicembre 2010
<b>Data sottoscrizione Accordo</b>	3 novembre 2010
<b>Data sottoscrizione Primo Accordo Integrativo</b>	4 maggio 2011
<b>Data sottoscrizione Secondo Atto Integrativo all'Accordo</b>	23 dicembre 2013
<b>Importo complessivo assentito in Accordo</b>	€ 144.474.050,96
<b>Importo programmato per il periodo (anno 2013)<sup>1</sup></b>	€ 30.293.311,70
<b>Importo speso (fino al 31/12/2013)</b>	finanziamenti: € 27.814.649,69 <sup>2</sup> cofinanziamenti: 20.847.708,70
<b>Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (fino al 31/12/2013)</b>	finanziamenti: € 30.363.927,04 cofinanziamenti: € 27.412.078,51

<sup>1</sup> L'importo è riferito a quanto indicato nei cronoprogrammi delle attività trasmessi al Ministero. Per la quota di finanziamento statale la somma indicata per l'annualità 2013 è pari a € 17.688.000,00 (nota del Commissario straordinario n. PG.2011.101276 del 21/04/2011), mentre per la parte di cofinanziamento l'importo corrispondente ammonta a € 12.605.311,70 (nota del Commissario straordinario n. PG.2011.178556 del 22/07/2011).

I finanziamenti di parte statale sono stati trasferiti solo parzialmente: ad oggi mancano € 23.668.400 e pertanto gli importi programmati per il 2013 risultano privi di copertura finanziaria.

<sup>2</sup>Relativamente alle risorse statali, l'importo totale speso pari a € 27.814.649,26 include € 6.152.311,53 e € 1.400.000 trasferiti rispettivamente con ordine n°44/2013 e n°43/2013 il 07/05/2013.

## 2. DIFESA DEL SUOLO E CONTESTO REGIONALE

La Regione Emilia-Romagna occupa un territorio vasto e paesaggisticamente variegato, caratterizzato da livelli di pericolosità idraulica, da frana e costiera cui, in alcuni contesti, corrispondono condizioni di rischio rilevanti.

Alle peculiari condizioni del territorio negli ultimi anni si sono aggiunti gli effetti dei cambiamenti climatici, che si manifestano con una maggiore frequenza di eventi piovosi concentrati in certi periodi dell'anno e, dunque, con una sollecitazione prolungata dei corsi d'acqua e del sistema di opere di difesa idraulica lungo i medesimi.

Di seguito, per maggiore chiarezza, viene riassunto brevemente lo stato del dissesto nelle sue varie manifestazioni e si dà conto dell'organizzazione regionale per quanto attiene la gestione operativa degli interventi di mitigazione del rischio. Tale quadro, nel quale si è inserita l'attività commissariale per l'attuazione dell'Accordo, ricalca quanto già riportato nella precedente relazione annuale, ma viene comunque inserito nella presente per ragioni di completezza e di maggiore facilità di lettura.

### 2.1 Dissesto idrogeologico

L'Emilia-Romagna è una delle regioni più franose d'Italia, con oltre il 20% del territorio collinare e montano interessato da circa 70.000 frane, di cui 30.000 attive o riattivate negli ultimi 20 anni (dati 2009 – "Per la sicurezza del territorio 2007-2009", Regione Emilia-Romagna). Di queste, più di 400 sono state perimetrate e inserite nei Piani di Bacino in quanto a rischio molto elevato o elevato.

La grande maggioranza dei danni causati da movimenti franosi avviene per la riattivazione di corpi di frana già esistenti sui quali in passato, in numerosi casi, sono stati edificati centri abitati.

Per quanto riguarda le infrastrutture, la gestione del dissesto si pone come un tema di complessa e costosa risoluzione a causa della diffusione pervasiva delle frane sull'intero territorio collinare regionale. Si pensi che in alcuni comuni oltre il 40% del territorio è coperto da frane e spesso non esistono percorsi alternativi oltre a quelli esistenti.

La sicurezza dei versanti è oggi affrontata attraverso un approccio basato sul principio della prevenzione e della riduzione del danno, a partire da alcune azioni convergenti quali, in primo luogo, l'applicazione del sistema di vincoli e di prescrizioni presenti negli strumenti della pianificazione di bacino. Accanto a tali elementi è indispensabile approfondire la conoscenza del territorio e del meccanismo di innesco dei fenomeni franosi, al fine di prevederne l'evoluzione a breve termine: il bagaglio di conoscenze derivante dal monitoraggio dei versanti in dissesto è infatti il presupposto di eventuali azioni di emergenza e, nel medio-lungo periodo, di un'efficace pianificazione del territorio e di una corretta progettazione di interventi strutturali.

### 2.2 Rischio idraulico

Il complesso assetto della rete idrografica naturale e artificiale, la consistenza e la distribuzione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle attività produttive sono i fattori che concorrono a determinare le condizioni di rischio idraulico cui è esposto il territorio dell'Emilia-Romagna.

Nelle aree di pianura il reticolo naturale assume connotati di forte artificialità strutturale, a causa della progressiva arginatura degli alvei che ne ha irrigidito la naturale dinamica evolutiva. L'azione antropica sul sistema dei corpi idrici è inoltre evidente per la presenza di una fitta rete di canali di bonifica, con funzioni irrigue e di scolo delle acque, che si irradia capillarmente in questo ambito territoriale dalla solida vocazione produttiva.



A parte il fiume Po, caratterizzato dalla presenza di ampie aree golenali racchiuse dagli argini maestri in cui le piene possono trovare uno sfogo, i tratti fluviali interessati dalla presenza di rilevati arginali presentano, per lo più, alvei canalizzati con sezioni regolari che trasferiscono verso valle le onde di piena senza laminazione. In queste aree il rischio idraulico si può manifestare per tracimazione o rottura degli argini determinate dall'insufficiente capacità di smaltimento delle acque o da impreviste e locali criticità. In un contesto siffatto è evidente la strategicità di una manutenzione preventiva, in grado di mantenere in efficienza un sistema di opere di difesa così diffuso e ormai vetusto.

Nelle aree di montagna i corsi d'acqua presentano invece caratteristiche di naturalità, sebbene si collochino in alcuni casi in contesti fortemente antropizzati, con presenza di centri abitati, infrastrutture, attività produttive che si sono sviluppati sui terrazzi fluviali e, quindi, in aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione. In generale, la sicurezza idraulica e la stabilità dei versanti sono strettamente legate: l'equilibrio dei profili di fondo e delle sponde dei corsi d'acqua è infatti condizione necessaria ad evitare erosioni destabilizzanti al piede dei pendii e dei terrazzi fluviali.

È infine opportuno ricordare il reticolo idrografico minore, che negli anni passati è stato spesso soggetto a interventi di tombinamento, deviazione o artificializzazione a causa della crescente domanda di trasformazione urbanistica del territorio. Esso risulta sempre più di frequente inadeguato a sopportare le attuali condizioni di deflusso, divenute più gravose a causa dei cambiamenti di uso del suolo, spesso accompagnati da interventi che aumentano l'estensione di aree impermeabilizzate. La rete minore, inoltre, a causa dei tempi di corrivazione che la contraddistinguono, risente in modo più marcato rispetto ai corsi d'acqua di maggiori dimensioni degli eventi piovosi di forte intensità e localmente concentrati che si presentano sempre più frequentemente in tutto il corso dell'anno.

Il difetto di efficienza del sistema idrografico è dunque imputabile alla citata artificialità strutturale del reticolo idrografico, alle trasformazioni progressive di ampie porzioni di territorio e all'inadeguatezza della rete di scolo che ne è conseguita a causa dell'aumento dei carichi idraulici, oltre che alle variazioni indotte sulle sollecitazioni meteorologiche dai cambiamenti climatici. A questi elementi va inoltre aggiunta la riduzione della pendenza media dei corsi d'acqua nei tratti di pianura per effetto della subsidenza.

### 2.3 Difesa della costa e subsidenza

La fascia costiera, che si estende per circa 130 km dalla Foce del Po di Goro fino a Cattolica, è, per sua natura, un ambiente dinamico che subisce costanti modifiche per l'azione combinata di fattori climatici e meteo-marini. L'impatto di questi fattori è particolarmente significativo su una costa bassa e sabbiosa, come quella emiliano-romagnola, con territori retrostanti posti a quote inferiori al livello del mare (aree ferraresi e ravennate).

L'area costiera riveste grande importanza per l'economia regionale sia per l'attività turistica, che da sola contribuisce al 7% del PIL regionale, sia per il contributo di settori produttivi come la pesca e il trasporto marittimo. Essa, inoltre, comprende un inestimabile patrimonio ambientale e naturalistico tutelato all'interno del Parco del Delta del Po. Si comprende facilmente, quindi, come la dinamica evolutiva naturale di queste aree possa contrastare con le esigenze di sviluppo territoriale.

L'evoluzione della fascia costiera negli ultimi secoli ha risentito fortemente della naturale riduzione del trasporto solido che ha determinato l'arretramento delle cuspidi deltizie e la conseguente rettificazione della linea di riva. Tale tendenza si è aggravata, soprattutto nel dopoguerra, a causa dell'intenso sfruttamento dell'area costiera sia in superficie sia nel sottosuolo.

La costa si presenta quindi come un ambito sensibile sul quale occorre costantemente intervenire per contrastare e mitigare i processi di erosione delle spiagge e i fenomeni di inondazione degli abitati che si verificano in occasione di forti mareggiate e intense precipitazioni.

Le politiche di gestione del territorio e di difesa della costa, introdotte dalla Regione già a partire dagli anni Ottanta, hanno fatto registrare nell'ultimo decennio una sensibile riduzione dei più importanti fenomeni di dissesto.

Contestualmente la Regione ha promosso studi e ricerche al fine di creare un quadro sistemico dell'ambiente costiero capace di orientare le strategie di difesa della costa: l'opzione della "difesa morbida", rappresentata dal ripascimento artificiale, è apparsa la più idonea al fine di assecondare, in modo controllato, il dinamismo naturale della linea di costa. Gli interventi di ripascimento delle spiagge, realizzati dalla Regione, hanno ridotto notevolmente i tratti di costa interessati da arretramento per erosione, che sono passati da circa 35 km del 2000 a circa 16 km del 2007. Oggi risultano stabilizzati 19 km di costa, rispetto ai quali vengono svolte verifiche periodiche per accertare le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'approvvigionamento di sabbia per i ripascimenti è garantito dallo sfruttamento dei depositi sottomarini, costituiti dagli antichi cordoni litorali e individuati tra 30- e 50 m di profondità in Adriatico, delle sabbie litoranee provenienti da spiagge in forte avanzamento, accumuli presso moli e opere di difesa, dragaggi alle imboccature dei porti e alle bocche fluviali, e delle sabbie dell'entroterra (opere portuali, allargamento darsene, scavi edili in genere).

Ad oggi, dunque, il ripascimento e la manutenzione ordinaria delle spiagge fanno parte della nuova strategia regionale di gestione e di difesa della linea di costa, con l'abbandono del ricorso alle opere rigide tradizionali, per le quali si procede unicamente con una rimodulazione dell'esistente.

Le azioni mirate di ripascimento vengono inoltre integrate attraverso politiche di miglioramento del trasporto solido fluviale e di riduzione di perdita di sabbia dal sistema attraverso una corretta gestione dei sedimenti di spiaggia (pulizia e vagliatura in loco, installazione di barriere frangivento e di argini invernali di protezione), oltre che proseguendo nelle politiche di riduzione della subsidenza.

Oltre alle azioni strutturali rappresentate un elemento innovativo nella strategia di difesa dell'ambito costiero è rappresentato dallo sviluppo del monitoraggio e dalla diffusione delle conoscenze.

L'evoluzione dei fenomeni erosivi, infatti, deve essere monitorata costantemente in ragione del fatto che una seria programmazione di interventi non può essere attuata in una logica di emergenza. A tal fine la Regione ha istituito, da oltre 30 anni, reti di monitoraggio topo-batimetrico e della subsidenza a scala regionale. Negli ultimi anni sono state avviate nuove attività di rilievo con tecniche innovative, quale il telerilevamento, che consentono un'acquisizione rapida e capillare dei dati batimetrici, mareografici e di subsidenza.

La mole di dati così prodotta viene gestita attraverso un sistema di analisi e di gestione delle informazioni che risulta utile anche ai fini della diffusione e della condivisione delle conoscenze con tutte le strutture e gli enti periferici che operano per la difesa della costa<sup>3</sup>

Il riferimento per il governo del territorio negli ambiti costieri è costituito dalle linee guida per la "Gestione Integrata delle Zone Costiere - GIZC", nelle quali le azioni appena esposte sono portate a sistema in una visione complessiva e volta a raggiungere un assetto costiero ottimale e sostenibile ai fini della difesa e della sicurezza dei litorali e dei territori retrostanti.

#### 2.4 Gestione operativa

Migliorare i livelli di sicurezza del territorio e delle popolazioni in relazione al rischio idraulico, idrogeologico, di erosione e ingressione marina è uno degli obiettivi principali che la Regione Emilia-Romagna si pone da tempo. Tale obiettivo si declina in un complesso di azioni finalizzate ad innalzare il livello di prevenzione e di protezione degli insediamenti e delle popolazioni in relazione alle criticità del territorio, a migliorare la

---

<sup>3</sup> interfaccia web-gis "Il Sistema Informativo del Mare e della Costa" (<http://geo.regione.emilia-romagna.it/costa>).

capacità di valutazione delle azioni intraprese, a diffondere e rendere fruibili ai cittadini le conoscenze territoriali.

La programmazione regionale in materia di difesa del suolo si fonda, in particolare, sul riconoscimento del ruolo della pianificazione di bacino e sull'integrazione tra gli enti e i soggetti competenti per territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

La pianificazione di bacino, attraverso l'analisi di fenomeni e criticità in un'ottica di scala vasta, mette a sistema la complessità del reticolo idrografico regionale precedentemente descritto. A partire da tale impostazione e dal bagaglio di conoscenze reperibile nei PAI, nei quali sono stati da tempo individuati gli interventi strategici a livello di bacino idrografico, vengono formati ed attuati i programmi regionali di intervento, che beneficiano degli aggiornamenti, delle segnalazioni di criticità e del contributo tecnico delle molteplici strutture operative presenti sul territorio regionale, il cui coordinamento consente di perseguire la coerenza e l'integrazione delle politiche regionali nei vari ambiti territoriali e nei diversi settori d'intervento.

Sotto il profilo tecnico, la Regione si avvale, infatti, di numerosi soggetti, relativamente alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo e della costa, alle funzioni di polizia idraulica e gestione del servizio di piena, alla gestione del pronto intervento e gli interventi di somma urgenza, oltre che all'esecuzione delle verifiche tecniche in caso di dissesti, eventi alluvionali e meteorologici intensi e al monitoraggio dei fenomeni suddetti, anche nell'ambito del sistema di allertamento di protezione civile.

Tali funzioni vengono esercitate attraverso le seguenti strutture:

- 1) i **Servizi Tecnici di Bacino** (S.T.B.), strutture nate in seguito al passaggio dei Geni Civili dallo Stato alle Regioni, gestiscono il reticolo idrografico naturale minore, secondario e larga parte di quello principale, ad esclusione dei tratti di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po), di cui si dirà più avanti; i S.T.B. operano inoltre nei settori del dissesto idrogeologico e della difesa della costa;
- 2) l'**A.I.Po** è competente lungo i tratti di corsi d'acqua nei quali siano presenti opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria limitatamente al bacino del Po (affluenti principali del fiume Po nei tratti di pianura, cavi e canali artificiali classificati come precedentemente indicato); l'Agenzia, inoltre, riveste il ruolo di Centro di Competenza nell'ambito del sistema di allertamento della protezione civile, con riferimento alle analisi idrauliche e all'impiego della modellistica di piena;
- 3) i **Consorzi di Bonifica**, gestiscono il reticolo artificiale di competenza, con funzioni irrigue e di scolo, nonché parte del reticolo interconnesso, sulla base di specifici accordi con i soggetti 1) e 2). In alcuni casi realizzano inoltre interventi tesi ad assicurare il buon regime idraulico dei terreni ricadenti nei comprensori collinari e montani, attraverso la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti

Per quanto concerne, in particolare, le attività relative alla protezione civile il soggetto che opera in Emilia-Romagna è l'**Agenzia regionale di Protezione civile**, cui competono la predisposizione della pianificazione di emergenza regionale e il relativo supporto agli enti locali, le attività di previsione degli eventi calamitosi e prevenzione del rischio, nell'ambito del Sistema di protezione civile e in stretto raccordo con il Centro Funzionale regionale; in corso di evento competono alla struttura l'organizzazione e il coordinamento delle operazioni di soccorso delle popolazioni sinistrate e del Volontariato di Protezione civile. L'Agenzia opera costantemente in stretto rapporto con tutte le strutture competenti a livello regionale, cui fornisce ausilio e un affiancamento in caso di valutazioni tecniche di danni o dissesti e di necessità di supporto agli enti locali interessati da eventi calamitosi; provvede, inoltre, alla programmazione di interventi di somma urgenza e pronti interventi, alla formazione di piani di interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, sulla base di Ordinanze di Protezione civile.

Nel contesto operativo ora descritto, il **Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli** fornisce un valido contributo conoscitivo grazie alle attività di studio e monitoraggio a supporto della Gestione Integrata della Zona Costiera e delle procedure di pianificazione ed intervento, in raccordo col Servizio Difesa del

suolo, della costa e bonifica, e di previsione e valutazione della pericolosità idrogeologica a supporto delle attività del Centro Funzionale dell'Emilia-Romagna, oltre che alla gestione del Sistema Informativo Geotematico, Sismico, dei Suoli, e del sistema fisico costiero.

Si è già fatto riferimento al ruolo dei PAI nel sistema di gestione della difesa del suolo a livello regionale. Vale comunque la pena ricordare che le **Autorità di bacino**, costituite ai sensi della L. 183/1989, in qualità di soggetti competenti in materia di pianificazione di bacino, per la Regione Emilia-Romagna sono cinque:

- di rilievo nazionale: Autorità di bacino del fiume Po e Autorità di bacino del fiume Tevere;
- di rilievo interregionale: Autorità di bacino del Reno, Autorità di bacino interregionale Marecchia e Conca;
- di rilievo regionale: Autorità di bacino dei Fiumi Romagnoli.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 il territorio regionale è interessato dai tre distretti Padano, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino centrale.

L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna**, tra i vari compiti di monitoraggio e studio delle diverse componenti ambientali, fornisce un fondamentale supporto tecnico anche nel campo della difesa del suolo, in particolare attraverso il Servizio Idrometeorologia, che svolge osservazioni e previsioni operative e di ricerca e sviluppo in meteorologia, climatologia, idrologia, agrometeorologia, radarmeteorologia e meteorologia ambientale, anche in qualità di Centro Funzionale nell'ambito del Sistema di Allertamento nazionale.

Infine, il **Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica** opera il coordinamento a livello regionale tra le funzioni di pianificazione e di programmazione degli interventi per il tempo differito, oltre a collaborare e mantenere il raccordo con le strutture che si occupano della gestione degli interventi in emergenza. In particolare il Servizio collabora con le Autorità di bacino per la formazione e l'attuazione della pianificazione di bacino e verifica i contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale nei settori della difesa del suolo, della costa e bonifica (PTCP) e delle attività estrattive (PIAE). Provvede inoltre, di concerto con il S.T.B. competente territorialmente, a fornire supporto e coordinamento in materia di vincolo idrogeologico, all'attuazione del Piano di Gestione Integrata della Zona Costiera (GIZC) e per lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio idropluviometrico, nonché alla redazione di studi, ricerche e monitoraggi nelle materie di competenza.

Sotto il profilo delle opere strutturali, il Servizio provvede alla programmazione esecutiva e al monitoraggio degli interventi di difesa del suolo, della costa e bonifica in connessione con le Autorità di bacino e i soggetti attuatori (S.T.B., A.I.Po, Consorzi, e, più raramente, Comuni), si occupa dell'istruttoria tecnica e della gestione amministrativo-contabile degli interventi e dei pronti interventi, nonché del coordinamento tecnico e amministrativo-procedurale dei S.T.B., dei Consorzi di Bonifica e dell'A.I.Po.

Relativamente alla gestione delle emergenze, il Servizio fornisce collaborazione e supporto all'Agenzia regionale di Protezione civile nell'ambito del Sistema di allertamento regionale e della formazione dei piani di interventi discendenti da Ordinanze.

### 3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

Per ragioni di chiarezza, si riassume nel seguito l'organizzazione della struttura commissariale e delle relative attività, già descritte nella precedente relazione annuale.

A seguito della nomina a Commissario, il Prefetto Grimaldi ha avviato i primi contatti con l'Assessorato regionale alla Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e con la Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione (di seguito competente Direzione regionale), quest'ultima supportata dal punto di vista tecnico dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e, dal punto di vista giuridico, dal Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria.

Per il tramite di tali strutture regionali, sono state avviate le iniziative necessarie a dare attuazione all'Accordo, anche attraverso contatti con i funzionari della Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM e dell'ISPRA per quanto concerne la tematica del monitoraggio degli interventi.

Dal gennaio 2011 sono stati organizzati alcuni incontri, a cura della competente Direzione regionale, finalizzati ad organizzare le attività per l'attuazione dell'Accordo.

In primo luogo sono state discusse le possibili modalità di organizzazione del lavoro con il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, il Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria e l'Agenzia regionale di Protezione Civile; il confronto sulle proposte avanzate ha permesso di delineare un quadro delle prime attività necessarie e dei criteri operativi per l'attuazione dell'Accordo, oltre che di comporre un mosaico funzionale delle strutture di supporto da coinvolgere.

Successivamente, con il supporto del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, il Commissario ha consultato le strutture operative cui la Regione di norma ricorre per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio (Servizi Tecnici di Bacino, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Consorzi di bonifica) ai fini di una ragionevole previsione dei tempi di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento alla progettazione degli interventi previsti, ai tempi presunti per la cantierabilità e alla gestione degli interventi ricompresi nella quota di cofinanziamento, alcuni dei quali risultavano avviati in via ordinaria.

A conclusione di tale fase interlocutoria, ai fini di una celere attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, il Commissario straordinario ha deciso di avvalersi della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso le strutture e gli enti a cui la medesima ricorre per la realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica (nota n. PG/2011/39529 del 14 febbraio 2011 indirizzata al MATTM), fermi restando i poteri di indirizzo e, ove ritenuto necessario, di sostituzione e di deroga attribuiti al Commissario dal DPCM di nomina ai sensi della normativa ivi richiamata.

Nei merito dell'attuazione degli interventi, le modalità operative e procedurali sono state individuate con Decreto commissariale n. 1 del 16 maggio 2011, del quale di seguito si riportano le disposizioni organizzative più significative:

- le decisioni del Commissario hanno la forma di decreti;
- gli atti specifici per l'attuazione dei singoli interventi (determinazioni, pareri, ecc.) sono emanati in analogia a quanto previsto per i decreti del Presidente della Giunta regionale;
- agli atti viene applicato il regime di pubblicità vigente in Regione Emilia-Romagna attraverso lo strumento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, in relazione alla natura e alle finalità del singolo provvedimento.

È stata operata una distinzione iniziale tra gli interventi finanziati con risorse statali (finanziamenti del MATTM e risorse FSC destinate alla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.6/2012) e quelli ricadenti nella quota del cofinanziamento regionale.

Per gli interventi finanziati con risorse statali, le indicazioni sono riportate nel citato Decreto n. 1/2011, che prevede l'applicazione delle disposizioni vigenti presso la Regione in quanto alle relazioni organizzativo- funzionali e alle competenze, oltre che per la contabilità, fatto salvo il regime previsto per le risorse allocate su Contabilità Speciale intestata al Commissario straordinario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Bologna.

Per gli interventi oggetto di cofinanziamento, il Commissario ha emanato uno specifico decreto (DCS/2011/4 del 20/09/2011, integrato con DCS/2012/1 del 16 aprile 2012) che stabilisce per tali fattispecie l'applicazione delle medesime disposizioni previste per l'attuazione della parte statale, ad eccezione di quanto attiene alla gestione contabile che, per gli interventi cofinanziati, fa riferimento alle procedure ordinarie. Il Commissario, infatti, come affermato in varie occasioni, ha ritenuto di mantenere le risorse del cofinanziamento sui capitoli di Bilancio originari per ragioni di semplificazione amministrativa e di efficacia di azione della struttura commissariale.

Tutti gli interventi, a prescindere dall'importo e dalla fonte di finanziamento, sono soggetti al parere preventivo del Comitato Consultivo Regionale (di seguito CCR), di cui all'art. 12 e seguenti della L.R. n. 22/2000. Il parere viene generalmente reso sulla base del progetto preliminare, tuttavia i soggetti attuatori possono presentare al vaglio del CCR progetti definitivi/esecutivi qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario ai fini di contenere i tempi complessivi del procedimento. In sede di adunanza è facoltà del CCR richiedere un ulteriore parere per livelli successivi di progettazione in caso di interventi di particolare importanza e complessità.

In riferimento all'organizzazione vigente in Regione per la gestione ordinaria del settore della difesa del suolo, il Commissario ha stabilito di mantenere le competenze e le attribuzioni descritte al paragrafo 2.4.

In particolare, per la realizzazione degli interventi sono stati individuati i soggetti attuatori che, di norma, operano nell'ambito della difesa del suolo, con riferimento alle finalità dei singoli interventi e agli ambiti territoriali di competenza (Agenzia Interregionale per il fiume Po, Servizi Tecnici di Bacino, Consorzi di Bonifica). Essi provvedono alla realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e delle disposizioni previste da altre normative di settore, oltre che delle disposizioni commissariali.

Infine, come già esplicitato nella precedente relazione annuale, la gestione contabile degli interventi finanziati con fondi afferenti alla Contabilità Speciale è condotta attraverso l'Agenzia regionale di Protezione Civile, con il supporto di un'unità di personale appositamente acquisita e di cui si dirà nel seguito.

Come chiarito nella precedente relazione annuale, per gli interventi finanziati con risorse statali il Commissario, sentite le strutture regionali competenti circa la fattibilità di tale operazione, ha ritenuto di utilizzare gli strumenti forniti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011<sup>4</sup>, che all'art. 6 comma 4, ha autorizzato il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, ad inserire gli interventi dell'Accordo in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati dalla precedente ordinanza n. 3850/2010. Nell'ambito di tale percorso amministrativo,

---

<sup>4</sup> Con la finalità di garantire la rimozione delle situazioni di criticità ed accelerare le azioni volte alla messa in sicurezza ed alla mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, la citata Ordinanza ha autorizzato i Commissari delegati ex OPCM 3850/2010 ad inserire gli interventi di cui agli Accordi di programma siglati dal MATTM con le Regioni in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati da quest'ultima.

è stata operata una suddivisione degli interventi in tre piani attuativi – Parte A, Parte B e Parte C - distinti sulla base del possesso, per ciascun intervento, dei requisiti di coerenza rispetto alla OPCM 3850/2010. Per un maggior dettaglio dei contenuti dei piani attuativi si rimanda alla Relazione relativa alle attività 2011

La correazione con la pianificazione di protezione civile, oltre ad accelerare la realizzazione degli interventi ricollegabili alla OPCM 3850/2010, ha reso possibile il ricorso alle procedure di contabilità speciale, la quale, grazie all'esclusione delle relative somme dal Patto di stabilità, ha consentito alla Regione di operare senza limiti di spesa.

Nel contempo tale scelta comporta che la Contabilità Speciale appositamente istituita e intestata al Commissario straordinario possa essere operante solo per una parte degli interventi: il relativo Conto di Tesoreria, infatti, è stato aperto in virtù della OPCM 3925/2011 e, pertanto, le risorse che ad esso fanno capo possono essere impiegate unicamente per gli interventi ricompresi nel Piano attuativo Parte A, redatto ai sensi della citata ordinanza. Per gli interventi ricompresi nei piani attuativi Parte B e Parte C la corrispondente quota parte delle risorse statali è stata pertanto trasferita su un apposito Capitolo del Bilancio regionale.

Tale operazione è stata compiuta a seguito dell'emanazione del Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 27/3/2013, che ha trasferito le somme relative dalla contabilità speciale n. 5578 ai capitoli di Bilancio della Regione Emilia-Romagna appositamente istituiti con deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 10 giugno 2013, che, inoltre, ha approvato la relativa variazione di bilancio di previsione 2013. Il trasferimento è stato formalmente effettuato con ordinativo n. 43/2013 per € 1.400.000 (tranche relativa a interventi finanziati con Delibera CIPE n. 6/2012) e con ordinativo n°44/2013 per € 6.152.311,53 (tranche relativa a interventi finanziati con risorse del MATTM).

È stato inoltre costituito uno staff tecnico-operativo composto da collaboratori del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e del Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria, i cui nominativi sono riportati nel Programma di Attività di pertinenza, con funzioni di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo e giuridico, oltre che di gestione del monitoraggio dello stato degli interventi mediante la banca dati regionale SIMADA, che gestisce il monitoraggio di settore, e, con il supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA, mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).

Attorno al tema del monitoraggio nel corso del 2013 si sono concentrate numerose attività. Oltre al sistema regionale SIMADA e al sistema ReNDiS dell'ISPRA, infatti, gli interventi dell'Accordo finanziati con fondi FSC (Delibera C.I.P.E. n.6/2012) sono soggetti al monitoraggio attraverso un'ulteriore banca dati (BDU - Banca Dati Unitaria) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il monitoraggio ha cadenza bimestrale e prevede l'implementazione dei dati nel sistema SGP (Sistema Gestione Progetti) presso il MISE. In base a quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 8/2012, l'implementazione dei dati nella BDU e il raggiungimento di soglie prefissate per i pagamenti sono le condizioni necessarie affinché le risorse vengano trasferite ai Commissari.

Nel corso del 2013, dunque, al tema specifico del monitoraggio è stata dedicata particolare cura, a fronte della complessità e della numerosità delle banche dati in uso, oltre che delle condizioni poste sui trasferimenti dei fondi di cui si è appena detto. Lo sforzo principale, oltre che nell'aggiornamento dei dati nei vari sistemi, è stato volto ad organizzare le attività di ricognizione delle informazioni in modo organico e secondo modalità il più possibile semplificate, per evitare di moltiplicare le richieste ai soggetti attuatori e avere certezza della fondatezza del dato.

Sono state quindi rispettate le scadenze fissate, di seguito riassunte:

- per ReNDiS e SIMADA 31 dicembre 2012, 31 marzo 2013, 30 giugno 2013 e 30 settembre 2013, 31 dicembre 2013;

- per SGP-BDU 30 giugno 2013, 31 agosto 2013, 31 ottobre 2013, 31 dicembre 2013.

Nell'ambito dell'organizzazione descritta, è stato inoltre necessario ricorrere a personale esterno per consentire l'espletamento di funzioni specifiche:

- 1) un collaboratore a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di segreteria particolare (richiesta di assunzione con nota del Commissario n. 141991 del 09/06/2011); la procedura di assunzione, svolta ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Regionale, si è conclusa con l'assunzione della collaboratrice Barbara Tantini (determina di assunzione n. 10772 del 08/09/2011); la durata del contratto decorre dal 12/09/2011 al 10/12/13 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a 88.368,55 euro, corrispondenti allo stipendio lordo contrattuale e agli oneri riflessi. L'incarico è stato prorogato con determinazione n.16568 del 12/12/2013 (richiesta di proroga del contratto a tempo determinato avanzata dal Commissario del 04/12/2013) fino al termine del mandato dell'Assessore Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile, previsto per il 2015;
- 2) una unità di personale per la gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla contabilità speciale dell'Accordo, a cui si è accennato sopra, operante presso l'Agenzia regionale di Protezione Civile (richiesta di assunzione con nota del Commissario n. PG.2012.0046980 del 22/02/2012); la procedura di assunzione, svolta con una selezione pubblica ha permesso di individuare la collaboratrice Chiara Morinelli (determina di assunzione n. 3926 del 26/03/2012); la durata del contratto decorre dal 02/04/2012 al 10/12/13 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a 65.458,20 euro, corrispondenti allo stipendio lordo contrattuale e agli oneri riflessi. L'incarico è stato prorogato (richiesta di proroga del contratto a tempo determinato NP.2013 0015481 del 04/12/2013 avanzata dal Commissario Straordinario Prefetto Vincenzo Grimaldi al Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo della Regione Emilia-Romagna) fino al 01/04/2015 con determinazione n. 16314 del 09/12/2013;
- 3) una unità professionale per la fornitura dei servizi di gestione fiscale, previdenziale e assicurativa relativa al compenso del Commissario e di gestione delle ritenute dei lavoratori autonomi (offerta del Rag. Gian Paolo Gianferrari in data 19/09/2011, agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e assunta al protocollo con n. PG.2011.0231885 del 26/09/2011); la fornitura descritta è stata affidata con procedura di affidamento diretto con Decreto del Commissario straordinario n. DCS/2012/4 del 17/10/2012; l'impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo è pari a 4.033,36 euro, oltre a una quota di rimborso per spese generali pari al 15% e i contributi previdenziali del 2% di cui all'art. 13 della Legge 5 agosto 1991, n. 249;
- 4) un'unità professionale per un supporto specialistico per il monitoraggio degli interventi inseriti nell'accordo RER-MATTM; l'incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, è stato conferito mediante una procedura comparativa che ha permesso di individuare la collaboratrice Melissa Semeraro (determinazione n.11445 del 18/09/2013); la durata del contratto decorre dal 18/09/2013 al 18/09/2014 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a circa 38.000,00 euro, al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato previsto nel periodo contrattuale.

Nell'attesa dell'emanazione dei decreti di proroga degli incarichi commissariali, il MATTM, con propria nota del 06/12/2013 prot. 0052385, ha invitato i Commissari straordinari ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa di cui al decreto legge n. 293/1994 convertito in legge n. 444/97



#### 4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

Rispetto a quanto riportato nella precedente relazione, si segnalano i seguenti aggiornamenti.

Nei mesi di ottobre e novembre il MATTM ha trasferito sulla contabilità speciale n. 5578 una somma pari a 9 943 453,44 euro. Tale somma corrisponde a un'anticipazione dell'importo complessivamente previsto per il cosiddetto "Piano Nord" ed è stata resa disponibile in tre tranches riferite a quanto disposto dal punto 7 della Delibera CIPE n. 8/2012 e di seguito riportate:

- € 2.240 000 00 a titolo di saldo della prima quota pari al 20% del totale finanziato;
- € 4 550 000 00 corrispondenti alla seconda quota pari al 25% del totale finanziato;
- € 3 153 453,44 corrispondente a parte della terza quota pari al 25% del totale finanziato.

L'effettivo utilizzo di tali somme è in ogni caso subordinato al raggiungimento delle soglie di spesa indicate dal comma 7.3 della Delibera CIPE n. 8/2012.

Inoltre, come spiegato nel precedente paragrafo 3, nel corso dell'anno è stato dato corso al trasferimento di risorse dalla contabilità speciale a capitoli specifici del bilancio regionale al fine di avviare gli interventi ricompresi nell'Accordo di programma rimasti esclusi dallo stralcio di piano ex OPCM 3925/2011.

Si tratta complessivamente di 7 552.311,53 euro, così suddivisi:

- 1.400.000 euro per interventi finanziati dalla Delibera CIPE n. 6/2012;
- 6.152.311,53 euro per interventi finanziati con risorse ministeriali.

La situazione complessiva per le risorse di parte statale è riportata nella Tabella 2.

**Tabella 2:** risorse economiche di parte statale.

<b>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente</b>			
<b>Importo corrente (per l'anno 2013)</b>	<b>Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</b>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
€ 9 943 453 44	€ 50.543 453,44	€ 27 814 649,26	€ 22 728 804,18

Nella Tabella 3 è invece riassunto lo stato delle risorse in capo al cofinanziamento, rispetto alle quali si specifica nuovamente che sono allocate sui Capitoli del Bilancio della Regione poiché, per motivi di semplificazione amministrativa e rapidità di esecuzione, il Commissario ha ritenuto di non procedere al trasferimento sulla Contabilità Speciale (rif. Paragrafo 3).

Si precisa, inoltre, che i dati inseriti nella Tabella 3 sono relativi all'ultimo monitoraggio effettuato per l'anno 2013 con il contributo dei soggetti attuatori degli interventi, riferito al 31 dicembre scorso.

Tabella 3 risorse economiche relative al cofinanziamento regionale.

<b>Risorse economiche provenienti dalla Regione e dall'A.I.Po</b>			
<b>Importo corrente (per l'anno 2013)</b>	<b>Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</b>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
€ 2 297 121 32	€ 63.405.650,96	€ 20.847 708,70	€ 42 557 942,26

L'importo inserito per l'anno 2013, pari a 2.297 121,32 euro, si riferisce alle risorse individuate con la proposta di utilizzo delle economie realizzate in seguito all'attuazione dei programmi ex L. 267/1998 avanzata dalla Regione con Deliberazione n. 1122/2013. A seguito della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28/11/2013, i relativi interventi sono stati inseriti nel secondo Atto integrativo all'Accordo di Programma, sottoscritto in data 23/12/2013 (rif. Paragrafo 7).

Per ragioni di chiarezza si ritiene opportuno ribadire quanto comunicato e riportato in numerose occasioni, relativamente alla natura degli importi impegnati: in Regione Emilia-Romagna, infatti, le procedure di gestione amministrativa e contabile prevedono che l'atto formale di impegno venga adottato contestualmente all'approvazione del contratto di appalto e non in corrispondenza della programmazione dell'intervento, in quanto all'impegno di spesa deve corrispondere l'ammontare esatto dell'obbligazione giuridica perfezionata e l'identificazione del relativo beneficiario.

Ciò che viene formalmente impegnato per ciascun intervento, dunque, corrisponde agli importi di aggiudicazione e relativi oneri al netto del ribasso di gara, e non al relativo importo lordo di finanziamento. Quest'ultima somma viene tuttavia considerata "vincolata" in quanto costituisce il presupposto per poter dare luogo alle procedure di aggiudicazione e, a seguito delle medesime, di avere a disposizione le risorse per eventuali varianti in corso d'opera entro i limiti previsti dalle norme di legge, senza incorrere nel rischio di non avere la cassa necessaria.

Per completezza si specifica quindi che per questa Regione, a fronte di un impegno reale complessivo (quota finanziamento e quota cofinanziamento) di 57 776.005,55 euro, riportato nello schema finanziario di cui al Paragrafo 1, l'impegno "lordo" relativo agli importi finanziati ammonta a oltre 85 milioni di euro.

Si fa inoltre nuovamente presente che prendere a riferimento l'impegno effettivo in luogo dell'impegno "lordo" genera un dato relativo alla disponibilità di competenza sensibilmente diverso nei due casi.

**5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RELATIVO STATO DELLA SPESA**

Può risultare utile effettuare un'analisi della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi strutturali in rapporto ai costi relativi al funzionamento della struttura commissariale

Nella Tabella 4 sono riportati gli importi relativi a tali fattispecie di attività, con riferimento sia all'anno 2013 sia a tutta la durata dell'Accordo

Nella casella relativa all'attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti nell'Accordo per l'anno 2013 è riportata la spesa relativa alle sole risorse presenti nella Contabilità Speciale

**Tabella 4** spesa per l'attuazione dell'Accordo disaggregata per attività

<i>Descrizione attività</i>	<i>Importo speso corrente (per l'anno 2013)</i>	<i>Importo speso cumulato (anno 2013 e precedente periodo)</i>
<i>struttura commissariale</i>	€ 80 005 84	€ 299 443 60
<i>attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.</i>	€ 15 231 259 98	€ 27 515 206 09

Le spese indicate per la struttura commissariale si riferiscono alle seguenti voci:

1. compenso del Commissario straordinario per 298.117,22 euro, di cui 78.679,46 euro riferiti al 2013;
2. pagamenti per i servizi prestati dal Ragioniere incaricato Gianferrari Gianpaolo (capitolo 3, punto 3)) per € 1.298,10;
3. pagamenti per i servizi prestati dall'Ing. Melissa Semeraro (capitolo 3, punto 4)) pari a € 28,28 relativamente alla liquidazione all'INAIL riferiti al 2013.

In merito agli stipendi delle due collaboratrici assunte a tempo determinato (capitolo 3, punti 1) e 2)) e relativi oneri riflessi, si specifica che i medesimi sono anticipati mensilmente dalla Regione Emilia-Romagna: sono stati recentemente predisposti i Decreti commissariali per il rimborso alla Regione delle somme corrispondenti per le annualità 2012 e 2013 attraverso un trasferimento dalla Contabilità Speciale

## 6. PROSPETTO CONTABILITÀ SPECIALE

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo entrate-uscite relativo al conto di tesoreria n. 5578.

**Tabella 5:** prospetto riepilogativo entrate-uscite Contabilità Speciale.

Contabilità Speciale n. 5578 intestato al "COMMISSARIO STRAORDINARIO OPCM 3925/2011"					
Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna					
Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Emilia-Romagna sottoscritto il 3 novembre 2010					
Piano Attuativo dell'Accordo di Programma approv. con Decreto del Pres. Giunta n. 114 del 10.06.2011 reg. alla Corte dei Conti il 17/6/2011 reg.1 foglio 130					
		Entrate		Uscite	Saldo
Cap. dello Stato	Stanzamenti	Accrediti su C.S. 5578	Data accrediti		
Cap. 8640/2009		11.000.000,00			
Cap. 8531/2009		13.000.000,00	16 mag. 2011		
Cap. 8640 /2010	22.536.064,46	5.383.752,93	15 dic.2011		
Cap. 8531/2010	16.663.935,54	3.663.935,54	15 dic.2011		
art. 2 comma 240 L.191 23.12.2009	41.868.400,00				
Cap. 8531/2012		1.400.000,00	27.09.2012		
Cap. 8640/2012		6.152.311,53	18-ott-12		
	<b>2011</b>			143.520,21	21.904.168,26
	<b>2012</b>			12.359.863,67	17.096.616,12
	<b>2013</b>			15.311.265,82	
Cap. 8582 2013		129.098,01	06 sett. '13		
Cap. 8531		107.789,99	06 sett. '13		
Cap. 8531 2013		2.003.112,00	19 sett.'13		
Cap. 8531 2013		3.153.453,44	20 nov. '13		
Cap. 8531 2013		4.550.000,00	20 nov. '13		
	<b>81.068.400,00</b>	<b>50.543.453,44</b>		<b>27.814.649,70</b>	<b>22.728.803,74</b>
residuo da riscuotere	30.524.946,56				

## 7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

### 7.1 Descrizione delle attività

In adempimento a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.C.M. 10 dicembre 2010 sono state inviate le seguenti relazioni trimestrali sulle attività svolte dal Commissario nel 2013:

- 8ª relazione per il periodo gennaio-marzo (PG.2013.0135304 del 03/06/2013),
- 9ª relazione per il periodo aprile –giugno (PG.2013.0246634 del 09/10/2013);
- 10ª relazione per il periodo giugno - settembre (PG.2013.0246774 del 09/10/2013).

Nel corso del 2013 sono proseguite le attività per l'attuazione dell'Accordo, che non hanno fatto rilevare particolari criticità di ordine tecnico, se non quelle legate ad imprevisti verificatisi in corso di progettazione o di esecuzione dei lavori ove si siano verificati eventi meteorologici intensi.

Oltre all'attuazione degli interventi, le attività più rilevanti che hanno impegnato il Commissario straordinario nel corso dell'anno e, a cascata, tutte le strutture operative e di staff coinvolte, hanno riguardato l'assegnazione della quota di risorse CIPE afferenti al "Piano Nord", per la quale sono state svolte numerose riunioni di coordinamento in Regione, oltre che con le altre Amministrazioni regionali interessate e con gli uffici della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM.

È stato inoltre profuso grande impegno nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, al fine di avere a disposizione un quadro chiaro dell'effettivo avanzamento dei lavori e delle eventuali criticità riscontrate - locali o sistematiche, tecniche, amministrative o giuridiche che fossero - anche al fine di riferire al Ministero e al competente Ispettorato, sia in adempimento a quanto stabilito dall'Accordo e dal Decreto di nomina del Commissario, sia per soddisfare necessità di verifiche specifiche sollevate dagli uffici ministeriali.

Su impulso del Commissario è stata inoltre condotta un'ulteriore verifica in merito agli interventi ricompresi nell'Accordo, al fine di pervenire a una proposta di modifica aggiornata e corretta da sottoporre al Comitato di Indirizzo e Controllo nei primi mesi del 2013. Tale proposta è stata discussa durante la seduta del 13/02/2013, nel corso della quale la regione ha altresì presentato il risultato di una ricognizione delle economie realizzate in seguito alla esecuzione di interventi finanziati tra il 1998 e il 2008 con le risorse ex L. 267/1998.

A seguito della proposta del MATTM di integrare tali risorse nella quota di cofinanziamento dell'Accordo di programma, la Regione ha svolto le istruttorie e le attività tecnico-amministrative necessarie, pervenendo all'adozione di un'apposita Deliberazione di Giunta (DGR n. 1122/2013, rif. Paragrafo 4), cui è seguita una nuova convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo in data 28/11/2013. In tale occasione sono stati congiuntamente individuati gli elementi utili alla definizione del secondo Atto integrativo all'Accordo di Programma, consistenti nella modifica all'elenco degli interventi dovuta alle seguenti motivazioni:

- suddivisione in lotti di macro-interventi;
- modifiche alle disponibilità regionali sui capitoli di bilancio posti a base del cofinanziamento;
- integrazione con ulteriori sei interventi nella quota di cofinanziamento con copertura a valere sulle economie derivanti dai programmi ex L. 267/1998, di cui si è detto sopra.

Il secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma è stato firmato in data 23/12/2013.

Nel corso dell'autunno si è provveduto a fornire al Ministero gli aggiornamenti richiesti in merito allo stato di attuazione dell'Accordo e alle previsioni di spesa per il 2014, oltre che a implementare i dati nelle nuove sezioni di ReNDiS rese operative da ISPRA. Di seguito si riportano gli elementi principali di tale scambio di informazioni.

Nel mese di ottobre, il Ministero dell'Ambiente ha richiesto, con nota n. 47507/GAB del 11/10/2013, l'elenco degli interventi previsti dall'Accordo di Programma che fossero cantierabili non oltre il 30 Giugno 2014, ai fini di una loro esclusione dal patto di stabilità in vista della approvazione della Legge Finanziaria. Secondo le indicazioni riportate nella citata nota, l'Assessorato ha trasmesso il quadro richiesto con e-mail del 14/10/2013: i progetti segnalati ammontano a complessivi € 15.619.647,53.

In seguito a una specifica richiesta da parte del Ministero (nota n. 0054453/TRI del 07/11/2013) si è provveduto a compilare, nel sistema di monitoraggio RENDIS, i dati relativi all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi finanziati con la Delibera CIPE n. 6/2012.

A seguito di una ulteriore richiesta avanzata dal MATTM con nota n. 0058706/TRI del 17/12/2013 è stata avviata l'attività di ricognizione di nuovi interventi da proporre a finanziamento e la contestuale definizione di un quadro aggiornato dello stato di avanzamento fisico, finanziario e contabile di ciascun intervento inserito nell'Accordo, al fine di verificarne la compatibilità con le esigenze di una celere attuazione in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone.

Infine, nel corso del 2013 si sono svolte cinque sedute del Comitato Consultivo Regionale (CCR), in quattro delle quali sono stati esaminati progetti previsti dall'Accordo di Programma:

- nella seduta del 11 giugno sono stati esaminati due progetti, l'uno relativo al consolidamento dell'abitato di Succiso in Comune di Ramiseto (RE) (2° stralcio - annualità 2012) per un importo di 700.000,00 euro, l'altro inerente i lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche esistenti nel tratto montano del fiume Reno in località Lama di Reno (BO) per un importo di 400.000 euro;
- in data 4 settembre sono stati esaminati due progetti esecutivi, l'uno relativo alla messa in sicurezza delle arginature del fiume Santerno in località Cà di Lugo (RA) per un importo di 300.000,00 euro, l'altro inerente l'adeguamento delle arginature del fiume Montone alla piena due centennale tra le province di Forlì e Ravenna, per un importo di 1.398.647,53 euro;
- in data 24 ottobre sono stati esaminati quattro progetti finanziati con risorse statali, per un totale di 5.090.000,00 euro, e uno ricompreso nella quota di cofinanziamento per 3.000.000,00 euro;
- in data 21 novembre sono stati esaminati quattro progetti finanziati con risorse statali, per un totale di 1.900.000,00 euro, e uno ricompreso nella quota di cofinanziamento per 800.000,00 euro.

#### 7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Si riportano di seguito i dati riepilogativi dello stato di avanzamento complessivo dell'Accordo, relativi alle quote di finanziamento statale e cofinanziamento regionale (Tabella 6).

Si precisa che, relativamente alla quota di finanziamento statale, al fine di restituire dati coerenti circa la consistenza degli interventi ricompresi nell'Accordo, sono stati considerati come in "attesa di avvio" tutti gli interventi che non risultavano dotati di copertura finanziaria alla data del 31/12/2013, anche per i casi in cui per le medesime opere fossero stati già eseguiti rilievi, indagini e studi.

Per la medesima ragione, la fattispecie "esecuzione di studi e indagini" risulta non ricomprendere alcun intervento in quanto gli interventi per i quali in passato era stata indicata questa fase, ormai completata, sono attualmente in corso di progettazione o di esecuzione, oppure in attesa di avvio.

Tabella 6: riepilogo dello stato di attuazione degli interventi

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi al dicembre 2013</b>
Attesa di avvio	n. 21
Esecuzione studi ed indagini	n. 0
In corso di progettazione	n. 20
Progettazione ultimata	n. 15
Lavori aggiudicati	n. 26
In esecuzione	n. 44
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. 130
<b>Totale interventi</b>	<b>n. 256</b>

#### 8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO PER L'ANNUALITÀ 2014

Nell'annualità 2014 si darà corso all'attuazione degli interventi originariamente previsti per le annualità 2011 e 2012 relativi alla programmazione individuata per l'assegnazione dei fondi CIPE per complessivi € 18.200.000,00 (Delibera n. 6/2012), oltre a ulteriori € 6.152.311,53 relativi a risorse dal Bilancio del Ministero trasferiti sul Bilancio regionale per dare attuazione agli interventi esclusi dal piano attuativo ex OPCM 3925/2011, di cui si è detto al Paragrafo 4.

Al 31/12/2013 dei trentasei interventi finanziati con risorse FSC, ventotto hanno la progettazione esecutiva e otto sono in fase esecuzione lavori. Per tutti gli interventi c'è stata la stipula del contratto ad esclusione di due casi per i quali le obbligazioni giuridicamente vincolanti verranno contratte nella prima metà del 2014. Tale criticità era stata peraltro segnalata con e-mail del 15/11/2013, in risposta a specifica richiesta pervenuta via posta elettronica da parte della competente Direzione generale del Ministero in data 07/11/2013, e successivamente indicata nella specifica sezione di ReNDiS.

Si fa comunque presente che ai trentasei interventi finanziati con le risorse FSC è stata assegnata la priorità e pertanto per essi si prevede di arrivare al 31/12/2014 con tutti i lavori in corso di esecuzione o ultimati.

Con riferimento alla citata nota del MATTM, prot. 0058706/TRI del 17/12/2013, si prevede di segnalare le nuove necessità di interventi urgenti nei tempi richiesti e, qualora si verificasse la possibilità di nuovi finanziamenti, si procederà al coordinamento dei soggetti attuatori al fine di sviluppare la progettazione in tempi adeguati.



## 9. CRITICITÀ

Ad oggi la criticità di maggior peso rispetto all'attuazione dell'Accordo è costituita dalla mancanza di certezze circa la disponibilità delle risorse non ancora trasferite.

In particolare, come si evince dalla Tabella 5, alla Regione Emilia-Romagna non risultano assegnati € 30.524.946,56, relativi ai fondi ex art. 2, comma 240 della Legge n. 191/2009 originariamente previsti dall'Atto integrativo sottoscritto nel maggio 2011, oltre a € 9.007.600,00 previsti dalla fase programmatica.

Preme nuovamente sottolineare l'urgenza di provvedere quanto prima al trasferimento delle suddette somme: le ragioni risiedono non solo nella necessità di garantire la realizzazione in tempi brevi di interventi unanimemente riconosciuti come urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche nel fatto che tali interventi sono in parte localizzati in un territorio duramente colpito dal sisma del 2012 e dall'alluvione che ha interessato la pianura modenese nel gennaio 2014.

PAGINA BIANCA

X

Prot. n.170

Treviso, 6 febbraio 2014

*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

(D.P.C.M. 3 marzo 2011)

**RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse  
Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. 0004795/TRI del 12/02/2014

Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio e  
del Mare.

Dir. Gen. per la tutela del Territorio e delle Risorse  
Idriche.

Via Cristoforo Colombo n. 44  
00147 ROMA

**Con preghiera di cortese inoltro al Parlamento**

OGGETTO: D.P.C.M. 3 marzo 2011. Art.2 – comma 3.

**Relazione annuale al Parlamento** sull'attività del Commissario Straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Friuli – Venezia Giulia.

**Anno di riferimento: 2013.**

Sulla base delle propedeutiche in subiecta materia, afferenti gli anni 2011 e 2012, proseguiva nel gennaio 2013 l'attività commissariale diretta all'attuazione dell'A.d.P. recante gli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Friuli Venezia Giulia.

In tal contesto, il 21 gennaio 2013, presso gli uffici del Genio Civile in Pordenone, in tematico incontro tra Commissario Straordinario e Dirigente Regionale del Genio Civile, Ing. Lillini, si acquisiva, in via formale, nota del Magistrato alle Acque, n.423, datata 21/01/2013, recante disponibilità di quella struttura ad eseguire, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in regime di avvalimento, tramite i propri tecnici, interventi urgenti e prioritari, ricadenti sulle tratte fluviali di residuale competenza statale e inseriti nell'Accordo di Programma con i seguenti codici:

UD 001A/10 – Fiume Tagliamento euro 1.768.100,00;



PN 005A/10 – Fiume Livenza euro 4.000.000,00;

UD 0033A/10 – Fiume Tagliamento euro 2.890.900,00.

Tale ultimo, inserito nella sezione programmatica dell'atto integrativo dell'A.d.P., in atto non finanziabile.

Venivano, inoltre, segnalati in lettera interventi urgenti, non considerati nell'A.d.P. e di possibile attuazione attraverso la rimodulazione degli interventi di cui all'A.d.P. stesso, sempre nel caso venissero a realizzarsi economie sugli appalti, e comunque previa autorizzazione della Regione, sentito il Comitato di Controllo e di Indirizzo.

Con riferimento all'intervento riferito ad "impianto idrovoro di San Cassiano a Brugnera", si chiedeva la rivisitazione della bozza progettuale, in quanto l'idrovoro in questione non appariva del tutto compatibile in regime di piena dell'asta, rimasta di competenza del Genio Civile.

Da parte Commissariale si faceva riserva di segnalare al Comune di Brugnera le osservazioni del Genio Civile, Ente competente sull'asta ove sarebbe andata a scaricare l'idrovoro, e di dare riscontro alla citata nota n.423, chiedendo al Magistrato alle Acque di formalizzare intanto eventuale assenso all'avvalimento quale soggetto realizzatore dei due interventi UD 001A/10 – Tagliamento (euro 1.768.100,00) e PN005A/10 – Livenza (euro 4.000.000,00), sempre subordinatamente a copertura finanziaria, e secondo rispettive priorità, da parte del Ministero dell'Ambiente.

Seguiva dal Ministero dell'Ambiente lettera di convocazione a riunione del 4 febbraio 2013, in Roma, per la trattazione dei seguenti argomenti:

- a ) stato di attuazione degli interventi inseriti negli Accordi di Programma sottoscritti tra Ministero e Regioni interessate;
- b ) modalità di trasferimento delle risorse basate sul criterio di avanzamento degli interventi.

In ottemperanza a precisa richiesta posta con la lettera di convocazione, veniva compilato dal Commissario, poi consegnato nel corso della suindicata riunione, schema finanziario sintetico della contabilità speciale recante dati aggiornati al gennaio 2013, con riferimento alla delibera CIPE n.6/2012.

Il 18 febbraio 2013, tra Commissario e Comune di Sacile(PN), si addiveniva a formale convenzione di avvalimento per la realizzazione dell'intervento urgente di rinforzo degli argini del fiume Livenza, in territorio del Comune di Sacile, contraddistinto in A.d.P. al codice PN012A/10.

Analoga convenzione, in pari data, veniva sottoscritta con il Comune di Prata (PN) per la realizzazione dell'intervento di cui all'A.d.P. codice 011A/10, dal titolo " Realizzazione impianto idrovoro per lo scarico nel fiume Meduna delle acque meteoriche raccolte nel reticolo idrografico minore a difesa dell'abitato di Peressine" nel Comune di Pordenone.



Il 22 febbraio 2013 veniva sottoscritta convenzione, tra Commissario e Sindaco di Trasaghis(UD), di avvalimento di quel Comune per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di pareti rocciose nelle frazioni di Avasinis e Brulins, contraddistinti dal codice UD 023B/10 dell'A.d.P.

In tema di gestione dei fondi regionali, impegnati in A.d.P., con nota n.10048/P, la Regione F.V.G. informava il Commissario della confirmatoria Ministeriale n.16963, datata 28/02/2013, ribadente gli indirizzi ministeriali già espressi nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 14 maggio 2012, circa la possibilità di formalizzare in apposita convenzione le procedure più opportune per la gestione degli interventi già oggetto di delegazioni amministrative intersoggettive disposte dalla Regione alla data di sottoscrizione dell'A.d.P.

In relazione a tanto, si precisavano termini e modalità procedurali con riferimento ai lavori anzidetti, che, a tenore del comma 2 dell'art.6 della Convenzione (già formalizzata in data 6 agosto 2012), si sarebbero svolti col coordinamento e monitoraggio Commissariale delle relative fasi di attuazioni, mentre i relativi decreti ed atti di contabilità sarebbero stati di diretta responsabilità del Direttore del competente Servizio Regionale.

Il 27 marzo 2013, presso la sede Commissariale di PN, si teneva tematico incontro tra Commissario e Assessore competente del Comune di PN, nel corso del quale si acquisiva proposta Comunale di candidatura alla realizzazione degli interventi, di cui alle sigle PN 009A/10 e PN 010A/10, dell'A.d.P., rispettivamente concernenti "Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello" e "Realizzazione arginature di protezione delle aree abitate poste nelle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova".

Lo stesso 27 marzo 2013 veniva sottoscritta, tra Commissario e Direttore del Servizio Regionale Difesa del Suolo, convenzione di avvalimento per la realizzazione, da parte del Servizio Regionale, dell'intervento di cui alla sigla PN 007A/10 dell'A.d.P., concernente sistemazione idraulica e messa in sicurezza degli argini del fiume Meschio a difesa dell'abitato di Fratta.

Nell'aprile a seguire, con decreto Commissariale n.6, in data 02/04/2013, si disponeva l'avvalimento dell'Amministrazione comunale di Brugnera(PN) per la realizzazione dell'intervento, ricadente in quel territorio, compreso nell'Accordo di Programma di cui trattasi.



Con decreto dirigenziale n.627 del 2 aprile 2013, la Regione F.V.G. si impegnava a trasferire alla contabilità speciale del Commissario straordinario la somma di euro 806.000,00 relativa alle risorse regionali libere previste in A.d.P.

L'importo totale era quello previsto per la realizzazione di due interventi, nei Comuni di Pasiano e di Prata di Pordenone, per i quali la Regione si era proposta quale Ente realizzatore.

Il 5 aprile successivo, con commissariale n.41/2013, veniva transitata al Ministero dell'Ambiente copia di convenzione di avvalimento intervenuta con il Comune di Tarvisio per i lavori con identificativo UD024B/10, di cui all'A.d.P.

Con decreto commissariale n.8, datato 11 aprile 2013, si disponeva l'avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione dell'intervento relativo alla sistemazione idraulica della sponda sinistra del fiume Meduna, in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone (identificativo in A.d.P.:PN030C/10), per un importo di euro 533.000,00.

In tematica progressione, con decreto commissariale n.19 in data 23/04/2013, si disponeva l'avvalimento dell'Amministrazione comunale di Pordenone per la realizzazione dell'intervento, ricadente in quel territorio, compreso nell'Accordo di Programma.

Di seguito alla riunione di coordinamento, tenutasi il 23 aprile 2013 presso il Ministero dell'Ambiente e concernente l'esame delle questioni relative all'inserimento e validazione dei dati nel sistema di monitoraggio previsto dalla presa d'atto della delibera CIPE n.6/2012, questo Commissario straordinario, con nota 67 del 9/05/2013, comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico i nominativi dei funzionari dello staff commissariale destinatari delle necessarie abilitazioni per l'utilizzo del software S.G.P. – Sistema Gestione Prospettive del monitoraggio per la Banca Dati Unitaria – nelle persone del Dott. Castelli, con funzioni di manager dello strumento, e dell'Ing. Fabrizio Fattor, con funzioni di responsabile dello strumento.

Con municipale n.0036806, datata 28/05/2013, il Comune di PN, in seguito ai decreti commissariali n.19 del 23/04/2013, relativo all'intervento PN010A/10, dell'importo di euro 2000.000,00, e n.20 del 23/04/2013, relativo all'intervento PN009A/10, dell'importo di 1.600.000,00, faceva tenere all'Ufficio del Commissario Straordinario la necessaria richiesta documentazione (Deliberazione di G.M., Cronoprogrammi delle opere e generalità dei Responsabili Unici dei relativi procedimenti).

Il tutto finalizzato alla stipula della convenzione di avvalimento con il Comune realizzatore.

A sua volta, il Comune di Tarvisio, siccome realizzatore in avvalimento degli interventi a tutela della pubblica incolumità (abitati) in località Tarvisio Centrale nel Comune di Tarvisio(cod.UD024B/10), dimetteva all'Ufficio



del Commissario copia della determina dirigenziale di affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e C.R.E. dei relativi lavori.

A richiesta, in ambito di indagine conoscitiva della Corte dei Conti, con nota commissariale n.80 del 12/06/2013 si trasmetteva al MATTM lo schema finanziario sintetico della contabilità speciale, aggiornata al 12/06/2013, intestata al Commissario, presso la Sezione di Tesoreria – Banca d'Italia di Trieste.

In data 12 giugno 2013, in Trieste, presso la Direzione Centrale dell'Ambiente della Regione F.V.G., il Commissario straordinario incontrava, per convenevole approccio e confronto sulle tematiche di interesse, la Dottoressa Sara Vito, Assessore all'Ambiente nella insediata Giunta Regionale F.V.G., cui seguiva conferenza generale con le unità avvalse della stessa Regione.

Con decreto commissariale n. 6 del 2 aprile 2013, si disponeva l'avvalimento del Comune di Brugnera(PN) quale Ente realizzatore dell'intervento di urgente sistemazione idraulica del territorio e miglioramento dell'impianto idrovoro in loc. S.Cassiano a tutela di allagamenti dei relativi centri abitati, contrassegnato con Cod.PN006A/10, dell'importo di euro 1.250.000,00, a valere su fondi FAS statali.

Con decreto n.7 dell'8 aprile 2013, si disponeva avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di lavori con identificativo ISPRA UD29C/10, in territorio di Tolmezzo, per un importo di euro 400.000,00, a valere su fondi regionali.

Con decreto n.8 dell'11 aprile, si disponeva avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione dell'intervento, di cui all'identificativo ISPRA PN030C/10, in Comune di Pasiano di PN, dell'importo di euro 533.000,00, a valere su fondi regionali.

Con decreto n.9 dell'11 aprile 2013, si disponeva avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di intervento con identificativo ISPRA PN031C/10, in territorio del Comune di Prata(PN), dell'importo di euro 373.000,00 a valere su fondi regionali.

Con decreti n.15, 16, 17,18, datati 15 aprile 2013, si disponeva l'avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di lavori con identificativo ISPRA GO028C/10, lotti 1-2-3-4, in Comuni vari, presso il torrente Versa, i fiumi Isonzo e Iudrio ed il torrente Torre, dell'importo di euro 800.000,00, a valere su fondi regionali. In tematico contesto, con decreto Commissariale n.23, del 18 giugno 2013, si disponeva l'avvalimento della preesistente struttura commissariale regionale quale realizzatrice dell'intervento di difesa e regimazione idraulica del Rio del Lago, in Comune di Tarvisio, con identificativo ISPRA UD032C/10, dell'importo di euro 3.500.000,00.

Con decreti n.27 e n.28, in data 22 agosto 2013, si approvavano i progetti preliminari afferenti interventi di manutenzione argini, seconda e terza categoria, nella bassa Udinese, bacino del torrente But e bacino del fiume Tagliamento, in Comuni vari della provincia di Udine, con identificativo UD026C/10 – lotto 2 e lotto 3.



dei rispettivi importi di euro 60.000,00 e di euro 240.000,00, affidati in avvalimento alla Regione F.V.G. quale realizzatrice.

In pari data, con decreto n.26, veniva approvato il progetto preliminare, relativo agli interventi di ripristino e consolidamento in sponda sinistra del torrente But, in località Cadunea e Tolmezzo(UD), per un importo di euro 400.000,00, identificati al Cod. ISPRA UD029C/10, già affidati in avvalimento alla Regione F.V.G. quale realizzatrice.

Con decreto commissariale n.33, in data 19 settembre 2013, in prosieguo di avvalimento disposto con decreto n.12 del 15 aprile 2013, si approvava il progetto preliminare per i lavori affidati alla Regione F.V.G. quale realizzatrice e identificati col Cod.PN027C/10 – lotto1, in provincia di Pordenone, per l'importo di euro 288.000,00.

Con decreto n.34, pure in data 19 settembre 2013, si procedeva ad approvazione del progetto preliminare relativo al secondo lotto dello stesso intervento, dell'importo di euro 304.000,00, mentre, con decreto n.35, sempre in data 19 settembre, si approvava il progetto preliminare afferente l'intervento per la realizzazione del terzo lotto, dell'importo di euro 358.000,00.

Mentre a seguito di riassetti organizzativi la Direzione Regionale Ambiente veniva affidata a nuovo Dirigente, si rivelava pregnante l'adesione della Regione F.V.G. ad iniziativa della Regione Piemonte – capofila, atta a rimarcare le criticità affliggenti l'avanzamento degli interventi del "Piano Nord".

Si segnalava, nella circostanza, da parte Regionale, che il Commissario Straordinario delegato per la Regione F.V.G., con nota prot.29 dd. 19/03/2013, in relazione a precisa richiesta Ministeriale, aveva trasmesso la programmazione, nel triennio 2013-2015, delle risorse, pari ad euro 11.400.000,00, di cui alla delibera CIPE n.6/2012, per il finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in territorio regionale. In tal contesto programmatico, il Commissario aveva chiesto, per l'anno 2013, il trasferimento del 20% delle risorse, pari ad euro 2.280.000,00.

Soggiungeva, la relazione della Regione F.V.G., che: "Le modalità di trasferimento, sulla base dei vincoli imposti dal MISE con circolare prot.n.1859 dell'11/02/2013, sulla quale sono state sollevate perplessità dai Commissari, crea non pochi problemi di compatibilità con il sistema gestorio della contabilità speciale intestata agli stessi Commissari, imperniata, come è noto, sul principio che l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti siano supportati dalla previa ed effettiva disponibilità di cassa.

Disponibilità di cassa, peraltro, non solo indispensabile per la formalizzazione delle stesse obbligazioni giuridicamente vincolanti ma anche per poter assicurare nei confronti delle ditte appaltatrici il rispetto delle disposizioni in materie dei pagamenti dei lavori pubblici di cui all'art.141 del d.lgs.n.163/2006 e degli artt.143 e 144 del DPR n.207/2010".

Per così proseguire:





“Si evidenzia, inoltre, che le tempistiche ordinarie per la realizzazione dei lavori, inclusi nel finanziamento, sono assolutamente inconciliabili con la scadenza del 31/12/2013 per la sottoscrizione di un’obbligazione giuridicamente vincolante”.

E così concludere:

“ Da ultimo si fa rilevare gli ulteriori appesantimenti burocratici correlati alla nuova attività di monitoraggio delle risorse FAS/FSC, limitate alla sola quota Piano Nord, tramite il software SGP del Mise ed IGRUE.

Tale incombenza comporta un ulteriore aggravio di lavoro di inserimento informatico a carico della struttura commissariale che va a duplicarsi con il lavoro che la stessa struttura già svolge per il monitoraggio ISPRA richiesto dall’Accordo di Programma.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si chiede uno slittamento dei termini di rendicontazione delle risorse richieste di cui alla delibera CIPE sopraccitata...”.

Nel mese di settembre 2013, pervenivano, intanto, accreditamenti in contabilità speciale 5632 del Commissario dei rispettivi importi di euro 148.382,00 e di euro 1.254.694,92.


Con decreto Commissariale n.36 , in data 7 ottobre 2013, si approvava progetto preliminare di intervento per la sistemazione idraulica e messa in sicurezza degli argini del fiume Meschio, a difesa dell’abitato di Fratta, in Comune di Caneva(PN), contraddistinto in A.d.P. cod. PN007A/10, già affidato, con decreto di avalimento n.12 del 3 dicembre 2012, alla Regione F.V.G. Direzione Centrale Ambiente ed Energia quale Ente realizzatore.

A seguire, in data 21 ottobre, veniva approvato il progetto preliminare dell’intervento PN011A/10 per la realizzazione di impianto idrovoro per lo scarico nel fiume Meduna delle acque meteoriche a difesa dell’abitato di Peressine in Comune di Prata(PN).

In data 11/11/2013, seguiva incontro conoscitivo e consultivo con il subentrato neo eletto Assessore Regionale all’Ambiente, Dott.ssa Sara Vito, preceduto, lo stesso giorno e presso gli stessi uffici regionali in Trieste, da preambolo concertativo tra Commissario straordinario con staff regionale e prefettizio in avalimento Commissariale, e i nuovi vertici designati alla Direzione Centrale Ambiente della Regione F.V.G., in primis il Direttore Dott. Dario Danese, subentrato al Dott. Giovanni Petris. Si cennava alla necessitata definizione di nuovo nucleo di personale Regionale da designarsi in avalimento al Commissario, atteso l’avvicendamento di vertice Direzionale regionale.

Vi si rassegnavano problematiche di attualità e urgenza tratteggiandosi eventuali ipotesi risolutive da avviare presso i competenti organi deliberanti della Regione.

Il tutto, quindi, sottoposto all’attenzione dell’Assessore Dott.ssa Sara Vito, al successivo cospetto della quale Commissario e staff avvalso, con Direttore Centrale Regionale, convenivano e conferivano, dopo i



convenevoli di rito, con l'espresso auspicio commissariale di acquisire adeguato rinnovato supporto organizzativo.

Ibidem, si richiamava l'attenzione sulla necessità di rimodulare gli avvalimenti, onde assicurare utili apporti per un più rapido ed efficace disbrigo delle attività e dei procedimenti in attuazione dell'A.d.P..

Al riguardo, soggiungeva il Commissario la necessità di individuare anche figure professionali in grado di coadiuvare il direttore amministrativo-contabile, di appartenenza prefettizia, che ha sin da principio, per quanto possibile, in affiancamento al Commissario e con l'ausilio di altra professionalità prefettizia di rango subalterno, consentito l'operatività della struttura Commissariale nei vari ambiti ed in particolare in quello amministrativo-contabile. Tanto più, fino alla delibera Regionale di avvalimento al Commissario ed alla correlata, succedanea convenzione del 6 agosto 2012 tra Commissario e Regione.

Il 20 novembre 2013, con decreto commissariale n.38, si disponeva l'avvalimento del Magistrato alle Acque di Venezia, Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, quale realizzatore, per i lavori con identificativo PN005A/2010 di cui all' A.d.P., relativi a consolidamento arginale in località Traffe, in Comune di Pasiano di Pordenone.

Con e-mail del 17 dicembre 2013, il Ministero dell'Ambiente sollecitava i Commissari Straordinari a prendere atto delle disposizioni contenute nel D.L.10/12/2013, n.136, art.6, entrato in vigore al 10/12/2013, in materia di Commissari per il dissesto idrogeologico.

Chiedeva il Ministero di comunicare per quali interventi i Commissari Straordinari indirizzati si avvalsero di strutture non ricomprese tra quelle ammesse dal dettato normativo appena vigente, dettagliandone numero, tipologia ed ammontare dei procedimenti affidati, in essere.

Con e-mail datata 18 dicembre 2013, questo Commissario riscontrava l'anzidetta richiesta ministeriale, comunicando di aver individuato per l'avvalimento, tra le strutture non ricomprese in quelle ammesse dal dettato normativo (art.6 D.L.136/2013), la sola struttura facente capo al Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna di Pordenone, quale realizzatrice dell'intervento per arginature di contenimento delle acque di piena del fiume Fiume a difesa del capoluogo in Comune di Fiume Veneto, dell'importo di euro 1.500.000,00. Nei confronti del Consorzio anzidetto era stato emesso decreto Commissariale di avvalimento n.39, in data 11/12/2013, in quasi concomitanza con il D.L.136/13 e perciò nella sconoscenza di esso da parte Commissariale.

Si soggiungeva che in data 18/12/2013 il Consorzio di Bonifica in parola, in ossequio al Decreto Legge citato, era stato invitato a soprassedere alla produzione dei documenti richiesti in decreto Commissariale.

La procedura resta prudenzialmente sospesa, dopo la normazione d'urgenza, a necessitata moratoria in relazione ad ipotesi emendative, da più parti officiosamente formulate, sul disposto di cui all'art.6 del D.L.136/2013.



Si allega, a concludente documentazione, cronoprogramma degli interventi in A.d.P., aggiornato al 31/12/2013 e prospetto riassuntivo di contabilità Commissariale.

Con osservanza



Il Commissario Straordinario

Dr. Vittorio Capozelli





MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



REGIONE  
LAZIO

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL  
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE  
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

(Art. 2, comma 240, Legge 23 dicembre 2009 n. 191)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2011)

X

Prof. P. Pernice  
Pernice

Prot. 365

Roma, 12 4 FEB. 2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse  
Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. 0006582-TRJ del 03/03/2014

Al Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Tutela Risorse  
Idriche- Div.X  
Via C. Colombo,44  
00100 Roma

c.a. Avv. Maurizio Pernice

**OGGETTO:** Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Lazio. Relazione annuale 2013.

Si trasmette la relazione annuale anno 2013 sullo stato delle attività del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. del 07/11/2011

Dott. Vincenzo Santoro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO: Dott. Vincenzo Santoro

Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – D.P.C.M. del 07 novembre 2011

RENDICONTO N: 1

Esercizio finanziario 2013

Contabilità speciale n. 5584 aperta il 08/04/2011

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 61.687.420,12	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari		1) Redditi da lavoro dipendente	€ 125.712,85
2) Fondi Statali		2) Consumi intermedi	
3) Fondi Regionali	€ 1.690.604,53	3) Interessi passivi	
4) Fonti di Enti Locali		4) Trasferimenti a Regioni	
5) Tariffe e Proventi per servizi	€ 14.479,44	5) Trasferimenti a Enti Locali	€ 266.593,33
6) Accensione Prestiti		6) Investimenti diretti	€ 2.169.426,26
7) Altro		7) Trasferimenti in c/capitale	€ 362.613,99
		8) Rimborso prestiti	
		9) Versamenti erariali	€ 102.888,51
		10) Versamenti previdenziali	€ 45.404,18
		11) Altro	€ 2.253.387,30
		<b>Totale uscite</b>	<b>€ 5.326.026,42</b>
<b>Totale al 31/12</b>	<b>€ 63.392.504,09</b>	12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€ 2.370,97
		Disponibilità di cassa	€ 58.064.106,70
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 63.392.504,09</b>

Roma, .....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Dott. Vincenzo Santoro

IL DIRETTORE

DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

DI .....



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione annuale anno 2013

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. del 7/11/2011

07/02/2014

Commissario Straordinario Delegato

Dott. Vincenzo Santoro

PAGINA BIANCA



## 1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

*(Completare i campi sollecitati)*

<b>Regione</b>	Lazio
<b>Commissario straordinario delegato</b>	Vincenzo Santoro
<b>Decreto nomina</b>	D.P.C.M. del 7/11/2011
<b>Data sottoscrizione Accordo</b>	15/07/2010
<b>Data sottoscrizione Accordo Integrativo</b>	15/07/2010
<b>Importo complessivo assentito in Accordo</b>	90.000.000,00
<b>Importo programmato per il periodo (anno 2013)</b>	55.165.763,58
<b>Importo speso per il periodo (anno 2013)</b>	5.328.397,39
<b>Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2013)</b>	

## 1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

*(Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale)*

In data 15 luglio 2010 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio un Accordo di Programma (AP) finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 240. della Legge 23 gennaio 2009. n. 191.

Con D.P.C.M. del 7.11.2011 è stato nominato il Dott. Vincenzo Santoro, Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 del suddetto Accordo di programma da effettuare nel territorio della Regione Lazio.

## 1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

*(Descrivere la struttura commissariale sia dal punto di vista logistico sia come risorse umane)*

L'attività del Commissario straordinario delegato dal punto di vista logistico viene svolta all'interno della struttura della Regione Lazio.

Il Commissario, per l'espletamento delle attività di cui all'accordo di programma, si avvale del personale degli uffici della Regione Lazio, infatti con decreto n. 2 del 29/9/2011 ha costituito un gruppo di lavoro composto da personale interno della Regione.

Tale gruppo di lavoro è formato da figure professionali in grado di svolgere gli incarichi di supporto tecnico- amministrativo alle attività del Commissario Straordinario delegato nelle varie fasi relative alla progettazione, espletamento delle gare di appalto ed esecuzione dei lavori degli interventi individuati nell'Allegato 1 del suddetto Accordo di programma da effettuare nel territorio della Regione Lazio.

Ha proceduto inoltre, all'assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di un soggetto esterno per lo svolgimento delle attività a supporto dell'Ufficio del Commissario.

#### 1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

*Indicare quanto è stato versato sulla c. s. del Ministero dell' Ambiente, dalle Regioni o da altre fonti sia con imputo corrente che cumulato, lo speso e relativi residui*

<b>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell' Ambiente</b>			
<b>Importo corrente</b> <i>(per l'anno 2013)</i>	<b>Importo cumulato</b> <i>(anno 2013 + precedente periodo)</i>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
58.245.286,54	60.000.000,00	8.754.799,2	51.245.200,80

<b>Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare)</b>			
<b>Importo corrente</b> <i>(per l'anno 2013)</i>	<b>Importo cumulato</b> <i>(anno 2013+ precedente periodo)</i>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
1.690.604,53	1.758.904,53	0	0

#### 1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

*Indicare per ciascuna delle attività indicate nella seguente tabella il relativo stato di realizzazione della spesa, con particolare esclusivo riferimento quanto effettivamente pagato*

<b>Descrizione attività</b>	<b>Importo speso corrente</b> <i>(per l'anno 2013)</i>	<b>Importo speso cumulato</b> <i>(anno 2013 + precedente periodo)</i>
struttura commissariale	€ 167.909,75	€ 268.695,80
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	€ 5.158.116,70	

## 1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

*Allegato al prospetto contabile riapilativo entimonitorio del 1° gennaio al 31 dicembre 1973*

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 61.687.420,12	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari		1) Redditi da lavoro dipendente	€ 125.712,85
2) Fondi Statali		2) Consumi intermedi	
3) Fondi Regionali	€ 1.690.604,53	3) Interessi passivi	
4) Fonti di Enti Locali		4) Trasferimenti a Regioni	
5) Tariffe e Proventi per servizi	€ 14.479,44	5) Trasferimenti a Enti Locali	€ 266.593,33
6) Accensione Prestiti		6) Investimenti diretti	€ 2.169.426,26
7) Altro		7) Trasferimenti in c/capitale	€ 362.613,99
		8) Rimborso prestiti	
		9) Versamenti erariali	€ 102.888,51
		10) Versamenti previdenziali	€ 45.404,18
		11) Altro	€ 2.253.387,30
		<b>Totale uscite</b>	<b>€ 5.326.026,42</b>
<b>Totale al 31/12</b>	<b>€ 63.392.504,09</b>	12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€ 2.370,97
		Disponibilità di cassa	€ 58.064.106,70
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 63.392.504,09</b>

## 1.7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

## 1.7.1 Descrizione delle attività

*Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale del commissario, sia a livello locale degli enti realizzatori e rilevare gli eventuali ritardi/omissioni rispetto al corrispondente piano delle attività per il periodo di riferimento.*

Tutte le attività sono svolte a livello centrale dal Commissario e dalla sua struttura, mentre sono state trasferite a livello locale per una maggiore collaborazione con i Comuni, la redazione delle progettazioni dei vari interventi. Le criticità maggiori si sono avute soprattutto nell'acquisizione dei pareri da parte dei vari Enti competenti in materia ( Soprintendenze, Genio civile).

## 1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

*Attraverso la compilazione delle tabelle sottostanti evidenziare lo stato di avanzamento globale degli interventi in Anno. Lo stato di attuazione relativa ad ogni singolo intervento dovrà essere indicato all'interno l'appuntamento della scheda intervento FENADIS e lì, dove previsto, nelle tabelle Dati Unificati del CISA.*

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi al dicembre 2013</b>	<b>n. interventi al dicembre 2012</b>
Attesa di avvio	n. 4	n. 14
Esecuzione studi ed indagini	n. 1	n. 3
In corso di progettazione	n. 14	n. 22
Progettazione ultimata	n. 14	n. 15
Lavori aggiudicati	n. 6	n. 1
In esecuzione	n. 19	n. 3
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 1	n. 1
<b>Totale interventi finanziati</b>	<b>59</b>	

#### 1.8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014

*Completare la tabella seguente*

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014</b>
Attesa di avvio	n. 1
Esecuzione studi ed indagini	n. 0
In corso di progettazione	n. 3
Progettazione ultimata	n.5
Lavori aggiudicati	n. 14
In esecuzione	n. 11
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 25
<b>Totale interventi finanziati</b>	<b>59</b>

#### 1.9. CRITICITA'

*Descrivere le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo.*

Le maggiori criticità che hanno portato ad un rallentamento iniziale, si sono avute maggiormente nelle procedure di acquisizione dei pareri da parte degli organi competenti. Si

evidenzia che pur essendo state espletate le conferenze di servizi, per alcuni lavori da effettuare soprattutto nel Comune di Roma, trattandosi di zone archeologiche è stato necessario acquisire pareri specifici da parte delle Soprintendenze archeologiche con conseguente rallentamento della tempistica prevista in fase di progettazione esecutiva.

#### **1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE**

*Annunziato e precisazioni finali che si ritengono essenziali ad uno esecutivo futuro che preserva l'edifico*

In conclusione, come si evince dall'avanzamento dei lavori, tutti gli interventi previsti nell'Accordo di programma sono stati attivati. Per l'appalto degli interventi sono state esperite gare ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa del codice degli appalti D.L.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

m\_ante.TRI.REGISTRO UFFICIALE (I) .0003509.04-02-2014



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli  
interventi di mitigazione del rischio idro geologico*

Al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare Direzione Generale per  
la Tutela del Territorio e delle risorse idriche  
alla c.a. Avv. Maurizio Pernice via Cristoforo  
Colombo, 44 00100 ROMA (RM) Email:  
DGTri@pec.minambiente.it

e, p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare Direzione Generale  
Ispettorato Generale alla c.a. ing. Mauro  
Luciani via Cristoforo Colombo, 44 00100  
ROMA (RM)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare Direttore Generale della  
Direzione per la Tutela del territorio e delle  
risorse idriche Divisione X - Difesa del suolo,  
rischio idrogeologico e distretti ideografici  
c.a. Maddalena Mattei Gentili via Cristoforo  
Colombo, 44 00100 ROMA (RM)

**Oggetto : Invio relazione annuale anno 2013.**

Con la presente si trasmette ai sensi dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione annuale 2013 sull'attività svolta dallo scrivente Commissario per l'attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CARLO MARIA MARINO

*Il Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui  
all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione  
Lombardia (D.P.C.M. 10 dicembre 2010)*

Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

Tel. 02-67656585 – Fax 02-67652938

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)[mitigazione\\_rischio\\_idrogeologico@pec.regione.lombardia.it](mailto:mitigazione_rischio_idrogeologico@pec.regione.lombardia.it)



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione annuale anno 2013

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 dicembre 2010

04/02/2014

Commissario Straordinario Delegato

Carlo Maria Marino

PAGINA BIANCA



## 1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA


<b>Regione</b>	<b>LOMBARDIA</b>
<b>Commissario straordinario delegato</b>	<b>CARLO MARIA MARINO</b>
<b>Decreto nomina</b>	<b>10 DICEMBRE 2010</b>
<b>Data sottoscrizione Accordo</b>	<b>4 NOVEMBRE 2010</b>
<b>Data sottoscrizione Accordo Integrativo</b>	<b>19 MAGGIO 2011</b>
<b>Importo complessivo assentito in Accordo</b>	<b>217.640.700,00</b>
<b>Importo programmato per il periodo (anno 2013)</b>	<b>54.294.500,00</b>
<b>Importo speso per il periodo (anno 2013)</b>	<b>24.153.907,46</b>
<b>Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2013)</b>	<b>31.548.088,47</b>

## 1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Nel 2013 in Lombardia vi sono stati alcuni dissesti diffusi, ma senza eventi particolarmente intensi. Sono comunque diverse le situazioni a rischio anche elevato ancora presenti sul territorio per le quali non è stato finanziato sinora alcun intervento.

Nella tabella sottostante sono indicati gli interventi prioritari di difesa del suolo da finanziare, che Regione Lombardia ha richiesto al Ministero dell'Ambiente, tra cui anche gli interventi della fase programmatica presenti nell'Atto integrativo dell'Accordo di programma.


Provincia	Comune	Località	Titolo	Importo totale	Importo richiesto
Bergamo	GANDELLINO	Tezzi	Completamento galleria drenante	5.950.000,00	1.300.000,00
Bergamo	SAN PELLEGRINO TERME	San Rocco	Realizzazione di difese per caduta massi sull'abitato	500.000,00	500.000,00
Brescia	CIVIDATE CAMUNO	Fiume Oglio	Argine fiume Oglio	3.795.500,00	2.100.000,00
Lecco	COSTA MASNAGA	Brenno	Realizzazione vasca di laminazione sul Torrente Bevera	4.000.000,00	3.000.000,00
Milano	PAULLO	Colturano, Mediglia, Tribiano, Vizzolo Predabissi	Riqualificazione idraulica ambientale del colatore Addetta	15.071.832,22	10.441.186,61



Mantova	GUIDIZZOLO	Birbesi, Gaiole, Possenta	Lavori di sistemazione idraulica del Vaso Birbesi e della rete di scolo dell'abitato di Guidizzolo	1.500.000,00	1.500.000,00
Varese	TRADATE	A monte della SP19	Realizzazione area di laminazione in comune di Tradate ed altri	6.000.000,00	6.000.000,00
Sondrio	CHIESA IN VALMALENCO	Corno di Braccia	Consolidamento vallo paravalanghe Corno di Braccia	5.900.000,00	5.900.000,00
Milano	PADERNO DUGNANO	anche Provincia Monza e della Brianza	Realizzazione area di laminazione sul torrente Seveso a protezione della Città di Milano	110.000.000,00	34.000.000,00
Bergamo	BRANZI	Pizzo dell'Orto - sito valanghivo Valle delle Ruine	Opere paravalanghe - sito valanghivo Valle delle Ruine	553.000,00	553.000,00
Bergamo	ARDESIO	Ludrigno	Opere paravalanghe in Valle Vendulo, a protezione del centro abitato	2.470.000,00	950.000,00
Pavia	PAVIA	Travacò Siccomario - San Martino Siccomario - Cava Manara	Costruzione impianto idrovoro su canale Gravellone e su Colatore Fuga	2.000.000,00	2.000.000,00
Sondrio	VALFURVA	Ruinon	Bypass idraulico torrente Frodolfo	33.000.000,00	33.000.000,00
Brescia	GARDONE VAL TROMPIA	Bovegno, Concesio, Gardone Val Trompia, Nave	Interventi prioritari di sistemazione idrogeologica in Valle Trompia	1.385.000,00	765.000,00
Lodi	SAN ROCCO AL PORTO	San Rocco al Porto	Rialzo e ringrosso dell'argine maestro del fiume Po	1.500.000,00	1.500.000,00
Pavia	SAN CIPRIANO PO	San Cipriano Po	Realizzazione dell'argine maestro nel Comune di San Cipriano Po	5.500.000,00	4.000.000,00
Mantova	SERMIDE	Moglia	Realizzazione della nuova controchiavica a Po, a valle di quella esistente, presso l'impianto di sol	7.800.000,00	1.550.000,00
Milano	CASSANO D'ADDA	Traversa Retorto	Ristrutturazione opera di presa del canale Retorto sul fiume Adda	3.000.000,00	3.000.000,00
Pavia	TRAVACÒ SICCOMARIO	Travacò Siccomario	Adeguamento argine maestro tratto confluenza Fiume Po - Fiume Ticino	2.500.000,00	2.500.000,00

### 1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

In data 14/03/2011 il Commissario straordinario ha provveduto all'emissione di un decreto di avalimento con il quale ha individuato in Regione Lombardia, nella Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, la struttura principale per le attività tecnico amministrative e di coordinamento connesse all'attuazione degli



interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'Accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Le unità di personale che si occupano, a tempo parziale, degli interventi dell'Accordo di programma e delle attività amministrative connesse sono composte da 2 dirigenti, 3 quadri e 6 funzionari.

Il Commissario ha inoltre individuato le seguenti strutture regionali di cui avvalersi per gli aspetti di competenza in relazione all'attuazione dell'Accordo di Programma:

- Direzione Generale Protezione Civile, polizia locale e sicurezza e la Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio;
- Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria della Direzione Centrale Programmazione integrata, per gli aspetti relativi ai capitoli di bilancio;
- Unità Organizzativa Servizio Giuridico regionale e avvocatura, della Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo, per le questioni legali e giuridiche;
- Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi indipendenti, per le procedure relative ai controlli amministrativi;
- Struttura Valutazione di Impatto ambientale della Direzione generale Ambiente, Energia e Reti, per le verifiche di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Struttura Programmazione Comunitaria e attuazione del PAR 2007-2013 del FAS, della Direzione Centrale Programmazione Integrata, per la gestione dei fondi FAS regionali;
- Sedi Territoriali di Regione Lombardia, per i controlli a livello locale degli interventi e per i pareri e le autorizzazioni di competenza.

Nello stesso decreto è stata anticipata l'individuazione della tipologia degli Enti attuatori degli interventi, di cui all'Accordo di Programma, presa anche visione dei criteri di individuazione di cui alla d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369, tra Comuni, Comunità Montane, Province, Consorzi, Parchi ed Enti del Sistema Regionale.


#### 1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

<b>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente</b>			
<b>Importo corrente (per l'anno 2013)</b>	<b>Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</b>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
8.304.420,92	43.173.651,69	27.182.896,15	15.990.755,54*

\*di cui 14.872.005,95 impegnati

<b>Risorse economiche provenienti dalla Regione</b>			
<b>Importo corrente (per l'anno 2013)</b>	<b>Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</b>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
4.163.629,42	88.999.808,10	45.751.135,53	43.248.672,57*

\*di cui 17.126.551,99 impegnati



## 1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

<i>Descrizione attività</i>	<i>Importo speso corrente (per l'anno 2013)</i>	<i>Importo speso cumulato (anno 2013 + precedente periodo)</i>
<i>struttura commissariale</i>	120.882,20	410.569,60
<i>attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.</i>	24.103.025,26	72.523.462,08

## 1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

<b>ENTRATE 2013</b>	
Giacenza di cassa al 1/1/2013	65.723.768,17
1) Fondi Statali	8.304.420,92
2) Fondi regionali	4.163.629,42
3) Restituzione fondi erogati	13.683,59
<b>Totale al 31 dicembre 2013</b>	<b>78.205.502,10</b>

<b>USCITE 2013</b>	
Tipologia di spesa:	
A) redditi da lavoro	29.302,00
B) consumi intermedi	4.305,89
C) interessi passivi	0,00
D) trasferimenti a Enti regionali	7.982.404,81
E) trasferimenti ad Enti Locali	16.120.620,45
F) investimenti diretti	0,00
G) trasferimenti in c/capitale	0,00
H) rimborso prestiti	0,00
I) versamenti erariali	7.923,98
L) versamenti previdenziali	9.350,33
M) altro	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>24.153.907,46</b>
disponibilità di cassa	54.051.594,64
<b>Totale a pareggio</b>	<b>78.205.502,10</b>



## 1.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

### 1.7.1 Descrizione delle attività

Al 31 dicembre 2013 sono state stipulate convenzioni con gli Enti Attuatori, per un totale di 161 interventi attivati; per altri 2 interventi, comunque già in corso per precedenti accordi, si procederà alla stipula delle convenzioni appena risolte le problematiche ancora esistenti; si tratta dell'intervento della vasca di laminazione di Costa Masnaga (codice LC064B/10) di cui si è in attesa di definire le competenze sugli interventi necessari, con la Società Holcim, per il ripristino della miniera di Brenno quale area di laminazione, a seguito del parere positivo espresso dal Consiglio dei Ministri sul progetto preliminare, nella riunione del Consiglio del 29 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 14-quater della legge 241/90 e dell'articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 20 luglio 2011, nonché dell'intervento relativo alla vasca di laminazione sul torrente Guisa a Cesate (codice MI082B/10), già appaltato, di cui è in corso la sostituzione dell'Ente Attuatore (AIPO al posto della Provincia di Milano).

**Risultano quindi attivati tutti gli interventi previsti nell'Accordo di programma.**

Per gli interventi dell'Accordo sono state attivate risorse per un totale di **215.340.700,00 €** (dei 217.640.700,00 € dell'AdP), di cui:

- 69.770.700,00 € (dei 69.770.700,00 € dell'AdP) a valere sui fondi a carico del Ministero dell'Ambiente;
- 145.570.000,00 € (dei 147.870.000,00 € dell'AdP) a valere sul cofinanziamento regionale.

#### **Stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2013:**

- 36 interventi hanno concluso i lavori;
- 61 interventi sono in fase di realizzazione, con lavori in corso;
- 17 interventi sono in fase di appalto;
- 49 interventi sono in corso di progettazione


Dei 36 interventi che hanno concluso i lavori, 21 hanno concluso anche l'iter amministrativo, da cui sono emerse economie per un totale di 381.496,48 €.

Nel 2013, per l'attuazione degli interventi sono stati liquidati agli Enti Attuatori importi per un totale di 24.033.025,26 €.

Nel corso del 2013 sono state sottoscritte le seguenti convenzioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma:

- Il 16 gennaio rinnovata la convenzione l'Ufficio d'Ambito territoriale della Provincia di Varese e la Bozzente s.r.l. per l'intervento sul fiume Bozzente a Cislago-Mozzate (VA159B/10);
- il 18 marzo 2013 rinnovata la convenzione con il Parco Regionale della Valle del Lambro per le opere di regolazione idraulica del lago di Pusiano - cavo Diotti, a Merone (CO049B/10);
- il 26 marzo 2013 stipulata la convenzione con l'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO) per l'intervento sul nodo idraulico di Brescia (BS170A/10).

Sono inoltre stati sottoscritti, in data 8 gennaio 2013, due Addendum alle convenzioni con AIPO relative al nuovo argine in destra Serio, in Comune di Sergnano (CR059A/10) e alla realizzazione dell'argine in sinistra Adda in Comune di Rivolta d'Adda (CR058A/10), a seguito della modifica dell'importo delle convenzioni precedentemente firmate, approvata dal Comitato di Indirizzo e Controllo dell'AdP.




A seguito della conclusione della sperimentazione del trasferimento ad ERSAF di personale delle Sedi Territoriali Regionali, in data 30 settembre 2013, ERSAF ha comunicato che in conseguenza delle mutate condizioni organizzative conseguenti alla sperimentazione dei “servizi al territorio”, è nelle condizioni di dover interrompere l’attività su 22 interventi di cui è Ente Attuatore, la cui progettazione è stata effettuata da personale rientrato in Regione Lombardia.

Il Commissario Straordinario ha quindi chiesto a Regione Lombardia - U.O. Coordinamento SIREG e STER la disponibilità a gestire tali interventi; le Sedi Territoriali Regionali si sono rese disponibili ad assumere la gestione di 20 interventi dell’Accordo di Programma.

Con decreto del Commissario Straordinario del 17 ottobre 2013, n. 76, sono stati individuati gli Enti Attuatori dei 22 interventi precedentemente assegnati ad ERSAF, elencati nella tabella sottostante.

PROV.	COMUNE	LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	NUOVO ENTE ATTUATORE
BG	BERGAMO, LALLIO, STEZZANO, DALMINE, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, VERDELLO, VERDELLINO, ARCENE, CISERANO, LURANO, POGNANO, CASTEL ROZZONE, LEVATE	varie	Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio esondazione Torrente Morletta.	500.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BG	DOSSENA	Malavista	Ripristino opere esistenti lungo le valli Bretta e Moia	90.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BG	FUIPIANO IMAGNA	Prato del Sole	Sistemazione idraulica Torrente Barboglio	80.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BG	LOVERE	Lovere	Sistemazione tombotto Valle Rescudio, loc. centro abitato	80.000	sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BS	GUSSAGO	varie	Manutenzione briglie in località Caricatore e in Val Gandine e pulizia torrente Gandovere	150.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BS	SULZANO	Sulzano	Sistemazione torrente Calchere	35.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
BS	VILLA CARCINA	Villa Carcina	Adattamento scogliere fiume Mella	370.000	AIPO
CO	CARIMATE	varie	Rettifica livellata di fondo e ripristino difese idrauliche sul torrente Seveso nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia ed il tratto a valle del ponte S.P. Novedratese	50.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
CO	SAN SIRO	Acquaseria	Regimazione tratto terminale a lago e consolidamento difese esistenti lungo il torrente Serio	75.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
CO	SORICO	Sorico	Ricalibratura alveo e consolidamento difese idrauliche deteriorate nel tratto terminale del torrente Sorico a lago	50.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA



LC	BARZIO	Barzio	Manutenzione e completamento regimazione idraulica sulla valle Inseca	82.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
PV	BORGOPRIOLO	varie	Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento alveo sui torrenti Coppa e Schizzola.	220.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
PV	CASTANA	varie	Ripristino reticolo idrico, Rio Pulice e Foso Matto	150.000	sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
PV	FORTUNAGO	varie	Ripristino opera ammalorate e consolidamento spondale torrente Ardivestra	70.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
SO	CHIESA IN VALMALENCO	Valle di Somprato	Manutenzione alveo Valle di Somprato da quota 1000 a quota 1200 in Comune di Chiesa in Valmalenco.	150.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
SO	GORDONA, MESE	Mulino	Rifacimento e consolidamento arginature e sponde sul torrente Rossedo	150.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
SO	VALDISOTTO	varie	Sistemazione alveo Rio li Canal	50.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
SO	VALFURVA	varie	Realizzazione di soglie e scogliere sul torrente Frodolfo a S. Antonio e S. Nicolò	300.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
VA	CASTELVECCANA	Veccana	Lavori di ripristino manufatti idraulici - Torrente Froda	250.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
VA	LAVENO MOMBELLO	Mombello	Sistemazione frana sovrastante via Gattirolo	250.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA
VA	TRAVEDONA MONATE	varie	Sistemazione manufatti sul torrente Acquanegra	150.000	Comune di Travedona Monate
VA	VALGANNA	varie	Sistemazione e regimazione idraulica del torrente Margorabbia e affluenti	200.000	Sede Territoriale REGIONE LOMBARDIA

A tal fine sono quindi state sottoscritte le convenzioni con i nuovi Enti Attuatori:

- Il 5 novembre 2013 con il Comune di Travedona-Monate;
- Il 7 novembre con l'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO);
- Il 7 novembre con Regione Lombardia - U.O. Coordinamento SIREG e STER.

Successivamente è stata sottoscritta (20 dicembre 2013) una convenzione integrativa con ERSAF nella quale è prevista la continuazione della realizzazione dei rimanenti 26 interventi di manutenzione e strutturali dell'importo totale di € 6.510.000,00 €. Inoltre, per i 22 interventi progettati ed in seguito trasferiti ad altri Enti Attuatori, è stata rendicontata da ERSAF una spesa di 16.699,44 € e la differenza, rispetto all'anticipazione dei fondi precedentemente erogati per 350.200,00 €, pari a 333.500,56 € al netto delle spese, è previsto che verrà compensata dal Commissario Straordinario nei successivi pagamenti.



Infine, in data 2 dicembre 2013, è stata stipulata una convenzione biennale con L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia) per le attività di supporto tecnico al monitoraggio e gestione del rendiconto ad ISPRA (nel sistema informativo ReNDIS di cui all'art. 9 dell'AdP) sull'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente, a supporto del Commissario Straordinario, dell'importo di 120.000,00 €.

E' attivo il sito istituzionale del Commissario straordinario, periodicamente aggiornato, che contiene le indicazioni per la realizzazione e rendicontazione degli interventi da parte degli Enti Attuatori e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del programma. sul sito del Commissario Straordinario nella pagina "Trasparenza, valutazione e merito" vengono pubblicati tutti i pagamenti effettuati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Per attuare gli interventi previsti nell'Accordo di programma sono stati effettuati diversi incontri e riunioni sia in sede che presso altri Enti ed in particolare:

- 4 incontri presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 33 riunioni in sede o presso altre sedi per la gestione ed attuazione degli interventi;

Per l'avanzamento tecnico finanziario degli interventi, nel 2012, il Commissario ha sottoscritto 107 decreti di pagamento, a cui è seguita l'emissione di 111 mandati di pagamento alla Banca d'Italia.

Mediamente le procedure di verifica e l'erogazione del pagamento avviene entro 30 giorni dal momento in cui viene protocollata in entrata la richiesta da parte dell'Ente Attuatore.

Il Commissario per il proseguo delle attività legate all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma ha predisposto 3 decreti necessari alle modifiche sopravvenute nella definizione degli Enti Attuatori degli interventi dell'Accordo di programma e per la definizione del regolamento per l'erogazione degli incentivi.

Gli interventi in capo agli Enti Attuatori avanzano mediamente con regolarità e con scarsi ritardi rispetto alle tempistiche previste nelle convenzioni sottoscritte. Ritardi si hanno per gli interventi affidati al sistema Regionale, a seguito delle problematiche organizzative emerse nel 2013, nonché per gli interventi più complessi (es. vasche di laminazione) per i tempi lunghi che richiedono le diverse autorizzazioni. Alcuni ritardi negli appalti si sono verificati per la necessità di negare l'assenso commissariale alle procedure di appalto per mancanza di completa copertura finanziaria degli interventi sulla contabilità speciale a seguito del ritardato trasferimento delle risorse ministeriali. Ritardi si sono spesso verificati nel trasferimento dei fondi agli Enti Attuatori a causa della necessità del rispetto del Patto di Stabilità locale.

Per alcuni interventi strutturali di notevole importanza, anche economica, sono in corso le progettazioni dopo che le procedure autorizzative previste dalla legge si sono risolte in tempi lunghi, nonostante gli incontri ed i solleciti da parte commissariale.

Si segnalano nello specifico i seguenti interventi:

Intervento di messa in sicurezza del Lago d'Idro (importo 48 M€) – il progetto è stato depositato il 20 giugno 2011 deposito, da parte dell'Ente Attuatore (Infrastrutture Lombarde S.p.A.), per la procedura di VIA nazionale; successivamente sono state depositate le integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali; il provvedimento di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni è stato





rilasciato dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali il 17 aprile 2013, con decreto n. 107. Nella stessa data, il 20 giugno 2011, è stata attivata la procedura presso il Ministero delle Infrastrutture per l'istruttoria necessaria per le Grandi Dighe; il Ministero ha concluso l'istruttoria e trasmesso informalmente la documentazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In data 28 giugno 2013 è giunta l'approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi della l. 584/1994, con prescrizioni.

- Intervento di realizzazione della vasca di laminazione di Nerviano (importo 10.5 M€) – il progetto della vasca di laminazione, dopo un lungo processo di condivisione con i Comuni ed i cittadini, ha raggiunto la fase definitiva ed è stato inviato per la procedura di VIA regionale il 3 ottobre 2011, con successiva richiesta di integrazioni; la compatibilità ambientale dell'intervento è stata approvata con decreto del 19 marzo 2013.

Inoltre gli interventi più impattanti sul territorio (esempio vasche di laminazione delle piene) hanno sempre forti opposizioni a livello locale sia da parte dei cittadini che, spesso, delle amministrazioni locali, con necessità di concordare le modalità di intervento, ciò che comporta allungamenti dei tempi di progettazione oltre le previsioni.

#### 1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi al dicembre 2013</b>	<b>n. interventi al dicembre 2012</b>
Attesa di avvio	n. 0	n. 1
Esecuzione studi ed indagini	n. 0	n. 0
In corso di progettazione	n. 49	n. 86
Progettazione ultimata	n. 17	n. 38
Lavori aggiudicati	n.	n.
In esecuzione	n. 61	n. 28
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. 36	n. 10
<b>Totale interventi finanziati</b>	<b>163</b>	<b>163</b>



## 1.7. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014</b>
Attesa di avvio	n. 0
Esecuzione studi ed indagini	n. 0
In corso di progettazione	n. 6
Progettazione ultimata	n. 15
Lavori aggiudicati	n.
In esecuzione	n. 67
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 75
<b>Totale interventi finanziati</b>	<b>163</b>

## 1.8. CRITICITA'

Le principali criticità sono legate alla mancata disponibilità di fondi ministeriali in contabilità speciale, ciò che ha comportato la necessità di negare sino al loro arrivo l'assenso agli appalti di diversi interventi, con ritardi nella programmazione degli stessi. E' stato più volte sollecitato un trasferimento più rapido delle risorse finanziarie al Ministero dell'Ambiente.

**A tal fine si ritiene indispensabile che nel 2014 vengano stanziati i fondi ministeriali mancanti a valere sui FSC, pari a 20.870.700,00 €, in quanto, in mancanza della delibera di stanziamento, non potranno essere attuati gli interventi finanziati con tali risorse.**

Altre criticità si sono registrate per singoli interventi, come esposto precedentemente, soprattutto in funzione dei tempi molto lunghi per ottenere le autorizzazioni; in tal caso il Commissario Straordinario ha provveduto a sollecitare gli Enti preposti per un'accelerazione del rilascio dei pareri.

In data 10 Dicembre 2013 è scaduto il triennio di nomina commissariale e quindi sino al 31 Dicembre si è provveduto ad operare in regime di prorogatio ai sensi del DI 293/1994.



## 1.9. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

### Pagamento competenze Commissariali

Il pagamento delle competenze del Commissario straordinario è definito dal d.p.c.m. del 8 aprile 2011, nel quale sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi e che tale compenso lordo, più gli oneri riflessi dovuti sui compensi, deve gravare sulle risorse finanziarie dell'Accordo di Programma; inoltre viene comunicato che i pagamenti devono essere autoliquidati dallo stesso utilizzando una parte dei fondi stanziati per gli interventi.

A partire dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto all'art. 15, commi 2 e 3, che i compensi dei Commissari straordinari siano ridotti. Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, del 9 febbraio 2012, è stato comunicato che il compenso dei Commissari ammonta ad un parte fissa massima di 50.000 € annui, cui andrà in seguito aggiunta una parte variabile, sempre di un massimo di 50.000 €, da determinare sulla base del raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi. Inoltre il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto al comma 2 dell'art. 23-ter, che la retribuzione riconosciuta ai commissari non può comunque superare il 25% del trattamento economico percepito nell'Ente di appartenenza. Il Commissario è in regime pensionistico dal 15 Aprile 2013.

Nel rispetto di queste di queste regole, si è provveduto ad autoliquidare le rate trimestrali 2013 in attesa di indicazioni del Ministero dell'Ambiente sulle modalità di determinazione della parte variabile del compenso commissariale.

Al 31 dicembre 2013, dopo due anni dalla emanazione della legge, non è pervenuta alcuna comunicazione a riguardo da parte del Ministero, in assenza della quale il Commissario si regola secondo le prassi consolidate sulla materia.

### Rendiconto contabilità speciale

I fondi dell'AdP sono gestiti tramite contabilità speciale intestata al commissario straordinario, ai sensi degli articoli 8 e 10 del dpr 367/94, aperta il 4 aprile 2011 con n. 5580 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano.

Ai sensi degli artt. 11-15 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, si è provveduto in data 16 gennaio 2013, entro i termini previsti dal citato decreto legislativo, a trasmettere all'Organo di controllo il rendiconto amministrativo e contabile della contabilità speciale commissariale per il 2012 per i controlli previsti; in base all'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo, il rendiconto è stato trasmesso agli uffici preposti di Regione Lombardia.

Con nota del 4 giugno 2013, l'Organo di Controllo regionale ha trasmesso la relazione inerente l'attività di controllo alla sezione regionale della Corte dei Conti, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Ministero dell'Ambiente.



**Rendiconto ReNDIS**

E' continuato l'inserimento dei dati dei progetti dell'Accordo di Programma nel portale ReNDIS; nella tabella sottostante si riporta un quadro generale delle comunicazioni caricate sul portale ReNDIS nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.

Tipo di comunicazione	n.
Riepilogo amministrativo (*)	29
Stato attuazione	971
Quadro economico	112
Quadro finanziario (*)	74
Quadro contabile (*)	55
Invio documenti	440
Posizione geografica	85
Caratteristiche tecniche (*)	30
Comunicazione generica	190
<b>Numero totale di comunicazioni inviate nel 2013</b>	<b>1986</b>

(\*) nuove maschere introdotte in data 6/09/13; (\*) nuova maschera introdotta il 2/12/2013

L'attività di caricamento dei dati si è svolta in funzione della disponibilità progressiva di nuove informazioni relative agli interventi che stanno proseguendo l'iter di attuazione. Infatti l'avanzamento della progettazione ed esecuzione dell'intervento determina la crescente disponibilità di dati utili per la compilazione del data-base di ReNDIS.

Per ogni intervento concluso mediamente sono state caricate dalle 40 alle 50 comunicazioni.

Il Commissario Straordinario  
(Prof. Carlo Maria Marino)





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

## **COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche  
(D.P.C.M. del 9 marzo 2011)

### **Accordo di Programma**

**“Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari  
per la mitigazione del rischio idrogeologico”**

tra il

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

e la

**Regione Marche**

sottoscritto in data 25 novembre 2010

**Deliberazione CIPE n. 6 del 20.01.2012**

(G.U. n. 88 del 14.04.2012)

**RELAZIONE TECNICA  
AL 31 DICEMBRE 2013**

PAGINA BIANCA

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

**RELAZIONE TECNICA AL 31 DICEMBRE 2013****INDICE**

1. INTRODUZIONE
2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2013
  - 2.1. Fase preliminare all'avvio delle attività
  - 2.2. Attuazione sui fondi disponibili degli interventi maggiormente prioritari
  - 2.3. Attuazione degli interventi di cui alla Del. CIPE n. 6/2012
3. ASPETTI GENERALI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
  - 3.1. Accordo di Programma del 25 novembre 2010
  - 3.2. Interventi maggiormente prioritari attivati sui fondi disponibili
  - 3.3. Interventi attivati sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012
  - 3.4. Interventi di cui all'allegato 1 dell'adP attualmente privi di copertura finanziaria
  - 3.5. Interventi di cui all'allegato 1, punto 2 - Cofinanziamento regionale
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2013
5. ACCREDITAMENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE AL 31 DICEMBRE 2013
6. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL 31 DICEMBRE 2013
  - 6.1. Interventi maggiormente prioritari attivati sui fondi disponibili
  - 6.2. Interventi attivati sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012
  - 6.3. Sintesi complessiva sugli interventi attivati
  - 6.4. Situazione finanziaria - Importi erogati ed importi impegnati
7. ADEMPIMENTI SUGLI O.G.V. DI CUI ALLA PRESA D'ATTO DEL 26 OTTOBRE 2012
8. CRITICITÀ

PAGINA BIANCA





## *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

### **1. INTRODUZIONE**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 35.900.000,00.

Parimenti, in relazione alle disponibilità finanziarie indicate dalla Regione Marche a titolo di cofinanziamento regionale, sono stati individuati n. 24 ulteriori interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A2, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 20.527.838,75.

Ragion per cui la copertura finanziaria del fabbisogno, come analiticamente descritta all'art. 4, tab. 1 dell'accordo di programma sottoscritto in data il 25 novembre 2010, risulta pari ad un importo complessivo di €. 56.427.838,75.

L'accordo, all'art. 5, prevede che, per l'attuazione degli interventi, i soggetti sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Regione Marche, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 9 marzo 2011 il dott. Antonio SENNI, Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche.



## *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## **2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2013**

### **2.1. FASE PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ**

#### ➤ INCONTRO CON GLI ENTI BENEFICIARI

Il Commissario Straordinario, nel corso del proprio mandato, ha svolto fino al momento le attività di sua competenza nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 del DPCM 9 marzo 2011 di nomina, che definisce puntualmente i compiti del Commissario:

- *attuare* gli interventi,
- *provvedere alla opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso:*
  - *emanare gli atti e i provvedimenti*
  - *curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.*

Al Commissario sono state attestate, quindi, competenze *esclusivamente* di attuazione con esclusione delle attività di programmazione.

Ragion per cui il Commissario Straordinario, ricevuto il proprio mandato, in fase di approccio alle attività da svolgere ha ricercato da subito di instaurare una opportuna e fattiva collaborazione con gli enti locali interessati dagli interventi da realizzare, ponendo come primo riferimento gli uffici competenti della Regione Marche ma cercando anche di coinvolgere in senso attivo e collaborativo i relativi uffici delle Provincie e dei vari Comuni territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP..

Ciò anche nell'intenzione di valorizzare quanto indicato all'art. 4 del D.P.C.M. di nomina del 9 marzo 2011, in merito al contenimento delle spese tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, spese che pertanto dovrebbero, laddove possibile, essere ricomprese nell'ambito dei corrispettivi e degli incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006 e s.m.i..

In tal senso, in data 16 giugno 2011 presso l'Auditorium della Fiera della Pesca di Ancona si è avuto un incontro con tutti i rappresentanti degli enti territorialmente interessati (Amministrazioni Comunali e Provinciali, Regione Marche P.F. Difesa della Costa). In quella sede è stato possibile presentare agli Enti locali l'Accordo, il Commissario Straordinario e il suo ruolo, le modalità di attuazione dell'Accordo come fissate nell'articolato e nel decreto di nomina del Commissario, nonché illustrare ai presenti le modalità di gestione dell'accordo e rappresentare loro la necessità di un sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi, ponendo particolare attenzione ai temi inerenti la celerità nella attuazione e la qualità degli interventi da realizzare nonché le necessità di ottimizzazione della spesa.

In particolare, nel corso di tale incontro è stato osservato ai presenti che per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tale attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 554 del 1999. (*art. 4 c. 1, DPCM 9 marzo 2011*).

Pertanto, anche in virtù delle indicazioni contenute nel decreto di nomina, il Commissario ha rappresentato che nelle attività connesse alla selezione e scelta dell'ente avvalso, si sarebbero perseguiti i seguenti obiettivi fondamentali:

- **Ottimizzazione della spesa**, attraverso una verifica prioritaria della possibilità di espletamento delle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006;

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

- **Qualità e finalità degli interventi**, da rivolgere esclusivamente alla rimozione del rischio idrogeologico ed essere depurati da eventuali lavorazioni non attinenti, fatte salve quelle funzionali all'efficienza delle opere;
- **Celerità nella attuazione degli interventi**, con definizione di tempi certi per l'espletamento delle fasi propedeutiche all'appalto nonché della successiva esecuzione dei lavori.

Si è rappresentato che deroghe all'espletamento delle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi integralmente ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, potevano essere prese in considerazione solo nei casi in cui si rilevi carattere di particolare urgenza dell'intervento e su cui i possibili enti pubblici di cui all'art. 4 c. 1, DPCM 9 marzo 2011 non abbiano potuto offrire, attraverso l'uso integrale di proprie risorse interne, adeguata alternativa in termini di qualità progettuale e di tempistica di attuazione.

In tali casi sarà possibile procedere con l'avvalimento di alcuni interventi anche ad enti proponenti che, causa assenza di professionalità adeguate nei loro organici, per l'espletamento degli interventi dovranno avvalersi del supporto di professionisti esterni. Tale tipo di avvalimento sarà possibile solo previa presentazione, da parte dell'ente proponente, di una proposta adeguata e competitiva sia in termini di qualità progettuale e di tempistica di attuazione che ai fini del contenimento delle spese tecniche entro limiti definiti.

A seguire, sono stati effettuati dal 7 al 15 luglio 2011 presso gli uffici della Regione ad Ancona incontri bilaterali, che hanno coinvolto singolarmente i rappresentanti di tutti gli enti locali territorialmente interessati. In tale sede è stato possibile operare una analisi preliminare delle varie ipotesi progettuali e si è considerato anche la possibilità di limitare i costi avvalendosi di risorse interne agli Enti stessi, come previsto dal citato DPCM di nomina del Commissario.

Gli esiti di tali incontri, su cui ha positivamente influito quanto già rappresentato nel corso del precedente incontro collegiale del 16 giugno, sono stati particolarmente soddisfacenti.

Infatti è stato possibile verificare che le varie ipotesi progettuali rappresentate si presentavano in larga parte concettualmente condivisibili. Inoltre, specie in virtù di un importante supporto offerto dagli uffici tecnici sia della Regione che delle Provincie, si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti era possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi in larga misura di risorse professionali interne agli stessi Enti locali.

Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Giova osservare che da tali incontri tecnici bilaterali era emerso che per gran parte degli interventi previsti (ovvero per n. 42 interventi, per un importo complessivo di € 31.100.000) era risultato possibile, stante le proposte formali ricevute dal sistema locale Regione/Provincie/Comuni/Prov. OO.PP., procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi esclusivamente di risorse professionali interne agli stessi uffici tecnici degli Enti locali, con conseguenti non trascurabili risparmi di spesa.

➤ **COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DEL 28/07/2011**

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, il Commissario, stante la fattiva collaborazione avviata negli incontri precedenti con gli enti locali interessati dagli interventi da realizzare, ovvero gli uffici competenti della Regione ma anche i relativi uffici delle Provincie e dei vari Comuni territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP., ha redatto e quindi consegnato al Comitato il Cronoprogramma Generale Annualità 2011-13 ed il Cronoprogramma di dettaglio Annualità 2011, all'interno del quale si evidenziava il concordato avvio con gli Enti locali interessati di procedure di gara entro l'anno 2011 per complessivi n. 26 interventi, per un importo complessivo pari ad Euro 17.400.000,00.

Parimenti, nel corso dello stesso Comitato il Commissario ha consegnato una specifica relazione inerente i criteri previsti per la procedura di selezione degli Enti Attuatori degli interventi del programma, che si basa sulla analisi dei riscontri ottenuti nel corso degli incontri avuti con il sistema locale

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Regione/Province/Comuni, in particolar modo prendendo a riferimento i temi inerenti la celerità nella attuazione e la qualità degli interventi da realizzare, nonché le necessità di ottimizzazione della spesa.

Quindi, per una efficace attuazione dei singoli interventi, il Commissario ha comunicato la propria intenzione di predisporre, in condivisione con la Regione Marche, una Bozza di "Atto di Convenzionamento" tra Commissario, Regione ed Ente Attuatore, che contenga tutte le modalità specifiche per la gestione delle varie fasi inerenti l'attuazione di ciascun intervento. Al riguardo ha osservato che a seguito della stipula delle convenzioni, si sarebbe reso necessario procedere con l'erogazione dei primi finanziamenti agli Enti Attuatori, sulla base delle disponibilità di cassa di cui alla contabilità speciale, che a quel momento erano però ancora limitate al versamento effettuato dal MATTM con provvedimento del 23 giugno 2011, per un importo di € 569.023,88, quindi poco significativo ai fini dell'attuazione di quanto invece previsto.

Per altro verso, in merito agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", il Commissario ha riferito che con propria nota prot. n. 0010/2011/U del 4/07/2011 ha chiesto alla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche di voler predisporre una relazione sullo stato dell'arte degli interventi inseriti nell'Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell'Accordo di programma, che contenga tutti i dati relativi allo stato della progettazione e degli studi propedeutici necessari, agli atti di approvazione in linea tecnica, ai provvedimenti inerenti i finanziamenti emessi, all'avvenuta aggiudicazione dei lavori o comunque in generale sullo stato di attuazione degli interventi.

Al riguardo la Regione Marche ha reso noto la necessità di operare delle modifiche agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", ed ovvero che risultava necessario eliminare da tale elenco buona parte degli interventi in quanto a causa anche dei recenti eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza, risultavano già avviati ed in parte conclusi.

La Regione ha inoltre comunicato che con nota prot. n. 477 del 26/07/2011 l'Assessore delegato della Regione Marche ha presentato la propria proposta di rimodulazione dell'Accordo, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 6824/TRI/DI del 2.03.2011, recependo l'invito a proporre il "trasferimento di interventi" – per la misura di € 3.590.000,00 (10% della quota di competenza statale) "dalla fase attuativa a quella programmatica dell'Accordo, che potrà trovare successiva copertura con eventuali economie realizzate o con successivi stanziamenti".

➤ RICHIESTA ACCREDITO FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 2011

In seguito, al fine di provvedere alla attuazione dei cronoprogrammi ed in vista dell'attivazione delle gare di appalto previste entro fine anno 2011, tenuto conto delle tempistiche definite all'interno del Cronoprogramma consegnato nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, e stante la mancanza di comunicazioni al riguardo da parte dei soggetti sottoscrittori l'accordo di Programma, il Commissario Straordinario con propria nota prot. 0037/2011/U del 17 ottobre 2011 ha chiesto al MATTM di poter introitare in contabilità speciale una prima erogazione dei fondi stanziati all'Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009 n. 191, a copertura della Annualità 2011, per un importo complessivamente stimato in € 17.400.000,00.

Con la stessa nota si è inoltre chiesto di avere quanto meno conferma della disponibilità delle somme richieste, anche in virtù del fatto che con la stipula delle Convenzioni si sarebbe avviato tutto il processo attuativo dell'Accordo con le relative obbligazioni finanziarie.

Purtroppo tale nota non ha avuto significativi esiti per cui il Commissario nel corso del 2011 non ha ricevuto le somme richieste né tantomeno parte significativa delle stesse. Parimenti, nel corso del secondo semestre dell'anno 2011 non risultano giunte comunicazioni al Commissario in merito alla conferma della disponibilità delle somme né in merito ai possibili tempi di erogazione.

Ragion per cui il Commissario non ha potuto procedere nel corso del 2011 con le attività previste, in quanto le stesse erano inevitabilmente vincolate alla disponibilità di copertura economica degli interventi da attuare. In assenza di tale copertura economica, il Commissario non è stato pertanto materialmente in condizione di poter procedere con quanto invece già da tempo programmato.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

**2.2. ATTUAZIONE SUI FONDI DISPONIBILI DEGLI INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI**

In merito alla disponibilità di risorse, solo verso la fine del 2011, previa verifica della disponibilità in Contabilità speciale, il Commissario ha potuto riscontrare l'avvenuto versamento, con provvedimento del 15 dicembre 2011, di un importo pari ad € 2.544.521,71. Tale accredito, sommato a quanto inizialmente versato in data 23 giugno 2011, portava la disponibilità in Contabilità Speciale a complessivi Euro 3.113.545,59.

La disponibilità di tali somme versate ha permesso quindi al Commissario, solo ad inizio 2012, di riavviare la fase di attuazione delle attività previste, anche se l'entità di tali somme comunque non permetteva di attuare quanto previsto, ma imponeva inevitabilmente la necessità di operare tra gli interventi aventi più celere cantierabilità una forte selezione.

Sono state allo scopo avviate le relative attività di interfacciamento con la Regione Marche, inizialmente al fine di definire le modalità d'uso di tali esigue somme ed ovvero:

- destinarle alla attuazione di pochi interventi maggiormente urgenti al fine di lasciare comunque disponibilità per poter finanziare le campagne di indagine specialistiche in molti degli interventi che necessitano di tali attività;
- destinarle integralmente alla attuazione di alcuni interventi;

L'orientamento emerso è stato prevalentemente quello di seguire la strada di destinare tali somme per la realizzazione integrale di alcuni interventi, da selezionare quindi fino all'occorrenza delle somme disponibili.

Tale attività di fatto è stata però sospesa nel momento in cui si è avuta notizia della delibera CIPE del 20 gennaio 2012, e del relativo previsto finanziamento in essa contenuto per le regioni del centro-nord, tra cui anche la regione Marche, nonché della convocazione di tali regioni per una riunione in data 30 gennaio 2012 indetta dal Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente - dr. Antonio Strambaci, e relativa all'assegnazione risorse ex art. 33, comma 3, L. 183/2011

➤ RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2012 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.33, COMMA 3, L. 183/2011

Nel corso di tale riunione si è appreso anche dell'avvenuto impegno disposto dal MATTM, a favore dell'AdP MATTM - Regione Marche, di ulteriori Euro 2.017.081,03.

A seguito della riunione, il MATTM ha inviato alle regioni intervenute le tabelle contenenti i dati riepilogativi delle risorse fino ad ora impegnate e/o trasferite a favore di ciascuna Regione, nonché un file, in formato excel, che sarebbe dovuto essere completato a cura del Commissario delegato per l'attuazione dell'Accordo d'intesa con la Regione interessata, con l'inserimento di tutti gli interventi della sezione attuativa degli Accordi, che vengono finanziati a valere su risorse FAS statali, per i quali doveva essere specificato anche il livello di priorità, il grado progressivo di cantierabilità (espresso in giorni), il livello di progettazione, il livello di rischio, la popolazione esposta. Nel suddetto prospetto dovevano, altresì, essere indicati gli interventi che trovano copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali impegnate e/o trasferite.

Preso atto di quanto e cosa richiesto, sono state di conseguenza avviate con i referenti regionali le necessarie attività volte alla compilazione di quanto richiesto dal MATTM.

Quindi, con comunicazione in data 20/02/2012 l'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche ha trasmesso al MATTM la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche compilata nei campi indicati dal Ministero per la definizione di criteri di riparto delle risorse in oggetto. In tale tabella i vari interventi vengono ordinati singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

In tale elenco, gli interventi sono peraltro indicati anche attraverso l'uso di codici compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, al riguardo precedentemente già concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche.



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

#### ➤ SELEZIONE DEGLI INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI

La disponibilità delle somme versate, nonché la prevedibile disponibilità delle somme impegnate, ha permesso quindi di riavviare la fase di attuazione delle attività previste, anche se l'entità di tali somme non permetteva di attuare quanto previsto nel corso dell'estate 2011 ma altresì imponeva inevitabilmente la necessità di operare tra gli interventi aventi migliore cantierabilità una forte selezione.

A tal fine si è preso atto della comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, conseguente alla citata riunione del 30/01/2012, contenente la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche, ordinati dalla Regione Marche singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Sulla base di tale tabella, considerando le priorità espresse, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili nonché impegnate (Euro 5.130.626,62). Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi, in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (di cui Euro 369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, sono relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012).

Ragion per cui in data 24/02/2012 si è proceduto ad Ancona, presso la sede del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, ad un incontro con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati ai 12 interventi maggiormente prioritari, di seguito specificati:

Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento	Livello priorità
AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	Disgaggi e barriere paramassi	400.000	1
AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000	2
PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	Opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	3
PU	Plobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riquilif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	4
FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	5
PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	Riduzione rischio idrogeologico	300.000	6
MC	Fiumi Chienti e Potenza	Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3)	Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	600.000	7
AP	Fiume Tronto	Spinetoli ESOND E3	Riparazione argine	400.000	8
FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	9
FM	Torre San Patrizio	Cupaggio FRANA R3	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	10
FM	Montefortino	Capol -Via Circonvallazione ESOND R4	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	11
AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	12

*n.b. L'intervento in comune di Force (AP) risulta finanziato per € 1.130.626,62 con fondi MATTM e per € 369.373,38 con fondi a valere sulle risorse della Del. CIPE n. 6/2012.*

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Gli esiti di tali incontri, su cui ha positivamente influito quanto già rappresentato nel corso dei precedenti incontri del luglio 2011, sono stati particolarmente soddisfacenti.

E' stato possibile verificare che le varie ipotesi progettuali rappresentate si presentano in larga parte concettualmente condivisibili. Inoltre, specie in virtù di un importante supporto offerto dagli uffici tecnici sia della Regione che delle Province, si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti era possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi in larga misura di risorse professionali interne agli stessi Enti locali.

Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

➤ PREDISPOSIZIONE DI UNA DISCIPLINA GENERALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Considerato che ai fini dell'attuazione del programma degli interventi e delle occorrenti intese con i soggetti pubblici interessati, come previsto all'art. 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2011, era necessario sottoscrivere con gli Enti Attuatori degli interventi una convenzione per regolare la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi ed i controlli e le verifiche sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione finanziaria, il Commissario ha ritenuto utile definire una disciplina generale a cui fare riferimento nelle singole convenzioni di avvalimento, dando corso alla predisposizione dei seguenti documenti di riferimento:

- Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
- Convenzione-Tipo di avvalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi.

La predisposizione di tali documenti è stata curata in stretta collaborazione con l'ufficio del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, che ha potuto quindi visionare le bozze e proporre le proprie richieste di modifica.

Per cui, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Assessorato alla Tutela e Risanamento Ambientale e alla Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 839 del 15 maggio 2012, con cui si esprime formalmente la condivisione sugli schemi di convenzione proposti dal Commissario, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione dei seguenti documenti, che di fatto definiscono e disciplinano le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma:

Ordinanza n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

Collaborazione tecnica ed operativa del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche.

Decreto n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

Approvazione delle linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, e delle modalità di convenzionamento con gli enti avvalsi.

➤ RIUNIONE DI COORDINAMENTO E DI CONCERTAZIONE DEL 18 MAGGIO 2012

Definite le modalità di attuazione degli interventi, il Commissario ha dovuto però constatare che a quella data risultavano ancora soltanto impegnate dal MATTM, ma ancora non accreditate, le ulteriori somme per complessivi Euro 2.017.081,03. Considerato che sulla disponibilità delle stesse non si erano ancora avute indicazioni temporali da parte del MATTM, il Commissario ha dovuto prendere atto che le stesse non potevano ancora considerarsi disponibili per l'attuazione di tutti i 12 interventi selezionati.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Ragion per cui ha segnalato alla Regione Marche che occorre operare una ulteriore selezione sugli interventi inizialmente individuati, sulla base di valutazioni di priorità e di urgenza, al fine di individuare gli interventi finanziabili sulla base delle esigue risorse a quel momento utilmente disponibili in contabilità speciale.

Al riguardo si è svolta ad Ancona il 18 maggio 2012 presso il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, un incontro tra il Commissario ed i rappresentanti regionali, nel corso della quale si è condivisa l'opportunità di dar corso alla selezione degli interventi da finanziare, nei limiti delle risorse utilmente disponibili, utilizzando a tal fine le indicazioni di priorità comunicate dall'Assessore regionale al MATTM con la citata comunicazione del 20 febbraio 2012.

Pertanto, e visto l'Allegato 1 all'Accordo di programma, sono stati individuati i seguenti interventi, qui indicati anche secondo i codici, compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche, quali prioritari e da realizzarsi nel territorio della Regione Marche sulla base delle risorse attualmente utilmente disponibili in contabilità speciale, nonché i relativi importi programmati:

- AN002A/10 - Comune di Genga (AN). Località Gola di Frasassi. Disgaggi e barriere paramassi. 400.000,00 Euro;
- AP012A/10 - Comune di Acquasanta Terme (AP). Località Quintodecimo. Disgaggi e barriere. 300.000,00 Euro;
- PU039A/10 - Comune di Acqualagna-Fermignano (PU). Località Gola del Furlo. Opere di protezione fenomeni di crollo. 100.000,00 Euro;
- PU049A/10 - Comune di Piobbico (PU). Località M. Montiego-capol.. Consolidamento e riqualif. ambientale versante a monte capoluogo + studio crollo M. Montiego. 200.000,00 Euro;
- FM024A/10 - Comune di Lapedona (FM). Località Centro storico – versante nord. Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico. 700.000,00 Euro;
- PU040A/10 - Comune di Borgo Pace (PU). Località Capoluogo – T. Auro. Riduzione rischio idrogeologico. 300.000,00 Euro;
- MC031A/10 - Comuni di Civitanova, Corridonia, Tolentino, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati (MC). Località Fiumi Chienti e Potenza. Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti. 600.000,00 Euro.

Per quanto sopra, si è ritenuto opportuno avviare quanto prima gli interventi sopra menzionati, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 2.600.000,00. Per tali interventi le amministrazioni comunali o provinciali competenti per territorio sono state individuate dalla Regione Marche come soggetti competenti in via ordinaria.

Per tali interventi sono state quindi immediatamente avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni già in data 18 e 19 giugno 2013, ad eccezione dell'intervento MC031A/10 in quanto oggetto di richiesta di scomposizione in più interventi.

Il Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche hanno anche condiviso sulla opportunità di dar corso alla selezione degli ulteriori interventi da finanziare, nei limiti delle risorse al momento impegnate dal MATTM, utilizzando a tal fine le indicazioni di priorità comunicate da Regione Marche al MATT con la citata comunicazione del 20 febbraio 2012, da finanziare non appena disponibili le somme al quel momento solo impegnate dal MATTM.

➤ **COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DEL 11 LUGLIO 2012**

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, il Commissario Straordinario ha consegnato il nuovo cronoprogramma degli interventi, che sostituiva quanto presentato nel corso del precedente Comitato, redatto sulla base di quanto concordato con la Regione Marche nel corso dell'incontro del 18 maggio 2012, di quanto a suo tempo formalmente proposto dal sistema locale Regione/Province/Comuni in conseguenza agli incontri tecnici intercorsi, nonché da quanto comunicato



*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

dalla Regione Marche con nota n. 854 del 25/05/2012 in merito agli interventi proposti ai fini del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012.

Regione Marche ha comunicato che nella propria nota n. 854 del 25/05/2012 gli interventi sono corredati dei codici RENDIS per la regolare conduzione del programma.

In merito all'intervento indicato con codice MC031A/10, la Regione Marche, in accoglimento della richiesta formulata dall'ufficio del Genio Civile della Provincia di Macerata, ha chiesto al Comitato di scomporre l'intervento in questione articolandolo in tre distinti interventi e quindi di procedere con tre diversi appalti, come di seguito indicato:

- MC031A/10-1 - Comuni di Macerata e Montecassiano (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza. 169.000,00 Euro;
- MC031A/10-2 - Comuni di Corridonia e Macerata (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del Torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;
- MC031A/10-3 - Comuni di Recanati, Montelupone e Macerata (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;

Considerato che l'articolazione proposta non attua un'artificiosa suddivisione dell'intervento in considerazione del fatto che i tre interventi interessano due corsi d'acqua e tre tratti ben distinti, il Comitato in questione ha espresso il proprio parere favorevole sulla richiesta della Regione Marche.

Per tali interventi sono state quindi avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni in data 31 luglio 2013.

In merito agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", Regione Marche ha riferito che erano tutti interventi prossimi all'avvio, pertanto sono iniziati già quando si sono rilevati i primi ritardi per la nomina del Commissario, in quanto la Regione non poteva bloccare l'attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Pertanto, Regione Marche ha proposto una rettifica della parte di cofinanziamento dell'Accordo, prevedendo di intervenire con ulteriori 6M€ già disponibili per il finanziamento di ulteriori interventi, a quel momento in corso di individuazione. Per dette variazioni la Regione ha proposto la sottoscrizione di un atto integrativo in cui si potrà operare la riduzione del 10% dell'importo quota MATTM (da 35,9M€ a 32,3M€) come avvenuto con le altre regioni del centro-nord, il frazionamento di eventuali interventi complessi e la sostituzione integrale della parte di cofinanziamento regionale con un nuovo elenco di interventi.

Anche il Commissario ha chiesto di stralciare la parte di cofinanziamento dall'Atto Integrativo all'Accordo, in quanto ha osservato che formalmente ha la responsabilità anche sui relativi interventi pur non avendo avuto modo di occuparsi della loro attuazione in quanto già avviati.

Al riguardo, il Comitato ha convenuto di non stralciare gli interventi del cofinanziamento dall'accordo ma di definire, nell'atto integrativo, che la gestione di detti interventi è a carico della Regione e non del Commissario, e parimenti ha chiesto alla Regione di predisporre una bozza di atto integrativo in linea con quanto proposto.

➤ **ULTERIORI INCONTRI CON ALCUNI ENTI BENEFICIARI**

Nel corso delle giornate del 28, 30 e 31 luglio 2012 e poi del 4 dicembre 2012 ad Ancona, presso la sede del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, si sono svolti degli incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati agli interventi selezionati quali maggiormente prioritari nel verbale di coordinamento e concertazione del 18 maggio 2012.

A seguito di tali incontri sono state quindi avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni, completando di

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

fatto l'iter di avvio della attuazione di tutti i 12 interventi preselezionati nel corso dell'incontro del 24 febbraio 2012 e poi ratificati per mezzo del verbale di coordinamento e concertazione del 18 maggio 2012.

➤ AGGIORNAMENTO DELL'ORDINANZA N. 001/2012

Con la nota prot. n. 0819027 del 7 dicembre 2012 la Regione Marche, per mezzo del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, ha riproposto i rapporti di collaborazione con il Commissario, aggiornando i riferimenti di competenza regionale per le diverse tematiche attuative del programma di interventi.

Parimenti, a seguito dei contenuti della delibera CIPE n. 6/2012 e della conseguente presa d'atto dell'elenco degli interventi del 26 ottobre 2012, il Commissario ha preso atto che ferma restando l'attività di monitoraggio a cura del Ministero dell'ambiente, come prevista nell'ambito degli accordi programma già stipulati, gli interventi elencati nella sopracitata presa d'atto saranno presumibilmente monitorati, in aderenza alle previsioni della delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti, anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca Dati Unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione offerta dalla amministrazione regionale delle Marche per le attività tecniche ed operative connesse all'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma, ma anche di estendere la collaborazione alle attività connesse all'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi, oltre che mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS - ISPRA), anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca Dati Unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia prot. n. 819027 del 7 dicembre 2012, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione del seguente documento:

Ordinanza n. 014/2012 del 10 dicembre 2012 :

Collaborazione tecnica ed operativa del "Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa del suolo" della Regione Marche.

*(aggiorna e sostituisce la precedente ordinanza del 18 maggio 2012, n. 001/2012)*



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## **2.3. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DEL. CIPE N. 6/2012**

### ➤ RIUNIONE DI COORDINAMENTO E CONCERTAZIONE DEL 4 DICEMBRE 2012

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione Marche che, stante le probabili e presumibili condizioni di celerità nella attuazione degli interventi richieste dal CIPE ai fini della erogazione dei fondi, occorre procedere con l'individuazione di procedure condivise che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui sopra.

Al riguardo si è pertanto svolto ad Ancona in data 4 dicembre 2012 un incontro tra il Commissario ed i rappresentanti della Regione Marche, in cui si è condiviso quanto proposto dal Commissario. Pertanto, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare, laddove possibile, le procedure di attuazione degli interventi, si è convenuto quanto segue:

- di dare corso alle varie attività propedeutiche attivabili anche in assenza di copertura finanziaria integrale dei vari interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012;
- di procedere pertanto, per tali interventi, alla formalizzazione delle Ordinanze di avvalimento e delle relative Convenzioni per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi, indicando in via cautelare all'interno di tali provvedimenti che:
  - le ordinanze e convenzioni di avvalimento si attivano in merito agli obblighi finanziari assunti dal Commissario Straordinario Delegato solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica integrale dell'intervento, di cui alle risorse finanziate dalla delibera CIPE n. 6/2012, e comunque solo a seguito di formale comunicazione che in tal senso il Commissario Straordinario Delegato invierà ad ogni singolo Ente avvalso;
  - prima di procedere all'avvio di qualsivoglia procedura che comporti un impegno di spesa, l'Ente Avvalso dovrà acquisire il formale assenso del Commissario Straordinario che deve programmare la spesa sulla contabilità speciale;
  - il Commissario, avuta la disponibilità della relativa risorsa finanziaria sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, ne darà comunicazione all'ente avvalso. Conseguentemente, provvederà ad accantonare sulle somme disponibili sul conto della contabilità speciale n. 5621 "C S RISCHIO IDROGEOL MARCHE", le relative somme.

per tali interventi le amministrazioni comunali o provinciali competenti per territorio sono state individuate dalla Regione Marche come soggetti competenti in via ordinaria.

### ➤ INCONTRI TECNICI CON ENTI TERRITORIALI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Convenuto con la Regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare, laddove possibile, le procedure di attuazione degli interventi, a seguito della riunione di coordinamento e concertazione di cui al punto precedente, si è tenuto un incontro con i rappresentanti degli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE n. 6/2012.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Nel corso dei vari incontri sono stati illustrati ai possibili Enti attuatori i contenuti della delibera CIPE n. 6/2012, nonché della nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e della conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

Sono stati resi noti gli esiti della riunione di coordinamento e concertazione da poco conclusa tra il Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche, che individua le procedure da attuare, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare laddove possibile le procedure di attuazione degli interventi.

Sono state quindi illustrate le possibili bozze delle ordinanze e delle convenzioni di avvalimento che potrebbero comunque essere emanate e stipulate in attesa dell'avvenuto accreditamento delle risorse previste a copertura di ogni singolo intervento, nonché le modalità da seguire nelle successive fasi di attuazione degli interventi (redazione e approvazione progetti definitivi ed esecutivi, espletamento delle gare d'appalto, esecuzione dei lavori, pagamenti, etc.).

Inoltre, nel corso dell'incontro è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, attualizzando quanto peraltro gli stessi avevano già formalizzato nel corso del mese di luglio 2011, specificando pertanto con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi in questione, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Si è infine rappresentata la volontà, condivisa da Commissario e Regione Marche, affinché si proceda celermente alla fase di formalizzazione delle Ordinanze e Convenzioni di avvalimento, così come descritte e rappresentate, individuando nelle date del 20 e 21 dicembre 2012 il riferimento per il completamento di tale attività.

➤ **STIPULA DELLE CONVENZIONI CON GLI ENTI TERRITORIALI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012**

Come convenuto nel corso della riunione del 4 dicembre, nel corso delle giornate del 20 e 21 dicembre 2012 ad Ancona, presso la sede della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, si sono svolti degli incontri con i rappresentanti di tutti gli Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

Nel corso di tali incontri è stato possibile per il Commissario emettere le Ordinanze e sottoscrivere le relative Convenzioni di avvalimento per tutti gli enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

➤ **INCONTRI TECNICI CON I REFERENTI REGIONALI (ANCONA, 13 MAGGIO 2013)**

Nel corso della giornata del 13 maggio 2013 si è svolto ad Ancona, presso la sede della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, alla presenza del Commissario Straordinario e di alcuni componenti della struttura commissariale, nonché del Referente Operativo Regionale per la Gestione dell'Accordo di Programma e di funzionari regionali, un incontro tecnico allo scopo di affrontare i seguenti aspetti legati all'attuazione dell'Accordo:

- 1) Accelerazione dell'attuazione dei primi interventi convenzionati (interventi non compresi nella presa d'atto CIPE del 26/10/2012);
- 2) Monitoraggio tecnico degli interventi previsti nell'accordo (monitoraggio Rendis-Ispra);
- 3) Avvio degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012;
- 4) Monitoraggio tecnico e finanziario degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012 (monitoraggio CIPE);

Nel corso della riunione, con riferimento ai punti di cui sopra, si è concordato quanto segue.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

- 1) Accelerazione dell'attuazione dei primi interventi convenzionati (interventi non compresi nella presa d'atto CIPE del 26/10/2012).

Si è concordato, constatato il mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione di molti interventi da parte degli Enti attuatori, l'invio a tali enti con urgenza della diffida ad adempiere prevista dall'art. 7 delle convenzioni di avvalimento.

- 2) Monitoraggio tecnico degli interventi previsti nell'accordo (monitoraggio Rendis-Ispra).

Il Commissario ha delegato la Regione ad adempiere a quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo in merito al monitoraggio RENDIS-ISPRA.

- 3) Avvio degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012.

Stante i contenuti della nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, si è concordato che il Commissario invierà con urgenza a tutti gli Enti attuatori degli interventi di cui alla presa d'atto CIPE del 26/10/2012 specifica nota prevista dall'art. 6 delle relative convenzioni di avvalimento, finalizzata ad attivare la tempistica di attuazione degli interventi nonché a rimarcare la scadenza del 31/12/2013 (fissata dal DIPE nella nota n. 4822 del 27/11/2012) per il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

- 4) Monitoraggio tecnico e finanziario degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012 (monitoraggio cipe);

Per quanto riguarda il monitoraggio tecnico e finanziario degli stessi interventi, chiesto dal DIPE nella medesima nota del 27/11/2012 come condizione necessaria per il trasferimento al Commissario dell'anticipazione del 20% dell'ammontare complessivo del finanziamento deliberato dal CIPE (pari, per la Regione Marche, a 13,6 M€), si è concordato di utilizzare per la gestione dei dati, come indicato nella riunione di coordinamento svoltasi al MATTM il 23/04/2013, il sistema SGP (MISE) con la seguente attribuzione di ruoli:

- RI - Simone Poeta
- RS - Mario Smargiasso
- MS - Antonio Senni

Si è concordato altresì che sarà cura della Regione Marche (Servizio Programmazione) provvedere con urgenza alla richiesta, da inviare al MISE, per la creazione delle relative utenze SGP, ove non già esistenti, e per la relativa associazione delle stesse agli interventi interessati.

➤ **AVVIO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012 E RELATIVA PRESA D'ATTO DEL 26/10/2012**

Con nota Prot. n. 0001859/2013 del 11/02/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, in merito alla impegnabilità delle risorse ed alle modalità di trasferimento delle stesse ha specificato, tra le altre, che :

- la disciplina della fonte di finanziamento, contenuta nei commi 863 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296/2006 come modificata dalla legge n. 244/2007 e nelle delibere del CIPE n. 166/2007 e n. 8/2012, rappresenta la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad operare;
- le delibere n. 166/2007 e n. 8/2012 sono volte a disciplinare, la prima, le modalità generali di trasferimento delle risorse per il sostenimento delle spese di tutti gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e, la seconda, a regolare le specifiche modalità riferite agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è un fondo pluriennale di spesa in conto capitale la cui dimensione complessiva e articolazione annuale sono state fissate per far fronte alle esigenze di investimento di una pluralità di amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei tempi di realizzazione



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

della spesa stessa e nell'intento di non creare inutili riserve di tesaurizzazione presso alcune delle Amministrazioni coinvolte.

- per questa ragione la legge ha autorizzato l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese. In forza di tale disciplina ogni assegnazione effettuata dal CIPE, per ciascuna finalità, è interamente e pienamente utilizzabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate; i trasferimenti delle risorse, invece, sono regolati in relazione all'avanzamento delle opere.

Inoltre, la citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, laddove di fatto chiarisce che: "...non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento...", ha consentito pur in attesa del completo trasferimento delle risorse, di avviare la tempistica di attuazione degli interventi, al riguardo già pre-concordata con la stipula delle relative convenzioni.

Pertanto, con nota n. 0090/U/2013 in data 15 maggio 2013 il Commissario, tenuto conto di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822 e poi dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con nota prot. 1859 dell'11 febbraio 2013, ha invitato l'ente avvalso a procedere nella esecuzione dell'Ordinanza e dell'attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari, osservando che tale comunicazione va quindi intesa quale comunicazione ai sensi dell'art. 6, primo comma, della relativa convenzione e pertanto, dalla data di ricevimento della stessa, decorrono i termini di cui al cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento riportati al medesimo art. 6 della convenzione.

Con la stessa nota n. 0090/U/2013 in data 15 maggio 2013 il Commissario ha altresì evidenziato all'ente avvalso che, come specificato nella suddetta nota PCM-DIPE n. 4822 del 27 novembre 2012, le risorse assegnate, non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2013 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie, saranno revocate dal CIPE;



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 3. ASPETTI GENERALI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

### 3.1. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25 NOVEMBRE 2010

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 35.900.000,00.

Di seguito si elencano gli interventi come indicati nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 35.900.000,00 :

Ente prop.	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto
Comune di Fabriano	AN	Fabriano	Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4	barriere paramassi (completamento)	150.000
Comune di Genga	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000
Comune di Serra San Quirico	AN	Serra S. Quirico	Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4	palificata e drenaggi	400.000
Comune di Sirolo	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000
AdB REGIONALE MARCHE	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Fiumesino ESOND R4	mitigaz rischio idraulico Fiume Esino	1.400.000
	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Castelferretti ESOND R4	mitigazione Fossi S. Sebastiano, Rigatta, Cannetacci (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.500.000
	AN	Castelfidardo	MonteCamillone ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000
	AN	Osimo	Osimo Stazione ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000
	AN	Senigallia	Bettolelle- Brugnetto ESOND R4	Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanziam vari)	1.000.000
	AN	Serra Quirico	S. Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4	disgaggi e barriere paramassi	250.000
Provincia AP - Comune Acquaviva Picena	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo Versante Nord FRANA R3	Consolidamento	400.000
Protezione Civile/Comune di Acquasanta Terme	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000
Comune di Arquata del Tronto	AP	Arquata d. Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000
Comune di Cossignano	AP	Cossignano	versante Nord capoluogo FRANA R3	Consolidamento	500.000



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Ente prop.	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto
Protezione Civile/Comune di Force	AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000
Comune di Palmiano/CM/Prov AP	AP	Palmiano	capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3	Regimazione idrica, riprofilatura vers	250.000
Comune di San Benedetto del Tronto	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000
AdB Tronto	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4 Spinotoli ESOND E3	consolidamento briglia riparazione argine	1.500.000
Comune di Altidona	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	completamento consolidamento parete rocciosa	300.000
Comune di Campofilone	FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3	messa in sicurezza idraulica foce	300.000
Comune di Fermo	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000
Comune di Fermo	FM	Fermo	Marina Palmense ESOND R4	Adeguamento sez idraul. F.sso Torre	250.000
Comune di Lapedona	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000
Comune di Monsampietro Morico/Prov. FM	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000
Protezione Civile/Comune di Montefalcone	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000
Comune di Montefortino	FM	Montefortino	Capol -Via Circonvallazione ESOND R4	opere di sostegno, difesa spondale	400.000
Comune di Torre San Patrizio	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio FRANA R3	consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000
AdB Reg.le - Prov Fermo	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000
Comune di Belforte del Chienti	MC	Belforte del Chienti	Versante orientale abitato FRANA R3	trincee drenanti, palificate, riprofilature	500.000
Provincia di Macerata	MC	Fiumi Chienti e Potenza	Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3)	opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	600.000
Comune di Cingoli	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	consolidamento centro abitato	800.000
Comune di Civitanova Marche	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000
Comune di Treia	MC	Treia	Piangiano FRANA R3	Risanamento movimento franoso	700.000
AdB TEVERE	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia ESOND R4	Regim idraulica adeg sez e sist amb	1.000.000
		Ussita	Fosso Valruscio ESOND R4	Regimazione idraulica e ripristina sez defl	
		CastelSAng. Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	
Protezione Civile/Regione Marche	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	interventi di difesa della costa	4.500.000
Provincia di Pesaro e Urbino	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000
Comune di Borgo Pace	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA - FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000





*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Ente prop.	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto
Comune di Cantiano	PU	Cantiano	Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4	riduzione rischio idrogeologico	250.000
Comune di Frontone	PU	Frontone	Castello - perimetr in corso	consolidam movim franoso	250.000
Comune di Macerata Feltria	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	palificata, trincee drenanti	180.000
Comune di Montecalvo in Foglia	PU	Montecalvo in Foglia	Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4	Messa in sicurezza	300.000
Comune di Montelabbate	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	consolidamento frana	400.000
Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino	PU	Pesaro	Chiusa di Ginestreto ESOND PESARO R4	Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro	2.500.000
Com. Pesaro e Prov. Pesaro e Urbino/AdB Marecchia Conca	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	messa in sicurezza centro abitato	800.000
Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000
Comune di Piobbico	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000
Comune di Sassocorvaro	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000
Comune di Sant'Ippolito	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	bonifica versante NW	300.000
Protezione Civile/Regione Marche	PU	Fano	Via Ruggeri COSTA - assim R4	interventi di difesa della costa	3.200.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO ACCORDO DI PROGRAMMA</b>					<b>35.900.000,00</b>

In data 20/02/2012 l'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche, in ottemperanza a quanto richiesto dal MATTM in occasione della riunione del 30/01/2012, ha trasmesso al MATTM la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche compilata nei campi indicati dal Ministero per la definizione di criteri di riparto delle risorse oggetto della Deliberazione CIPE n. 6/2012. In tale tabella i vari interventi vengono ordinati singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Tale comunicazione è stata prodotta anche in considerazione della ipotesi di rimodulazione dell'accordo richiesta dal MATTM con nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011. Nell'elenco allegato, che comprende tutti gli interventi dell'allegato 1, Tab. A1, all'Accordo di Programma, gli interventi sono peraltro indicati anche attraverso l'uso di codici compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, a quel tempo già precedentemente concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche.

Di seguito si indicano gli interventi ed i relativi codici:

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo
AN001A/10	AN	Fabriano	Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4	barriere paramassi (completamento)	150.000
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000



*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo
AN003A/10	AN	Serra S. Quirico	Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4	palificata e drenaggi	400.000
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000
AN005A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Fiumesino ESOND R4	mitigaz rischio idraulico Fiume Esino	1.400.000
AN006A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Castelferretti ESOND R4	mitigazione Fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.500.000
AN007A/10	AN	Castelfidardo	MonteCamillone ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000
AN008A/10	AN	Osimo	Osimo Stazione ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000
AN009A/10	AN	Senigallia	Bettolelle- Brugnetto ESOND R4	Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanzia vari)	1.000.000
AN010A/10	AN	Serra Quirico S.	Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4	disgaggi e barriere paramassi	250.000
AP011A/10	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo Versante Nord FRANA R3	Consolidamento	400.000
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000
AP014A/10	AP	Cossignano	versante Nord capoluogo FRANA R3	Consolidamento	500.000
AP015A/10	AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000
AP016A/10	AP	Palmiano	capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3	Regimazione idrica, riprofilatura vers	250.000
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	consolidamento briglia	1.100.000
AP019A/10	AP	Fiume Tronto	Spinetoli ESOND E3	riparazione argine	400.000
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	completamento consolidamento parete rocciosa	300.000
FM021A/10	FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3	messa in sicurezza idraulica foce	300.000
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000
FM023A/10	FM	Fermo	Marina Palmense ESOND R4	Adeguamento sez idraul. F.sso Torre	250.000
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol -Via Circonvallazione ESOND R4	opere di sostegno, difesa spondale	400.000
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio FRANA R3	consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	800.000
MC030A/10	MC	Belforte del Chienti	Versante orientale abitato FRANA R3	trincee drenanti, palificate, riprofilature	500.000



*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo
MC031A/10	MC	Fiumi Chienti e Potenza	Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3)	opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	600.000
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	consolidamento centro abitato	800.000
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000
MC034A/10	MC	Treia	Piangiano FRANA R3	Risanamento movimento franoso	700.000
MC035A/10	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia ESOND R4	Regim idraulica adeg sez e sist amb (300.000)	300.000
MC036A/10	MC	Ussita	Fosso Valruscio ESOND R4	Regimazione idraulica e ripristina sez defl (400.000)	400000
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe (300.000)	300000
MC038A/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	interventi di difesa della costa	4.500.000
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000
PU041A/10	PU	Cantiano	Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4	riduzione rischio idrogeologico	250.000
PU042A/10	PU	Frontone	Castello - perimetr in corso	consolidam movim franoso	250.000
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	palificata, trincee drenanti	180.000
PU044A/10	PU	Montecalvo in Foglia	Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4	Messa in sicurezza	300.000
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	consolidamento frana	400.000
PU046A/10	PU	Pesaro	Chiusa di Ginestreto ESOND PESARO R4	Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro	2.500.000
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	messa in sicurezza centro abitato	800.000
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	bonifica versante NW	300.000
PU052A/10	PU	Fano	Via Ruggeri COSTA - assim R4	interventi di difesa della costa	3.200.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO ACCORDO DI PROGRAMMA</b>					<b>35.900.000,00</b>

Successivamente la Regione Marche, con nota n. 854 del 25/05/2012 dell'Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi, ha comunicato gli interventi proposti ai fini del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012.

Tale comunicazione è stata prodotta anche in considerazione della ipotesi di rimodulazione dell'accordo richiesta dal MATTM con nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011. Vengono indicate pertanto al contempo anche gli interventi che trovano copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali a quella data impegnate e/o trasferite, gli interventi che al quel momento restavano ancora privi di indicazioni circa la loro copertura finanziaria e gli interventi da porre nella parte programmatica dell'atto integrativo di successiva predisposizione.



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Con la nota di regione Marche n. 854 del 25/05/2012 di fatto si scompone l'allegato "1" Tab. A1 dell'Accordo di Programma in più sottoelenchi, in funzione del diverso tipo di finanziamento posto a copertura o meno degli interventi, nonché della parte programmatica, come di seguito indicato.

#### ➤ INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	Disgaggi e barriere paramassi	400.000	400.000,00		1
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000	300.000,00		2
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	Opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	100.000,00		3
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualf ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	200.000,00		4
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	700.000,00		5
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	Riduzione rischio idrogeologico	300.000	300.000,00		6
MC031A/10	MC	Fiumi Chienti e Potenza	Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3)	Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	600.000	600.000,00		7
AP019A/10	AP	Fiume Tronto	Spinetoli ESOND E3	Riparazione argine	400.000	400.000,00		8
FM021A/10	FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	300.000,00		9
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio FRANA R3	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	300.000,00		10
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol -Via Circonvallazione ESOND R4	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	400.000,00		11
AP015A/10	AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio - <i>(1° stralcio completamento)</i>	1.500.000	1.130.626,62		12
<b>TOTALE INTERVENTI DA ESEGUIRE CON SOMME GIA' IMPEGNATE</b>						5.130.626,62		

#### ➤ INTERVENTI RICOMPRESI IN DELIBERA CIPE 6/2012

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
AP015A/10	AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio - <i>(2° stralcio completamento)</i>	1.500.000		369.373,38	1
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000		4.210.000,00	2
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000		300.000,00	3
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000		800.000,00	4
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000		600.000,00	5
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000		300.000,00	6
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	800.000		800.000,00	7
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000		300.000,00	8



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000		800.000,00	9
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000		300.000,00	10
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000		1.100.000,00	11
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000		800.000,00	12
AN004A/10	AN	Siroio	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000		750.000,00	13
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000		400.000,00	14
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000		500.000,00	15
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpa V.le Vittorio Veneto	200.000		200.000,00	16
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000		270.000,00	17
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S. Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000		200.000,00	18
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000		180.000,00	19
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000		400.000,00	20
<b>TOTALE DA ESEGUIRE CON FONDI FAS L. 183/2011 art. 33, c.omma3</b>							<b>13.579.373,38</b>	

#### ➤ INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AdP ATTUALMENTE PRIMI DI COPERTURA FINANZIARIA

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
AN001A/10	AN	Fabriano	Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4	Barriere paramassi (completamento)	150.000		150.000,00	1
FM023A/10	FM	Fermo	Marina Palmense ESOND R4	Adeguamento sez idraul. Fso Torre	250.000		250.000,00	2
AN009A/10	AN	Senigallia	Bettolelle- Brugnetto ESOND R4	Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanziaim vari)	1.000.000		1.000.000,00	3
AN006A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Castelferretti ESOND R4	Mitigazione Fossi S. Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.500.000		1.500.000,00	4
AN010A/10	AN	Serra Quirico	Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4	Disgaggi e barriere paramassi	250.000		250.000,00	5
PU044A/10	PU	Montecalvo in Foglia	Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schietti ESOND R4	Messa in sicurezza	300.000		300.000,00	6
AP011A/10	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo Versante Nord FRANA R3	Consolidamento	400.000		400.000,00	7
AP014A/10	AP	Cossignano	versante Nord capoluogo FRANA R3	Consolidamento	500.000		500.000,00	8
PU042A/10	PU	Frontone	Castello - perimetr in corso	Consolidam movim franoso	250.000		250.000,00	9
PU052A/10	PU	Fano	Via Ruggeri COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	3.200.000		3.200.000,00	10
AN007A/10	AN	Castelfidardo	MonteCamillone ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000		1.200.000,00	11
AN008A/10	AN	Osimo	Osimo Stazione ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000		1.200.000,00	12



*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
AN005A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Fiumesino ESOND R4	Mitigaz rischio idraulico Fiume Esino	1.400.000		1.400.000,00	13
PU041A/10	PU	Cantiano	Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4	Riduzione rischio idrogeologico	250.000		250.000,00	14
MC035A/10	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia ESOND R4	Regim idraulica adeg sez e sist amb (300.000)	300.000		300.000,00	15
MC034A/10	MC	Treia	Piangiano FRANA R3	Risanamento movimento franoso	700.000		700.000,00	16
MC030A/10	MC	Belforte del Chienti	Versante orientale abitato FRANA R3	Trincee drenanti, palificate, riprofilature	500.000		500.000,00	17
AP016A/10	AP	Palmiano	capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3	Regimazione idrica, riprofilatura vers	250.000		250.000,00	18
RISORSE RESIDUE DA REPERIRE PER ULTERIORE FASE DEL PROGRAMMA							13.600.000,00	

➤ INTERVENTI DA PORRE IN FASE PROGRAMMATIVA NELL'ATTO INTEGRATIVO DA PREDISPORRE

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
MC038A-2/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA assim R4	Interventi di difesa della costa	290.000		290.000,00	1
PU046A/10	PU	Pesaro	Chiusa Ginestreto ESOND PESARO R 4	Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro	2.500.000		2.500.000,00	2
MC036A/10	MC	Ussita	Fosso Valruscio ESOND R4	Regimazione idraulica e ripristino sezione di deflusso	400.000		400.000,00	3
AN003A/10	AN	Serra San Quirico	Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4	Palificata e drenaggi	400.000		400.000,00	4
RISORSE RESIDUE DA REPERIRE PER FASE PROGRAMMATICA (10%)							3.590.000,00	



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

### 3.2. INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI

Ad inizio dell'anno 2012 la disponibilità delle somme versate (euro 3.113.545,59), nonché la prevedibile disponibilità entro brevi termini delle somme impegnate (Euro 2.017.081,03), ha permesso quindi di avviare la fase di attuazione delle attività previste, previa necessità di operare tra gli interventi aventi più celere cantierabilità, oltre che urgenza, una forte selezione.

A tal fine si è preso atto della comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, conseguente alla citata riunione del 30/01/2012, contenente la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche, ordinati dalla Regione Marche singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Sulla base di tale tabella, considerando le priorità espresse, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili nonché impegnate (Euro 5.130.626,62). Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi, in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (n.b. di cui Euro 369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, sono relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012).

Tali interventi inoltre sono diventati di fatto 14, sempre per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00, in conseguenza della scomposizione in tre distinti interventi dell'intervento :

- MC031A/10 - Comuni di Civitanova, Corridonia, Tolentino, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati (MC). Località Fiumi Chienti e Potenza. Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti. 600.000,00 Euro.

Ragion per cui si è proceduto ad una serie di incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati a tali interventi. Nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Di seguito si riporta l'elenco di tali interventi, corredato delle indicazioni inerenti l'ente avvalso (soggetto attuatore), il Responsabile del procedimento, i codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo di Gara) nonché le date di stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
AN002A/10	AN	Genga	400.000	Comune di Genga	Ing. Paolo Loretelli	D37H12000750001	4782378F28	12/06/2012	18/06/2012
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Arch. Emidio Cinesi	I62J12000040001	47115974D7	12/06/2012	19/06/2012
AP015A/10	MC	Force	1.500.000	Comune di Force (AP)	Geom. Amedeo Vagnoni	H88G13000000001	49333243C0	29/11/2012	20/12/2012
AP019A/10	AP	Spinetoli	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	Arch. Emidio Cinesi	I49H13000010001	4919301F97	27/09/2012	04/12/2012
FM021A/10	FM	Campofilone	300.000	Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM)	Ing. Riccardo Treggiari	G49H12000290001	5005229D9F	27/09/2012	04/12/2012
FM024A/10	FM	Lapedona	700.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C99H11000750001	49564911C4	12/06/2012	19/06/2012



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
FM027A/10	FM	Montefortino	400.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C69H11000920001	4956580B33	29/11/2012	04/12/2012
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	300.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C49H11000450001	4956562C58	27/09/2012	04/12/2012
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	169.000	Provincia di Macerata	Ing. Stefania Tibaldi	F19H12000160001	4768950608	23/07/2012	31/07/2012
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	200.000	Provincia di Macerata	Ing. Stefania Tibaldi	F89H12000310001	4768807008	23/07/2012	31/07/2012
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	231.000	Provincia di Macerata	Ing. Stefania Tibaldi	F99H12000190001	4768601607	23/07/2012	31/07/2012
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	100.000	Provincia di Pesaro e Urbino	Geom. Luciano Lombardi	B43B12000100001	4909009261	12/06/2012	19/06/2012
PU040A/10	PU	Borgo Pace	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	Geom. Renato Dini	I59H12000120001	490392923B	12/06/2012	19/06/2012
PU049A/10	PU	Piobbico	200.000	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	Geom. Brenno Truffelli	I33B10000490001	43709573D2	12/06/2012	19/06/2012

Per tutti questi interventi, ad eccezione del solo intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazioni stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Ne consegue un significativo risparmio in termini di spesa, in quanto per tali interventi le spese tecniche connesse alla realizzazione dell'appalto risultano contenute nel valore del 2% dell'importo lavori, in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione di cui all'art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006.

I risparmi in tal senso conseguiti, rispetto a quanto sarebbe occorso in caso di ricorso a professionisti esterni, hanno permesso di destinare maggiori risorse al corrispondente importo dei lavori.

Nel solo caso dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), l'ente avvalso ha rappresentato che per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006), l'amministrazione comunale non ha nel proprio organico idonee professionalità che possano seguire le progettazioni e la direzione lavori, e pertanto per l'espletamento dell'intervento dovrà avvalersi del supporto di professionisti esterni.

In tal caso l'autorizzazione ad avvalersi di professionisti esterni è stata concessa all'ente richiedente, con la condizione di contenere tali spese entro determinati limiti, come definiti nel documento "Norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", approvate dal Commissario Straordinario con decreto n. 1/2012 del 18/05/2012.





### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

#### **3.3. INTERVENTI ATTIVATI SUI FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012**

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione Marche che, stante le probabili e presumibili condizioni di celerità nella attuazione degli interventi richieste dal CIPE ai fini della erogazione dei fondi, occorre procedere con l'individuare procedure condivise che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui sopra.

Definita la procedura attuativa da adottare, si è quindi proceduto ad una serie di incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati a tali interventi. Nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avalimento e delle conseguenti Convenzioni di avalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.

Di seguito si riporta l'elenco di tali interventi, corredato delle indicazioni inerenti l'ente avvalso (soggetto attuatore), il Responsabile del procedimento, i codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo di Gara) nonché le date di stipula delle relative Ordinanze di avalimento e delle conseguenti Convenzioni di avalimento:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	Geom. Daniele Re	I99H13000110000	5098136AE8	21/12/2012	21/12/2012
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	300.000	Comune di CastelSAng. Nera	Geom. Giovanni Battista Ricci	F49H12000360002	5028805D27	21/12/2012	21/12/2012
PU048A/10	PU	Pesaro	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Dott. Luigi Alberto Tosti	B73B12000390001	4910587894	20/12/2012	20/12/2012
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	600.000	Comune di Montefalcone App.no	Geom. Domenico Procaccini	F55D12000160003	5125191169	21/12/2012	21/12/2012
PU051A/10	PU	S. Ippolito	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	Ing. Francesco Passetti	F35D12000290001	4921540748	20/12/2012	20/12/2012



*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	800.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C69H11000930001	4956603E2D	21/12/2012	21/12/2012
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Arch. Emidio Cinesi	I22J12000210001	49002863EE	21/12/2012	21/12/2012
MC032A/10	MC	Cingoli	800.000	Comune di Cingoli	Ing. Emanuele Brunacci	J62J11000340001	4910049C9A	20/12/2012	20/12/2012
FM020A/10	FM	Altidona	300.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C19H11000600001	4956630478	21/12/2012	21/12/2012
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	Ing. Fernando Mistichelli	I32J12000250001	4900430AC1	21/12/2012	21/12/2012
PU047A/10	PU	Pesaro	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Dott. Tiberi Vincenzo	B72J11000260001	491066481F	20/12/2012	20/12/2012
AN004A/10	AN	Sirolo	750.000	Comune di Sirolo	Arch. Mario Maraschioni	I43B13000020001	493257272D	21/12/2012	21/12/2012
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	400.000	Comune di Civitanova Marche	Ing. Franco Capozzucca	E77H11002860002	492877167E	20/12/2012	20/12/2012
AP017A/10	AP	San Benedetto	500.000	Comune di San Benedetto	Ing. Enrico Offidani	F85D13000000001	49583396C7	21/12/2012	21/12/2012
FM022A/10	FM	Fermo	200.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C69H11000940001	4956640CB6	21/12/2012	21/12/2012
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	270.000	Comune di Sassocorvaro	Arch. Marco Maria Rondini	I43B12000260001	4989001DDA	21/12/2012	21/12/2012
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	200.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C39H11000450001	49566168E9	21/12/2012	21/12/2012
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	180.000	Comune di Macerata Feltria	Geom. Emanuele Santini	F49B12000050001	4910185CD5	21/12/2012	21/12/2012
PU045A/10	PU	Montelabbate	400.000	Comune di Montelabbate	Arch. Fausto Virgilio Dimatera	J88C10000930001	5021398CB4	21/12/2012	21/12/2012

Per la maggior parte di questi interventi, ovvero ad eccezione dei soli interventi sotto indicati, le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazioni stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Ne consegue un significativo risparmio in termini di spesa, in quanto per tali interventi le spese tecniche connesse alla realizzazione dell'appalto risultano contenute nel valore del 2% dell'importo lavori, in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione di cui all'art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006.

I risparmi in tal senso conseguiti, rispetto a quanto sarebbe occorso in caso di ricorso a professionisti esterni, hanno permesso di destinare maggiori risorse al corrispondente importo dei lavori.

Nel solo caso dei seguenti interventi:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	300.000	Comune di CastelSAng. Nera	Geom. Giovanni Battista Ricci	F49H12000360002	5028805D27	21/12/2012	21/12/2012
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	600.000	Comune di Montefalcone App.no	Geom. Domenico Procaccini	F55D12000160003	5125191169	21/12/2012	21/12/2012



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
AN004A/10	AN	Sirolo	750.000	Comune di Sirolo	Arch. Mario Maraschioni	I43B13000020001	493257272D	21/12/2012	21/12/2012
AP017A/10	AP	San Benedetto	500.000	Comune di San Benedetto	Ing. Enrico Offidani	F85D13000000001	49583396C7	21/12/2012	21/12/2012
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	270.000	Comune di Sassocorvaro	Arch. Marco Maria Rondini	I43B12000260001	4989001DDA	21/12/2012	21/12/2012
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	180.000	Comune di Macerata Feltria	Geom. Emanuele Santini	F49B12000050001	4910185CD5	21/12/2012	21/12/2012
PU045A/10	PU	Montelabbate	400.000	Comune di Montelabbate	Arch. Fausto Virgilio Dimatera	J88C10000930001	5021398CB4	21/12/2012	21/12/2012

l'ente avvalso ha rappresentato che per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006), l'amministrazione comunale non ha nel proprio organico idonee professionalità che possano seguire le progettazioni e la direzione lavori, e pertanto per l'espletamento dell'intervento dovrà avvalersi del supporto di professionisti esterni.

In tal caso l'autorizzazione ad avvalersi di professionisti esterni è stata concessa all'ente richiedente, con la condizione che per tutte le attività tecniche di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, siano esse riferite a prestazioni professionali normali, speciali e accessorie, comprese le attività tecnico-amministrative collegate e ogni altra spesa, che non siano svolte al suo interno e con personale della propria struttura, l'ente avvalso si impegna a rispettare i limiti di spesa indicati dal commissario nel documento "Norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", approvate dal Commissario Straordinario con decreto n. 1/2012 del 18/05/2012, nonché di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di tale natura.



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

#### **3.4. INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELL'ADP ATTUALMENTE PRIVI DI COPERTURA FINANZIARIA**

Alla data del 31 dicembre 2013 non si è ancora proceduto alla redazione di ulteriori Ordinanze e/o Convenzioni di avvalimento, in quanto risultano prodotte tutte le ordinanze e relative convenzioni di avvalimento inerenti tutti gli interventi al momento coperti da finanziamento, ovvero di cui ai fondi già disponibili in contabilità speciale intestata al Commissario nonché alle risorse destinate dalla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto degli interventi del 26/10/2012.

Tali interventi, al momento avviati, risultano essere quelli rappresentati a maggior priorità progressiva tra quelli indicati dalla Regione Marche, ai fini della presa d'atto del CIPE, con nota Prot. n. 854 del 25/05/2012.

Parimenti, non risultano ancora avviati tutti gli interventi indicati nella citata nota della Regione Marche 854/2012 quali privi di copertura finanziaria, ed ovvero :

- n. 18 interventi per Complessivi Euro 13.600.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire per ulteriore fase del programma");
- n. 3 + (1) interventi per Complessivi Euro 3.590.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire per fase programmatica (10%)");

stante la perdurante mancanza di copertura finanziaria degli stessi, protratta fino al periodo in questione, associata ad una mancanza di comunicazioni, da parte dei soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di Programma, su possibili prospettive di finanziamento futuro.

Gli interventi, di cui all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma, attualmente privi di copertura finanziaria sono i seguenti:

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Priorità
AN001A/10	AN	Fabriano	Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4	Barriere paramassi (completamento)	150.000	1
FM023A/10	FM	Fermo	Marina Palmense ESOND R4	Adeguamento sez idraul. Fso Torre	250.000	2
AN009A/10	AN	Senigallia	Bettolelle- Brugnetto ESOND R4	Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanzia vari)	1.000.000	3
AN006A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Castelferretti ESOND R4	Mitigazione Fossi S. Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.500.000	4
AN010A/10	AN	Serra S. Quirico	Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4	Disgaggi e barriere paramassi	250.000	5
PU044A/10	PU	Montecalvo in Foglia	Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4	Messa in sicurezza	300.000	6
AP011A/10	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo Versante Nord FRANA R3	Consolidamento	400.000	7
AP014A/10	AP	Cossignano	versante Nord capoluogo FRANA R3	Consolidamento	500.000	8
PU042A/10	PU	Frontone	Castello - perimetr in corso	Consolidam movim franoso	250.000	9
PU052A/10	PU	Fano	Via Ruggeri COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	3.200.000	10
AN007A/10	AN	Castelfidardo	MonteCamillone ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000	11
AN008A/10	AN	Osimo	Osimo Stazione ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000	12
AN005A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Fiumesino ESOND R4	Mitigaz rischio idraulico Fiume Esino	1.400.000	13
PU041A/10	PU	Cantiano	Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4	Riduzione rischio idrogeologico	250.000	14
MC035A/10	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia ESOND R4	Regim idraulica adeg sez e sist amb (300.000)	300.000	15



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Priorità
MC034A/10	MC	Treia	Piangiano FRANA R3	Risanamento movimento franoso	700.000	16
MC030A/10	MC	Belforte del Chienti	Versante orientale abitato FRANA R3	Trincee drenanti, palificate, riprofilature	500.000	17
AP016A/10	AP	Palmiano	capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3	Regimazione idrica, riprofilatura vers	250.000	18

a cui vanno aggiunti gli interventi proposti da regione Marche con la citata nota Prot. n. 854 del 25/05/2012 per la fase programmatica, anch'essi attualmente privi di copertura finanziaria, che sono i seguenti:

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Priorità
MC038A-2/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	290.000	1
PU046A/10	PU	Pesaro	Chiusa Ginestreto ESOND PESARO R 4	Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro	2.500.000	2
MC036A/10	MC	Ussita	Fosso Valruscio ESOND R4	Regimazione idraulica e ripristino sezione di deflusso	400.000	3
AN003A/10	AN	Serra San Quirico	Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4	Palificate e drenaggi	400.000	4

Peraltro, per tali interventi, la Regione Marche nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012, per mezzo di una apposita relazione presentata in sede di riunione, ha rappresentato la "... possibilità di traslocare, in sede di stipula dell'Atto Integrativo, alcuni interventi ricadenti nella tabella 1 dell'allegato 1 all'Accordo (quota Stato) in un nuovo elenco degli interventi di competenza regionale (ex tabella 2 dell'allegato 1) o nell'elenco degli interventi di fase programmatica (allegato 2 all'Accordo), e viceversa; l'individuazione degli interventi da collocare definitivamente nei due elenchi sarà fornita in un secondo tempo mediante Delibera di Giunta Regionale approvata in base agli esiti dell'esame da parte del CIPE del Piano Centro Nord ovvero, in assenza di informazioni sul completamento degli stanziamenti previsti dall'Accordo, a seguito della rivalutazione delle priorità."

Pertanto, il Commissario ha ritenuto opportuno attendere, prima di procedere con l'attivazione dei restanti interventi, la stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma ed il conseguente consolidamento del quadro degli interventi, proprio nell'intento di non creare difficoltà alla Regione Marche nel caso in cui, a seguito della rivalutazione delle priorità, fosse stato loro necessario modificare tale elenco di interventi.

Infatti, si sarebbe potuto procedere con la stipula delle relative Convenzioni, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, con la condizione che le stesse si sarebbero attivate in merito alla cronotempistica di attuazione ed impegni di spesa solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica dell'intervento. Ma ciò avrebbe poi vincolato la Regione Marche nell'ambito delle proprie valutazioni in sede di stesura dell'atto Integrativo.

Va qui rappresentato che, anche per le motivazioni sopra esposte, a partire dalla data del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 il Commissario, naturalmente nell'ambito del proprio ruolo e responsabilità, ha più volte sollecitato ai rappresentanti di Regione Marche la necessità di dare corso all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, anche al fine di avviare, nelle more delle relative coperture economiche degli interventi, quantomeno le fasi propedeutiche connesse all'attuazione di tali ulteriori interventi.



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

#### 3.5. INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PUNTO 2 - COFINANZIAMENTO REGIONALE

In particolare, gli interventi inseriti nell'Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell'Accordo di programma del 25 novembre 2010, sono i seguenti:

FONTI FINANZ	BENEFICIARIO/ ATTUATORE	INTERVENTO	TOTALE COFIN
<b>ACCORDI DI PROGRAMMA tra EE.LL. REGIONALI e SOGGETTI PRIVATI</b>			
<i>stipulato Acc. di Programma</i>	Prov. FM, Regione, Comuni Porto San Giorgio e Fermo, PRIVATI	opere strutturali mitigazione rischio idraulico	€ 400.000,00
<i>copertura attestata con DGR n. 17 del 14.01.2008</i>	Regione, Prov. AP, Comuni S. Benedetto T., Grottammare, Ripatransone, Acquaviva P., Consorzio Bon. Tronto	messa in sicurezza idraulica del Torrente Albula con una serie di casse di espansione a bocca tarata, adeguamenti alle sezioni idrauliche e rifacimento di alcuni attraversamenti esistenti	€ 5.232.766,09
<i>stipulato Accordo di Programma-cap. 42204220</i>	Regione, Prov. PU, Comune di Urbino	messa in sicurezza e riqualificazione ambientale area Lago di Schieti - Comune Urbino	€ 100.000,00
<b>sub-totale</b>			<b>€ 5.732.766,09</b>

<b>COFINANZIAMENTO PRIVATI IN PROCEDIMENTI PUBBLICI</b>			
	Prov. PU, Comune Pesaro	Del. CC Pesaro 121/2005: Disciplina Contributo privati per finanzia 1° cassa Espansione F. Foglia - loc. Chiusa Ginestreto	€ 3.000.000,00
	Prov. AN, Comune Castelfidardo	Contributo privati per interventi idraulici e casse di espansione (PS 2006 post alluvione An Sud) - Fosso Rigo	€ 3.000.000,00
	Regione, Prov. AN, Comuni Osimo	Contributo Autostrade SpA per opere di mitigazione e compensazione ambientale funzionali a arginature casse espansione e opere su golene e versanti (PS2006)	€ 800.000,00
<b>sub-totale</b>			<b>€ 6.800.000,00</b>

<b>POR - FESR MARCHE - ASSE V - Progetti Integrati per la Valorizzazione dei Territori (N.B.: solo difesa del suolo)</b>			
<i>fondi impegnati con decreti PF Politiche Comunit. DDPF /POC03 nn. 52, 53, 54, 55, 56 del 25.06.10 a carico del capitolo 31402767 del bilancio reg.le 2010 e dei successivi esercizi finanziari</i>	Provincia PU	Mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Metauro	€ 530.000,00
	Prov. PU - Unione Pian del Bruscolo	Operazione "Fiume Foglia": Percorsi in sicurezza tra Natura e Cultura	€ 150.000,00
	Prov. PU - Comune di Petriano	Lavori di messa in sicurezza del Fosso del Razzo	€ 250.000,00
	Provincia AN	Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a rischio idrogeologico R3 e R4 Fiume Esino	€ 749.717,01
	Provincia AN	Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a rischio idrogeologico R3 e R4 Fiumi Misa e Cesano	€ 749.717,01
	Provincia AN	Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a rischio idrogeologico R3 e R4 Fiume Musone	€ 749.717,01
	Provincia AN	Manutenzione straordinaria reticoli idrografici aree PAI rischio R3 e R4	€ 750.848,98
	Prov. AN - Comune di Chiaravalle	Realizzazione di un percorso lungo il fiume Esino	€ 361.142,43
	Prov. AN - Comune di Chiaravalle	Realizzazione di un percorso pedo-ciclabile di sorveglianza e fuga lungo la sponda sinistra del fiume Esino	€ 134.430,44
	Prov. AN - Comune di Senigallia	PercorriMisa_ Sistemazione di percorsi di controllo e di guardia lungo il corso del fiume Misa	€ 674.999,50
Comune di Staffolo	Lavori di miglioramento idrogeologico e statico del versante in località Borgo San Sebastiano	€ 30.000,00	



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

FONTI FINANZ	BENEFICIARIO/ ATTUATORE	INTERVENTO	TOTALE COFIN
	Comune di Cupramontana	Riassetto idrogeologico area PAI F-12-0829 a pericolosità P3 nella proprietà comunale Via S. Bartolomeo	€ 70.000,00
	Comune di Rosora	Lavori di bonifica e sistemazione dell'area verde comunale sita nel centro storico - versante contrada Pratelli - con pericolo di frana	€ 200.000,00
	Prov. FM - Comune Porto S. Giorgio	Lavori di mitigazione del rischio idraulico del fiume "Ete Vivo"	€ 500.000,00
	Provincia AP	Riqualificazione Fiume Aso	€ 102.500,28
		<b>sub-totale</b>	<b>€ 6.003.072,66</b>

OTTO x MILLE (DPCM 27/11/2009 - Reg. Corte Conti 31/12/2009)			
fondi già trasferiti dallo Stato agli ee.ll. attuatori	Comune di Acquasanta Terme	Completamento del consolidamento delle frazioni Capodirigo e Peracchia soggette a movimenti gravitativi	€ 796.800,00
	Comune di Genga	Completamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti della strada comunale Frasassi vulnerata dal crollo di massi ricciosi e della strada di accesso al Santuario della Madonna di Frasassi vulnerate da frane da crollo	€ 597.600,00
	Provincia di PU	Arginatura del tratto terminale del fiume Metauro fino alla foce nel comune di Fano (PU)	€ 597.600,00
		<b>sub-totale</b>	<b>€ 1.992.000,00</b>

<b>TOTALE COFINANZIAMENTI TERRITORIO REGIONALE</b>	<b>€ 20.527.838,75</b>
--	------------------------

In merito a tali interventi, il Commissario già con propria nota prot. n. 0010/2011/U del 4/07/2011 aveva chiesto alla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche di voler predisporre una relazione sullo stato dell'arte degli interventi inseriti nell'Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell'Accordo di programma, che contenga tutti i dati relativi allo stato della progettazione e degli studi propedeutici necessari, agli atti di approvazione in linea tecnica, ai provvedimenti inerenti i finanziamenti emessi, all'avvenuta aggiudicazione dei lavori o comunque in generale sullo stato di attuazione degli interventi.

Al riguardo la Regione Marche già nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011 ha reso noto la necessità di operare delle modifiche agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", ed ovvero che risultava necessario eliminare da tale elenco buona parte degli interventi in quanto a causa anche dei recenti eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza, risultano già avviati ed in parte conclusi

Quindi, nel corso del successivo Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 la Regione Marche ha proposto, per mezzo di apposita relazione presentata in sede di riunione (ed in particolare al punto 4 della stessa), testualmente quanto segue:

*Si propone alla valutazione del Comitato la richiesta di sostituire l'elenco degli interventi di cui all'allegato 1, tabella 2, dell'Accordo di Programma ("Cofinanziamenti territorio Regione Marche") con un nuovo elenco – comunque da definire in seguito, previa deliberazione della Giunta Regionale - da realizzarsi con fondi regionali già disponibili nel bilancio regionale, quindi immediatamente trasferibili alla contabilità speciale del Commissario Straordinario Delegato, per un importo complessivo di € 6.000.000,00 (di cui € 3.000.000,00 di risorse regionali e € 3.000.000,00 di fondi FAS già riprogrammati dalla Regione per il cofinanziamento dell'Accordo).*

*Tale eventualità era richiamata nelle anticipazioni espresse nella seduta del Comitato del 28 luglio 2011, nella quale si riferiva la necessità di "operare delle modifiche agli interventi riportati nell'allegato ... in quanto a causa anche dei (recenti) eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza,*

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

questi risultano già avviati e in parte conclusi”, che a maggior ragione, stante il protrarsi dello stato di incertezza sullo sviluppo del programma, non può che essere confermata.

Pertanto, per motivazioni in parte analoghe a quelle riportate al punto 2 (urgenza di attuare ogni possibile iniziativa per affrontare, in carenza di risorse statali post-emergenza, la situazione critica venutasi a determinare con l'evento alluvionale del marzo 2011), e in relazione alla imprevedibile durata del percorso intrapreso dalla stipula dell'Accordo sino al momento attuale, si è verificata l'impossibilità di interrompere l'attuazione degli interventi -già finanziati con altri programmi- da parte degli enti locali.

Con riferimento alle diverse sezioni della tabella 2. “Cofinanziamenti territorio Regione Marche” di cui all'Accordo, allo stato attuale tutti gli interventi a suo tempo inseriti nelle sezioni “POR-FESR MARCHE – ASSE V – Progetti integrati per la valorizzazione dei territori” e “Otto per Mille (DPCM 27/11/2009)” sono stati conclusi o almeno aggiudicati.

Per quanto riguarda la sezione “Accordi di Programma tra ee.II. Regionali e soggetti privati”, per due dei tre interventi previsti le procedure di autorizzazione sono state fortemente accelerate in quanto gli eventi alluvionali del marzo 2011 hanno colpito maggiormente la parte Sud della Regione (come si evince dal “Rapporto di evento” redatto e pubblicato dal Centro Funzionale Multirischi della Regione Marche).

Di tali interventi è prossima la realizzazione materiale con i finanziamenti pubblici o privati già disponibili, consistenti:

- in € 5.232.766,09 per le casse di espansione – in due stralci - sul torrente Albula in Comune di San Benedetto del Tronto;
- in € 400.000,00 come contributo di soggetti privati per interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Ete Vivo in Comune di Porto San Giorgio, in sinergia con gli interventi eseguiti in somma urgenza dalla Provincia di Fermo sulla parte terminale di quell'asta fluviale.

Resterebbe viceversa disponibile in linea teorica la somma di € 100.000,00 per l'intervento di “messa in sicurezza e riqualificazione ambientale dell'area Lago di Schieti” (Comune di Urbino), connesso e funzionale all'intervento inserito nell'elenco tabella 1 (quota statale) dell'Accordo (messa in sicurezza del F. Foglia in Comune di Montecalvo in Foglia-Provincia di Pesaro e Urbino-tra Ca' Gallo e lago di Schieti).

Poiché l'intervento in quota statale rientra al momento tra le seconde priorità (essendo infatti escluso dall'elenco sottoposto alla valutazione del CIPE nell'ambito del Piano Centro Nord), si ritiene non opportuno prevedere il mantenimento dell'intervento nella tabella relativa alle quote di parte regionale.

Si fa viceversa riserva di utilizzare tale (modesto) finanziamento regionale, per altro regolato da un pregresso accordo tra enti locali, indipendentemente dall'evoluzione dell'Accordo di Programma del 25.11.2010, fermo restando che l'utilizzo concreto che verrà stabilito terrà conto del possibile finanziamento dello Stato in modo da non condizionarne l'efficacia qualora questo fosse finanziato nel breve - medio termine.

Infine, per quanto riguarda la sezione “Cofinanziamento privati in procedimenti pubblici”, si evidenzia che lo stato dei procedimenti autorizzativi in atto per le progettazioni degli interventi principali (compresi nell'elenco dei finanziamenti statali dell'Accordo), così come la particolare situazione del mercato immobiliare e la tipologia del contributo atteso da parte dei soggetti privati interessati (terreni, progettualità, opere a realizzazione diretta), rendono quanto meno sconsigliabile fare affidamento sulla concreta possibilità che tali soggetti siano in grado di trasferire risorse di natura puramente finanziaria nella contabilità speciale del Commissario Straordinario.

Pertanto, pur considerando tali opportunità come elementi di possibile risparmio (in termini di costo per la PA a parità di efficacia) nell'ambito dei connessi interventi ricompresi nell'elenco a finanziamento statale -di cui però non sono prevedibili i tempi di attivazione-, si ritiene che anch'essi debbano essere scorporati dall'elenco degli interventi a cofinanziamento regionale.



*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

*Qualora l'ipotesi di sostituzione dell'elenco dei cofinanziamenti regionali fosse condivisa in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo, l'esatta allocazione dei fondi regionali utilizzabili per il cofinanziamento del programma potrà essere stabilita in seguito, e precisamente in sede di Atto Integrativo all'Accordo di Programma, sulla base delle informazioni disponibili in relazione all'esito della valutazione CIPE.*

*Considerato infatti che anche dopo l'eventuale auspicabile approvazione del Piano Centro Nord da parte del CIPE resterebbero ancora carenti di finanziamento statale gli interventi eccedenti la somma di competenza statale di € 18.710.000,00, la Giunta Regionale potrebbe stabilire di riservare la quota regionale (€ 6.000.000,00) per alcuni degli interventi attualmente ricadenti nell'elenco di competenza statale (da considerarsi più urgenti rispetto a quelli ricadenti nell'elenco programmatico di cui all'allegato 2 dell'Accordo), dai quali dovrebbero essere temporaneamente ricollocati in fase programmatica - per l'importo equivalente - alcuni degli interventi ora inseriti nell'allegato 1-tabella 1, ovvero procedere al finanziamento di alcuni o tutti tra gli interventi attualmente collocati in fase programmatica (allegato 2 dell'Accordo) nel frattempo divenuti più urgenti.*

*Pertanto in questa fase si richiede al Comitato di condividere la possibilità della traslocazione da un elenco all'altro e viceversa, in modo che al momento dell'Atto Integrativo possano essere recepite le proposte definite dalla Giunta Regionale - con specifico elenco - nel quadro delle priorità esistenti al momento.*

Pertanto, stante quanto relazionato dalla regione Regione Marche, e sentita la loro proposta di considerare la sostituzione integrale della parte di cofinanziamento regionale con un nuovo elenco di interventi, anche il Commissario ha chiesto al Comitato di stralciare la parte di cofinanziamento dall'Atto Integrativo all'Accordo in quanto formalmente ha la responsabilità anche sui relativi interventi pur non avendo avuto modo di occuparsi della loro attuazione in quanto già avviati.

Al riguardo, il Comitato ha convenuto di non stralciare gli interventi del cofinanziamento dall'accordo ma di definire nell'atto integrativo che la gestione di detti interventi è a carico della Regione e non del Commissario, e parimenti ha chiesto alla Regione di predisporre una bozza di atto integrativo in linea con quanto proposto

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

**4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2013**

Considerato che ai fini dell'attuazione del programma degli interventi e delle occorrenti intese con i soggetti pubblici interessati, come previsto all'art. 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2011, era necessario sottoscrivere con gli Enti Attuatori degli interventi una convenzione per regolare la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi ed i controlli e le verifiche sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione finanziaria, il Commissario ha ritenuto utile definire una disciplina generale a cui fare riferimento nelle singole convenzioni di avvalimento, dando corso alla predisposizione dei seguenti documenti di riferimento:

- Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
- Convenzione-Tipo di avvalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi.

La predisposizione di tali documenti è stata curata in stretta collaborazione con l'ufficio del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, che ha potuto quindi visionare le bozze e proporre le proprie richieste di modifica.

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Assessorato alla Tutela e Risanamento Ambientale e alla Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 839 del 15 maggio 2012, con cui si esprime formalmente la condivisione sugli schemi di convenzione proposti dal Commissario, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione dei seguenti documenti, che di fatto definiscono e disciplinano le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma:

Ordinanza n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

Collaborazione tecnica ed operativa del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche.

Decreto n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

Approvazione delle linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, e delle modalità di convenzionamento con gli enti avvalsi.

Copia di tale documentazione, che di fatto rappresenta una disciplina generale per l'attuazione degli interventi, è stata distribuita a tutti gli enti con cui sono state sottoscritte le Convenzioni di avvalimento.

Parimenti, a seguito dei contenuti della delibera CIPE n. 6/2012 e della conseguente presa d'atto dell'elenco degli interventi del 26 ottobre 2012, il Commissario ha preso atto che ferma restando l'attività di monitoraggio a cura del Ministero dell'ambiente, come prevista nell'ambito degli accordi programma già stipulati, gli interventi elencati nella sopracitata presa d'atto saranno presumibilmente monitorati, in aderenza alle previsioni della delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti, anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione offerta dalla amministrazione regionale delle Marche per le attività tecniche ed operative connesse all'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma, ma anche di estendere la collaborazione alle attività connesse all'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi, oltre che mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS - ISPRA), anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia prot. n. 819027 del 7 dicembre 2012, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione del seguente documento:

Ordinanza n. 014/2012 del 10 dicembre 2012 :

Collaborazione tecnica ed operativa del "Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa del suolo" della Regione Marche.  
(aggiorna e sostituisce la precedente ordinanza del 18 maggio 2012, n. 001/2012)

Sulla base di tali atti si è quindi, in buona prevalenza, svolta l'attività amministrativa del commissario.

Risultano al momento avviati complessivamente n. 33 interventi (14 + 19), per la cui attuazione risultano al momento prodotti, complessivamente, i seguenti atti:

- n. 33 Ordinanze
- n. 33 Convenzioni di avvalimento
- n. 122 Decreti Commissariali

Risultano altresì istruiti:

- n. 33 Progetti Definitivi
- n. 33 Progetti Esecutivi
- n. 33 Schemi di atti di gara

Si rappresenta che per tutti gli interventi è stata condotta una verifica particolarmente approfondita della fase progettuale. In tal senso si è considerata la documentazione progettuale inizialmente prodotta dagli enti avvalsi quale proposta preliminare, da cui si è partiti per poi procedere con la redazione dei Progetti Definitivi prima e poi dei relativi Progetti Esecutivi.

Ciò ha permesso di poter filtrare i contenuti dei progetti proposti ed indirizzare questi ultimi verso gli obiettivi preposti di qualità e finalità degli interventi, ovvero al fine di ottenere progetti che proponessero opere rivolte alla rimozione del rischio idrogeologico ed al contempo depurati da eventuali lavorazioni non attinenti, fatte salve quelle funzionali all'efficienza delle opere.

Le attività istruttorie svolte sui progetti si sono basate pertanto su un doppio filtro istruttorio, esercitato in tal senso da una parte dagli uffici regionali, sulla base di quanto disposto dalle Ordinanze n. 001/2012 del 18 maggio 2012 e poi n. 014/2012 del 10 dicembre 2012, e dall'altra dalla struttura tecnica di diretta collaborazione con il Commissario.

Pertanto, per tutti i 33 interventi che è stato possibile avviare, ovvero gli interventi dotati di copertura finanziaria derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621 e dalle somme stanziare dalla Delibera CIPE n. 6/2012, è stata al 31/12/2013 interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emesse le autorizzazioni ad indire le relative gare d'appalto.

A seguire, si riportano gli estremi di tutti gli atti prodotti dal Commissario alla data del 31/12/2013, elencati per ordine cronologico di emissione:

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
	n.	Data	n.	Data			
Ordinanza	1/2012	18/05/12	40	18/05/12	---	---	Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche
Decreto	1/2012	18/05/12	41	18/05/12	---	---	Approv. Linee guida e Convenzione tipo
Ordinanza	2/2012	12/06/12	53	12/06/12	AN002A/10	Genga (AN)	Avvalimento Comune di Genga (AN)
Ordinanza	3/2012	12/06/12	54	12/06/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno
Ordinanza	4/2012	12/06/12	55	12/06/12	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino
Ordinanza	5/2012	12/06/12	56	12/06/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Avvalimento Comune Piobbico (PU) + Prov. PU
Ordinanza	6/2012	12/06/12	57	12/06/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	7/2012	12/06/12	58	12/06/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Avvalimento C. M. Alto e Medio Metauro + Comune
Convenzione		18/06/12			AN002A/10	Genga (AN)	Commissario, Regione, Comune di Genga (AN)



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
	n.	Data	n.	Data			
Convenzione		19/06/12			AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno
Convenzione		19/06/12			PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Commissario, Regione, Provincia Pesaro Urbino
Convenzione		19/06/12			PU049A/10	Piobbico (PU)	Commissario, Regione, Comune Piobbico (PU), Prov. PU
Convenzione		19/06/12			FM024A/10	Lapedona (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo
Convenzione		19/06/12			PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Commissario, Regione, C. M. Alto e Medio Metauro + Comune
Decreto	2/2012	29/06/12	73	29/06/12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP
Decreto	3/2012	09/07/12	79	09/07/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approv. Prog. Definitivo con prescr. e nomina RUP
Decreto	4/2012	16/07/12	91	16/07/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP
Ordinanza	8/2012	23/07/12	97	23/07/12	MC031A/10	Vari	Avvalimento Provincia Macerata
Decreto	5/2012	27/07/12	98	27/07/12	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP
Decreto	6/2012	30/07/12	99	30/07/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP
Decreto	7/2012	31/07/12	100	31/07/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP
Convenzione		31/07/12			MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP
Convenzione		31/07/12			MC031A-2/10	MC, Corridonia	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP
Convenzione		31/07/12			MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP
Decreto	8/2012	06/08/12	113	06/08/12	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	9/2012	06/08/12	114	06/08/12	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	10/2012	06/08/12	115	06/08/12	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Progetto Definitivo
Ordinanza	9/2012	27/09/12	133	27/09/12	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno
Ordinanza	10/2012	27/09/12	134	27/09/12	FM021A/10	Campofilone (FM)	Avvalimento C. B. Aso-Tenna-Tronto
Ordinanza	11/2012	27/09/12	135	27/09/12	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Decreto	11/2012	28/09/12	137	28/09/12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	12/2012	14/11/12	155	14/11/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Perizia giustificativa, verbale somma urg.
Decreto	13/2012	14/11/12	156	14/11/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	14/2012	16/11/12	170	16/11/12	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	15/2012	16/11/12	171	16/11/12	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	16/2012	16/11/12	172	16/11/12	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Ordinanza	12/2012	29/11/12	186	29/11/12	FM027A/10	Montefortino (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	13/2012	29/11/12	187	29/11/12	AP015A/10	Force (AP)	Avvalimento Comune di Force (AP)
Decreto	17/2012	30/11/12	189	30/11/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Convenzione		04/12/12			AP019A/10	Spinetoli (AP)	Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno, nom. RUP
Convenzione		04/12/12			FM021A/10	Campofilone (FM)	Commissario, Regione, C. B. Aso-Tenna-Tronto, nom. RUP
Convenzione		04/12/12			FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Convenzione		04/12/12			FM027A/10	Montefortino (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Decreto	18/2012	07/12/12	193	07/12/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Ordinanza	14/2012	10/12/12	198	10/12/12	---	---	Agg. Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche
Decreto	19/2012	18/12/12	237	18/12/12	FM021A/10	Campofilone (FM)	Autorizzazione affidamento integrazione geologico-geotecnica
Ordinanza	15/2012	20/12/12	249	20/12/12	MC032A/10	Cingoli (MC)	Avvalimento Comune di Cingoli (MC)
Ordinanza	16/2012	20/12/12	250	20/12/12	PU047A/10	Pesaro (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino
Ordinanza	17/2012	20/12/12	253	20/12/12	PU048A/10	Pesaro (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino
Ordinanza	18/2012	20/12/12	254	20/12/12	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Avvalimento Comune S. Ippolito (PU) + Prov. PU
Ordinanza	19/2012	20/12/12	255	20/12/12	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Avvalimento Comune di Civitanova Marche (MC)



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
	n.	Data	n.	Data			
Convenzione		20/12/12			AP015A/10	Force (AP)	Commissario, Regione, Comune Force (AP) e nomina RUP
Convenzione		20/12/12			MC032A/10	Cingoli (MC)	Commissario, Regione, Comune Cingoli (MC) e nomina RUP
Convenzione		20/12/12			PU047A/10	Pesaro (PU)	Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP
Convenzione		20/12/12			PU048A/10	Pesaro (PU)	Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP
Convenzione		20/12/12			PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Commissario, Regione, Comune S. Ippolito (PU), Prov. PU e nomina RUP
Convenzione		20/12/12			MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Commissario, Regione, Comune Civitanova M. (MC) e nomina RUP
Ordinanza	20/2012	21/12/12	257	21/12/12	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno
Ordinanza	21/2012	21/12/12	258	21/12/12	AP018A/10	Ascoli Piceno	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno
Ordinanza	22/2012	21/12/12	259	21/12/12	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	23/2012	21/12/12	260	21/12/12	FM020A/10	Altidona (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	24/2012	21/12/12	262	21/12/12	FM022A/10	Fermo (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	25/2012	21/12/12	263	21/12/12	FM025A/10	Monsampietro M.	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	26/2012	21/12/12	264	21/12/12	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Avvalimento Comune di Macerata Feltria (PU)
Ordinanza	27/2012	21/12/12	266	21/12/12	AN004A/10	Sirolo (AN)	Avvalimento Comune di Sirolo (AN)
Ordinanza	28/2012	21/12/12	268	21/12/12	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Avvalimento Comune di Montefalcone App.no (FM)
Ordinanza	29/2012	21/12/12	269	21/12/12	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Avvalimento Comune di San Benedetto del tronto (AP)
Ordinanza	30/2012	21/12/12	270	21/12/12	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Avvalimento Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)
Ordinanza	31/2012	21/12/12	271	21/12/12	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Avvalimento Comune di Montelabbate (PU)
Ordinanza	32/2012	21/12/12	272	21/12/12	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Avvalimento Comune di Sassocorvaro (PU)
Ordinanza	33/2012	21/12/12	273	21/12/12	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Avvalimento Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche
Convenzione		21/12/12			AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			AP018A/10	Ascoli Piceno	Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			FM020A/10	Altidona (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			FM022A/10	Fermo (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			FM025A/10	Monsampietro M.	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Commissario, Regione, Comune Macerata Feltria (PU) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			AN004A/10	Sirolo (AN)	Commissario, Regione, Comune Sirolo (AN) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Commissario, Regione, Comune Montefalcone App.no (FM) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Commissario, Regione, Comune San Benedetto del tronto (AP) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Commissario, Regione, Comune Castelsantangelo sul Nera (MC) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			PU045A/10	Montelabbate (PU)	Commissario, Regione, Comune Montelabbate (PU) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Commissario, Regione, Comune Sassocorvaro (PU) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Commissario, Regione, Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche e nomina RUP
Decreto	01/2013	28/01/13	16	28/01/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	02/2013	07/03/13	46	07/03/13	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
	n.	Data	n.	Data			
Decreto	03/2013	12/03/13	49	12/03/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	04/2013	26/03/13	62	26/03/13	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	05/2013	27/03/13	65	27/03/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	06/2013	27/03/13	66	27/03/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	07/2013	16/05/13	109	16/05/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	08/2013	16/05/13	110	16/05/13	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	09/2013	16/05/13	111	16/05/13	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	10/2013	05/06/13	147	05/06/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	11/2013	10/06/13	149	10/06/13	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	12/2013	10/06/13	150	10/06/13	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	13/2013	14/06/13	170	14/06/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	14/2013	14/06/13	171	14/06/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	15/2013	14/06/13	173	14/06/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	16/2013	14/06/13	174	14/06/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	17/2013	17/06/13	177	17/06/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	18/2013	17/06/13	178	17/06/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	19/2013	20/06/13	179	20/06/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	20/2013	20/06/13	180	20/06/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	21/2013	26/06/13	194	26/06/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	22/2013	26/06/13	195	26/06/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	23/2013	26/06/13	196	26/06/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	24/2013	26/06/13	197	26/06/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	25/2013	28/06/13	204	28/06/13	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	26/2013	28/06/13	205	28/06/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	27/2013	28/06/13	206	28/06/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	28/2013	28/06/13	207	28/06/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	29/2013	04/07/13	211	04/07/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	30/2013	05/07/13	212	05/07/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	31/2013	05/07/13	213	05/07/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	32/2013	10/07/13	230	10/07/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	33/2013	10/07/13	231	10/07/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	34/2013	10/07/13	232	10/07/13	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	35/2013	10/07/13	233	10/07/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	36/2013	15/07/13	234	15/07/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	37/2013	29/07/13	257	29/07/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	38/2013	30/07/13	258	30/07/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	39/2013	30/07/13	259	30/07/13	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	40/2013	30/07/13	260	30/07/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	41/2013	01/08/13	261	01/08/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	42/2013	06/08/13	272	06/08/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	43/2013	09/08/13	279	09/08/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
	n.	Data	n.	Data			
Decreto	44/2013	09/09/13	285	09/09/13	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	45/2013	16/09/13	291	16/09/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	46/2013	25/09/13	301	25/09/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	47/2013	25/09/13	305	25/09/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	48/2013	27/09/13	307	27/09/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Perizia di variante n. 1
Decreto	49/2013	09/10/13	317	09/10/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	50/2013	11/10/13	322	11/10/13	AP015A/10	Force (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	51/2013	16/10/13	328	16/10/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	52/2013	16/10/13	331	16/10/13	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	53/2013	16/10/13	332	16/10/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	54/2013	18/10/13	336	18/10/13	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	55/2013	18/10/13	337	18/10/13	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	56/2013	18/10/13	338	18/10/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara
Decreto	57/2013	22/10/13	339	22/10/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	58/2013	29/10/13	358	29/10/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	59/2013	29/10/13	359	29/10/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	60/2013	04/11/13	360	04/11/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Quadro Economico rimodulato
Decreto	61/2013	08/11/13	371	08/11/13	FM021A/10	Campofilone (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	62/2013	12/11/13	372	12/11/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	63/2013	15/11/13	383	15/11/13	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	64/2013	15/11/13	388	15/11/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	65/2013	15/11/13	389	15/11/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	66/2013	15/11/13	390	15/11/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo
Decreto	67/2013	20/11/13	391	20/11/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Presenza d'atto studio e Liquidazione spese per incarichi tecnici
Decreto	68/2013	21/11/13	395	21/11/13	AP015A/10	Force (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	69/2013	22/11/13	396	22/11/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	70/2013	22/11/13	403	22/11/13	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara
Decreto	71/2013	26/11/13	408	26/11/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	72/2013	26/11/13	409	26/11/13	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	73/2013	02/12/13	424	02/12/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	74/2013	02/12/13	425	02/12/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	75/2013	02/12/13	426	02/12/13	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	76/2013	02/12/13	427	02/12/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	77/2013	05/12/13	443	05/12/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	78/2013	05/12/13	444	05/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	79/2013	05/12/13	446	05/12/13	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	80/2013	05/12/13	447	05/12/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	81/2013	06/12/13	459	06/12/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
	n.	Data	n.	Data			
Decreto	82/2013	06/12/13	460	06/12/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	83/2013	12/12/13	475	12/12/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo
Decreto	84/2013	12/12/13	476	12/12/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	85/2013	12/12/13	477	12/12/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	86/2013	13/12/13	478	13/12/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo
Decreto	87/2013	13/12/13	487	13/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Autorizzazione incarico supporto al RUP
Decreto	88/2013	13/12/13	488	13/12/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo e procedure di gara
Decreto	89/2013	13/12/13	489	13/12/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006
Decreto	90/2013	13/12/13	490	13/12/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006
Decreto	91/2013	16/12/13	491	16/12/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006
Decreto	92/2013	18/12/13	499	18/12/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	93/2013	18/12/13	500	18/12/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	94/2013	18/12/13	501	18/12/13	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	95/2013	19/12/13	506	19/12/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione incarico pubblicazione bando di gara
Decreto	96/2013	19/12/13	507	19/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	97/2013	21/12/13	517	21/12/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	98/2013	21/12/13	518	21/12/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	99/2013	21/12/13	519	21/12/13	FM021A/10	Campofilone (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	100/2013	24/12/13	525	24/12/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	101/2013	31/12/13	536	31/12/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	102/2013	31/12/13	537	31/12/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	103/2013	31/12/13	538	31/12/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara





*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 5. ACCREDITAMENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE AL 31 DICEMBRE 2013

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 - elenco "A1" ed elenco "A2" dell'accordo di programma, ammontavano complessivamente ad €. 56.427.838,75 di cui:

- €. 35.900.000,00 con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;
- €. 20.527.838,75 quale cofinanziamento regionale, definito con risorse derivanti da varie fonti di natura regionale;

In merito al finanziamento statale (fondi MATTM, di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191), al 31 dicembre 2013 risulta accreditato solo l'importo pari ad a € 5.130.626,62.

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 è intervenuta a copertura di quota parte del finanziamento statale rimasto scoperto, ed ovvero per una quota complessiva pari ad Euro 13.579.373,38 al momento solo parzialmente erogata.

I primi accreditamenti da parte del MATTM sono intervenuti a partire da fine giugno del 2011, e sono avvenuti come segue:

- -1° accreditamento : di €. 569.023,88 in data 23.06.2011
- -2° accreditamento : di €. 2.544.521,71 in data 15.12.2011
- -3° accreditamento : di €. 1.046.153,85 in data 25.09.2012 (CIPE)
- -4° accreditamento : di €. 2.017.081,03 in data 18.10.2012
- -5° accreditamento : di €. 34.077,00 in data 07.10.2013 (CIPE)
- -6° accreditamento : di €. 142.938,99 in data 07.10.2013 (CIPE)
- -7° accreditamento : di €. 1.496.831,15 in data 07.10.2013 (CIPE)
- -8° accreditamento : di €. 3.400.000,00 in data 05.11.2013 (CIPE)
- -9° accreditamento : di €. 2.356.418,08 in data 05.11.2013 (CIPE)

per un totale di € 13.607.045,69 di cui € 5.130.626,62 quale quota parte del finanziamento programmato a carico del MATTM ed € 8.476.419,07 derivante dalla delibera CIPE n. 6/2012.

La Regione Marche non ha ancora effettuato alcun accreditamento.

A seguire, si riporta in tabella un riepilogo delle somme accreditate al 31 dicembre 2013:

N.	Data	MATTM	MATTM Su fondi Del. CIPE n. 6/2012	Regione Marche	Importo
1	23/06/2011	€ 569.023,88			€ 569.023,88
2	15/12/2011	€ 2.544.521,71			€ 2.544.521,71
3	25/09/2012		€ 1.046.153,85		€ 1.046.153,85
4	18/10/2012	€ 2.017.081,03			€ 2.017.081,03
5	07/10/2013		€ 34.077,00		€ 34.077,00
6	07/10/2013		€ 142.938,99		€ 142.938,99
7	07/10/2013		€ 1.496.831,15		€ 1.496.831,15
8	05/11/2013		€ 3.400.000,00		€ 3.400.000,00
9	05/11/2013		€ 2.356.418,08		€ 2.356.418,08
		<b>€ 5.130.626,62</b>	<b>€ 8.476.419,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 13.607.045,69</b>



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

In merito ai fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, tenuto conto di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822, inerente la presa d'atto degli interventi del 26 ottobre 2012, si osserva che risultano stanziati a favore dell'Accordo di Programma MATTM - Regione Marche complessivi Euro 13.579.373,38.

Attualmente risulta accreditato in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale quota parte di tale somma, l'importo complessivo di Euro 8.476.419,07, pari al 62,42 % di quanto stanziato con la delibera n. 6/2012.

Rimane da accreditare il valore residuo dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, pari a Euro 5.102.954,31.

Resta altresì da definire, da parte dei soggetti sottoscrittori l'Accordo, modi e tempi di messa in disponibilità del Commissario della restante somma necessaria per dare attuazione alla parte restante del programma degli interventi di cui all'allegato 1, tab. A1, dell'Accordo di Programma del 25 novembre, ed ovvero:

– Euro 17.190.000,00

*(stante gli attuali impegni assunti con l'Accordo di Programma del 25 novembre)*


– Euro 13.600.000,00

*(laddove si pervenga alla stipula dell'Atto Integrativo che recepisce la riduzione del 10% richiesta dal MATTM con propria nota n. 6824/TRI/DI del 2.03.2011)*

Si evidenzia inoltre che la dinamica di erogazione dei fondi, molto lenta rispetto quanto inizialmente previsto, associata peraltro spesso ad una mancanza di informazioni sulla loro possibile tempistica, ha condizionato molto la fase di attuazione degli interventi, rallentandola sensibilmente.

Infatti il Commissario, gestore della contabilità speciale vincolata n. 5621, ha dovuto centellinare l'assunzione di impegni proprio per evitare di ritrovarsi, suo malgrado, in situazioni di mancanza di cassa a fronte di una eventuale insorgenza di impegni economici da onorare.

In tal senso, a seguire si riporta in grafico il confronto tra l'entità delle somme progressivamente accreditate sulla contabilità speciale vincolata n. 5621 ed il relativo andamento degli importi impegnati dal Commissario per l'attuazione degli interventi (quest'ultimo dato è riferito all'importo, progressivamente sommato, dei quadri economici dei progetti esecutivi approvati, su cui sono state autorizzate le conseguenti procedure di gara).

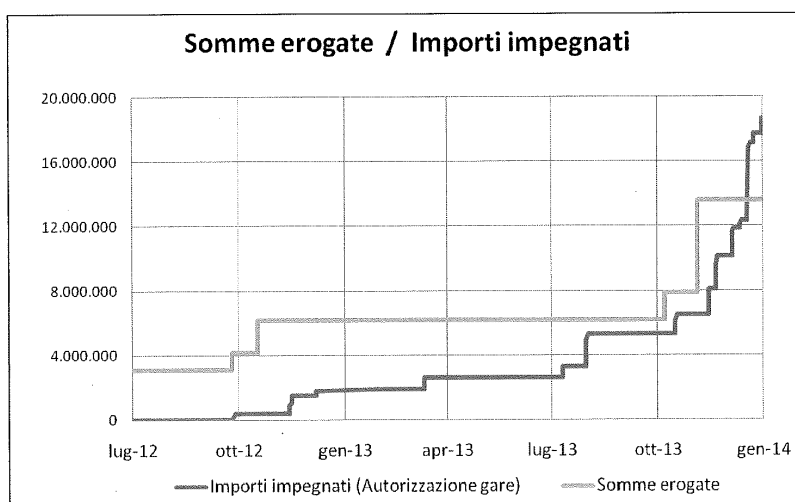



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 6. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL 31 DICEMBRE 2013

### 6.1. INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI

Come descritto nel precedentemente paragrafo 3.2, considerando le priorità espresse con comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, in conseguenza della citata riunione del 30/01/2012, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili e/o impegnate (Euro 5.130.626,62).

Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi (che diventano poi 14 in conseguenza della scomposizione in tre distinti interventi dell'intervento MC031A/10), in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (ovvero comprensivi di Euro 369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, quest'ultime relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012).

Al 31 dicembre 2013 lo stato di avanzamento di tali n. 14 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 6 Ultimati
- N. 3 In corso di esecuzione
- N. 2 Contratto già stipulato
- N. 1 Lavori aggiudicati
- N. 1 In corso le procedure di gara
- N. 1 Progetto esecutivo approvato e gara autorizzata

A seguire si descrive in dettaglio lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, valutato alla data del 31 dicembre 2013:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Bando di gara / Lettere invito	Aggiudicaz. Provv.	Aggiudicaz. Definitiva	Contratto	Consegna lavori	Ultimazione lavori
AN002A/10	AN	Genga	400.000	29/06/2012	28/09/2012	20/12/2012	09/05/2013	11/07/2013	26/07/2013	16/10/2013	09/11/2013
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	300.000	30/07/2012					Somma urgenza	22/10/2012	18/06/2013
AP015A/10	MC	Force	1.500.000	11/10/2013	21/11/2013	30/11/2013					
AP019A/10	AP	Spinetoli	400.000	10/06/2013	10/07/2013	18/09/2013	04/10/2013	19/11/2013			
FM021A/10	FM	Campofilone	300.000	08/11/2013	21/12/2013						
FM024A/10	FM	Lapedona	700.000	30/11/2012	12/03/2013	09/04/2013	07/05/2013	19/06/2013	10/09/2013	04/11/2013	
FM027A/10	FM	Montefortino	400.000	28/06/2013	01/08/2013	16/09/2013	30/09/2013	07/11/2013	20/12/2013		
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	300.000	14/06/2013	10/07/2013	31/07/2013	26/08/2013	02/10/2013	15/11/2013		
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	169.000	06/08/2012	16/11/2012	06/12/2012	19/12/2012	28/01/2013	28/03/2013	10/07/2013	4/10/2013
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	200.000	06/08/2012	16/11/2012	06/12/2012	19/12/2012	28/01/2013	28/03/2013	22/07/2013	
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	231.000	06/08/2012	16/11/2012	06/12/2012	19/12/2012	28/01/2013	28/03/2013	22/07/2013	
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	100.000	27/07/2012	28/01/2013	07/05/2013	10/06/2013	01/08/2013	07/10/2013	09/09/2013	09/10/2013
PU040A/10	PU	Borgo Pace	300.000	31/07/2012	07/12/2012	19/12/2012	11/02/2013	08/03/2013	21/05/2013	10/07/2013	07/10/2013
PU049A/10	PU	Piobbico	200.000	09/07/2012	14/11/2012	13/04/2013	30/04/2013	08/06/2013	20/06/2013	03/07/2013	30/09/2013



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

#### **6.2. INTERVENTI ATTIVATI SUI FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012**

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.

Al 31 dicembre 2013 lo stato di avanzamento di tali n. 19 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 2 Contratto già stipulato
- N. 10 Lavori aggiudicati
- N. 4 In corso le procedure di gara
- N. 3 Progetto esecutivo approvato e gara autorizzata

A seguire si descrive in dettaglio lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, valutato alla data del 31 dicembre 2013:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Bando di gara / Lettere invito	Aggiudicaz. Provv.	Aggiudicaz. Definitiva	Contratto	Consegna lavori	Ultimazione lavori
MC038A/10	MC	Porto Recanati	4.210.000	05/12/2013	19/12/2013	27/12/2013					
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	300.000	21/12/2013	31/12/2013						
PU048A/10	PU	Pesaro	800.000	26/03/2013	30/07/2013	08/10/2013	23/10/2013	18/11/2013	30/12/2013		
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	600.000	18/12/2013	24/12/2013	28/12/2013					
PU051A/10	PU	S. Ippolito	300.000	02/12/2013	18/12/2013	20/12/2013	30/12/2013				
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	800.000	26/11/2013	05/12/2013	13/12/2013	23/12/2013	30/12/2013			
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	300.000	18/10/2013	15/11/2013	29/11/2013	16/12/2013				
MC032A/10	MC	Cingoli	800.000	06/08/2013	16/10/2013	28/10/2013	19/11/2013	25/11/2013	30/12/2013		
FM020A/10	FM	Altidona	300.000	02/12/2013	12/12/2013	17/12/2013	30/12/2013	30/12/2013			
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	1.100.000	22/10/2013	15/11/2013	29/11/2013	19/12/2013				
PU047A/10	PU	Pesaro	800.000	14/06/2013	30/07/2013	04/11/2013	06/12/2013				
AN004A/10	AN	Sirolo	750.000	26/11/2013	05/12/2013	11/12/2013					
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	400.000	10/06/2013	18/10/2013	14/11/2013	02/12/2013	03/12/2013			

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Importo	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Bando di gara / Lettere invito	Aggiudicaz. Provv.	Aggiudicaz. Definitiva	Contratto	Consegna lavori	Ultimazione lavori
AP017A/10	AP	San Benedetto	500.000	12/11/2013	22/11/2013	26/11/2013	05/12/2013	<b>16/12/2013</b>			
FM022A/10	FM	Fermo	200.000	05/12/2013	13/12/2013	18/12/2013	30/12/2013	<b>30/12/2013</b>			
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	270.000	21/12/2013	<b>31/12/2013</b>						
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	200.000	16/10/2013	15/11/2013	28/11/2013	10/12/2013	<b>30/12/2013</b>			
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	180.000	29/10/2013	06/12/2013	<b>11/12/2013</b>					
PU045A/10	PU	Montelabbate	400.000	18/12/2013	<b>31/12/2013</b>						



### *Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

#### 6.3. SINTESI COMPLESSIVA SUGLI INTERVENTI ATTIVATI

Alla data del 31 dicembre 2013 risultano pertanto complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, e dalle somme stanziare dalla Delibera CIPE n. 6/2012.

Per tali n. 33 interventi, alla data del 31/12/2013 risulta interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Di questi interventi inoltre, alcuni sono in stato di aggiudicazione, in corso di esecuzione e, in n. 6 casi, già ultimati e collaudati.

Al 31 dicembre 2013 lo stato di avanzamento di tali n. 33 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 6 Ultimati
- N. 3 In corso di esecuzione
- N. 4 Contratti già stipulati
- N. 11 Lavori aggiudicati
- N. 5 In corso le procedure di gara
- N. 4 Progetto esecutivo approvato e gara autorizzata

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2013.

Per ognuno di tali interventi si rappresentano altresì anche le modalità di espletamento delle attività tecnico amministrative di cui agli incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006, ovvero se le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo sono interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazioni stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità (Int.), ovvero se l'ente avvalso risulta autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento di tali attività (Ext).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso		Stato avanzamento
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000	Comune di Genga	INT	Ultimati
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	Ultimati
AP015A/10	MC	Force	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	Comune di Force (AP)	EXT	In Gara
AP019A/10	AP	Spinetoli	Fiume Tronto	Riparazione argine	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	Lavori Aggiudicati
FM021A/10	FM	Campofilone	Ponte Nina – Rio Canale	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM)	INT	Prog. Ultimata Gara Autorizzata
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol. - Via Circonvallazione	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	Provincia di Fermo	INT	Contratto
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	Provincia di Fermo	INT	Contratto
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza	169.000	Provincia di Macerata	INT	Ultimati



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso		Stato avanzamento
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	Fiume Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio	200.000	Provincia di Macerata	INT	In Esecuzione
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto	231.000	Provincia di Macerata	INT	In Esecuzione
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	Provincia di Pesaro e Urbino	INT	Ultimati
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	INT	Ultimati
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riquilif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	INT	Ultimati
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	INT	In Gara
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di CastelSang. Nera	EXT	Prog. Ultimata Gara Autorizzata
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	INT	Contratto
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	EXT	In Gara
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	INT	Lavori Aggiudicati
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	800.000	Provincia di Fermo	INT	Lavori Aggiudicati
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	Lavori Aggiudicati
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	INT	Contratto
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	INT	Lavori Aggiudicati
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	Lavori Aggiudicati
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	INT	Lavori Aggiudicati
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	EXT	In Gara
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	INT	Lavori Aggiudicati
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto	EXT	Lavori Aggiudicati
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	INT	Lavori Aggiudicati
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	EXT	Prog. Ultimata Gara Autorizzata



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche


Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso		Stato avanzamento
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S. Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	INT	Lavori Aggiudicati
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	EXT	In Gara
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	EXT	Prog. Ultimata Gara Autorizzata


Per la maggior parte di questi interventi, le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazioni stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Di seguito si rappresenta in forma grafica l'incidenza sul totale riferita all'espletamento di tali attività tecnico amministrative nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006.

Per numero di interventi:

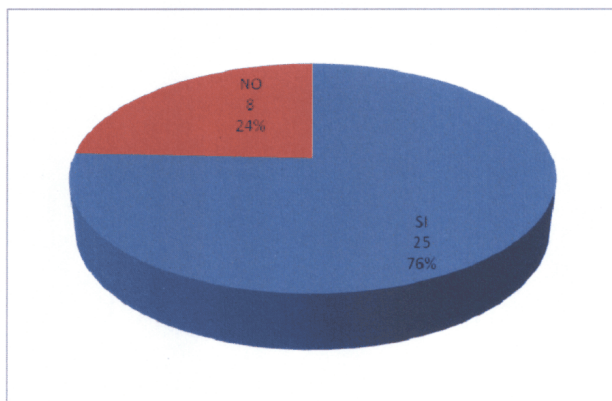

Per entità del finanziamento :

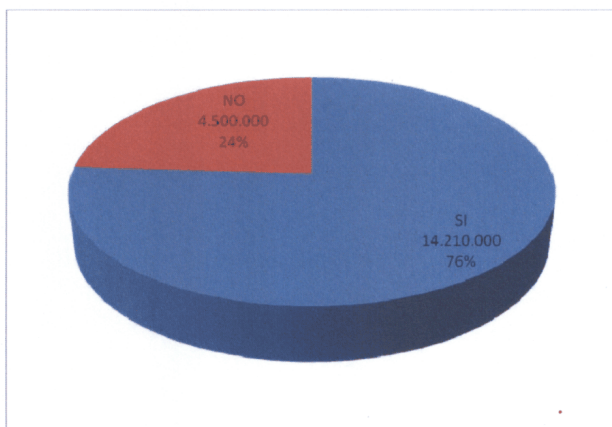




*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Parimenti, di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, valutato alla data del 31/12/2013 e con riferimento alle tipologie indicate in tabella:

Per numero di interventi:

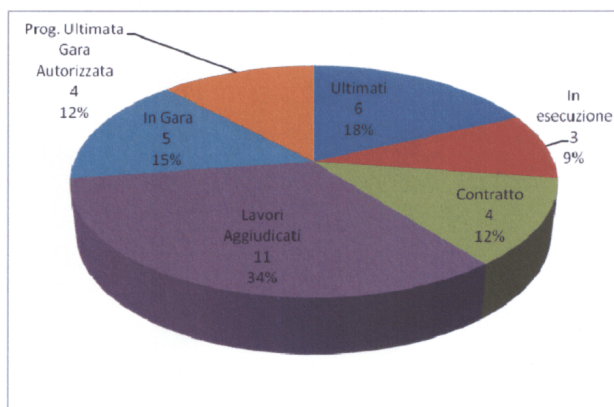

Per entità del finanziamento :

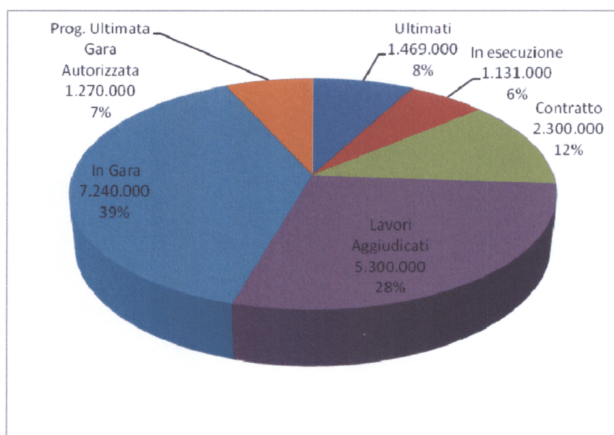



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

#### 6.4. SITUAZIONE FINANZIARIA - IMPORTI EROGATI ED IMPORTI IMPEGNATI

Alla data del 31 dicembre 2013 risultano complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, e dalle somme stanziare dalla Delibera CIPE n. 6/2012.

Per tali n. 33 interventi, alla data del 31/12/2013 risulta interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Ciò equivale a dire che per tutti questi interventi risultano integralmente impegnate le somme derivanti dai rispettivi quadri economici dei progetti su cui si stanno eseguendo, o sono già state eseguite, le rispettive gare di appalto.

Ragion per cui risulta complessivamente impegnato un importo totale pari ad Euro 18.710.000,00.

Parimenti, le somme accreditate al 31 dicembre 2013 sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, sono le seguenti:

- Euro 5.130.626,62      quale accredito diretto da parte del MATTM
- Euro 8.476.419,07      quale quota parte delle somme stanziare dalla Delibera CIPE n. 6/2012

Per un totale complessivo pari ad Euro 13.607.045,69.

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2013, a fronte di un accredito complessivo in contabilità speciale vincolata n. 5621 pari ad Euro 13.607.045,69 corrisponde un impegno di spesa pari ad Euro 18.710.000,00, ovvero con un disavanzo negativo pari ad Euro 5.102.954,31.

A seguire si descrive lo stato degli importi erogati ed impegnati per ognuno dei 33 interventi al momento attivati:

Codice	Prov.	Comune	Ente avvalso	Importo erogato fondi MATTM	Importo erogato fondi Del. CIPE 6/2012	Importo Impegnato su fondi MATTM	Importo Impegnato su fondi Del. CIPE 6/2012	Disavanzo
AN002A/10	AN	Genga	Comune di Genga	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Provincia di Ascoli Piceno	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
AP015A/10	MC	Force	Comune di Force (AP)	1.130.626,62	369.373,38	1.130.626,62	369.373,38	0,00
AP019A/10	AP	Spinetoli	Provincia di Ascoli Piceno	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FM021A/10	FM	Campofilone	Consorzio di Bonifica Asotenna-Tronto (FM)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
FM024A/10	FM	Lapedona	Provincia di Fermo	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
FM027A/10	FM	Montefortino	Provincia di Fermo	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Provincia di Fermo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Provincia di Macerata	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	Provincia di Macerata	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Provincia di Macerata	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Provincia di Pesaro e Urbino	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PU040A/10	PU	Borgo Pace	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PU049A/10	PU	Piobbico	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	0,00	2.583.698,89	0,00	4.210.000,00	-1.626.301,11



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Ente avvalso	Importo erogato fondi MATTM	Importo erogato fondi Del. CIPE 6/2012	Importo impegnato su fondi MATTM	Importo impegnato su fondi Del. CIPE 6/2012	Disavanzo
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	Comune di CastelSang. Nera	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
PU048A/10	PU	Pesaro	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	Comune di Montefalcone App.no	0,00	368.223,12	0,00	600.000,00	-231.776,88
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Provincia di Fermo	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Provincia di Ascoli Piceno	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
MC032A/10	MC	Cingoli	Comune di Cingoli	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
FM020A/10	FM	Altidona	Provincia di Fermo	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	Provincia di Ascoli Piceno	0,00	675.075,72	0,00	1.100.000,00	-424.924,28
PU047A/10	PU	Pesaro	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
AN004A/10	AN	Sirolo	Comune di Sirolo	0,00	460.278,90	0,00	750.000,00	-289.721,10
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Comune di Civitanova Marche	0,00	245.482,08	0,00	400.000,00	-154.517,92
AP017A/10	AP	San Benedetto	Comune di San Benedetto	0,00	306.852,60	0,00	500.000,00	-193.147,40
FM022A/10	FM	Fermo	Provincia di Fermo	0,00	122.741,04	0,00	200.000,00	-77.258,96
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Comune di Sassocorvaro	0,00	165.700,40	0,00	270.000,00	-104.299,60
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	Provincia di Fermo	0,00	122.741,04	0,00	200.000,00	-77.258,96
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Comune di Macerata Feltria	0,00	110.466,94	0,00	180.000,00	-69.533,06
PU045A/10	PU	Montelabbate	Comune di Montelabbate	0,00	245.482,08	0,00	400.000,00	-154.517,92

**Importo erogato :** 5.130.626,62 8.476.419,07

**Totale importo erogato** 13.607.045,69

**Importo impegnato :** 5.130.626,62 13.579.373,38

**Totale importo impegnato** 18.710.000,00

**Disavanzo :** -5.102.954,31

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti.

Effettuata la aggiudicazione degli appalti la spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve, prevedibile per la maggior parte di tali interventi anche in meno di sei mesi e quindi l'obbligo a "pagare" si concentra in un arco di tempo ridotto, non in "anni".

Al rischio di determinare condizioni di "debito" per l'Amministrazione, se non venisse garantito il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, con la necessaria tempestiva copertura con l'accREDITAMENTO preventivo delle somme si aggiungerebbe il danno, per l'economia reale del territorio, dato dall'accrescersi del "costo" delle opere per gli appaltatori in conseguenza dei ritardi nei pagamenti.

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che potrebbe però assumere caratteri "concreti" qualora si verificassero ritardi nella erogazione delle restanti somme rispetto quanto previsto dalla Del CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

**7. ADEMPIMENTI SUGLI O.G.V. DI CUI ALLA PRESA D'ATTO DEL 26 OTTOBRE 2012**

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dalla conseguente presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012 si rileva e/o si prende atto sostanzialmente, tra le altre, di quanto segue:

- gli interventi che trovano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 sono i primi 14 e parzialmente il 15° (intervento cod. AP015A/10 in comune di Force -AP) per un importo complessivo di €. 5.130.626,62 tutti accreditati;
- quota parte dei restanti interventi, già programmati con copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovano ora copertura sui fondi di cui all'art. 33, c. 3, Legge 183/2011 per € 13.579.373,38 parzialmente accreditati;
- detti fondi, come riportato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica del 27 novembre 2012 n. 4822, saranno accreditati alla Contabilità speciale intestata al Commissario con le modalità e secondo il criterio dello stato di avanzamento degli interventi, in analogia con quanto previsto al punto 7.3 della Delibera n. 8/2012;
- l'intero programma costruttivo, di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 ed alla conseguente presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012, dovrà definire obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013, pena la revoca dei finanziamenti!

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, laddove chiarisce che: "...non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento...", ha consentito pur in attesa del completo trasferimento delle risorse, l'approvazione dei relativi progetti anche oltre le somme effettivamente accreditate.

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti e che le normative europee sanciscono a carico delle Amministrazioni.

Ciò premesso, preso atto di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti, il Commissario ha posto in essere le attività connesse alla attuazione degli interventi di cui alla presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avalimento e delle conseguenti Convenzioni di avalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.



### Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Per tali n. 20 interventi (considerato anche l'intervento in cod. AP015A/10 in comune di Force ), alla data del 31/12/2013 risulta interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Di questi interventi inoltre, alcuni sono in fase di gara, alcuni risultano già aggiudicati e, in n. 2 casi, risulta stipulato il contratto di appalto.

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, considerando anche l'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force, valutato alla data del 31/12/2013.

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
AP015A/10	MC	Force	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	369.373,38 (1.500.000)	Comune di Force (AP)	In Gara
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	In Gara
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di CastelSang. Nera	Prog. Ultimata Gara Autorizzata
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Contratto
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	In Gara
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	Lavori Aggiudicati
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Lavori Aggiudicati
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	Contratto
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	Lavori Aggiudicati
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Lavori Aggiudicati
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	In Gara
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	Lavori Aggiudicati
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto	Lavori Aggiudicati
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	Prog. Ultimata Gara Autorizzata
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati



*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*


Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011


Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	In Gara
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	Prog. Ultimata Gara Autorizzata

Di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, valutato alla data del 31/12/2013 e con riferimento alle tipologie indicate in tabella:

Per numero di interventi:

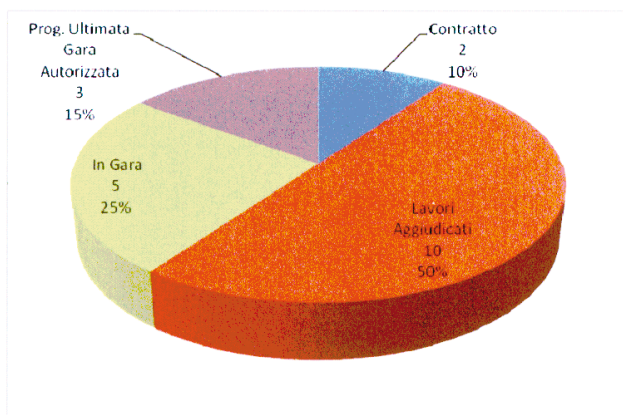

Per entità del finanziamento :

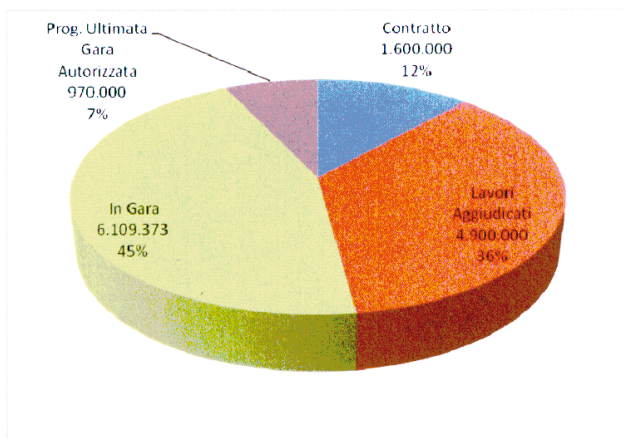

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

**8. CRITICITA'**

Si ritiene opportuno segnalare che buona parte della attività sino ad ora svolta potrebbe essere condizionata o compromessa dal mancato accreditamento tempestivo delle rimanenti risorse previste dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Parimenti, va segnalato che non risultano ancora avviati tutti gli interventi indicati nella citata nota della Regione Marche 854/2012 quali privi di copertura finanziaria, ed ovvero :

- n. 18 interventi per Complessivi Euro 13.600.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire per ulteriore fase del programma");
- n. 3 + (1) interventi per Complessivi Euro 3.590.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire per fase programmatica (10%)");

stante la perdurante mancanza di copertura finanziaria degli stessi, protratta fino al periodo in questione, associata ad una mancanza di comunicazioni, da parte dei soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di Programma, su possibili prospettive di finanziamento futuro.

Si rappresenta la necessità che i soggetti sottoscrittori l'Accordo giungano quanto prima alla stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010, come peraltro richiesto dal MATTM con propria nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011, nonché pre-concordato in linea di massima nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012.

In particolare, va osservato che la Regione Marche nel corso del citato Comitato, ha riferito in merito alla "possibilità di traslocare, in sede di stipula dell'Atto Integrativo, alcuni interventi ricadenti nella tabella 1 dell'allegato 1 all'Accordo (quota Stato)" su altre fonti di finanziamento o in quota programmatica, in conseguenza di una eventuale rivalutazione delle priorità.

Pertanto, il Commissario ha ritenuto opportuno attendere, prima di procedere con l'attivazione dei restanti interventi, la stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma ed il conseguente consolidamento del quadro degli interventi, proprio nell'intento di non creare difficoltà alla Regione Marche nel caso in cui, a seguito della rivalutazione delle priorità, fosse stato loro necessario modificare tale elenco di interventi.

Infatti, si sarebbe potuto procedere con la stipula delle relative Convenzioni, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, con la condizione che le stesse si sarebbero attivate in merito alla cronotempistica di attuazione ed impegni di spesa solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica dell'intervento. Ma ciò avrebbe poi vincolato la Regione Marche nell'ambito delle proprie valutazioni in sede di stesura dell'atto Integrativo.

Per le motivazioni sopra esposte, a partire dalla data del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 il Commissario, naturalmente nell'ambito del proprio ruolo e responsabilità, ha più volte sollecitato ai rappresentanti di Regione Marche la necessità di dare corso all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma.

Infine si osserva che l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, con il riconoscimento di urgenza e priorità per gli interventi in esso previsti, non consente alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle opere. I danni verificati nel recente passato nuovamente anche nelle Marche, dovrebbero far "diversamente" valutare i costi della prevenzione rispetto quelli, spesso ingenti, connessi al ristoro dei danni conseguenti proprio alla mancata prevenzione.

Con riferimento all'Accordo di Programma, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato, che potrebbe concretizzarsi qualora si verificasse ritardo nella messa a disposizione delle somme previste, oggi solo in parte accreditate alla contabilità speciale del Commissario, che dopo aver operato, con la approvazione dei progetti e l'affidamento dei relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, potrebbe correre il rischio di non poter onorare alcuni degli impegni assunti e soprattutto garantire la realizzazione delle relative opere.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
D.P.C.M. del 7/11/2011  
Accordo di Programma 02 maggio 2011

Prot. n. 236/CA del 06/02/2014

Indirizzi in allegato

*Il presente fax sostituisce  
l'originale ai sensi dell'art.  
43 C.6 DPR 445/2000*

**OGGETTO: Relazione annuale - anno 2013 ai sensi del D.P.C.M. del 7.11.2011.**

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. del 7.11.2011 di nomina a Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, si trasmette la relazione sull'attività svolta, con riferimento all'anno 2013.

**RISORSE FINANZIARIE**

Rispetto al complessivo valore di euro 27.000.000,00 assegnato dall' Accordo di Programma del 02 maggio 2011, così come modificato dall' Accordo integrativo del gennaio 2012, in termini economici, ad oggi solo il Ministero dell'Ambiente, in due diversi ratei (il primo il 19/09/2012 ed il secondo il 17/12/2012), ha versato sulla contabilità speciale la somma di euro 2.440.508,26, corrispondente al 100% dello stanziamento statale previsto nel citato accordo integrativo.

---

Ufficio del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico in Molise  
presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Via Cristoforo Colombo, 44 - (00147) ROMA  
tel. 06 57223801 fax 06 57225854 mail [commdelegato.molise@gmail.com](mailto:commdelegato.molise@gmail.com)



In relazione alla restante quota di cofinanziamento a carico della Regione Molise, la scrivente gestione in più occasioni ha provveduto a sollecitare la medesima Amministrazione Regionale al fine di aver certezza della disponibilità delle necessarie risorse per poter attivare gli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

A tal riguardo da ultimo con nota prot. n. 0036048 del 27/11/2013, la Regione Molise ha assicurato di disporre, a valere sul proprio bilancio regionale 2013, una quota parte di risorse finanziarie, pari ad euro 14.000.000,00.

La medesima Regione ha peraltro assicurato che tali risorse, che non è stato possibile trasferire nel corso dell'esercizio finanziario 2013 a causa dei vincoli derivanti dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, saranno trasferite nella contabilità speciale del Commissario, nell'esercizio finanziario 2014.

#### CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Sulla base delle risorse finanziarie accreditate sulla contabilità speciale, d'intesa con la Regione Molise, è stato predisposto il crono programma di attuazione per una prima fase di interventi prioritari (importo dell'intervento sotto la soglia dei 300.000,00 euro con priorità assegnata = 1, cfr. nota prot. n. 38/COM del 11/03/2013), ed è stato curato l'inserimento dei medesimi sul Sistema Informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (RENDIS).

Nel contesto della lista prioritaria di interventi e del cronoprogramma di attuazione dei medesimi, anche attraverso il supporto tecnico scientifico di INVITALIA s.p.a. appositamente convenzionata con la gestione Commissariale, acquisito il parere tecnico operativo di Invitalia Spa (con cui lo scrivente in data 31/07/2012 ha stipulato apposito atto convenzionale quale consulente tecnico nella valutazione dei progetti da ammettere a finanziamento), si è provveduto a sottoscrivere apposite **ordinanze per l'avvalimento**, la progettazione e la realizzazione degli interventi nelle seguenti amministrazioni comunali:

n. ordinanza	Amministrazione comunale	Codice intervento	Importo
52/COM	Torella del Sannio	CB050A/10	€ 150.000,00
53/COM	Pescopennataro	IS087B/10	€ 200.000,00
54/COM	Monteroduni	IS068A/10	€250.000,00

Ufficio del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico in Molise  
presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Via Cristoforo Colombo, 44 - (00147) ROMA  
tel. 06 57223801 fax 06 57225854 mail [commdelegato.molise@gmail.com](mailto:commdelegato.molise@gmail.com)



55/COM	Miranda	IS066A/10	€ 300.000,00
56/COM	Forlì del Sannio	IS064A/10	€ 300.000,00
57/COM	Castelbottaccio	CB079B/10	€ 400.000,00
75/COM	Bojano	CB003A/10	€ 250.000,00

In seguito, secondo quanto previsto dalle richiamate ordinanze, al fine di regolare i conseguenti rapporti di avalimento, si è provveduto a stipulare con le Amministrazioni comunali specifici **atti convenzionali**.

Ad oggi sono stati conseguentemente predisposti i **decreti di finanziamento e di impegno** delle risorse a valere sulle disponibilità nella contabilità speciale intestata alla scrivente gestione, in favore dei seguenti Comuni:

Decreto di Finanziamento	Comune Beneficiario
DEC 82/COM DEL 10/05/2013	TORELLA DEL SANNIO
DEC 83/COM DEL 10/05/2013	PESCOPENNATARO
DEC 86/COM DEL 10/05/2013	CASTELBOTTACCIO
DEC 100/COM DEL 03/06/2013	FORLI DEL SANNIO
DEC 110/COM DEL 27/06/2013	MIRANDA
DEC 112/COM DEL 18/07/2013	MONTERODUNI



DEC 118/COM DEL 22/07/2013	BOJANO
----------------------------	--------

A seguito della comunicazione delle determine di aggiudicazione definitiva dei lavori, da parte della Amministrazioni comunali e, a seguito di gare di appalto, la scrivente, dopo aver preliminarmente verificato la coerenza delle medesime con le finalità dell'intervento tramite il supporto di Invitalia S.p.a., ha provveduto alla liquidazione della competenza, così come individuata nei quadri economici dei singoli interventi, relativi alle spese tecniche connesse alle progettazioni.

Con particolare riferimento ai Comuni di Pescopennataro e Torella del Sannio, previa verifica tecnica effettuata da Invitalia S.p.a., si è inoltre provveduto ad erogare il pagamento corrispondente all' I ^ SAL.

Per quanto riguarda nuovi interventi, l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Lavori Pubblici con nota prot. n. 0020226/13 del 17/7/2013 ha comunicato che: *"considerato il lungo tempo trascorso dalla data di accertamento dei dissesti, da parte delle Strutture regionali competenti, tutti gli interventi sono da considerarsi urgenti"*.

In tale contesto, attesa la citata comunicazione della Regione Molise sulla disponibilità della quota parte di risorse finanziarie per un importo di euro 14.000.000,00, al fine di assicurare la necessaria accelerazione delle spese, lo scrivente, nel mese di dicembre 2013, ha provveduto a predisporre nuove apposite ordinanze per l'avvalimento, la progettazione e la realizzazione degli interventi nelle seguenti Amministrazioni comunali, per i quali è stata preliminarmente verificata tramite Invitalia S.p.a. l'esecutività e la cantierabilità, condizionandone l'efficacia all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie nell'anno 2014:

n. ordinanza	Amministrazione comunale	Codice intervento	Importo
168/COM	Sant'Angelo Limosano	CB045A/10	€ 300.000,00
169/COM	Roccavivara	CB038A/10	€ 200.000,00
170/COM	Montefalcone nel	CB028A/10	€250.000,00

Ufficio del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico in Molise  
 presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
 Via Cristoforo Colombo, 44 - (00147) ROMA  
 tel. 06 57223801 fax 06 57225854 mail [commdelegato.molise@gmail.com](mailto:commdelegato.molise@gmail.com)

	Sannio		
171/COM	Pizzone	IS072A/10	€ 250.000,00
172/COM	Oratino	CB032A/10	€ 200.000,00
173/COM	Campomarino	CB006A/10	€ 200.000,00
174/COM	Montenero di Bisaccia	CB029A/10	€ 300.000,00
175/COM	Ururi	CB054A/10	€ 250.000,00


Peraltro sia nelle ordinanze di avvalimento che nelle relative Convenzioni con gli Enti territoriali, in linea con le previsioni normative e delle interpretazioni del MEF e del MISE, si è provveduto ad inserire clausole di salvaguardia per la liquidazione delle somme a favore dei soggetti beneficiari ove le risorse promesse dalla Regione Molise non venissero per qualsivoglia motivazione trasferite alla contabilità speciale del Commissario delegato.

Tutte le attività hanno comportato la costante presenza sul territorio del Commissario che in accordo con le Istituzioni Regionali ha organizzato una serie di visite a Campobasso ed Isernia per la consegna degli atti Convenzionali e per formulare indirizzi e sollecitare, se del caso, i territori ad una maggiore ed intensiva azione di monitoraggio dei territori ed a presentare, ove non già fatto, i quadri economici ed altresì avviare i cantieri nel più breve tempo possibile e comunque entro il prossimo mese di maggio 2014 x concludere tutte le attività entro il prossimo 31 dicembre 2014.

L'auspicato e confermato trasferimento di risorse sulla contabilità speciale assicurerà nell'immediato un'accelerazione degli interventi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Aldo Cosentino



All'Ispettorato Generale del  
Ministero dell'Ambiente  
della Tutela del Territorio e del Mare  
c.a. Antonio Perrone  
e mail: [perrone.antonio@minambiente.it](mailto:perrone.antonio@minambiente.it)

Al Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Tutela del Territorio  
e delle Risorse Idriche  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
Fax. 06/57225194  
[tri-udg@minambiente.it](mailto:tri-udg@minambiente.it)

Al Comitato di indirizzo e controllo  
per la gestione dell'Accordo presso il  
Ministero dell'Ambiente  
della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale della Tutela del Territorio  
e delle Risorse Idriche  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
Fax. 06/57225194  
[tri-udg@minambiente.it](mailto:tri-udg@minambiente.it)

PAGINA BIANCA



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

## 4a Relazione trimestrale anno 2013 e sintesi complessiva del periodo Gennaio 2011 – Dicembre 2013

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 del Dicembre 2010

10/12/2013

Commissario Straordinario Delegato Dissesto Idrogeologico Puglia

Dott. Maurizio Croce

*MC*

PAGINA BIANCA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

## Sommario

- 1 PREMESSA
- 2 ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DELLA DELIBERA CIPE N. 8/2012
  - 2.1 CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E COMMISSARIO STRAORDINARIO
- 3 CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE
- 4 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI
- 5 SITUAZIONE FINANZIARIA
  - 5.1 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE
  - 5.2 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE
- 6 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'
  - 6.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
    - 6.1.1 Progettazione interventi ed attività di supporto tecnico da parte di Invitalia Attività Produttive S.p.A.
    - 6.1.2 Attività operative e di supporto del Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo
    - 6.1.3 Incontri e collaborazione/progettazione con i Comuni
    - 6.1.4 Nomine RUP
    - 6.1.5 Richieste di traslazione del finanziamento interventi
    - 6.1.6 Istruttorie e sopralluoghi
    - 6.1.7 Conferenze di Servizi
    - 6.1.8 Progettazioni e/o attività di supporto progettuale svolti direttamente dalla struttura commissariale
    - 6.1.9 Verifica UVER
    - 6.1.10 Attività di verifica e validazione progetti ex DPR 207/10
    - 6.1.11 Gare di appalto svolte/in corso
      - 6.1.11.1 Cantieri conclusi
- 7 LIVELLO DI ATTUAZIONE GLOBALE DEGLI INTERVENTI
- 8 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014
- 9 CRITICITA'
- 10 ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

## 1 PREMESSA

La presente relazione illustra le attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia (ex DPCM 10.12.2010) nel 4° trimestre 2013, fino alla chiusura dei termini di cui al DPCM del 10.12.2.13 (1° ottobre – 9 dicembre 2013) e, dal punto di vista finanziario, fino al 31/12/2013.

Si riporta anche, in ciascun paragrafo, una sintesi delle attività complessivamente svolte nel triennio di attività (11.12.2010 – 9.12.2013).

## 2 ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DELLA DELIBERA CIPE N. 8/2012

Di seguito si riporta la tabella anagrafica sintetica dell'Accordo di Programma del 25.11.2010 e della Delibera CIPE n. 8/2012

Regione	Puglia
Commissario Straordinario Delegato	Dott. Maurizio Croce
Data sottoscrizione Accordo di Programma	25 Novembre 2010
Importo complessivo assentito in Accordo	Euro 210.000.000,00
N° interventi previsti nell'Accordo di Programma	91
Decreto di nomina Commissario	D.P.C.M. 10.12.2010
Delibera CIPE	n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U.R.I Serie Speciale n. 121 del 25.05.2012
Importo complessivo finanziato dalla Delibera CIPE	Euro 194.690.000,00
N° interventi rimodulato dalla Delibera CIPE	84
Importo programmato per il periodo (2013)	€ 146.017.500,00
Importo speso per il periodo (2013)	€ 4.985.264,67
Importo accantonato con Obbligazione Giuridicamente Vincolante	a) 17.684.251,14 b) 99.410.000,00

**Nota.** Per gli importi giuridicamente vincolanti, il valore a) si riferisce alle gare con almeno aggiudicazione provvisoria al 9.12.2013 mentre ; il valore b) è la somma degli importi degli interventi relativi alle gare di appalto già bandite per i lavori (senza le indagini, per le quali sono state svolte altre 14 gare)

### 2.1 CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E COMMISSARIO STRAORDINARIO

In data 17.09.2013 è stata sottoscritta una Convenzione tra la Regione Puglia – Settore Risorse Naturali, regolante l'erogazione delle risorse finanziarie al Commissario medesimo, sulla base di quanto disposto dalla D.D. n. 46 del 14.06.2013 con la quale sono stati ammessi all'Asse II del P.O. FESR 2007/2013, tutti gli 84 interventi finanziati con la delibera CIPE n. 8/2012, per l'intero importo di € 194.690.000. Gli interventi sono quindi inseriti sia nel Programma "Frane e Versanti".



### 3 CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

La Regione Puglia presenta ambiti geologici abbastanza differenti fra loro con peculiarità morfologiche strettamente legate al contesto geografico in cui le stesse ricadono. In particolare, per gli aspetti morfologici, il territorio della Regione Puglia è suddivisibile in cinque macro-aree ovvero:

- il sub-appennino Dauno;
- il Tavoliere;
- il Gargano;
- le Murge;
- il Salento.

L'area del sub-appennino Dauno è caratterizzata da un territorio in forte evoluzione, distinto da notevoli processi morfologici, anche abbastanza profondi, legati all'acclività dei luoghi ed alle caratteristiche climatiche dell'area. La fenomenologia dei dissesti è fortemente presente ed interessa sia aree a vocazione essenzialmente agricola o boschiva, sia le aree urbanizzate e, in misura notevole, la viabilità, che risulta fortemente penalizzata, giungendo molto spesso a vere e proprie interruzioni che, in casi estremi, portano all'isolamento di interi centri comunali.

L'area del "Tavoliere" è invece caratterizzata da una delle più estese pianure dell'Italia meridionale in cui è riconoscibile un'area collinare ai piedi della quale è presente una spianata molto estesa, soprattutto lungo la fascia collinare sono presenti gli effetti dei fenomeni erosivi superficiali e profondi. In tale area i fenomeni di dissesto riguardano essenzialmente i pochi torrenti naturali esistenti, ma soprattutto i canali, sia naturali (lame) che artificiali, che non riescono a ricevere le notevoli quantità d'acqua dovute ad eventi meteorologici estremi (sempre più frequenti) e che, pertanto, provocano allagamenti sia di aree agricole che di aree e centri urbani, con effetti in molti casi estremamente dannosi e con forti rischi per l'incolumità umana.

L'area del Gargano è costituita invece da un grosso massiccio su cui gli effetti della tettonica hanno giocato un ruolo determinante nella determinazione delle forme del paesaggio. Oltre la tettonica sono i fenomeni carsici che hanno molto inciso sulla morfologia, con doline e *polje* molto estesi, che determinano delle forti depressioni. In questo ambito le forti pendenze e la brevità dei corsi d'acqua, ancorché effimeri, provocano, in caso di eventi estremi, un immediato interessamento delle zone di valle, a causa delle pendenze dei versanti e delle velocità che lo scorrimento idrico, con elevato trasporto solido che si trasferisce a valle, sia in zone produttive che residenziali/turistiche.

L'altopiano delle Murge, così come il Gargano, è caratterizzato da una notevole quantità di "emergenze" carsiche, con forme sia ipogee che epigee, quali *polje*, doline e "gravine" che rendono molto particolare il sovra suolo di questa porzione della Puglia. In tale area i fenomeni di dissesto sono dovuti sia a fenomeni di crollo, dovuti all'infiltrazione delle acque che ad allagamenti dovuti all'innesco di piene scaturite dalle gravine che "costringono" il flusso idrico in aree ristrette e, quindi, con forti velocità di spostamento e di carico solido.

La Penisola Salentina, geograficamente posta nella estrema porzione della regione, è caratterizzata da un paesaggio basso ed uniforme con delle dorsali poco elevate. Tale area presenta caratteristiche simili alla zona del Tavoliere, con frequenti allagamenti e alluvioni, dovute alla scarsa capacità di ritenuta dei corsi d'acqua, sia naturali che artificiali.

Così come sopra rappresentato il territorio regionale è quindi caratterizzato da un'estensione areale di quasi 20.000 Km<sup>2</sup>, con circa 800 Km di territorio costiero che, come visto in precedenza, risulta essere geologicamente molto articolato, con morfostrutture dominanti di tutti i tipi (catena, grandi piane alluvionali, vasti altopiani e tavolati carsici, vasti territori terrazzati e degradanti verso il mare, lunghe e

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

strette dorsali carbonatiche su cui insistono molti paesi) e litologie molto varie e differenti, spesso predisponesti ai dissesti (argille e argille scagliose, limi, sabbie, ghiaie, tufi, arenarie, terre rosse, calcari e dolomie carsificati, ecc.).

In generale, da dati pubblicati, risulta che i comuni pugliesi ad alta criticità idrogeologica sono circa 200, pari al 78% del totale. La superficie interessata è estesa invece 1.371 Km<sup>2</sup> (aree a rischio frana per il 35%, aree a rischio alluvioni per il 65%), di cui 1.031 Km<sup>2</sup> nella sola provincia di Foggia.

Dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia, emerge che 181 Comuni hanno al loro interno aree classificate a rischio idrogeologico molto elevato o elevato (R4 o R3).

#### 4 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

La struttura dell'Ufficio commissariale, regolata dai Decreti Commissariali n. 6, del 12.12.2011 e n. 27 del 21.02.2012, emanati sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 10 dicembre 2010, è composta complessivamente da n. 31 unità, così suddivise:

- n. 3 unità in posizione di comando da Invitalia Attività Produttive;
- n. 2 unità in posizione di comando dall'Autorità di Bacino della Puglia;
- n. 17 unità, in avvalimento part-time, dalla Regione Puglia;
- n. 8 unità, in avvalimento part-time, dalla Regione Sicilia/Commissario Straordinario Delegato Regione Sicilia.

Di seguito viene riportato l'elenco del personale componente la struttura Commissariale, con indicazione dell'Amministrazione di appartenenza e relativa disposizione di nomina e data di decorrenza.

<b>Personale in posizione di comando</b>		
<b>Cognome e nome</b>	<b>Amministrazione di appartenenza</b>	<b>Disposizione commissariale di nomina e decorrenza</b>
MARIOTTI CLAUDIO	Invitalia Attività Produttive S.p.A.	Decreto Comm.le n. 71 del 22/05/2012 con decorrenza 01/06/12
FAIETA MICAELA	Invitalia Attività Produttive S.p.A.	Decreto Comm.le n. 73 del 22/05/2012 con decorrenza 01/06/12
DE SIMONI STEFANIA	Invitalia Attività Produttive S.p.A.	Decreto Comm.le n. 72 del 22/05/2012 con decorrenza 01/06/12
CAGGIANO TIZIANA	Autorità di bacino della Puglia	Decreto Comm.le n. 53 del 02/05/2012 con decorrenza 02/05/12
DORIA ANDREA	Autorità di Bacino della Puglia	Decreto Comm.le n. 54 del 02/05/2012 con decorrenza 02/05/12

Secondo quanto disposto dall'art.1 c.5 del DPCM 20 luglio 2011, è prevista una quota non superiore all'1,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di Programma, da impiegare ove ritenuto indispensabile, dai Commissari Straordinari per lo svolgimento di missioni, nonché per l'acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio incarico.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

<b>Personale in avvalimento ex art.1 c.5 del DPCM del 20/07/2011</b>		
LEONARDO CAMPANALE	MIN. ECONOMIA E FINANZE - Ragioneria Terr.le dello Stato	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
GIUDITTA LOBEFARO	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
MICHELE LARATO	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
GIUSEPPE SFORZA	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 146 del 03/10/2012 con decorrenza dal 03/10/2012
SERGIO PEDOTE	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
VITA CAVONE	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
FRANCESCO MATARRESE	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
ORONZO SIMONE	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
MICHELE CHIECO	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
VINCENZO MORETTI	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
VITO NICOLA MASTRODOMENICO	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
RODOLFABIO BIANCO	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
VANIA CIANCIARUSO	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
LUIGI D'ELIA	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
GIAMPIERO DE NICOLÒ	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
GIUSEPPE MAZZONI	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 06 del 12/12/2011
DANIELA TEDESCHI	REGIONE PUGLIA	Decreto Comm.le n. 40 del 26/03/2012
PIETRO NICOLICCHIA	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 5 del 14/01/2013
ALESSANDRA SORCI	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013
STEFANIA VALLONE	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013
ANTONINO ABBAGNATO	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013
GIOVANNI PIERO DI MAGRO	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013
GIUSEPPE FERRANTE	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013
VINCENZO LA FATA	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 227 del 17/06/2013
ROSARIA LA PICA	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 107 del 22/03/2013

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

## 5 SITUAZIONE FINANZIARIA

Gli 84 interventi previsti nella Delibera CIPE n. 8/2012, sommano un costo complessivo di € 194.690.000, finanziato come segue:

- Risorse MATTM già disponibili:	€ 19.123.953,29 (A)
- Risorse assegnate con Delibera CIPE 8/2012, quota FSC:	€ 158.312.914,55 (B)
- Risorse assegnate con Delibera (/2012, quota MATTM):	€ 17.253.132,16 (C)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 194.690.000,00</b>

Le prime risorse economiche per l'avvio delle attività operative, sono state versate sulla contabilità speciale aperta dal Commissario Straordinario, in data 23 giugno 2011, per un importo pari ad € 2.120.985,79, a valere su fondi del MATTM, a cui ha fatto seguito, in data 15.12.2011, un secondo versamento di € 13.531.236,67.

Successivamente, in data 19.09.2012, il MATTM ha trasferito una ulteriore quota di € 3.471.730,87, che ha esaurito la quota complessiva MATT "Ante CIPE", per un totale (A) di € 19.123.953,29.

Nella medesima data del 19.09.2012 e poi in data 17.12.2012, il MATTM ha versato sulla contabilità speciale del commissario, risoettivamente, le somme di € 8.468.118,29 e di € 7.785.013,87, per un totale (C) pari ad € 17.253.132,16, corrispondente alla quota MATT di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012.

In seguito all'adozione della D.D. n. 46 del 14.06.2013 della Regione Puglia, la stessa ha provveduto a trasferire l'85% della quota regionale (ex FSC), sulla contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria dello Stato di Bari ed intestata al Commissario, sulla quale sono quindi, ad oggi, stati messi a disposizione:

- € 36.377.085,91 di provenienza MATTM;
- € 134.565.977,37 come parte della quota regionale.

5.1 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente (per l'anno 2013)	Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)	Speso	Residuo
0,0	€ 36.377.085,45	€ 5.625.552,39	€ 30.751.533,06
Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare)			
Importo corrente (per l'anno 2013)	Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)	Speso	Residuo
€ 134.565.977,37	€ 134.565.977,37	€ 1.837.672,28	€ 132.728.305,10

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

## 5.2 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	2013
Giacenza di cassa 1. 1.1.2013	€ 33.899.125,49	Tipologia di spesa:	
1) Fondi Comunitari		1) Redditi da lavoro dipendente	€ 54.400,60
2) Fondi Statali		2) Consumi intermedi	€ 3.288.246,13
3) Fondi regionali	€ 134.565.977,37	3) Interessi passivi	
4) Fondi di Enti Locali		4) Trasferimenti a Regioni	
5) Tariffe e proventi per servizi		5) Trasferimenti a Enti locali	
6) Accensione prestiti		6) Investimenti diretti	€ 1.438.731,86
7) Altro	88,65	7) Trasferimenti in c/capitale	
		8) Rimborso prestiti	
		9) Versamenti erariali	€ 139.595,57
		10) Versamenti previdenziali	€ 64.290,51
		11) Altro*	
		<b>Totale uscite</b>	<b>€ 4.985.264,67</b>
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	
		Disponibilità di cassa al 31.12.2013	€ 163.479.191,51
<b>Totale al 31.12.2013</b>	<b>€ 168.465.191,51</b>	<b>Totale pareggio</b>	<b>€ 168.465.191,51</b>

\*Voce 11) Altro: trattasi di spese in c/capitale


## 6 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

## 6.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Considerando le attività descritte nelle precedenti relazioni relative allo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ed in particolare all'ultima relazione di avanzamento attività, ovvero la "Relazione trimestrale Luglio – Settembre 2013", trasmessa in data 04.07.2013 con nota prot. 1402/DCI, si riportano di seguito, per ciascun capitolo:

- le attività svolte da questo Ufficio nel periodo Ottobre – 9 Dicembre 2013;
- una sintesi complessiva di quanto svolto nei tre anni di attività.





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 31.11.2010"

6.1.1 Progettazione interventi ed attività di supporto tecnico da parte di Invitalia Attività Produttive S.p.A.

Sulla base della Convenzione sottoscritta l'11 maggio 2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A., in forza di quanto previsto nel DPCM 10.12.2010, art. 4, comma 1, in data 14.12.2011, e delle successive note tecnico-operative con cui lo stesso Commissario ha trasmesso ad Invitalia Attività Produttive S.p.A. (IAP), in qualità di Soggetto Attuatore individuato da Invitalia S.p.A., la lista delle progettazioni di competenza da implementare e delle attività di supporto progettuale e tecnico-operativo da svolgere, in base ai quali, nel trimestre in oggetto:

- la Società ha completato e trasmesso agli uffici del Commissario:
  - il progetto definitivo completo dell'intervento BA046A/10 - Comune di Altamura;
  - il progetto definitivo completo dell'intervento FG022A/10 – Comune di Chieuti Via Fani.
 dei quali:
  - per il primo è già stata svolta la Conferenza di Servizi ed è già stata lanciata la gara con appalto integrato (cfr. quadro Gare in Allegato 2);
  - per il secondo è in corso l'istruttoria ai fini delle eventuali modifiche/integrazioni e per la successiva fase di approvazione.
- ha svolto/sta svolgendo attività di supporto alla progettazione, per relazioni specialistiche di tipo geologico-geotecnico e/o idraulico, relativamente agli interventi:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento	Supporto
FG037A/10	Ortanova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	Relazione geotecnica e di Calcolo Strutturale, Rilievi topografici, Relazione sulle interferenze, Piano di Gestione materiali scavati
FG036A/10	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	Relazione Geologica, relazione Geotecnica e di calcolo Strutturale
FG074A/10	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere	Relazione Geologica, relazione Geotecnica e di calcolo Strutturale
BA042A/10	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere - Lotto di Completamento	Rilievi topografici

- ha svolto attività di supporto tecnico, relativamente alle fasi di istruttoria di alcuni progetti definitivi pervenuti agli uffici del Commissario, relativamente agli interventi:

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
FG038A/10	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena
FG023A/10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento
FG040A/10	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"
FG082A/10	Volturino	Sistemazione e consolidamento versante in frana Loc. Lame-Fontana Vecchia

sulla base delle quali il Commissario Delegato ha richiesto modifiche/integrazioni progettuali ai progettisti degli stessi, al fine dell'implementazione e realizzazione delle successive fasi della progettazione e dell'attuazione degli interventi stessi.

- sulla base delle decisioni del Comitato di Indirizzo e Coordinamento di cui all'Accordo di Programma, relative alle richieste di traslazione degli interventi :

Cod. RENDIS	Comune	Titolo intervento	Importo (€)
FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Creta rossa" - Completamento	<b>2.500.000</b>
FG062A/10	Pietramontecorvino	Sistemazione idraulica-forestale in Loc. Pisciarelli-Fontanili	<b>2.800.000</b>
BR053A/10	San Pietro Vernotico	Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4 comune di S.Pietro Vernotico. <b>Progetto di Completamento</b>	<b>1.250.000</b>
FG005A/10	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. <b>Progetto di Completamento</b>	<b>2.940.000</b>
FG025A/10	Volturino	Sistemazione idraulica del Canale Valle Iuvara	<b>3.290.000</b>

considerate le decisioni favorevoli di tale Comitato, la necessità di operare in tempi strettissimi in modo da poter avviare le attività di appalto entro il termine del 31.12.2013, sono state quindi affidate a IAP le attività progettuali dei seguenti interventi "traslati":

Cod. RENDIS	Comune	Titolo intervento	Importo (€)
FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara"	2.500.000
FG005_1A/10	Volturara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio	1.500.000

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

FG025A/10	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	3.290.000
-----------	-----------	--	-----------

**Complessivamente, nel periodo Luglio 2011 – Dicembre 2013, Invitalia Attività Produttive ha svolto/sta svolgendo:**

A. la progettazione diretta, ivi comprese le indagini geognostiche necessarie, di n° 8 interventi:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)
BA049A/10	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord
FG010A/10	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino
FG022A/10	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani
LE045A/10	Seclì	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì
FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara"
FG005_1A/10	Volturara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio
FG025A/10	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano

- B. attività di supporto progettuale (relazioni specialistiche geotecniche, idrauliche, geologiche, di calcolo strutturale) di n° 4 interventi (FG037A/10- Ortanova, FG036A/10-Motta Montecorvino, FG074A/10-Motta Montecorvino, BA042A/10- Terlizzi)
- C. ha svolto la Direzione Lavori di n° 6 cantieri di indagini geognostiche ed ha eseguito i rilievi topografici di n. 7 interventi;
- D. ha svolto attività istruttorie per circa 10 interventi.

#### 6.1.2 Attività operative e di supporto del Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo

Sulla base dell'Accordo sottoscritto in data 9 gennaio 2012 e relativamente alla lista degli interventi su cui avviare ed eseguire le attività di rilevamento, il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del



Mediterraneo (CGIAM) avendo completato il rilevamento di 19 dei 20 interventi<sup>1</sup> previsti nella Convenzione stipulata con il Commissario Delegato, ha provveduto alla stesura del report conclusivo delle attività di rilevamento, ed ha provveduto, con nota del 21.10.2013, ha trasmettere il medesimo, sia in formato cartaceo che su supporto informatico (DVD) contenente tutti i dati ed i risultati dei rilievi svolti.

Il personale facente parte del Gruppo di Lavoro costituito dal CGIAM per le attività di supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario Delegato, ha inoltre proseguito la collaborazione diretta, mediante:

- la stesura di relazioni di inquadramento geologico, di specifiche e computi, relativamente agli interventi che la struttura commissariale ha in fase di progettazione in proprio o per gli interventi in cui svolge attività dirette di supporto progettuale (Bitetto, Rignano Garganico, Grottaglie);
- la verifica istruttoria di documentazione progettuale inerente alcuni interventi progettati da UTC o da tecnici esterni, quali :

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
FG034A/10	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino
FG004A/10	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stocaggio, S.p. 138 Limitoni
LE045A/10	Seclì	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì

- il supporto tecnico – operativo diretto per la preparazione di note, report e quant'altro di competenza della struttura commissariale in merito agli adempimenti relativo agli avanzamenti delle attività:

Sempre nel periodo in oggetto, il personale CGIAM di supporto alle attività del Commissario delegato, ha completato la Direzione lavori per il cantiere delle indagini finalizzate alla progettazione definitiva dell'intervento FG077A/10 di Bitetto, in cui la struttura commissariale è direttamente responsabile.

**Complessivamente, nel periodo Luglio 2011 – Dicembre 2013, il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo ha svolto:**

- A. Il rilievo mediante piattaforma avio/elitrasportata delle aree di intervento di seguito indicate:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)
FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato

<sup>1</sup> Allo stato si ha ancora a disposizione un ultimo rilievo da eseguire con piattaforma aerotrasportata, che si è preferito lasciare come riserva per eventuali necessità urgenti, tenuto anche conto che, in realtà, sono state rilevate ben 28 diverse aree territoriali comunali, considerato che l'estensione di alcuni bacini idraulici versanti su aree di intervento avevano dimensioni ben più ampie di quelle previste, con necessarie maggiori attività di rilievo, di analisi e di restituzione dati.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23.11.2010"

FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura
FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)
FG022A/10	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani
FG065A/10	Chieuti	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)
FG030A/10	Ex Genio Civile Foggia	Interventi prioritari di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore, tratto sotteso dalla diga di Occhito - I lotto
BA033A/10	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra il ponte S. Stefano/S.S. Bari - Potenza e loc. Terrasanta)
TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci
LE035A/10	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento.
FG077A/10	Rignano Garganico	Opere mitigazione rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro
FG066A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente radicata per mitigazione rischio idraulico
FG079A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Staina
LE083A/10	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale
LE045A/10	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli
BA042A/10	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere - Lotto di Completamento
LE080A/10	Veglie	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale
FG005A/10	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento
FG064A/10	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia

- B. ha svolto attività di Direzione Lavori per cantieri di indagine geognostica di n° 2 Interventi (Rignano Garganico e Bitetto);
- C. ha svolto attività istruttorie relativa a n° 13 interventi;
- D. ha svolto attività di supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario Delegato, anche mediante la stesura di relazioni di inquadramento geologico, di specifiche tecniche e computi, relativamente agli interventi che la struttura commissariale ha in fase di progettazione in proprio o per i quali svolge attività dirette di supporto progettuale ai Comuni per n° 7 interventi (BA069A/10-

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Bitetto, TA072A/10- Grottaglie, BA073A/10- Grumo Appula, FG037A/10- Orta Nova, FG077A/10- Rignano Garganico, FG052A/10- Sant'Agata di Puglia)

#### 6.1.3 Collaborazione con altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche

Nel corso dello svolgimento delle attività commissariali, al fine di facilitare i contatti con il territorio ed usufruire anche di esperienze e conoscenze dirette di alcune delle aree di intervento, sono state formalizzate collaborazioni con :

- la Provincia di Barletta-Andria-Trani, con la quale è stata stipulata una Convenzione ed un disciplinare per la progettazione ed il supporto tecnico-amministrativo per l'intervento BT027A/10 "Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce";
- l'ANBI Puglia con la quale, a valle di una convenzione quadro, sono stati stipulati disciplinari specifici con i Consorzi di Bonifica "Terre d'Apulia" e "del Gargano", per la progettazione degli interventi: 1) BA033A/10 – Comune di Gravina in Puglia "Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)" e, 2) FG081A/10 – Comune di Vico del Gargano "Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino".

La progettazione dell'intervento relativo a Gravina in Puglia si è conclusa ed è già stata svolta la relativa Conferenza di Servizi, si è in attesa di alcune piccole integrazioni per la definitiva approvazione e l'avvio della gara di appalto; gli altri due interventi sono in corso di progettazione.

#### 6.1.4 Incontri e collaborazione/progettazione con i Comuni

Nel periodo Ottobre – 9 Dicembre 2013 sono proseguiti gli incontri tecnico-operativi con i Comuni, finalizzati nella maggior parte dei casi:

- alla consegna ed analisi preliminare degli elaborati progettuali redatti dai Comuni,
- alla chiusura delle attività istruttorie sugli stessi,
- alla fase post- Conferenza di Servizi nei casi di necessità di revisioni/integrazioni progettuali;
- alla definizione delle procedure di gara e post gara per i progetti approvati.

In particolare i Comuni con cui sono stati svolti incontri, sia con gli uffici tecnici che, nella maggior parte dei casi, con i Sindaci e/o gli Assessori preposti, sono stati 35, e precisamente:

- Accadia, Alberobello, Altamura, Anzano di Puglia, Apricena, Provincia BAT, Biccari, Bitetto, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carpino, Celle di San Vito, Cerignola, Cisternino, Corato, Fasano, Foggia, Gravina in Puglia, Grottaglie, Grumo Appula, Martinafranca, Massafra, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Putignano, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Marco in Lamis, San Paolo di Civitate, Sant'Agata di Puglia, Seclì, Veglie e Volturino nell'ottica di proseguire e chiudere le attività progettuali,

sia per chiudere contenuti progettuali per/o a seguito delle conferenze di servizi, con il fine di condividere le modalità e le procedure previste dal vigente codice appalti, in maniera da poter

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

procedere con le successive fasi di verifica e validazione e di realizzazione degli interventi, sia per condividere/richiedere modifiche o integrazioni a seguito di istruttorie tecniche svolte.

Complessivamente, nel periodo Febbraio 2011 – Dicembre 2013, tutti i Comuni in cui ricadono interventi di competenza commissariale ex Accordo di Programma del 25.11.2010, sono stati incontrati, per molti in più occasioni, per discutere e condividere aspetti procedurali, modalità, contenuti e soluzioni degli interventi da attuare.

Con molti Comuni, sulla base delle specifiche richieste, è stata concordata, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 10.12.2013, una procedura per cui:

- il Comune predisponere, per il tramite del proprio UTC, la progettazione degli interventi ricadenti nel proprio territorio, avvalendosi del supporto progettuale di specialisti esterni (quando non presenti nell'UTC o impossibilitati a collaborare);
- il Comune procedeva direttamente all'affidamento a professionisti esterni della progettazione, nell'ambito di un importo inferiore a € 40.000 e secondo le procedure previste dall'art. 125, commi 10 e 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,

sulla base della quale sono state affidate e svolte le progettazioni, definitive e/o esecutive, di n. 62 interventi.

#### 6.1.5 Nomine RUP

Relativamente alle nomine dei RUP, per tutti gli interventi gli stessi erano stati già nominati in precedenza, ad eccezione di quelli relativi ai 5 interventi di cui era stata chiesta la traslazione del finanziamento, ovvero: 1) FG070A/10 - Casalnuovo Monterotaro, 2) FG062A/10 - Pietramontecorvino, 3) BR053A/10 - San Pietro Vernotico, 4) FG005A/10 - Volturara Appula, 5) FG025A/10 - Volturino.

Nel periodo Ottobre – 9 Dicembre 2013 si sono rese necessarie soltanto alcune sostituzioni di RUP dovute o a pensionamento di tecnici comunali precedentemente nominati, oppure a spostamenti di alcuni tecnici da un Comune ad un altro.

In Allegato 1, si riporta l'elenco completo dei RUP, con i riferimenti di nomina, ed i relativi Supporti, in genere facenti parte della struttura commissariale.

#### 6.1.6 Richieste di traslazione del finanziamento interventi

Sulla base delle specifiche richieste fatte da parte di alcuni Comuni (cfr. Tabella sottostante), per alcuni interventi era stata richiesta la traslazione delle aree di applicazione.

Cod. FENDIS	Comune	Intervento	Importo finanz. (€)
FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. in località "Creta rossa" - Completamento	€ 2.500.000
FG062A/10	Pietramontecorvino	Sistemazione idraulica-forestale in Loc. Pisciarelli-Fontanili	€ 2.800.000

REPUBBLICA ITALIANA      REGIONE PUGLIA




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010

BR053A/10	San Pietro Vernotico	Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4 comune di S. Pietro Vernotico. Progetto di Completamento	€ 1.250.000
FG005A/10	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento	€ 2.940.000
FG025A/10	Volturino	Sistemazione idraulica del Canale Valle Iuvara	€ 3.290.000

A valle delle procedure di richiesta e di verifica, anche formalmente richieste dal MATTM (cfr. nota del 19.12.2012, prot. 50333-TRI-X) ed a seguito degli ulteriori sopralluoghi e riscontri svolti, anche congiuntamente all'Autorità di Bacino della Puglia, in data 7.10.2013 si è riunito il Comitato di Indirizzo e Coordinamento di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010, il quale ha espresso parere favorevole alla traslazione degli interventi originariamente previsti

nei seguenti diversi/nuovi interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune	Titolo intervento	Importo (€)
FG070A/10 CUP: J55D12000170003	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara"	2.500.000
FG062A/10 CUP: J45D12000250003	Pietramontecorvino	Intervento di messa in sicurezza del versante collinare S. Pardo - 2° lotto funzionale	2.800.000
BR053A/10 CUP: J55D12000120003	San Pietro Vernotico	Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il canale Infocaciucci	1.250.000
FG005A/10 CUP: J85D12000170003	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento	1.440.000
FG005_1A/10 CUP: J84B12000420006	Volturara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio	1.500.000
FG025A/10 CUP: J95D12000110003	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	3.290.000

In ragione inoltre:

- dello "sdoppiamento" dell'intervento deciso dal Comitato per il Comune di Volturara Appula (al nuovo intervento in loc. Migliare – Masseria San Gregorio viene assegnato preliminarmente, e fatta salva diversa decisione da parte dell'Ente competente, il Codice Rendis FG055\_1°/10);
  - della necessità, espressa dal Comitato, di dover comunque procedere al finanziamento di ambedue gli interventi di Casalnuovo Monterotaro, prevedendo per quello originariamente previsto in località "Creta Rossa", le economie residue dall'intervento in località "Pagliara" e, se non sufficienti, integrate con economie di altri interventi inseriti nell'Accordo,
- le risorse assegnate con Delibera CIPE n.8/2012 saranno ripartite non già tra n. 84, bensì n. 86 interventi.





## 6.1.7 Istruttorie e sopralluoghi

Parallelamente allo svolgimento degli incontri con i Comuni, come già precedentemente illustrato, nel periodo in oggetto sono proseguite:

- le attività istruttorie sui progetti trasmessi agli uffici commissariali, ai fini del loro adeguamento o modifica o integrazione, ove necessario, e per la successiva approvazione mediante Conferenza di Servizi di cui agli all'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M 20 luglio 2011.;
- i sopralluoghi diretti del personale tecnico facente parte della struttura commissariale, sulle aree oggetto degli interventi da attuare, secondo le priorità e le disponibilità definite con gli stessi Comuni.

Sono inoltre quindi condotte le istruttorie sui progetti elaborati e trasmessi dai Comuni, ai fini della verifica della loro congruità, sia in termini di contenuti che di dimensionamenti, alle norme vigenti, sui seguenti interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
FG009A/10	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi
FG054A/10	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini
FG068A/10	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo
FG010A/10	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino
FG006A/10	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"
FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato
FG032A/10	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)
FG022A/10	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani
FG067A/10	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore
BR016A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto
BR017A/10	Fasano	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto
BR058A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto
BR059A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto
BA033A/10	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)
BA073A/10	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto
FG034A/10	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino
TA048A/10	Martina Franca	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Viale De Gasperi
TA047A/10	Massafra	Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

LE035A/10	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento
FG037A/10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova
FG004A/10	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stocaggio, S.p. 138 Limitoni
FG038A/10	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena
FG060A/10	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale
FG023A/10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento
BA076A/10	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale
FG077A/10	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro
FG078A/10	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"
FG040A/10	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"
FG066A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico
FG079A/10	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina
BR053A/10	San Pietro Vernotico	Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il canale Infocaciucci
FG052A/10	Sant'Agata di Puglia	Lavori di consolidamento versante Via Pagano-Gizzoli-Via della Libertà. Progetto di completamento
LE083A/10	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale
LE045A/10	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli
LE080A/10	Veglie	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale
FG081A/10	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino
FG082A/10	Volturno	Sistemazione e consolidamento versante in frana Loc. Lame-Fontana Vecchia

A seguito delle istruttorie di cui sopra, una volta trasmessi gli esiti ai Comuni, sono state richieste, ove necessario, integrazioni e/o modifiche progettuali indispensabili per chiudere eventuali carenze progettuali o per adeguare gli elaborati alle norme vigenti. A seguito di tali integrazioni, ove trasmesse, si è passati quindi alla fase di approvazione dei progetti in sede di Conferenza di Servizi o, ove possibile, direttamente alla progettazione esecutiva o alla gara di appalto (cfr. tabella di sintesi, aggiornata al 9.12.2013 – di cui in Allegato 2 1).

In aggiunta a quanto sopra sono stati svolti incontri periodici e tavoli tecnici con Enti (Regione Puglia, Autorità di Bacino) per la condivisione di osservazioni e richieste da trasmettere ai Comuni nell'ambito delle suddette istruttorie.

Sono stati anche espletati ulteriori sopralluoghi diretti per gli interventi:

Cod. REINDIS	COMUNE	Titolo intervento
BA033A/10	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)
TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci e del Canale Macchione

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

TA037A/10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova
FG038A/10	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena
FG060A/10	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale
FG040A/10	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"

**Complessivamente, nel periodo Luglio 2011 – Dicembre 2013, sono stati eseguiti sopralluoghi diretti su tutte le aree di intervento, e sono state eseguite istruttorie su 75 degli 86 progetti di competenza commissariale (considerando che nel totale sono compresi anche 4 degli interventi, di cui era richiesta la "traslazione").**

#### 6.1.8 Conferenze di Servizi

Nel periodo in oggetto (Ottobre – 9 dicembre 2013) sono state convocate e svolte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del DPCM 20 luglio 2011, n. 19 Conferenze di Servizi (CdS) per l'approvazione dei progetti dei seguenti interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
FG054A/10	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini
BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)
FG010A/10	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino
FG006A/10	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"
FG032A/10	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)
BR016A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto
BR058A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto
BR059A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto
BA033A/10	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)
BA073A/10	Grumo Appulia	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto
FG034A/10	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino
LE035A/10	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento
FG004A/10	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stocaggio, S.p. 138 Limitoni
FG060A/10	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

FG023A/10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento
BA076A/10	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale
FG078A/10	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"
FG040A/10	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"
LE045A/10	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli

Sulla base di tali Conferenze di Servizi 13 dei 19 interventi sono stati approvati direttamente, alcuni con prescrizioni, e per essi sono state immediatamente avviate le procedure di appalto (verifica e validazione ex DPR 207/10, stesura bando di gara/lettera di invito, etc.), mentre per gli altri 6 sono in corso le integrazioni /modifiche progettuali richieste dagli Enti.

A tali Conferenze si è aggiunta anche quella relativa all'intervento TA047A/10 - Massafra "Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico", convocata e tenutasi presso il Comune di Massafra, nel corso della quale è stato approvato il "Progetto definitivo generale degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio di Massafra", suddiviso in due lotti di intervento, di cui il 1° è di competenza commissariale e del quale è già pronto il progetto esecutivo da avviare a gara.

**Complessivamente, nel periodo Luglio 2011 – Dicembre 2013, sono state svolte n. 50 Conferenze di Servizi, ex art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 20 luglio 2011**

6.1.9 Progettazioni e/o attività di supporto progettuale svolti direttamente dalla struttura commissariale

Parallelamente alle attività di sopralluogo e di istruttoria prima descritte, i tecnici della struttura interna dell'ufficio del Commissario hanno completato le attività progettuali assegnate direttamente per alcuni degli interventi compresi nell'Accordo di Programma che sono:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Tipologia progettazione
BA069A/10	Bitetto	Lavori di sistemazione idraulica in C.da Misetta (alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	Preliminare
FG067A/10	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore	Definitivo/Esecutivo
TA071A710	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	Preliminare
FG037A/10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	Definitiva
BA042A/10	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere Lotto di Completamento	Preiiminare




**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
*per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010*

FG043A/10	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale	Esecutiva
-----------	------------------	--	-----------

Sulla base degli esiti degli incontri avuto con l'AdB Puglia e con i Comuni interessati, ed in considerazione della necessità di prevedere – nell'ambito delle somme messe a disposizione dall'Accordo di Programma e dalla Delibera CIPE – opere accessorie e/o migliorative, i progetti si cui sopra sono stato così definiti:

- BA069A/10 – Bitetto: sulla base del “parere preliminare favorevole dell'AdB Puglia”, ed avendo realizzato le indagini geognostiche previste dalla normativa vigente, sulla base di quanto disposto e reso possibile dall'art. 53, comma 2, punto c) del Codice appalti, il progetto preliminare in oggetto è stato messo direttamente in appalto (cfr. Quadro Gare di cui all'Allegato 2);
- TA072A/10 – Grottaglie: a valle degli esiti della Conferenza di Servizi svolta sul progetto preliminare redatto, e considerate le notevoli difficoltà operative e progettuali connesse alla soluzione della situazione di rischio idrogeologico presente nell'area, sia nella zona della gravina urbana che nelle aree di valle costantemente inondate nel corso di eventi meteorologici, anche non estremi, si è deciso di lanciare una gara di appalto direttamente sul preliminare, per la quale occorre comunque produrre, come atto preliminare, gli esiti di indagini geognostiche che, allo stato sono già state appaltate ed in fase di avvio; non appena saranno disponibili i risultati di tali indagini, si procederà immediatamente all'indizione della gara ex art. 53, comma 2, punto c), sopra richiamato;
- FG037A/10 – Orta Nova: è stata conclusa la progettazione definitiva dell'intervento che, in considerazione dell'entità del finanziamento, non consente di intervenire su tutti i punti necessari alla mitigazione del rischio idrogeologico nell'area e, pertanto, sulla base delle simulazioni effettuate, e rispettando il principio “idraulico” di avviare gli interventi da valle verso monte, è stata data prevalenza alla protezione della costruenda area produttiva/artigianale, prevedendo comunque la possibilità di operare anche su un ulteriore attraversamento idraulico, più a monte di tale tratto, in caso di appalto integrato dell'opera;
- BA042A/10 – Terlizzi: vale esattamente quanto sopra detto per l'intervento di Grottaglie;
- FG043A710 – Vico del Gargano: è già stata svolta ed aggiudicata la gara di appalto.

In aggiunta a tali interventi, la struttura commissariale ha assicurato in tale periodo, il completamento delle attività di supporto progettuale previste per gli interventi di:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Tipologia di supporto alla progettazione
BA011A/10	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza – progetto di completamento	Relazione geologica
FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG077A/10	Rignano Garganico	Opere di mitigazione del rischio alla confluenza dei torrenti Triolo e Candelaro	Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG081A/10	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino	Rel. Geologica



In aggiunta a questi, sta proseguendo le attività di supporto alla progettazione per i due interventi di Motta Montecorvino (FG036A/10 - *Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia* e FG074A/10 - *Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento*) in cui la progettazione definitiva, curata direttamente dal Comune e con l'ulteriore supporto di Invitalia Attività produttive per le relazioni specialistiche geologico - geotecniche e di calcolo strutturale, è in corso.

#### 6.1.10 Verifica UVER

Nel periodo 22 – 24 Ottobre 2013, funzionari dell'UVER – Unità di Verifica del Nucleo Tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica), hanno svolto presso la sede commissariale attività ispettive e di verifica che hanno riguardato 12 interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
FG002A/10	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona
FG051A/10	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto
FG003A/10	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma
FG057A/10	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavittelle
FG030A/10	ex Genio Civile Foggia	Interventi prioritari di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore, tratto sotteso dalla diga di Occhito I lotto
BR016A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto
TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci
BA073A/10	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto
BT027A/10	Provincia BT	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce
FG063A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto
FG005A/10	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento
FG025A/10	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano (ex Sistemazione Idraulica Canale Juvara)

Per gli interventi di Alberona e di Celle di San Vito, oltre alla verifica documentale ed all'intervista diretta presso la sede del Commissario in Bari, nella giornata del 24 ottobre è stato svolto anche il sopralluogo diretto sulle aree di cantiere per la presa d'atto e la verifica delle attività in corso.

Il Nucleo di valutazione UVER, giusto in data 10.12.2013, con propria nota prot. DPS 15034, ha trasmesso il proprio "Rapporto Finale – programma controlli sugli interventi finanziati dalla Delibera CIPE 8/2012 Frane e Versanti" – cod. identificativo 1329-08 del 9.12.2013, nel quale alle pagg- 21 ÷ 23 viene illustrato quanto osservato relativamente alla attività commissariali in Puglia e che così conclude:



*“Non sono emerse criticità significative e quelle rilevate, di scarsa entità, sono state dichiarate comunque superabili nell’arco di tre mesi.”*

#### 6.1.11 Attività di verifica e validazione progetti ex DPR 207/10

Ai sensi di quanto previsto al Capo II del DPR 207/10, secondo quanto disposto dall’art.93, comma 6, del Codice appalti, è necessaria la verifica (artt. Dal 45 al 54) e la validazione (art. 55), *“finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati”*.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 47 del medesimo DPR 207/10, le attività di verifica possono essere svolte:

- per lavori di importi < 1.000.000 € ..... dal Responsabile del Procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista ...;
- per lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore a 20.000.000 € di euro, dagli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

Per attuare tali disposizioni normative, il Commissario Straordinario Delegato ha emanato il Decreto n. 223 del 5 dicembre 2012, con il quale ha costituito il Gruppo Interno di Verifica (composto da tre tecnici di comprovata esperienza) ed ha regolamentato le relative procedure, e che è stato successivamente integrato con il Decreto Commissariale n. 335 del 22 ottobre 2013, al fine di poter fare affidamento su altri tecnici interni, vista la mole di attività di verifica da svolgere.

Complessivamente sono state svolte attività di verifica su 25 progetti<sup>2</sup>, definitivi o esecutivi, inerenti gli interventi di:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
BA011A/10	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento
BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncaminno, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)
FG051A/10	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto
FG050A/10	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle
FG055A/10	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti
FG006A/10	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"
BT012A/10	Canosa	Interventi di consolidamento abitato Cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento
FG029A/10	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto

<sup>2</sup> Considerando che i due progetti relativi agli interventi di "Fasano Torre Canne – Pezze di Greco II° e III° lotto" sono stati considerati un unico appalto

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

FG007A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento
FG084A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera
FG056A/10	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogni di adduzione vers. Est centro abitato SP 126
BR013A/10	Cisternino	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella"
BA014A/10	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato
FG001A/10	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata
FG057A/10	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle
BR016A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto
BR058A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto
BR059A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto
BA073A/10	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto
FG004A/10	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stocaggio, S.p. 138 Limitoni
FG060A/10	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale
FG023A/10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento
BA076A/10	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale
LE045A/10	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli
FG024A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo
FG063A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto

Le verifiche relative agli altri interventi per i quali è già stata svolta, o è in svolgimento, la gara di appalto, sono state assicurate dai RUP, così come tutte le validazioni previste dalla norma, a cui gli uffici commissariali hanno dato il necessario supporto, ove necessario o richiesto.

#### 6.1.12 Gare di appalto svolte/in corso

Nel periodo Ottobre – 9 dicembre 2013, sono state svolte (avviate e già in parte aggiudicate, altre ancora in corso), ben 40 gare di appalto (cfr. Quadro Gare di cui in Allegato 2), di cui:

- 1 relativa alla realizzazione delle indagini geologico-geognostiche finalizzate alla progettazione definitiva ed all'appalto ex art. 53, comma 2, punto c) del D.Lgs 163/06, relativa all'intervento TA072A/10 - Comune di Grottaglie "Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci e del Torrente Macchione";
- 39 relative ai seguenti interventi:



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

TITOLO intervento			IMPORTO AdP
Codice	Comune	Intervento	
FG071_A10	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	Intervento di sistemazione dissesto idrogeologico alla località "cimitero" nell'abitato di Castelluccio Valmaggiore alla "ia stretta della monaca" e "via degli emigranti"	€720.000,00
FG026A_10	SAN MARCO LA CATOLA	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Mulino a fuoco – Via Marconi – C.so Umberto	€1.430.000,00
BT012A_10	CANOSA	Intervento di consolidamento dell'abitato. cavita' centro urbano – progetto 1° stralcio completamente	€2.000.000,00
FG043A_10	VICO DEL GARGANO	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati loc. Postiglione San Menaio	€850.000,00
FG019A_10	FAETO	Consolidamento dei dissesti idrogeologici del centro abitato - zona cimitero comunale"	€800.000,00
FG041A/10	SERRACAPRIOLA	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio	€750.000,00
FG050A/10	ASCOLI SATRIANO	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	€1.800.000,00
FG018A/10	BOVINO	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto	€790.000,00
FG029A/10	CARLANTINO	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	€2.000.000,00
BR013_A/10	CISTERNINO	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella" nel Comune di Cisternino (BR)	€1.500.000,00
FG063A_10	TROIA	Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto	€3.000.000,00
FG028A/10	CAGNANO VARANO	Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Francesco - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate	€1.500.000,00
FG024A_10	TROIA	Consolidamento centro abitato via verdi – via san girolamo	€2.500.000,00
BR053A/10	SAN PIETRO VERNOTICO	Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4 comune di S.Pietro Vernotico. Progetto di Completamento	€1.250.000,00
FG061A/10	SERRACAPRIOLA	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. Progetto di completamento	€540.000,00
FG020A/10	FOGGIA	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini- Progetto di completamento	€800.000,00
FG007A_10	CELENZA VALFORTORE	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centra urbano valle Regina Margherita	€2.270.000,00
FG004A/10	PANNI	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stoccaggio, S.p. 138 Limitoni	€1.500.000,00
FG057A_10	DELICETO	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavittelle	€3.750.000,00
FG084A/10	CELENZA VALFORTORE	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	€2.600.000,00
FG001A_10	DELICETO	"Lavori di consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano zona "Arena Cavata" nel Comune di Deliceto (FG)	€2.500.000,00
BA011A_10	ALBEROBELLIO	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del canale di Via indipendenza	€1.720.000,00

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

FG021_A/10	ANZANO DI PUGLIA	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara	€1.200.000,00
FG051A_10	APRICENA	Lavori di realizzazione del canale scolmatore 2° lotto - adeguamento del Canale San Martino"	€5.250.000,00
FG023A/10	PIETRAMONTECORVINO	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento	€2.900.000,00
LE035A/10	MIGGIANO	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento	€400.000,00
FG078A/10	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"	€1.300.000,00
FG006A/10	CANDELA	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	€3.300.000,00
FG060A/10	PESCHICI	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale	€2.500.000,00
LE045A/10	SECLI'	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli	€3.690.000,00
FG055A/10	BICCARI	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	€3.250.000,00
BA073A/10	GRUMO APPULA	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	€3.520.000,00
BA046A/10	ALTAMURA	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord - Altamura, tra Via Vecchia Buoncaminno, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	€3.000.000,00
BA076A/10	PUTIGNANO	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale	€3.390.000,00
BR058A/10 BR059A/10	FASANO	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto e 3° Lotto	€10.480.000,00
BR016A/10	FASANO	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto	€6.180.000,00
FG039A/10	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi	€870.000,00
BA014A/10	CORATO	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	€2.000.000,00
BA069A/10	BITETTO	Lavori sistemaz. idraulica C.da Missetta (Aiveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	€1.720.000,00

Tali gare corrispondono ad un valore complessivo degli interventi previsti in AdP pari ad € 91.520.000 che, sommato al valore degli interventi già messi in appalto in precedenza, pari ad € 7.890.000,00, ed al valore delle indagini messe a gara ed affidate, pari ad € 620.818,70, comportano un valore complessivo pari ad € 100.030.818,70, corrispondente al 51,38 % dell'importo complessivo dell'Accordo di Programma così come modificato dalla Delibera Cipe n. 8/2012.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23.11.2010"

## 6.1.13 Cantieri conclusi

Nel periodo oggetto della presente relazione si è concluso il cantiere delle opere dell'intervento FG064A/10 – Comune di Volturara Appula "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici strada Amborchia", del quale sono in corso di svolgimento le procedure per la chiusura amministrativa.

**Congiuntamente all'intervento BR015A/10 - Comune di Fasano "Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica Lotto 1/A - Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare", sono stati pertanto conclusi completamente n. 2 interventi**

## 7 LIVELLO DI ATTUAZIONE GLOBALE DEGLI INTERVENTI

Allo stato attuale, anche in relazione alle decisioni assunte dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Accordo di programma il 7.10.2013, gli interventi di competenza sono **86**, interamente finanziati dalla Delibera CIPE n. 8 del 2012.

Si riporta qui di seguito un esame analitico e dettagliato dello stato dell'arte degli interventi rientranti nell'Accordo di Programma, così come modificati dalla Delibera CIPE n. 8/2012 ed aggiornati post Comitato del 7.10.2013.

Qui di seguito si riporta lo stato di avanzamento lavori degli **86** interventi, ed in particolare:

- n. 9 interventi risultano in fase di istruttoria, ovvero i cui progetti, definitivo o esecutivo, sono stati trasmessi agli Uffici commissariali e sono in fase di verifica o di revisione per la successiva fase di approvazione;
- n. 31 interventi per i quali sono in corso le attività di progettazione, intendendo tutte le fasi propedeutiche la realizzazione degli interventi, pertanto sono inclusi quelli per i quali sono state già affidate le attività di indagini geognostiche o si è in attesa di acquisire le necessarie autorizzazioni e pareri o l'approvazione in sede di Conferenza di Servizi;
- n. 44 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara o per cui la gara è già stata aggiudicata e i cantieri sono in avvio, oppure dove gli interventi sono già in fase di realizzazione;
- n. 2 interventi già ultimati.

<i>Interventi</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
9	<i>Istruttoria di dettaglio</i>	10,5%	€ 18.060.000,00
30	<i>In fase di Progettazione</i>	34,9%	€ 80.610.000,00
45	<i>In fase di Attuazione Intervento</i>	52,3%	€ 93.920.000,00
2	<i>Interventi Ultimati</i>	2,3%	€ 2.100.000,00
<b>86</b>	<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 194.690.000,00</b>

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi


REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010

## Interventi %

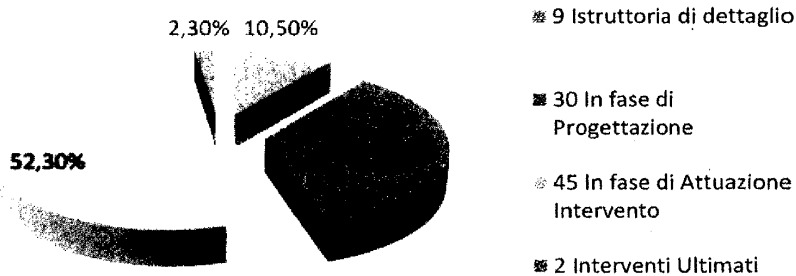

Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

### Interventi in fase di progettazione

Interventi in fase di Progettazione			
N. Interventi	Stato	%	€
9	Progettazione esecutiva in corso	30%	€ 22.390.000,00
21	Progettazione definitiva	70%	€ 58.220.000,00
30	<b>TOTALE in fase di Progettazione</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 80.610.000,00</b>

Gli interventi che risultano in fase di progettazione sono così suddivisi:

- n. 9 interventi per i quali è in corso la redazione del progetto esecutivo;
- n. 21 interventi per i quali si è conclusa/si sta concludendo la fase di progettazione definitiva;

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:

REPUBBLICA ITALIANA




REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

## INTERVENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE



■ 9 Progettazione esecutiva  
in corso

■ 21 Progettazione  
definitiva

**Interventi in fase di attuazione**

Interventi in fase di Attuazione			
N. Interventi	Stato	%	€
1	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	2,2%	€ 700.000,00
29	GARA IN CORSO	64,4%	€ 71.290.000,00
10	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	22,2%	€ 15.420.000,00
5	AVVIATI LAVORI	11,1%	€ 5.810.000,00
<b>45</b>	<b>TOTALE in fase di attuazione intervento</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 93.220.000,00</b>

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

- n. 1 intervento in cui gli atti sono già stati predisposti, ma la gara non è stata avviata in quanto il 10.12.2013 i due D.P.C.M. del 10.12.2010 e del 20.07.2011 hanno cessato i loro effetti e si è entrati in regime ordinario, in attesa della proroga commissariale;
- n. 29 interventi per i quali la gara è ancora in corso;
- n. 10 interventi per i quali sono state già espletate le procedure di gara per la realizzazione, è già stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva e si è in attesa o della stipula del contratto ai sensi di legge o della consegna dei lavori di cantiere;
- n. 5 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione;

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:


REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010

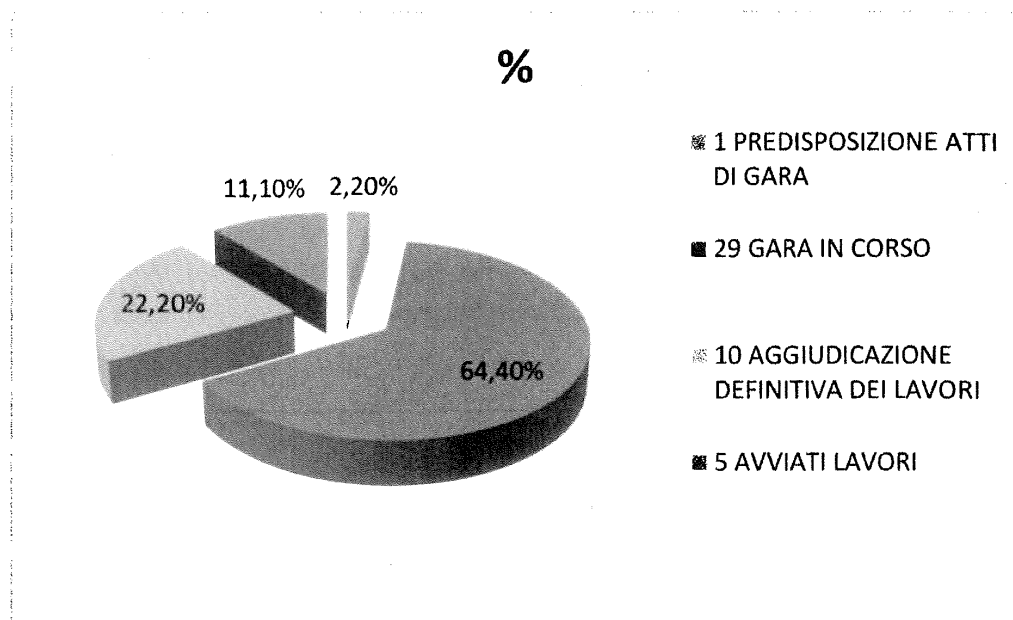**Interventi ultimati**

Interventi Ultimati A			
N. interventi	Stato	%	€
1	BR 015A/10 Fasano	71,4%	€ 1.500.000,00
2	Fg064A/10 Volturara Appula – Strada Amborchia	28,6%	€ 600.000,00
2	TOTALE interventi ultimati	100%	€ 2.100.000,00

## 8 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO ADP PER L'ANNUALITA' 2014

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014
Attesa di avvio (2° intervento di Casalnuovo Monterotaro x Creta Rossa)	n. 1*
Esecuzione studi ed indagini	n. 0
In corso di progettazione (entro 30.03.2014)	n. 5
Progettazione ultimata	n. 5

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Lavori aggiudicati/ in fase di aggiudicazione	n. 7
In esecuzione	n. 38
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 30
<b>Totale interventi finanziati *</b>	<b>86</b>

## 9 CRITICITA'

Nell'ambito dell'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, le criticità che si sono presentate possono essere così sinteticamente riassunte:

- La necessità di recuperare in tempi brevi il ritardo accumulato nella decisione sui cinque da "traslare", per i quali è in corso la progettazione finale ai fini dell'appalto;
- per gli interventi di mitigazione che interessano i corsi d'acqua Ofanto e Fortore, le risorse a disposizione sembrano non essere sufficienti a garantire un significativo effetto di mitigazione del rischio idrogeologico, almeno a livello di frequenza degli eventi alluvionali se non di classe di rischio;
- i tempi lunghi che sono occorsi per avviare la fase di progettazione di molti interventi a seguito dell'indisponibilità iniziale di molti Comuni a collaborare con il Commissario Delegato;
- alla fase di istruttoria di diversi progetti che si è dovuta necessariamente protrarre per più tempo del previsto per giungere ad un livello degli elaborati progettuali tale da poter essere portato in approvazione da parte del Commissario e degli Enti competenti;
- ad alcune criticità emerse in sede di approvazione di alcuni progetti relativamente ad alcuni aspetti idraulici o paesaggistico/architettonico, che hanno richiesto revisioni/modifiche progettuali per la loro definitiva approvazione.

## 10 ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base di tutto quanto in precedenza riportato e descritto, si possono esprimere le seguenti considerazioni conclusive:

- A seguito dell'Accordo di Programma del 25.11.2010 e del successivo D.P.C.M. di nomina del Commissario Straordinario delegato del 10.12.2010, le attività operative sono, di fatto, potute iniziare soltanto nel mese di Luglio 2012 a valle dell'erogazione della prime risorse economiche da parte del Ministero dell'Ambiente. Nel periodo Gennaio – Giugno 2011 è stata in ogni caso eseguita una verifica dello stato dell'arte degli interventi previsti nell'AdP, attraverso l'analisi dei questionari predisposti dalla struttura Commissariale e compilati dai Comuni interessati;

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

- a valle della fase conoscitiva di cui sopra, le attività operative sono state rallentate dalla difficile interlocuzione iniziale con i Comuni che ha rallentato la fase di acquisizione degli elaborati progettuali già esistenti necessari per la concreta realizzazione degli interventi stessi;
- dai progetti acquisiti è emerso un quadro reale del livello di progettazione estremamente scarno e poco affidabile che ha reso necessario adeguare alcuni progetti "definitivi" esistenti o, in molti casi redigerli *ex-novo*.
- tutta la fase di progettazione degli 84 interventi finanziati dalla Delibera CIPE n. 8/2012 ha richiesto una complessa attività istruttoria da parte della struttura commissariale comprensiva, obbligatoriamente, per prendere evidenza diretta dello stato dei luoghi e delle aree di realizzazione degli interventi, di sopralluoghi diretti sulle aree di intervento.
- in ultimo, secondo lo stato attuale delle attività riassunto sinteticamente al Cap. 7, e la previsione di cui al precedente Cap. 8, si può ragionevolmente supporre che le attività commissariali, considerata anche la proroga di cui al potranno essere completate almeno per il 95% degli interventi assegnati nell'Accordo di Programma del 25.11.2010, così come modificato dalla Delibera CIPE n. 8/2012 e dalle decisioni del Comitato di Indirizzo e Coordinamento del 7.10.2013, prevedendo allo stato attuale, l'impossibilità ad eseguirne alcuni per situazioni connesse all'effettiva efficacia nella mitigazione del rischio idrogeologico, o per criticità ambientali (paesaggistici-architettoniche-archeologiche).



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
*per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010*

**ALLEGATO 1**

**ELENCO RUP e SUPPORTI al RUP**

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23.11.2010"

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento	Decreto nomina commissariale	RUP Commissario	Supporto al RUP
FG009A/10 J25D12000120003	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi	n. 75 del 06/3/2013	Arch. Luigi Troso	Dott. Giuseppe Mazzoni
FG054A/10 J25D12000170003	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini	n. 76 del 06/3/2013	Arch. Luigi Troso	Dott. Giuseppe Mazzoni
BA011A/10 J65D12000100003	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento	n. 137 del 19/9/2012	Geom. Vito Nicola Sabatelli	Dott. Luigi D'Elia
FG002A/10 J35D12000060001	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	n. 186 del 04/12/2012	Geom. Leonardo Forgione	Dott. Francesco Matarrese
FG021A/10 J45D12000200003	Anzano di Puglia	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara	n. 183 del 04/12/2012	Geom. Giuseppe Di Paola	Dott. Oronzo Simone
FG068A/10 J45D12000220003	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo	n. 184 del 04/12/2012	Geom. Giuseppe Di Paola	Dott. Oronzo Simone
BA046A/10 J75D12000020001	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	n. 47 del 11/4/2012	Geom. Vincenzo Martimucci	Ing. Micaela Faieta
FG051A/10 J55D12000160003	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto	n. 306 del 17/09/2013	arch. Giovanni Papalillo	Sig.ra Stefania De Simoni
FG050A/10 J65D12000110003	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	n. 195 del 04/12/2012	Arch. Gioacchino Casamassima	Dott. Luigi D'Elia
BA049A/10 J95D12000060001	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord	n. 193 del 04/12/2012	Dott.ssa Tiziana Caggiano	Dott. Claudio Mariotti
FG010A/10 J75D12000040001	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino	n. 35 del 13/3/2012	Ing. Fedele Antonio Luisi	Sig.ra Stefania De Simoni
FG055A/10 J75D12000130003	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	n. 67 del 27/2/2013	Geom. Giuseppina Caterino	Sig.ra Stefania De Simoni + Dott. Michele Chieco

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

BA069A/10 J45D12000240003	Bitetto	Lavori sistemaz. idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	n. 158 del 17/10/2012	Ing. Giuseppe Sangirardi	Geom. Giuseppe Pugliese (Bitetto)
FG018A/10 J85D12000120001	Bovino	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. intervento funzionale - 1° Lotto	n. 220 del 04/12/2012 (supp. n. 57 del 26/2/2013)	Ing. Daniele De Cotiis	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG028A/10 J95D12000070003	Cagnano Varano	Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Francesco - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate	n. 35 del 13/02/2013 (supp. n.146 del 11/4/2013)	Arch. Antonio Di Nauta	Ing. Andrea Doria
FG006A/10 J15D12000060003	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	n. 205 del 04/12/2012	Geom. Salvatore Montemorra	Dott. Giuseppe Mazzoni
BT012A/10 J25D12000090001	Canosa	Interventi di consolidamento abitato Cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento	n. 109 del 4/9/2012	Arch. Cataldo Menduni	RTP Todisco Angelo e altri-Canosa
FG029A/10 J35D12000170003	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	n. 213 del 04/12/2012	Geom. Angelo Capozio	Sig.ra Vita Cavone
FG008A/10 J45D12000120001	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	n. 165 del 17/10/2012	Geom. Carlo Vallese	Dott. Giuseppe Laraia
FG070A/10 J55D12000170003	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara"	n. 424 del 07/11/2013	Dott.ssa Tiziana Caggiano	
FG031A/10 J85D12000180003	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	n. 161 del 17/10/2012	Arch. Gioacchino Casamassima	Dott. Giuseppe Mazzoni
FG071A/10 J85D12000210003	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)	n. 162 del 17/10/2012	Arch. Gioacchino Casamassima	Dott. Giuseppe Mazzoni
FG007A/10 J15D12000090003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento	n. 157 del 16/10/2012 (supp. n. 58 del 26/2/2013)	Ing. Antonio Perrella	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG084A/10 J15D12000160003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	n. 156 del 16/10/2012 (supp. n. 59 del 26/2/2013)	Ing. Antonio Perrella	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG003A/10 J25D12000080001	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma	n. 160 del 17/10/2012	Arch. Vincenzo Manzi	Dott.ssa Daniela Tedeschi

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

FG056A/10 J25D12000150003	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogni di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	n. 219 del 28/05/2013	M. Ilo Vito Girardi	Dott.ssa Daniela Tedeschi Ing. Micaela Faieta
FG032A/10 J35D12000180003	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)	n. 221 del 04/12/2012 (supp. n. 150 del 11/4/2013)	ing. Clorindo Izzillo	Dott.ssa Vania Cianciaruso
FG022A/10 J45D12000160003	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani	n. 104 del 24/7/2012 (supp. n. 188 del 04/12/2012)	Arch. Michele Longo	Sig.ra Stefania De Simoni
FG065A/10 J45D12000230003	Chieuti	Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna (Valle dell'Inferno)	n. 122 del 04/9/2012	Sig.ra Silvana Nuozzi	Dr.ssa Tiziana Caggiano
BR013A/10 J35D12000190003	Cisternino	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella"	n. 196 del 04/12/2012 (supp. n. 61 del 26/2/2013)	ing. Angela Bomba	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
BA014A/10 J55D12000100003	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	n. 62 del 03/5/2012 (supp. n. 216 del 04/12/2012)	Ing. Giuseppe Amorese	Dott.ssa Vania Cianciaruso
FG001A/10 J55D12000040001	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata	n. 222 del 04/12/2012	Geom. Pasquale Russo	Dott.ssa Vania Cianciaruso
FG057A/10 J55D12000130003	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle	n. 163 del 17/10/2012	Geom. Pasquale Russo	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG030A/10 J95D12000050001	ex Genio Civile Foggia	Interventi prioritari di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore, tratto sotteso dalla diga di Occhito I lotto	n. 143 del 10/4/2013	Geom. Sergio Gasparrelli	Ing. Andrea Doria
FG019A/10 J65D12000070001	Faeto	Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero"	n. 208 del 04/12/2012 (supp. n.145 del 11/4/2013)	Geom. Lorenzo Girardi	Dott. Luigi D'Elia
FG067A/10 J65D12000120003	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore	n. 211 del 04/12/2012 (supp. n.144 del 11/4/2013)	Geom. Lorenzo Girardi	Dott. Luigi D'Elia
BR015A/10 J55J12000000001	Fasano	Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica Lotto 1/A - Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare	n. 20 del 20/2/2012	Geom. Leonardo Angelini	Ing. Rosa Belfiore (Fasano)
BR016A/10 J55D12000050001	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto	n. 48 del 26/2/2013	Geom. Leonardo Angelini	Dr.ssa Tiziana Caggiano

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23/11/2010"

BR017A/10 J55D12000110003	Fasano	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto	n. 49 del 26/2/2013	Ing. Rosa Belfiore	Ing. Andrea Doria
BR058A/10 J55D12000140003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto	n. 47 del 26/2/2013	Geom. Leonardo Angelini	Dr.ssa Tiziana Caggiano
BR059A/10 J55D12000150003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto	n. 46 del 26/2/2013	Geom. Leonardo Angelini	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG020A/10 J75D12000120003	Foggia	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini- Progetto di completamento	n. 207 del 04/12/2012	Geom.Carmelo Fredella	Dott. Giuseppe Laraia
BA033A/10 J85D12000190003	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasantà)	n. 207 del 14/05/2013 (supp. N. 20 del 18/01/2013)	Ing. Onofrio Tragni	Dott. Francesco Matarrese
TA072A/10 J45D12000260003	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	n. 214 del 04/12/2012	Ing. Micaela Faieta	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
BA073A/10 J95D12000150003	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	n. 136 del 19/9/2012 (supp. n. 217 del 04/12/2012)	Ing. Carlo Colasuonno	Dott.ssa Daniela Tedeschi
FG034A/10 J95D12000090003	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino	n. 407 del 28/10/2013 (supp. n. n. 166 del 17/10/2012)	Arch. Francesco delli Muti	Dott. Luigi D'Elia
TA048A/10 J95D12000130003	Martina Franca	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Viale De Gasperi	n. 19 del 18/01/2013	Ing. Giuseppe Mandina	Dott. Oronzo Simone
TA047A/10 J25D12000140003	Massafra	Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico	n. 194 del 04/12/2012 (supp. n.....)	Arch. Luigi Traetta	Dott.ssa Loredana Valente
LE035A/10 J15D12000140003	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento	n. 199 del 04/12/2012 (supp. n. 63 del 26/2/2013)	ing. Antonio Rocco Cavallo	Dott. Luigi D'Elia
FG036A/10 J85D12000200003	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	n. 121 del 4/9/2012	Dott. Michele Sassone	Dott.ssa Vania Cianciaruso

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010"

FG074A/10 J85D12000220003	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento	n. 120 del 4/9/2012	Dott. Michele Sassone	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG075A/10 J95D12000140003	Orsara di Puglia	Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - 2° Stralcio	n. 203 del 04/12/2012 (supp. n. 149 del 11/4/2013)	Ing. Giorgio Castriota	Sig.ra Vita Cavone
FG037A/10 J15D12000150003	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	n. 197 del 04/12/2012 (supp. n. 18 del 18/01/2013)	ing. Giovanni Battista Vece	Dott. Michele Chieco
FG004A/10 J25D12000070001	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stoccegaggio, S.p. 138 Limitoni	n. 185 del 04/12/2012	Geom. Massimo De Luca	Dott. Francesco Matarrese
FG038A/10 J35D12000210003	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena	n. 305 del 17/09/2013	Geom. Rocco Elia Tavaglione	Dott. Michele Chieco
FG060A/10 J35D12000230003	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale	n. 304 del 17/09/2013	Arch. Massimo D'Adduzio	Dott. Michele Chieco
FG023A/10 J45D12000170003	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento	n. 237 del 01/07/2013	Geom. Francesco Gesualdo	Dott. Giuseppe Mazzoni
FG062A/10 J45D12000250003	Pietramontecorvino	Intervento di messa in sicurezza del versante collinare S. Pardo - 2° lotto funzionale	n. 425 del 07/11/2013	Dott.ssa Tiziana Caggiano	
BT027A/10 J35D12000050001	Provincia BT	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce	n. 187 del 23/04/2013	ing. Vincenzo Guerra	/
BA076A/10 J35D12000220003	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale	n. 135 del 19/9/2012 (supp. n. 204 del 04/12/2012)	Ing. Pietro Savoia	Sig.ra Stefania De Simoni
FG077A/10 J65D12000150003	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro	n. 139 del 19/9/2012	Geom. Pio D'Atti	Dott.ssa Daniela Tedeschi
FG039A/10 J75D12000090001	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi	n. 351 del 15/10/2013 (supp. n. 16 del 18/01/2013)	Dott.ssa Tiziana Caggiano	Dott. Francesco Matarrese
FG078A/10 J75D12000140003	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"	n. 350 del 15/10/2013 (supp. n. 17 del 18/01/2013)	Ing. Micaela Faieta	Dott. Francesco Matarrese

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

FG044A/10 J95D12000100003	Roseto Valfortore	Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo	n. 192 del 04/12/2012	Ing. Fedele Antonio Luisi	Sig.ra Stefania De Simoni
FG040A/10 J35D12000200003	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"	n. 187 del 04/12/2012 (supp. n. 147 del 11/4/2013)	ing. Michele Chiumento	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG026A/10 J45D12000190003	San Marco la Catola	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto	n. 215 del 04/12/2012	geom. Valter Pellegrino	Dott.ssa Vania Cianciaruso
FG066A/10 J65D12000140003	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico	n.285 del 23/08/2013 (supp. n. 209 del 04/12/2012 + n.292 del 03/09/2013)	Geom. Luigi Gianfrancesco	Sig.ra Vita Cavone + ing. Andrea Doria
FG079A/10 J65D12000130003	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina	n. 293 del 03/09/2013	Geom. Luigi Gianfrancesco	Ing. Andrea Doria
BR053A/10 J55D12000120003	San Pietro Vernotico	Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il canale Infocaciucci	n. 384 del 25/10/2013	Ing. Michele Zaccaria	Ing. Andrea Doria
FG052A/10 J85D12000230003	Sant'Agata di Puglia	Lavori di consolidamento v ersante Via Pagano-Gizzoli-Via della Libertà. Progetto di completamento	n. 189 del 04/12/2012 (supp. n. 148 del 11/4/2013)	Ing. Michela Benedetto	Dott. Giuseppe Mazzoni
LE083A/10 J15D12000170003	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale	n. 218 del 04/12/2012 (supp. n. 52 del 26/2/2013)	Arch. Arturo Contaldo	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
LE045A/10 J25D12000040001	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli	n. 43 del 26/3/2012 (supp. n. 145 del 3/10/2012)	Geom. Mario Antonio Carluccio	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG041A/10 J95D12000120003	Serracapriola	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio. Progetto di completamento	n. 37 del 13/02/2013	Geom. Pasquale Pallamolla	Dott. Oronzo Simone
FG061A/10 J95D12000170003	Serracapriola	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. Progetto di completamento	n. 36 del 13/02/2014	Geom. Luigi Ferrero	Dott. Oronzo Simone
BA042A/10 J15D12000100003	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonasiere - lotto di Completamento	n. 219 del 04/12/2012 (supp. n. 12 del 18/01/2013)	Arch. Francesco Gianferrini	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG024A/10 J55D12000090003	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo	n. 182 del 04/12/2012 (supp. n. 51 del 26/2/2013)	Ing. Antonio Fernando Manigrasso	Dott.ssa Vania Cianciaruso



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23.11.2010"

FG063A/10 J55D12000180003	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto	n. 190 del 04/12/2012 (supp. n. 50 del 26/2/2013)	Ing. Antonio Fernando Manigrasso	Dott.ssa Vania Cianciaruso
LE080A/10 J25D12000160003	Veglie	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale	n. 55 del 26/02/2013	Arch. Antonio Anglano	Dott. Oronzo Simone
FG043A/10 J65D12000080001	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale	n. 341 del 14/10/2013 (supp. n. 144 del 3/10/2012)	Arch. Luigi Troso	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG081A/10 J65D12000160003	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino	n. 54 del 26/02/2013	Ing. Micaela Faieta	Dott. Francesco Matarrese
FG005A/10 J85D12000170003	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento	n. 387 del 25/10/2013	Geom. Pasquale Quarato	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG005_1A/10 J84B12000420006	Volturara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio	n. 388 del 25/10/2013	Ing. Michele De Rosa	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG064A/10 J85D12000240003	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia	n. 124 del 4/9/2012 (supp. n. 212 del 04/12/2012)	Ing. Micaela Faieta	Sig.ra Vita Cavone
FG025A/10 J95D12000110003	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	n. 426 del 07/11/2013	Dott.ssa Tiziana Caggiano	
FG082A/10 J95D12000160003	Volturino	Sistemazione e consolidamento versante in frana Loc. Lame-Fontana Vecchia	n. 56 del 26/02/2013	Geom. Giuseppe Clemente	Dott.ssa Daniela Tedeschi

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO 2**

**QUADRO GARE SVOLTE/IN CORSO**

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA




BIANCHI PIETRA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"Per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma originario n. 251/2010"

BRUNSAVITE	FASANO	LAVORI ingegneria	OG13 III	€1.500.000,00	decreto n. 41 del 26 marzo 2012	€1.500.000,00	€511.199,84	€3.788,50	Geom. Leonardo Angelini	Decreto n. 45 del 28 marzo 2012 Decreto n. 48 del 12 aprile 2012 (apertura Termini) Decreto Commissariale n. 81 del 19 giugno 2012 Decreto Commissariale n. 106 del 30 luglio 2012	n. da 107 a 116 da 259/03/2012 n. da 185 a 186 del 13/04/2012	12/04/2012 24/04/2012
FRANZITTO	BICCARI	INDAGINI	INDAGINI	€4.600.000,00	Decreto n. 69 del 22 maggio 2012	€19.896,41	€19.789,95	€104,46	Ing. Fedele Antonio Luisi	Decreto Commissariale n. 81 del 19 giugno 2012 Decreto Commissariale n. 106 del 30 luglio 2012	n. da 243 a 253 del 20/06/2012	ore 12:00 del 30.07.2012
FRANZITTO	SECLY FASE I	INDAGINI relative al rischio idrogeologico	INDAGINI	€3.690.000,00	Decreto Commissariale n. 70 del 22 maggio 2012	€19.891,25	€19.891,25	€0,00	Geom. Mario Carluccio	Decreto Commissariale n. 106 del 30 luglio 2012	n. da 286 a 296 del 31/07/2012	04/09/2012
FRANZITTO	SECLY FASE II	INDAGINI relative al rischio idrogeologico	INDAGINI	€3.690.000,00	Decreto Commissariale n. 70 del 22 maggio 2012	€72.250,98	€69.730,98	€2.520,00	Geom. Mario Carluccio	Decreto Commissariale n. 107 del 30 luglio 2012	n. da 297 a 307 del 31/07/2012	04/09/2012
FRANZITTO	Altamura Fase I	INDAGINI relative al rischio idrogeologico	INDAGINI	3.000.000,00	Decreto Commissariale e n. 105 del 24 luglio 2012	€94.524,58	€94.524,58	€0,00	Geom. Vincenzo Mantucci	Decreto Commissariale n. 107 del 30 luglio 2012	n. da 320 a 350 del 18/09/2012	01-ott-12
FRANZITTO	Altamura Fase II	INDAGINI relative al rischio idrogeologico	INDAGINI	3.000.000,00	Decreto Commissariale e n. 105 del 24 luglio 2012	€75.070,31	€74.340,31	€730,00	Geom. Vincenzo Mantucci	Decreto Commissariale n. 126 del 8 settembre 2012	n. da 331 a 341 del 18/09/2012	01-ott-12
FRANZITTO	ALBERBELLO	INDAGINI relative al rischio idrogeologico	INDAGINI	3.000.000,00	Decreto Commissariale e n. 155 del 16 Ottobre 2012	€22.695,77	€22.591,31	€104,46	Geom. Nicola Sabatelli	Decreto n. 167 del 29 ottobre 2012	n. 952 del 29/10/2012	13-nov-12
FRANZITTO	CHEJUTI FASE I	INDAGINI relative al rischio idrogeologico	INDAGINI	2.290.000,00	Decreto Commissariale e n. 154 del 16 Ottobre 2012	€77.707,94	€77.603,48	€104,46	Arch. Michele Longo	Decreto 172 del 15 novembre 2012	n. 979 del 15/11/2012	26-nov-12
FRANZITTO	CHEJUTI FASE 2	INDAGINI relative al rischio idrogeologico	INDAGINI	2.290.000,00	Decreto Commissariale e n. 154 del 16 Ottobre 2012	€16.888,60	€16.888,60	€0,00	Arch. Michele Longo	Decreto 172 del 15 novembre 2012	n. 1003 del 16/11/2012	26-nov-12
FRANZITTO	Voturrara Appia	LAVORI ingegneria	OS21 II	€600.000,00	Decreto n. 230 del 12 dicembre 2012	€410.893,49	€410.084,59	€808,90	Ing. Micaela Faieta	DECRETO COMMISSARIALE n. 33/13 del 11/02/2013	n. 7/13 del 11/2/2013	ore 9:00 del 22 febbraio 2013

Handwritten signature or mark

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXVII N. 19 VOL. I



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nel Accordo di Programma signed il 25.11.2010

Table with 15 columns: Municipality, Description, Code, Budget, Date, Status, Amount, Date, Amount, Date, Date, Amount, Date, Date, Date. Rows include municipalities like OFITE NOV3, RIGNANO GARGANICO, BARI, CASTELLUCCIO VALMAGGIORE, LECCE DI SAN VITO, BIRETTO, ALCERONA (FG), CELE DI SAN VITO, TERLIZZI (BA), CASTELLUCCIO VALMAGGIORE, SAN MARCO LA FOGLIA (FG), CANOSA (BT), and VICO DEL GARGANO.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXVII N. 19 VOL. I



REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'accordo di Programma siglato il 25/11/2013

Table with columns for Province (e.g., FOGGIA, BARI, BRINDISI), Municipality (e.g., FAETO, SERRACAPRIOLA, AScoli SATRIANO), Work Type (e.g., LAVORI, LAVORI), Budget (e.g., €500.000,00), and Administrative Details (e.g., Decreto, Commissariale).

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXVII N. 19 VOL. I



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23/11/2016

Table with columns: PROV. (e.g., CELENZA, FOGGIA), DESCRIZIONE (e.g., Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare), CODICE (e.g., OS21.III), VALORI (e.g., €1.578.584,06), DATA (e.g., 17/10/2013), and other administrative details.

Handwritten signature or initials



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXVII N. 19 VOL. I



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PIEMONTE

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Piemonte previsti nell'Accordo di Programma stipulato il 23.11.2010

Table with columns: Cod. Progr., Denominazione, Descrizione, Stato, Data, Importo, Beneficiario, Note, etc. Rows include projects like 'Sistemazione idraulica strada S. Jaco' and 'Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di S. Jaco'.

Stipulato il 23/11/2010. Commis. n. 189 del 06 marzo 2013. Decreto n. 58/04/2013.

Handwritten mark resembling the number '2'.

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex DPCM 10 dicembre 2010 e OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1 e s.m.i.

**RELAZIONE DI DETTAGLIO**  
**DAL 10.12.2010 AL 10.11.2013**

**Palermo, 15.11.2013**

PAGINA BIANCA



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

## SOMMARIO

- 1**   **PREMESSA**
- 2**   **ASPETTI GENERALI ACCORDO DI PROGRAMMA**
  - 2.1   ACCORDO DI PROGRAMMA ORIGINARIO
  - 2.2   ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
- 3**   **CONVENZIONI**
- 4**   **ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTE**
  - 4.1   ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RIPARTIZIONE ANNUALE DELLE RISORSE
  - 4.2   ALBO PROFESSIONISTI
  - 4.3   ALBO IMPRESE
  - 4.4   Costituzione Piattaforma Informatica E-Procurement
  - 4.5   Attività di Gara da MARZO 2011 a NOVEMBRE 2013
    - 4.5.1 Aspetti Generali: Copertura finanziaria
    - 4.5.2.   Delibera CIPE
    - 4.5.4   GARE INTERVENTI LETTERA A PREVISTI NELL'ADP:
    - 4.5.6.   GARE INTERVENTI LETTERA B
- 5**   **STATO DELL'ARTE**
  - 5.1   INTERVENTI LETTERA A (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)
  - 5.2   INTERVENTI LETTERA B (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)
- 6**   **CONCLUSIONI**

PAGINA BIANCA



Il Commissario Straordinario Delegato



## 1 PREMESSA

La presente relazione illustra le attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato, finalizzate all'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, inseriti nell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 30 marzo 2010 (allegato 1) e del successivo atto integrativo siglato il 3 maggio 2011 (allegato 2). In particolare, le attività nel seguito descritte sono state espletate dal 10.12.2010, data di conferimento dell'incarico allo scrivente Commissario, ex D.P.C.M. del 10.12.2010 (allegato 3) successivamente integrato con D.P.C.M. del 20/07/2011 (allegato 4), al 10.11.2013.

## 2 ASPETTI GENERALI ACCORDO DI PROGRAMMA

### 2.1 ACCORDO DI PROGRAMMA ORIGINARIO

L'Accordo di Programma ed il successivo atto integrativo sono finalizzati alla programmazione, finanziamento e attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi nella Regione Sicilia è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo pari a € **152.692.572,11**, a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera A**, e da fondi europei stanziati dalla Regione Sicilia, nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, per un importo di € **151.644.604,81**, a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera B**, per un importo complessivo pari a € **304.337.176,92**.

L'art. 8 dell'A.d.P. prevede, inoltre, la costituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo, organo collegiale chiamato, tra l'altro, a definire eventuali rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie accertate sugli stessi - compresi i ribassi d'asta - nonché a definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.

A tal proposito, in data 17 ottobre 2010, il suddetto Comitato, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella zona di Giampileri (ME) e di S. Fratello (ME), ha deliberato di far transitare le risorse finanziarie, originariamente previste sui fondi regionali (elenco B), sulle risorse statali (elenco A) relativamente agli interventi ME087 Giampileri "Opere di consolidamento località Giampileri" di importo pari a € **24.000.000,00** e ME 107 San Fratello "Opere di consolidamento centro abitato per un importo € **18.000.000,00**.

Successivamente, a seguito dell'O.P.C.M. 3886 del 9 luglio 2010, i suddetti interventi identificati con la lettera A sono stati gestiti direttamente dal Commissario Delegato di cui all'O.P.C.M. 3815

Pag. 3 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

del 10 ottobre 2009. Con la medesima O.P.C.M. il Commissario è stato nominato Soggetto Attuatore per l'attuazione degli interventi previsti in AdP avvalendosi dei poteri previsti dall'O.P.C.M. 3815/09.

## 2.2 ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

A seguito della registrazione alla Corte dei Conti dell'Accordo integrativo del 3 maggio 2011 altre risorse, a valere sui Fondi FAS, sono state destinate alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per complessivi € 21.251.185,84 di cui € 12.756.002,61 a valere sulle risorse ministeriali stanziato con Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed € 8.495.183,23 a valere sui fondi della Regione Sicilia del Programma Operativo FESR 2007/2013, linea di intervento 2.3.1.1.

Atto integrativo all'Accordo di programma		
Interventi lettera A	€	12.756.002,61
Interventi lettera B	€	8.495.183,23
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>21.251.185,84</b>

Le risorse complessive stanziato per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano, pertanto, ad € 325.588.362,76, ripartiti tra fondi Ministeriali e Regionali come riassunto nella tabella seguente.

Fondi Ministeriali (lettera A)		
AdP	€	152.692.572,11
AdP integrativo	€	12.756.002,61
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>165.448.574,72</b>
Fondi Regionali (lettera B)		
AdP	€	151.644.604,81
AdP integrativo	€	8.495.183,23
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>160.139.788,04</b>

Si rappresenta che nel transito di interventi tra le due diverse coperture finanziarie si è cercato di rispettare, per quanto possibile, gli stanziamenti del Ministero e della Regione, cosicché, a fronte di un finanziamento statale complessivo pari a € 165.448.574,72 (AdP + Atto integrativo) gli interventi identificati dalla lettera A risultano gravare per un onere complessivo pari a € 165.361.376,61, mentre gli interventi ricadenti nella lettera B risultano gravare per un importo complessivo pari a € 160.226.986,15.





Il Commissario Straordinario Delegato



### 3 CONVENZIONI

L'art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010 prevede che per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario Straordinario Delegato possa avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi e delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

Come specificatamente previsto dal suddetto art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, potendo lo stesso Commissario avvalersi per la realizzazione degli interventi anche di società specializzate a totale capitale pubblico, in data 18 febbraio 2011 è stata sottoscritta una specifica convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia S.p.A.<sup>1</sup> [Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A, di seguito denominata "INVITALIA" o Agenzia], riguardante attività funzionali e/o di assistenza tecnico – amministrativa - e specialistica .

In particolare:

nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa, l'Agenzia garantisce la progettazione ed il supporto nelle attività di predisposizione ed affidamento delle procedure di gara (anche ricorrendo a strumenti informatici dedicati) e di progettazione, e nelle fase esecutiva dei lavori e di collaudo. L'Agenzia si impegna, inoltre, a predisporre tutta la documentazione necessaria per l'adempimento, da parte del Commissario, degli oneri informativi al medesimo spettanti nei confronti del Parlamento, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, della Regione Sicilia, del Comitato di gestione e di indirizzo per la gestione dell'Accordo, dell'ISPRA, del Repertorio Nazionale degli Interventi per la difesa del suolo (ReNDiS).

nell'ambito delle attività di supporto tecnico-logistico, l'Agenzia assicura tra l'altro la presenza di un Ufficio a Palermo ed uno a Roma di supporto alle attività del Commissario Delegato, mettendo a disposizione almeno 10 risorse, tra competenze di carattere senior e competenze di carattere junior. Il suddetto personale opera all'interno di uno specifico gruppo di lavoro, le cui caratteristiche esatte, nonché le modalità operative, sia tecniche che amministrative, sono previste in uno specifico Piano esecutivo annesso alla Convenzione stessa.

<sup>1</sup> società a totale capitale pubblico, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari. L'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, Invitalia si avvale, come previsto nel citato D.lgs 1/99, della propria controllata Invitalia Attività Produttive S.p.A. (per brevità nel seguito IAP, già Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.), che è in possesso di specifiche ed adeguate competenze ed esperienze, acquisite durante la pluriennale collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con diversi Commissari Delegati, nel settore della progettazione e gestione di interventi ambientali<sup>2</sup>.

Nel seguito viene riportata una tabella riassuntiva in cui vengono elencati gli interventi di cui IAP sta curando la progettazione:

n.	PRO V	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO A4P	nota di incarico	Stato
1	CT	<u>36</u>	Ramacca	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato	€ 1.200.000	prot.255/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
2	EN	<u>44</u>	Gagliano Castelferrato	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga	€ 800.000	prot.252/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Intervento sospeso
3	ME	<u>49</u>	Alcara Li Fusi	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimazione acque - C.da Cappuccini	€ 1.200.000	prot.253/UC e 257/UC del 08.03.2011	Progettazione conclusa
4	ME	<u>81</u>	Librizzi	Opere di consolidamento versante e sistemazione - Zona Ronco Marurà	€ 500.000	prot. 254/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
5	PA	<u>180</u>	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi	€ 90.000	prot. n. 2711/UC del 01.12.2011	Progettazione consegnata In attesa acquisizione progetti
6	PA	<u>181</u>	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi	€ 400.000	prot. n. 2713/UC del 02.12.2011	Progettazione consegnata In attesa acquisizione progetti
7	ME	<u>71</u>	Frazzanò	Monitoraggio delle aree in frana del centro abitato e delle aree ad elevato rischio idrogeologico (R4)	€ 300.000	prot. 10/UC del 10 gennaio 2012	Progettazione conclusa
8	ME	<u>109</u>	San Pier Niceto	Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato	€ 600.000	Progettazione: prot. 425/UC del 10 febbraio 2012	Progettazione conclusa

<sup>2</sup> Dal 1° dicembre 2011 Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. ha assunto la nuova denominazione "Invitalia Attività Produttive S.p.A.", incorporando per fusione anche la ex Invitalia Reti S.p.A.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

n.	PRO V	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico	Stato
9	ME	099*	Piraino	Opere di consolidamento –San Leonardo	€ 685.305,38	prot.256/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
10	ME	099*	Piraino	Opere di San Costantino	€ 414.694,62	prot.256/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
11	CT	<u>023</u>	Calatabiano	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria	€ 250.000	prot. n. 667/UC del 28 febbraio 2012	Progettazione conclusa
12	ME	<u>91</u>	Mirto	Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000	prot.294/UC del 11 marzo 2011	Progettazione conclusa
13	ME	<u>132</u>	Ucria	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – Zona via Annunziata	€ 2.500.000	prot.621/UC del 03.05.2011	Progettazione conclusa
14	SR	<u>186</u>	Porto Palo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000	prot. 533/UC del 20 febbraio 2012	Progettazione conclusa
15	SR	<u>163</u>	Pachino	Intervento in Contrada Raneddi	€ 2.000.000	prot.621/UC del 03.05.2011	In attesa acquisizione pareri
16	ME	<u>79</u>	Librizzi	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale	€ 2.150.000	prot.2514/UC del 15 novembre 2011	Progettazione conclusa
17	ME	<u>115 3</u>	Sant'Angelo di Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano	€ 1.200.000	prot. 425/UC del 10 febbraio 2012	Progettazione conclusa
18	SR	<u>162</u>	Carlentini	Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000	prot. n. 1343/UC del 20/04/2012	Progettazione conclusa
19	PA	<u>142</u>	Carini	Barriera paramassi zona industriale – Monte Columbrina	€ 1.000.000	Nota prot.520/UC del 18.04.2011	Progettazione conclusa



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

n.	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico	Stato
20	ME	<u>177</u> Int	Brolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto	€ 600.000	Nota prot. n. 1336/UC del 19.04.2012	Progettazione conclusa
21	ME	<u>119</u>	Sinagra**	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò	€ 3.000.000	Nota prot. 295/UC del 11.03.2011	Progettazione conclusa
22	PA	<u>143</u>	Castelbuono	opere di drenaggio e consolidamento C.da Liccia	€ 2.000.000	prot. n. 4370 del 26.10.2012	Progettazione conclusa
23	AG	<u>174</u>	Cattolica Eraclea	Crolli costone roccioso centro abitato Località Zagarella" Cod. PAI 064 1CE 001	€ 1.170.000	prot. n. 4370 del 26.10.2012	Progettazione conclusa
24	TP	190B	San Vito Lo Capo	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00	Nota del 04 giugno 2013 prot. n. 3260/UC	In fase di progettazione

Si riporta inoltre, nella tabella che segue gli interventi per i quali il Commissario ha provveduto ad affidare ad IAP incarichi differenti dalla progettazione:

n.	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico
1	CL	<u>20</u>	Serradifalco	Consolidamento centro abitato	€ 1.700.000	prot. 1829/UC del 21.09.2011: monitoraggio
2	ME	<u>92</u>	Mistretta	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta - Torrente Santa Domenica	€ 800.000	Piano di indagini: prot.1979/UC del 04 ottobre 2011 e prot. n. 2136/UC del 18 ottobre 2011

Qui di seguito, infine, gli interventi per i quali il Commissario ha provveduto a revocare l'incarico di progettazione:

PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico
CT	<u>21</u>	Acicatena	Opere di Consolidamento del Centro Abitato località Vanpolieri	€ 4.500.000	prot. n. 621/UC del 03.05.2011
ME	<u>88</u>	Messina	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 3.000.000	prot.1828/UC del 21 settembre 2011

Pag. 8 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

ME 100 Raccuja *Opere di consolidamento – Zona Centro abitato:  
"Progetto degli interventi di prima attuazione  
per la mitigazione del rischio idrogeologico"* da definire prot. 425/UC del 10 febbraio 2012

Sono state, inoltre, stipulate le seguenti convenzioni con Enti pubblici:

- 1) Convenzione con il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria stipulata in data 28.10.10.

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
ME	113	Santa Marina Salina	A	Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro	€ 2.000.000,00
ME	124	Terme Vigliatore	B	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00
ME	130	Tusa	B	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00
TP	169	Mazara del Vallo	A	Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona Tonnarella	€ 800.000,00
TP	189	Mazara del Vallo	A	Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale – I stralcio	€ 2.000.000,00

- 2) **Protocollo d'intesa** per l'accelerazione delle procedure di cui agli articoli 19 e ss. del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii., in relazione ai progetti relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia di cui all'allegato 1 dell'Accordo di Programma, stipulato con il Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 VIA/VAS – dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana in data 28.10.10.

- 3) **Convenzione con il Servizio Provinciale di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 10.11.10.

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
PA	136	Belmonte Mezzagno	A	Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano	€ 3.000.000,00
PA	156	Termini Imerese	A	Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto	€ 800.000,00

4) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento** stipulata in data 10.11.10.

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
AG	001	Agrigento	A	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	€ 2.000.000,00
AG	006	Favara	A	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis	€ 1.500.000,00

5) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Palermo** stipulata in data 11.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
PA	140	Camporeale	B	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00
PA	150	Palermo	B	Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli	€ 4.300.000,00
PA	154	Polizzi Generosa	A	Opere di consolidamento – Zona via G.Borgese	€ 500.000,00

6) **Convenzione con il Servizio Provinciale di Siracusa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 12.11.10.

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
SR	161	Avola	A	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da Cavagrande del Cassibile	€ 600.000,00

7) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa** stipulata in data 15.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

8) **Convenzione con il Comune di Valledolmo** stipulata in data 17.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, funzioni di stazione appaltante, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
PA	157	Valledolmo	A	Opere di consolidamento - C.da Renella	€ 500.000,00

9) **Convenzione con il Comune di Ficarra** stipulata in data 18.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, funzioni di stazione appaltante, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
ME	065	Ficarra	B	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Grenne	€ 1.028.981,00

10) **Convenzione Servizio Provinciale di Catania del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 18.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
CT	<u>031</u>	Misterbianco	A	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo	€ 500.000,00
CT	<u>033</u>	Piedimonte Etneo	A	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa	€ 500.000,00

Pag. 11 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

**11) Convenzione Servizio Provinciale di Trapani del Dipartimento Regionale della Protezione Civile stipulata in data 18.11.10**

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
TP	<u>168</u>	Erice	A	Consolidamento costone roccioso – Zona Crocifissello	€ 500.000,00
TP	<u>172</u>	San Vito Lo Capo	A	Collocazione rete paramassi – Zona Makari	€ 450.000,00

**12) Convenzione Ufficio del Genio Civile di Trapani stipulata in data 26.11.10**

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	Intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
TP	173	Trapani	B	Opere di regimazione idraulica – Zona Salinagrande	€ 4.000.000,00

**13) Convenzione con il Dipartimento Di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Catania stipulata in data 12.09.11 per "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini di un tratto di mare prospiciente il Comune di Pachino (SR)" e la "realizzazione di un modello d'onda di larga scala del settore di mare della Sicilia sud orientale relativamente all'intervento SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" – Comune di Pachino (SR).**

**14) Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Messina stipulata in data 14.09.11 "Analisi diacronica e delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra la punta Castellazzo e Punta delle Formiche" relativamente all'intervento SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" – Comune di Pachino (SR).**

**15) Convenzione con la DHI -Italia stipulata in data 16.11.11 per "Acquisizione e processamento dei dati del modello d'onda del Mar Mediterraneo di Met – Office per tre celle situate a largo della Costa Sud – Orientale della Sicilia" e la "realizzazione di un modello d'onda di larga scala**





Il Commissario Straordinario Delegato



del settore di mare della Sicilia sud orientale” relativamente all’intervento SR 163 “Interventi in contrada Raneddi” – Comune di Pachino (SR).

**16) Convenzione con Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo stipulata in data 30.11.11**

**Contenuti:**

- a. *Rilievo con tecniche da terra, aeree e da satellite di dati territoriali ed ambientali. In particolare, questa attività prevede in fase di rilievo l'utilizzo di GPS, laser scanner, camere fotogrammetriche, videocamere digitali, sensori iperspettrali, sensori IR ed in fase di post-processing l'impiego dei più evoluti sistemi software di elaborazione oltre che codici di calcolo appositamente realizzati;*
- b. *Post-processing di dati disponibili e/o rilevati, anche con modelli e procedure previsionali e di tipo anche statistico, al fine di pervenire alla definizione delle zone o delle situazioni di rischio per le quali provvedere, quindi, alla valutazione della vulnerabilità ambientale e territoriale legata ad eventi naturali ed antropici relativamente ad aree urbanizzate e non urbanizzate, con particolare riguardo al rischio: sismico, idrogeologico, idraulico (piene e siccità) e di incendio;*
- c. *Sistema di monitoraggio del territorio per il controllo dei diversi fattori di rischio con la redazione di mappe dinamiche per la definizione della vulnerabilità delle risorse del territorio e dei possibili scenari previsionali;*
- d. *Interventi di rilevamento delle condizioni di sicurezza del costruito e delle infrastrutture (strade, ferrovie e acquedotti, ecc.) con priorità per quelli di importanza strategica, con tecniche di rilievo innovative al fine di rilevarne il grado di vulnerabilità e pericolosità in relazione a possibili eventi calamitosi e prefigurarne l'eventuale intervento di adeguamento occorrente;*
- e. *Progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo per le emergenze che permetta una gestione informatizzata di tutte le attività connesse con le problematiche di intervento sul territorio sia in situazioni ordinarie sia in condizioni di allerta;*
- f. *Supporto all'organizzazione ed istituzione di unità di crisi e sale operative, intese come sistema composto dal personale, locali, ed attrezzature, tecnologie, metodologie, finalizzate alla gestione delle emergenze;*
- g. *Man power dedicato e/o a tempo da adibire a mansioni specialistiche di acquisizione, elaborazione, restituzione dati;*
- h. *Mezzi (aereo ed elicottero) per la ricognizione aerea, ove necessario equipaggiati con adeguata strumentazione per l'indagine e l'osservazione, da impiegare anche per interventi con carattere di urgenza;*
- i. *Attività finalizzate al coinvolgimento in progetti e al reperimento di fondi in ambito nazionale ed internazionale."*

**Progetti assegnati:**

Pag. 13 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO AdP
AG	174	Cattolica Eraclea	B*	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)	€ 1.170.000,00
ME	079	Librizzi	A	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale	€ 2.150.000,00
ME	081	Librizzi	A	Opere di consolidamento versante e sistemazione - Zona Ronco Marurà	€ 500.000,00
ME	091	Mirto	A	Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000,00
ME	099	Piraino	A	Opere di consolidamento - Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole	€ 1.100.000,00
ME	100	Raccuja	A	Opere di consolidamento - Zona Centro abitato	€ 5.000.000,00
ME	115_3	Sant'Angelo di Brolo	A	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano	€ 2.500.000,00
ME	119	Sinagra	A	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò	€ 3.000.000,00
ME	120	Sinagra	A	Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini	€ 1.000.000,00
ME	132	Ucria	A	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio - Zona via Annunziata	€ 2.500.000,00
ME	177_Int	Brolo	A	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto	€ 600.000,00
PA	142	Carini	A	Barriere paramassi - Zona Industriale	€ 1.000.000,00
PA	149	Misilmeri	A	Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa	€ 2.000.000,00
PA	179	Altofonte	A	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 600.000,00
PA	181	Cefalù	A	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	€ 400.000,00
SR	162	Carlentini	A	Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000,00
SR	186	Portopalo di Capo Passero	A	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00

Pag. 14 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO AdP
SR	187	Rosolini	A	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	€ 1.800.000,00
TP	190	San Vito Lo Capo	B*	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00

17) **Protocollo di intesa con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo** stipulato in data 15.03.12 per la collaborazione nell'analisi dei dati esistenti di geologia marina nell'offshore della Sicilia Sud orientale per l'individuazione delle strategie ottimali finalizzate al reperimento di giacimenti sommersi di sabbie da utilizzare nel ripascimento di spiagge in arretramento.

18) **Convenzione con l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero UOS di Capo Granitola del Consiglio Nazionale Delle Ricerche** stipulata in data 18 aprile 2012 per il "Progetto di ricerca finalizzato all'individuazione di sabbie relitte sulla piattaforma Siciliana nell'area prospiciente il golfo di Gela".

19) **Convenzione con l'Azienda Regionale Foreste Demaniali** stipulata in data 06.09.12.

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, funzioni di stazione appaltante, direzione lavori e collaudi, assistenza tecnico-amministrativa.

Infine, in virtù del predetto art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, nel corso del 2011 il Commissario Straordinario Delegato ha sottoscritto, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nello svolgimento delle proprie attività, ***l'Accordo con il Soggetto Attuatore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia*** (gennaio 2011) e ***l'Accordo con il Soggetto Attuatore per l'Emergenza Isola di Lampedusa*** (giugno 2011) "per l'interscambio di risorse tecnologiche e operative, finalizzato alla migliore esecuzione delle attività istituzionali di competenza".



Il Commissario Straordinario Delegato



## 4 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTE

### 4.1 ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RIPARTIZIONE ANNUALE DELLE RISORSE

In primo luogo, a seguito di una serie di incontri effettuati con i singoli Comuni, con tutte le Amministrazioni e gli Enti convenzionati di cui al precedente paragrafo si è proceduto ad una istruttoria preliminare della documentazione tecnico – amministrativa relativa ai singoli interventi, ed in particolare in ordine alle seguenti priorità:

- stato e livello della progettazione disponibile;
- eventuali incarichi esterni affidati;
- importo aggiornato degli interventi (suddiviso ove possibile tra lavori, somme a disposizione ed IVA);
- vincoli e livello/stato delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere;
- presenza o meno del RUP dell'intervento, ed eventuale nomina;
- disponibilità o meno delle aree di intervento (occupazione dei suoli);
- eventuali lavori già affidati;
- eventuale previsione di affidamento interno alle Amministrazioni di attività di progettazione e gestione dell'intervento (ex comma 5, art. 92 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.);
- eventuale previsione di quota del finanziamento da destinare alla struttura commissariale per la gestione degli interventi;
- predisposizione di note in risposta dovute all'analisi di dati trasmessi.

In particolare, nell'ambito dell'attività propedeutica al finanziamento degli interventi, la struttura Commissariale ha effettuato un'azione di coordinamento tra gli Enti incaricati della progettazione esecutiva e le Amministrazioni Comunali interessate, che in sintesi sono consistite:

- Coordinare e presenziare Conferenze dei Servizi (n. 25 nel corso del 2011, n. 44 nel corso del 2012 e n. 42 alla data del 10.11.2013);
- Coordinare e presenziare tavoli tecnici (n. 18 nel corso del 2011, n. 8 nel corso del 2012 e n. 15 alla data del 10.11.2013);
- Convocare gli Enti coinvolti nella progettazione di diversi interventi al fine di porre in essere iniziative utili al superamento di tutte le problematiche tecnico-amministrative;
- Promuovere azioni necessarie ad incentivare la progettazione esecutiva degli interventi inseriti nell'AdP.

### 4.2 ALBO PROFESSIONISTI

In ottemperanza alla normativa vigente è stato predisposto l'Elenco di operatori economici a cui affidare incarichi di **progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006.**

Pag. 16 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

In data 20 aprile 2011, con Decreto Commissariale n° 55, è stato emanato il Bando per la istituzione presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'**Elenco dei professionisti** cui affidare i suddetti incarichi.

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo del Commissario Straordinario, **517 richieste** da parte di professionisti.

In data 20 luglio 2011 è stato pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) l'elenco delle richieste pervenute.

Il suddetto Elenco è stato suddiviso in ragione delle classi e categorie di cui alla tabella dell'art.14 della legge 2 marzo 1949, N. 143 e s.m.i..

**L'elenco ha validità per il triennio 2011/2013 con aggiornamento, ai sensi dell'art. 125, comma 12 del D.Lgs 163/2006, annuale a richiesta degli stessi iscritti.**

**L'aggiornamento dell'Elenco è regolamentato dal Bando nel quale viene stabilito che:**

- *“Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, i Professionisti iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall'Elenco dei Professionisti, una richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati”;*
- *“Le nuove domande pervenute entro il 30 maggio di ogni anno verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo; le conferme dell'iscrizione, da effettuarsi entro la stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione”.*

#### **AGGIORNAMENTO ANNO 2012 su piattaforma E-procurement**

Al fine di procedere con l'aggiornamento del suddetto elenco per l'anno 2012 ed in considerazione dell'entrata in funzione della piattaforma elettronica di cui al successivo punto A.3, le modalità di iscrizione sono state ampliate, consentendo ai professionisti di presentare domanda di rinnovo e/o nuova istanza anche mediante registrazione sul sito dedicato al Commissario <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor>.

Pertanto in data 17 maggio 2012 è stato pubblicato l'avviso sul sito del commissario [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) relativo alle modalità di iscrizione.



Il Commissario Straordinario Delegato



Al fine di dare maggiore pubblicità all'obbligo di conferma della propria istanza, pena la cancellazione dall'Elenco stesso, il predetto avviso è stato, altresì, trasmesso in data 18 maggio 2012 ai tutti professionisti già inseriti nell'elenco pubblicato in data 20 luglio 2011 mediante *e-mail* certificata e/o fax.

Nei termini previsti sono pervenute istanze pari a n. **316**, di cui 243 rinnovi di iscrizioni e 73 nuove iscrizioni. Con Decreto n. 515 del 04 ottobre 2012 è stato approvato l'Aggiornamento dell'Elenco Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), con le modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006, per l'anno 2012-2013.

I professionisti che hanno presentato istanza via cartacea sono stati comunque invitati ad effettuare la registrazione sul sito <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor> in quanto, grazie al completo funzionamento della piattaforma e-procurement, le gare di cui al successivo punto A.4, sono state espletate mediante procedura telematica.

#### **AGGIORNAMENTO ANNO 2013 su piattaforma E-procurement**

Per l'aggiornamento dell'Elenco professionisti previsto per il 2013 il Commissario, in considerazione di quanto rappresentato al punto precedente in merito alla piattaforma e-procurement, ha deliberato di limitare la modalità di iscrizione alla sola registrazione sul sito <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor>, "*conditio sine qua non*" per la successiva partecipazione alle procedure di gara, effettuate esclusivamente per via telematica.

Con Decreto Commissariale n. 264 dell' 08 aprile 2013 si è provveduto all'approvazione dello schema di AVVISO per l'aggiornamento dell'Elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progetta progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), con le modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006.

Nei termini previsti sono pervenute istanze pari a n. **370**, il cui elenco è stato pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 17 luglio 2013 come disposto con Decreto Commissariale n.452 del 17 luglio 2013.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

Dalla data di pubblicazione sono pervenute n. 5 richieste di integrazione da parte dei professionisti che a causa di un inconveniente sulla piattaforma dedicata sono stati impossibilitati alla conferma della propria istanza entro i termini previsti; l'Elenco delle istanze pervenute così come integrate dalle richieste suddette è stato approvato con Decreto Commissariale n. 848 del 11 ottobre 2013 e pubblicato sul sito del Commissario.

Al momento della stesura della presente relazione sono in corso di definizione le attività di aggiornamento dell'Elenco Professionisti **2014/2016**.

#### 4.3 ALBO IMPRESE

Il Commissario Straordinario Delegato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha istituito *l'Elenco delle imprese per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara*.

##### ANNO 2011

Per l'anno 2011 il Commissario ha provveduto ad istituire l'Elenco delle imprese con Decreto Commissariale n° 54 del 20 aprile 2011, con validità annuale ed aggiornamento trimestrale limitatamente agli affidamenti per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) nonché per estratto sulla G.U.R.I. – Serie speciale n.51 del 02.05.2011, sulla G.U.R.S. del 20 maggio 2011 e su il Sole 24ore del 04.05.2011, su La Repubblica del 04.05.2011, su La Sicilia del 04.04.2011 e su Il Giornale di Sicilia del 04.05.2011. Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo del Commissario Straordinario c/o IAP, **492 richieste da parte di imprese** operanti nel territorio nazionale. 2011, il cui elenco è stato pubblicato sul in data 20 luglio 2011 sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

Si evidenzia che l'Elenco è stato costituito:



Il Commissario Straordinario Delegato



-per l'affidamento di lavori fino ad un importo netto a base d'asta di € 1.000.000,00 con il metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, previsto all'Art. 122 comma 7 bis, del D. Lgs. n. 163/06;

-per l'affidamento fino ad un importo di € 1.500.000,00 con il metodo della procedura ristretta semplificata previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 163/06.

**ANNO 2012 su piattaforma E-procurement:**

Per l'anno 2012 il Commissario ha provveduto ad istituire l'Elenco di Fiducia Imprese con Decreto Commissariale n. 323 del 15 novembre 2011. L'elenco ha validità annuale, solo ed esclusivamente per la *procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando* e l'affidamento *con il metodo del cottimo fiduciario* si procederà trimestralmente all'integrazione dell'elenco imprese con le domande ammissibili pervenute successivamente.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il suddetto Bando per l'istituzione dell'Elenco delle imprese 2012 è stato pubblicato sulla GURI – 5a serie speciale n.137 del 21 novembre 2011, sulla G.U.R.S. n. 48 parte II del 02 dicembre 2011 nonché su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale ( Corriere della Sera e La Repubblica del 19.11.2011) e su n.2 quotidiani a tiratura regionale ( Giornale di Sicilia e La Sicilia del 19.11.2011).

Avendo attivato nel corso del 2011 la piattaforma e-procurement di cui al successivo punto, i soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro le ore 24,00 del 15 dicembre 2011 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), collegandosi al link <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor> secondo le modalità di inserimento dettagliatamente riportate nel documento "Guida alla compilazione del questionario e gestione della qualifica".

Entro i termini previsti sono pervenute n. **481** istanze di ammissione all'Elenco delle imprese 2012. Il cui elenco è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 26 gennaio 2012.





Il Commissario Straordinario Delegato



In data 30 ottobre 2012 è stato aggiornato l'Elenco Imprese 2012 limitatamente ai cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, mediante l'integrazione con le domande ammissibili pervenute nel corso del terzo trimestre, entro il 26 ottobre 2012. **Si precisa tuttavia che per le procedure ristrette semplificate, l'Elenco imprese istituito non può, ai sensi della normativa vigente, essere integrato e l'elenco a cui si è fatto riferimento resta quello pubblicato il 26 gennaio 2012 con 481 imprese iscritte.**

**ANNO 2013 su piattaforma E-procurement:**

Per l'anno 2013 si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 651 del 27 novembre 2012, l'Elenco di Fiducia Imprese con validità annuale ed aggiornamento **semestrale** limitatamente agli affidamenti per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

I soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro le ore 24:00 del 15 dicembre 2012 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

Entro i termini previsti sono pervenute oltre **520 istanze di ammissione all'Elenco** delle imprese 2013.

In data 19 dicembre 2012 si è provveduto alla pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) dell'elenco delle istanze pervenute, con l'avviso che eventuali chiarimenti dovevano pervenire entro e non oltre il 31.12.2012 ovvero i termini previsti dall'art.123 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.

In data 9 gennaio 2013 si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco definitivo delle imprese da invitare a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, approvato con Decreto Commissariale n. 10/2013 del 9 gennaio 2013. Le imprese regolarmente iscritte risultano essere n. **525**.

Con Decreto Commissariale n.77/13 del 04/02/2013 è stato disposto di procedere al sorteggio pubblico dell'ordine di iscrizione, alla presenza del Notaio Dott.ssa Susanna Operamolla, tra i

Pag. 21 di 49



Il Commissario Straordinario Delegato



soggetti aventi titolo ovvero fra le imprese da invitare a procedure ristrette semplificate per l'anno 2013 il giorno 08.02.2013.

Gli esiti del sorteggio pubblico del 08 febbraio 2013 per la formazione ordine di iscrizione imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate per l'anno 2013 sono stati pubblicati sul sito del Commissario Straordinario Delegato in data 8 marzo 2013.

A valle del sorteggio pubblico gli inviti sono stati rivolti agli operatori iscritti all'elenco Imprese 2013 nel rispetto rigoroso dell'ordine derivante dal sorteggio effettuato in data 08 febbraio 2012 sia per le procedure ristrette semplificate che per le negoziate ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 163/2006, al fine di maggiormente garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

In data 03/10/2013 si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento semestrale per tutte le istanze pervenute entro il 30 giugno 2013. Sono pervenute numero 106 richieste di iscrizione le quali sono state inserite nell'elenco delle Imprese esclusivamente per le procedure negoziate e per i cottimi fiduciari.

Al momento della stesura della presente relazione sono in corso di definizione le attività di aggiornamento dell'Elenco Imprese 2014.

#### **4.4 Costituzione Piattaforma Informatica E-Procurement**

Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto, secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., si è provveduto, all'individuazione di una soluzione tecnologica in modalità Software as a Service (SaaS)/Application Service Provider (ASP), che consenta l'esecuzione di gare telematiche, la gestione di Elenchi di Operatori Economici, la fornitura di servizi di Help Desk Tecnico e Informativo, la formazione degli utenti.

Con Decreto Commissariale n. 129 del 12.07.11, è stata disposta, a seguito di procedura di gara comunitaria esperita presso la sede del Commissario Straordinario di Roma c/o IAP l'affidamento della suddetta fornitura e la gestione del relativo servizio di e-procurement all'Impresa I-FABER S.p.A..



Il Commissario Straordinario Delegato



La piattaforma e-Procurement sviluppata da i-Faber per il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia è composta da due moduli, perfettamente integrati tra di loro: la piattaforma per la gestione dell'Elenco Fornitori e la piattaforma per la gestione delle gare telematiche.

La finalità del suddetto servizio è quella di conseguire celermente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, gli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma.

I principali vantaggi della Piattaforma elettronica sono:

- E' stata sviluppata specificamente per il settore italiano P.A. conforme al D.Lgs. 163/2006, recependo immediatamente eventuali modifiche del quadro normativo;
- Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 296, comma 2, D.P.R. 207/2010 e dall'art. 70, commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006, permette una riduzione dei tempi dell'intero processo di gara: **i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di sette giorni** se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica; se le stazioni appaltanti offrono per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori e ad ogni documento complementare, **i termini minimi per la ricezione delle offerte sono ridotti di ulteriori 5 giorni** per le procedure aperte e ristrette;
- Gestisce tutto il processo di acquisto, dalla pubblicazione del bando di gara all'aggiudicazione dell'appalto nell'ambito dei lavori, beni e servizi;
- Garantisce una totale trasparenza sul processo negoziale;
- Permette una **riduzione del contenzioso**.

La Piattaforma elettronica è pienamente funzionante dal 1 gennaio 2012 e si precisa, a tal proposito, che tutte le gare esperite a decorrere da tale data, di cui al punto successivo, sono state espletate mediante procedure telematiche.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

#### 4.5 Attività di Gara da MARZO 2011 a NOVEMBRE 2013

##### 4.5.1 Aspetti Generali: Copertura finanziaria

La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera A**, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013 a copertura degli interventi della **Lettera B**.

Le risorse complessive stanziati per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano a € **325.588.362,76**, ripartite tra fondi Ministeriali e Regionali, dati dalla somma delle risorse disponibili nell'Accordo di Programma e di quelle risorse, a valere sui Fondi FAS, destinate alla Regione Siciliana nel successivo Atto integrativo del 3 maggio 2011.

Con l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 30 marzo 2010 sono state destinate risorse pari a € 304.337.176,92 così ripartite:


- Fondi Ministeriali per un importo pari € **152.692.572,11**, a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera A**;
- Fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, per un importo di € **151.644.604,81**, a copertura degli interventi della **Lettera B**.

A seguito della registrazione alla Corte dei Conti dell'Accordo integrativo del 3 maggio 2011 altre risorse, a valere sui Fondi FAS, sono state destinate alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per complessivi € 21.251.185,84 così ripartite:

- € **12.756.002,61** a valere sulle risorse ministeriali stanziati con Legge 23 dicembre 2009, n. 191 a copertura degli interventi ricadenti nella Lettera A;
- € **8.495.183,23** a valere sui fondi della Regione Sicilia del Programma Operativo FERS 2007/2013, linea di intervento 2.3.1.1. a copertura degli interventi ricadenti nella Lettera B.



Il Commissario Straordinario Delegato

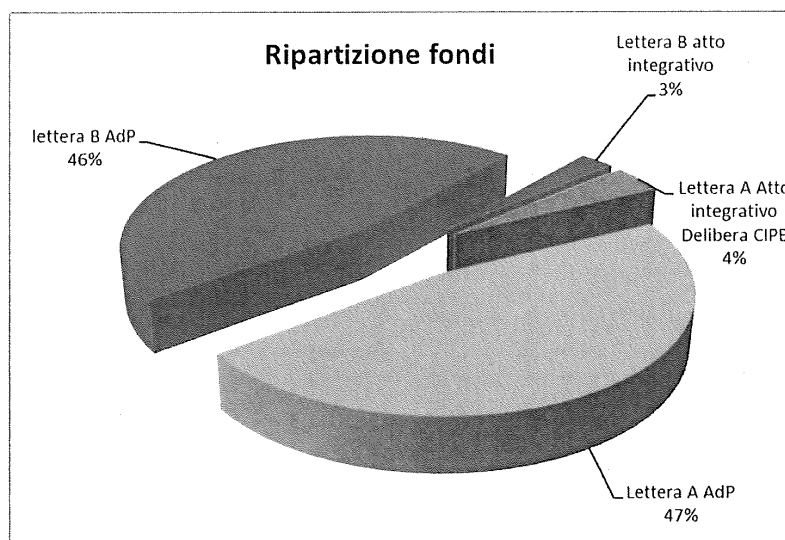

#### 4.5.2. Delibera CIPE

Nell'ambito del Piano di Azione Coesione - concordato con le regioni del Mezzogiorno - per il **rilancio dello sviluppo nelle regioni del Sud**, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha assegnato le risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per la realizzazione di **specifici interventi di rilevanza strategica regionale**, Deliberazione n. 8 del 20 gennaio 2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno" (pubblicata in data 25.05.2012 al n.121 della Gazzetta Ufficiale). L'attenzione è stata posta su interventi prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, al fine di limitare il rischio per l'**incolumità umana** nonché assicurare la **fruibilità dei beni** per evitare forti ricadute negative anche sull'**assetto economico e sociale del paese**. Da qui, dunque, la necessità di definire il quadro delle coperture finanziarie da assicurare per l'attivazione degli interventi in questione .

Nelle regione Siciliana sono stati individuati dalla Delibera CIPE n. 8, quali interventi di «carattere strategico regionale» quelli previsti dall'Atto integrativo ricadenti nella lettera A, pari a € 12.756.002,61. Tale individuazione è volta a migliorarne la qualità e accelerarne la

Pag. 25 di 49



Il Commissario Straordinario Delegato



realizzazione, rafforzando i processi di collaborazione istituzionale fra le amministrazioni interessate, con particolare riguardo alle modalità attuative degli interventi.

pr	intervento	comune	titolo	importo atto integrativo
ME	177	Brolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto	€ 600.000,00
ME	178	Caprileone	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)	€ 1.000.000,00
PA	179	Altofonte	Aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 600.000,00
PA	180	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita-	€ 90.000,00
PA	181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	€ 400.000,00
SR	184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	€ 2.000.000,00
SR	185	Buscemi	Consolidamento costone sottostante il Santuario	€ 200.000,00
SR	186	Porto Palo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00
SR	187	Rosolini	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	€ 1.800.000,00
SR	188	Siracusa	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	€ 3.466.002,61
TP	189	Mazara del Vallo	Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	€ 2.000.000,00

Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli 11 interventi così individuati viene assicurato dalla predetta Delibera a valere in quota parte sulle risorse attualmente già disponibili sul bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le restanti quote tramite la riduzione dei Programmi attuativi interregionali (PAIN) e dei Piano di azione regionali (PAR), come di seguito riportato in tabella.

Assegnazione presente delibera	Quota MATTM (L.266/2005 e L. 183/2011)	Quota Riduzione PAIN	Quota PAR
12.756.002,61	1.153.004,80	5.801.498,91	5.801.498,90

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

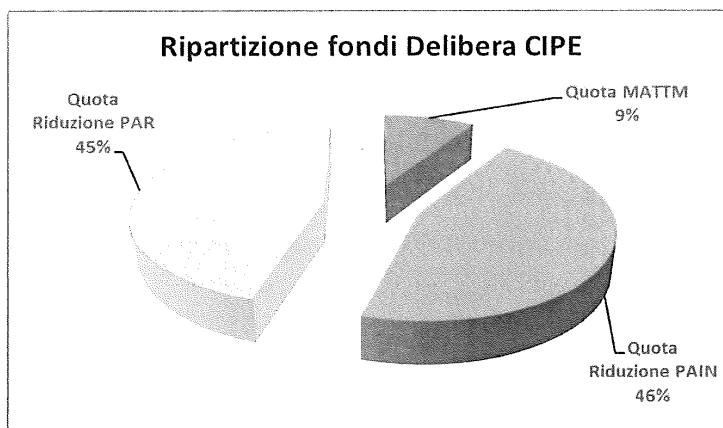

La Delibera prescrive dei tempi contenuti per la tempistica degli impegni giuridicamente rilevanti per gli interventi; stabilendo al punto 6. che:

*“Coerentemente con gli obiettivi di urgenza e di accelerazione della spesa le risorse assegnate con la presente delibera non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2013 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie saranno revocate [...] con delibera di questo Comitato”*

Per i termini e le modalità di attuazione così stringenti, nel presente atto, gli interventi di cui alla Delibera CIPE verranno trattati separatamente rispetto a quelli inseriti nell'AdP originario.

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni Progetti, gli interventi finanziati dal suddetto Accordo di Programma sono 202 distinti in:

- **94 ricadenti nella lettera A (fondi Ministeriali):**
  - ❖ 83 previsti dall'AdP
  - ❖ 11 previsti dall'Atto integrativo (Delibera CIPE)
- **107 nella lettera B (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d'intervento 2.3.1.A1)**
  - ❖ 101 previsti dall'AdP
  - ❖ 6 previsti dall'Atto integrativo

Stante l'approssimarsi della data di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli



Il Commissario Straordinario Delegato



interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di difficile risoluzione da parte Enti Beneficiari precedentemente individuati.

Pertanto dei 107 interventi ricadenti nella lettera B, n. 24 sono transitati sotto la gestione commissariale e il Commissario Straordinario è stato individuato quale Soggetto Beneficiario (di seguito indentificati con B\*).

**Gli interventi per i quali il Commissario ha la qualifica di Stazione appaltante salgono pertanto a 119.**

#### 4.5.3. GARE INTERVENTI LETTERA A

Fino al novembre 2013 sono state attivate **112** procedure di affidamento lavori e/o servizi relativi agli interventi previsti sia nell'Accordo di Programma che nell'Atto integrativo. Per i motivi già esposti in precedenza si riportano in seguito le gare distinte in quelle espletate per la realizzazione degli interventi previsti nell'AdP originario (N. 100 gare di cui 75 di lavori per un importo complessivo pari a € **137.684.459,92**) e quelle per la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE (N. 12 gare).

#### 4.5.4 GARE INTERVENTI LETTERA A PREVISTI NELL'ADP:

Da marzo 2011 al novembre 2013 sono state attivate le seguenti procedure di affidamento lavori e/o servizi:

- **N. 55** procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e procedura ristretta semplificata ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- **N. 10** procedure Aperte e Ristrette ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. di cui 2 in corso di cui 9 per l'affidamento di lavori e 1 per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori;
- **N. 28** procedure espletate, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei laboratori presenti sul sito [www.clp.it](http://www.clp.it) per la realizzazione di **indagini preliminari** da espletare in situ e propedeutiche alla progettazione;
- **N. 7** procedure di **Affidamento del servizio di progettazione** definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, **Direzione lavori** a

Pag. 28 di 49






REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

professionisti esterni mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del d.lgs. 163/2006, di cui una in fase di avvio.

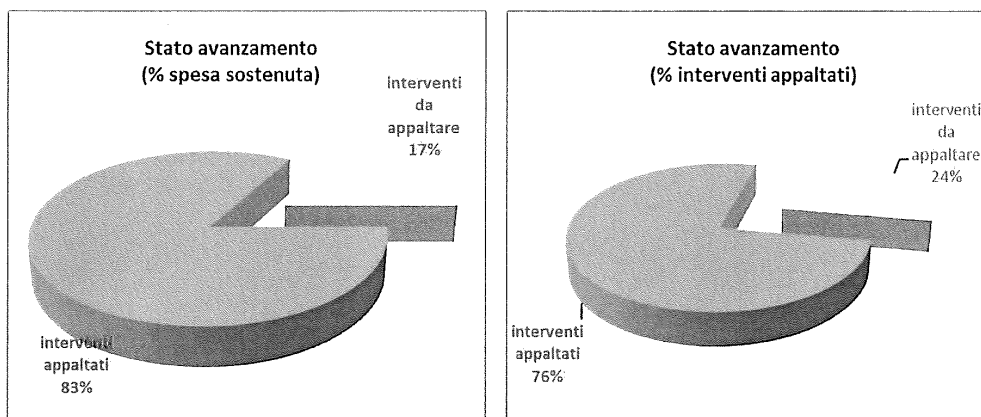

#### 4.5.5 GARE interventi previsti nell'ATTO INTEGRATIVO ed inseriti nella Delibera CIPE:

Da marzo 2011 a novembre 2013 sono state attivate **12 procedure di affidamento lavori e/o servizi**, di cui:

- **N. 6** procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e procedura ristretta semplificata ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- **N. 1** procedure Aperte e Ristrette ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., di cui 2 per l'affidamento di lavori;
- **N. 5** procedure espletate, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei laboratori presenti sul sito [www.clp.it](http://www.clp.it) per la realizzazione di **indagini preliminari** da espletare in situ e propedeutiche alla progettazione.



REPUBBLICA ITALIANA


Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

PR	intervento	comune	titolo	importo atto integrativo	Stato attuazione
ME	177	Briolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto	€ 600.000,00	verbale inizio attività del...
ME	178	Caprileone	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)	€ 1.000.000,00	verbale consegna lavori del 28/06/2013
PA	179	Altofonte	Aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 600.000,00	Verbale consegna lavori 15/10/2013
PA	180	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita-	€ 90.000,00	
PA	181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	€ 400.000,00	
SR	184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	€ 2.000.000,00	
SR	185	Buscemi	Consolidamento costone sottostante il Santuario	€ 200.000,00	Lavori ultimati
SR	186	Porto Palo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00	verbale consegna lavori del 18/11/2013
SR	187	Rosolini	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	€ 1.800.000,00	aggiudicata
SR	188	Siracusa	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	€ 3.466.002,61	verbale inizio attività del 22/07/2013
TP	189	Mazara del Vallo	Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	€ 2.000.000,00	

Evidenziati in rosso gli interventi appaltati.

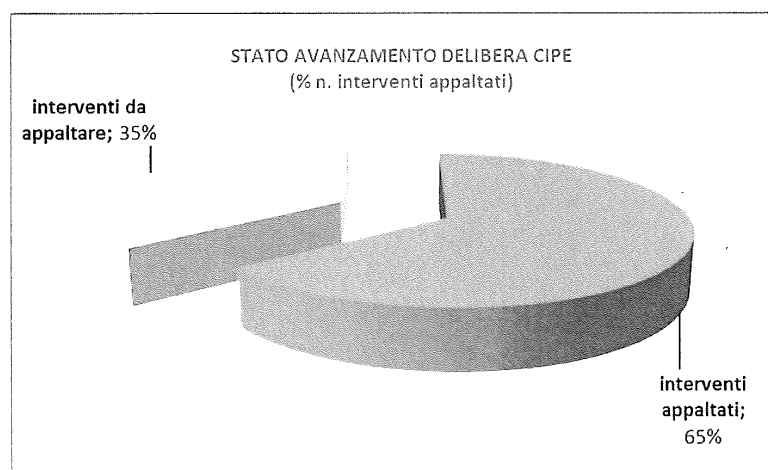



Il Commissario Straordinario Delegato




Come già riportato, per gli interventi la cui copertura finanziaria è garantita dalla Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, le risorse non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013 saranno revocate.

È bene sottolineare quindi che dei 4 interventi non ancora appaltati solo per l'intervento TP189 Mazara del Vallo non potrà essere rispettato il termine ultimo del 31 dicembre, con la possibilità concreta di revoca delle risorse. I restanti interventi invece sono ad un iter avanzato di approvazione dei progetti definitivi, per i quali si prevede l'emanazione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013. In particolare:

- per gli interventi ricadenti nel territorio di Cefalù (PA180 e PA181) il 20 novembre 2013 sarà acquisito l'ultimo parere;
- per l'intervento SR184 Avola è stata convocata la conferenza di Servizi per il giorno 22 novembre 2013 al fine di acquisire i pareri necessari all'approvazione del progetto.

Pertanto la situazione al 31 dicembre 2013 degli interventi dell'Atto integrativo sarà presumibilmente la seguente:

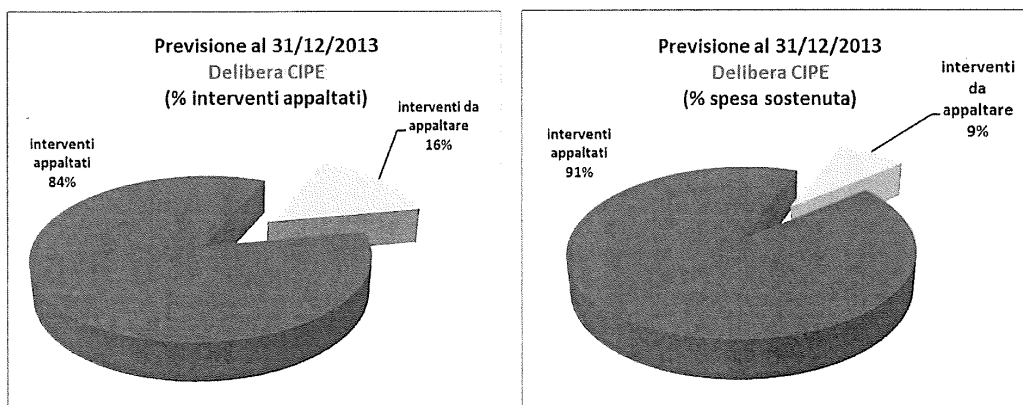



Il Commissario Straordinario Delegato



#### 4.5.6. GARE INTERVENTI LETTERA B


Le informazioni che seguono sono state elaborate sui dati forniti dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Fino al novembre 2013 sono state attivate **79** procedure di affidamento lavori relativi agli interventi previsti sia nell'Accordo di Programma che nell'Atto integrativo. Per omogeneità di esposizione si riportano in seguito le gare espletate per la realizzazione degli interventi B previsti nell'AdP originario (N. 75 gare) e le gare espletate per la realizzazione degli interventi ammessi nell'atto integrativo (N. 4 gare).

##### - GARE INTERVENTI LETTERA B PREVISTI NELL'ADP

Le risorse stanziare nell'Accordo di Programma per finanziare gli interventi ricadenti nella Lettera B sono pari a € 151.644.604,81 derivanti dal Programma Operativo FERS 2007/2013 per la Regione Siciliana.

Gli interventi che risultano ammessi a finanziamento sono pari a 101 dei quali n. 75 interventi risultano appaltati, per un importo complessivo pari a € 120.165.789,72.

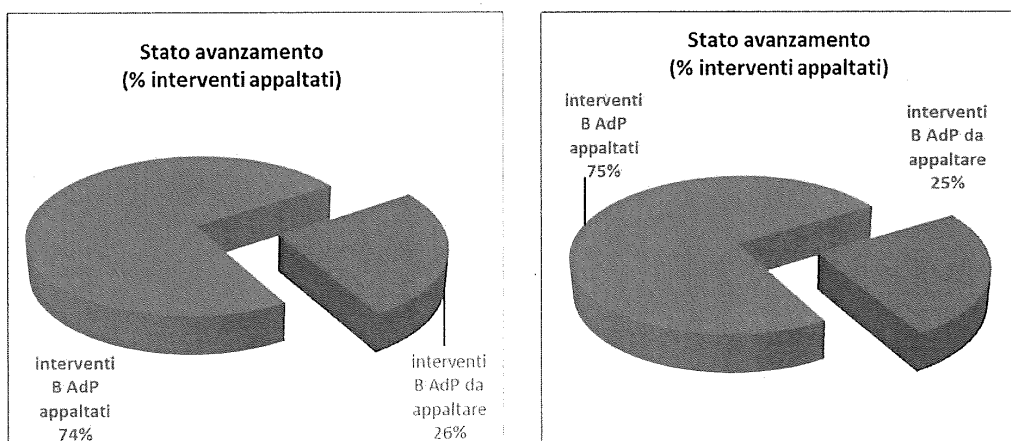

##### - GARE INTERVENTI LETTERA B PREVISTI NELL'ATTO INTEGRATIVO.

Le risorse stanziare nell'atto integrativo per finanziare gli interventi ricadenti nella Lettera B sono pari a € 8.495.183,23, per un totale di 6 interventi che risultano, sempre sulla base delle




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato




REGIONE SICILIANA

informazioni fornite dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, appaltati per un numero di 4 interventi.

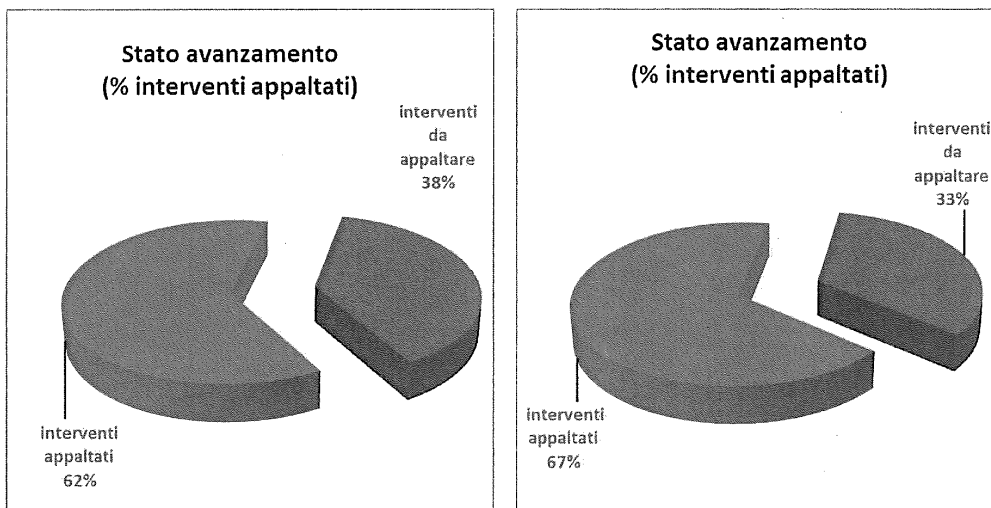

Si riporta infine il grafico relativo allo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'AdP e atto integrativo:

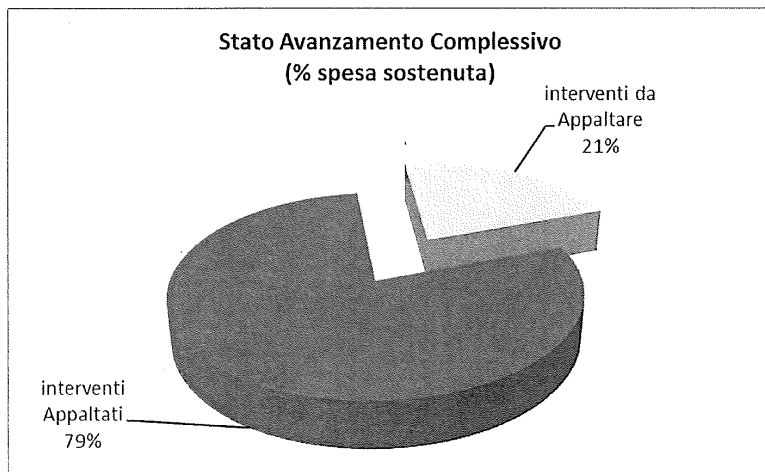




Il Commissario Straordinario Delegato



Al fine di interpretare meglio il grafico della figura precedente, si rappresenta di seguito il dettaglio delle percentuali degli interventi appaltati e da appaltare:

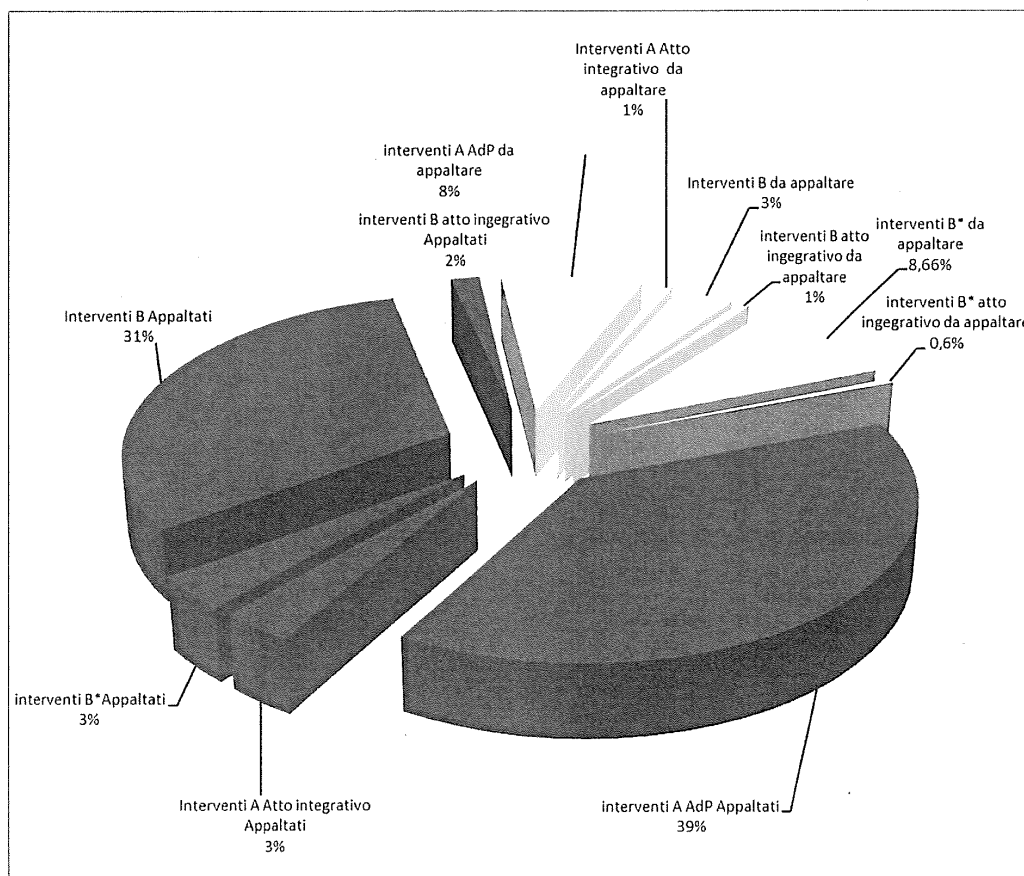

#### 4.5.4.1 Dati statistici

Si riporta qui di seguito un grafico relativo all'andamento delle percentuali di ribasso d'asta offerto dalle imprese che hanno partecipato alle relative gare d'appalto.




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

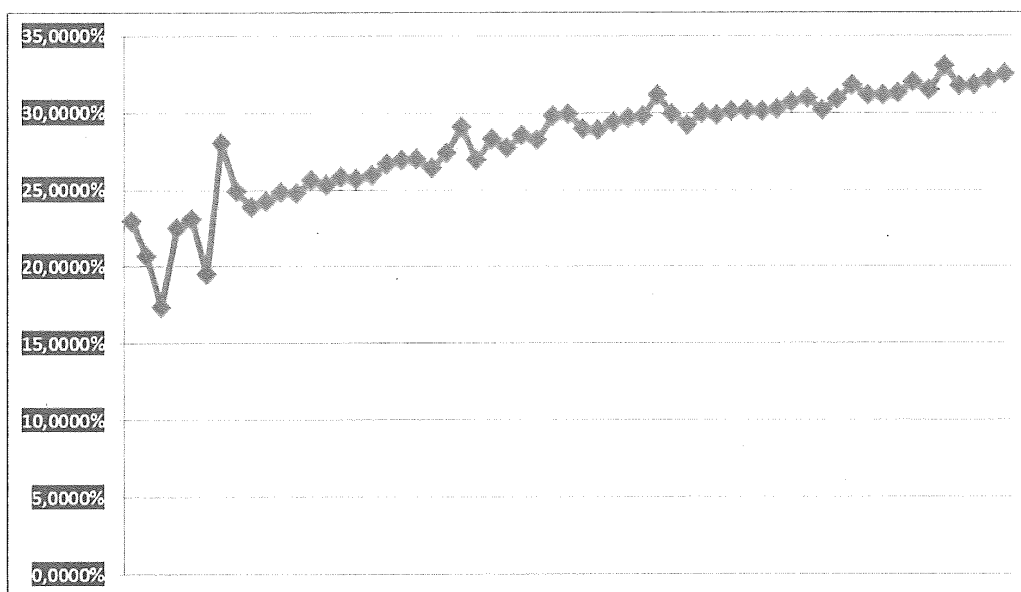

Come si può evidenziare, nel corso del 2013 si è confermato l'andamento già registrato nel corso dell'anno precedente rispetto ai valori del 2011, della percentuale di offerte presentate dalle imprese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma.

Si riporta qui di seguito il grafico relativo alla distribuzione territoriale per Regioni delle imprese Aggiudicatrici:




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

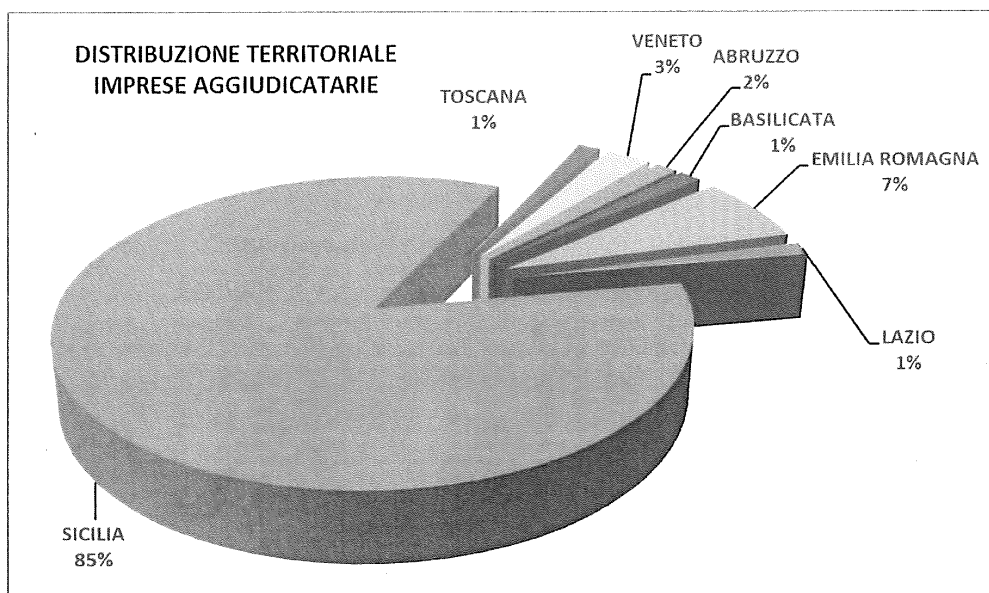

Il grafico sopra riportato mette in evidenza che l'obiettivo della mitigazione del rischio idrogeologico è stato in parte raggiunto utilizzando risorse del territorio Siciliano.

Un simile obiettivo risulta indispensabile per dare operatività alle imprese e rilancio allo sviluppo economico del territorio, mettendo a frutto le possibilità messe a disposizione dall'Europa. La strada tracciata negli ultimi anni è quella volta al miglioramento della competitività delle imprese locali, nel rispetto dei principi di economicità, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di assicurare una crescita stabile per l'intero Paese.

Particolarmente proficua risulta essere da questo punto di vista l'attività svolta da questo Commissario insieme alle Prefetture per promuovere un mercato sempre più governato dalle sole regole della libera concorrenza e per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.





REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

## 5 STATO DELL'ARTE

Si riporta qui di seguito un esame analitico e dettagliato dello stato dell'arte degli interventi rientranti nell'accordo di Programma e nel successivo atto integrativo dettagliato come segue:

- 1) Interventi lettera A;
- 2) Interventi lettera B.

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni Progetti, gli interventi sono 201 divisi in 94 ricadenti nella lettera A (fondi Ministeriali) e 107 nella lettera B (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d'intervento 2.3.1).

### 5.1 INTERVENTI LETTERA A (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)

Gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi ministeriali sono 94, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 19 interventi per i quali sono in corso le attività di progettazione esecutiva, intendendo tutte le fasi propedeutiche la realizzazione degli interventi, pertanto sono inclusi quelli per i quali sono state già affidate le attività di indagini geognostiche o si è in attesa di acquisire le necessarie autorizzazioni e pareri;
- n. 53 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara o gli interventi sono in fase di realizzazione;
- n. 22 interventi, tra cui quelli di Giampilieri e San Fratello, già ultimati.

<i>Interventi A</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
19	<i>In fase di Progettazione</i>	16,42%	€ 27.151.010,50
53	<i>In fase di Attuazione Intervento</i>	47,38%	€ 78.351.585,92
22	<i>Interventi Ultimati</i>	35,88%	€ 59.332.874,00
	<i>Economie</i>	0,32%	€ 525.906,19
<b>94</b>	<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 165.361.376,61</b>

Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

#### Economie derivanti da revoche

<i>Economie derivanti da revoche A</i>		
<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
<i>Economie derivanti da Revoche</i>	0,32%	€ 525.906,19
<b>TOTALE Economie A</b>	<b>0,32%</b>	<b>€ 525.906,19</b>





REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

In questa categoria sono state inserite le economie residue derivanti dalla revoca dell'intervento di Serradifalco (CL 020) decisa nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 settembre 2011, pari originariamente ad € 1.600.000,00, decurtate della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Caronia (ME 058), pari ad € 653.083,40 e della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Ali Terme (ME 051) pari ad € 421.050,50, così come deciso in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 18 maggio 2012.

#### **Interventi in fase di progettazione Esecutiva**

<i>Interventi in fase di Progettazione A</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
6	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	5,65%	€ 9.350.000,00
1	INDAGINI PRELIMINARI IN CORSO	1,21%	€ 2.000.000,00
1	ADEGUAMENTO DEL PROGETTO IN CORSO	1,51%	€ 2.500.000,00
6	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	5,03%	€ 8.311.010,50
5	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	3,02%	€ 4.990.000,00
<b>19</b>	<b>TOTALE in fase di Progettazione</b>	<b>16,42%</b>	<b>€ 27.151.010,50</b>

Gli interventi che risultano in fase di progettazione sono così suddivisi:


- n. 6 interventi per i quali è in corso la redazione del progetto esecutivo;
- n. 1 interventi per i quali il progetto esecutivo è già stato redatto ma, a seguito delle relative istruttorie e/o delle conferenze dei servizi, si è in attesa degli adeguamenti prescritti;
- n. 6 interventi per i quali interventi per i quali si è in attesa di pareri;
- n. 5 interventi per i quali è stata già svolta la conferenza dei servizi e sono stati acquisiti i pareri;
- n. 1 interventi per i quali le indagini preliminari sono in corso.



Il Commissario Straordinario Delegato



Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:

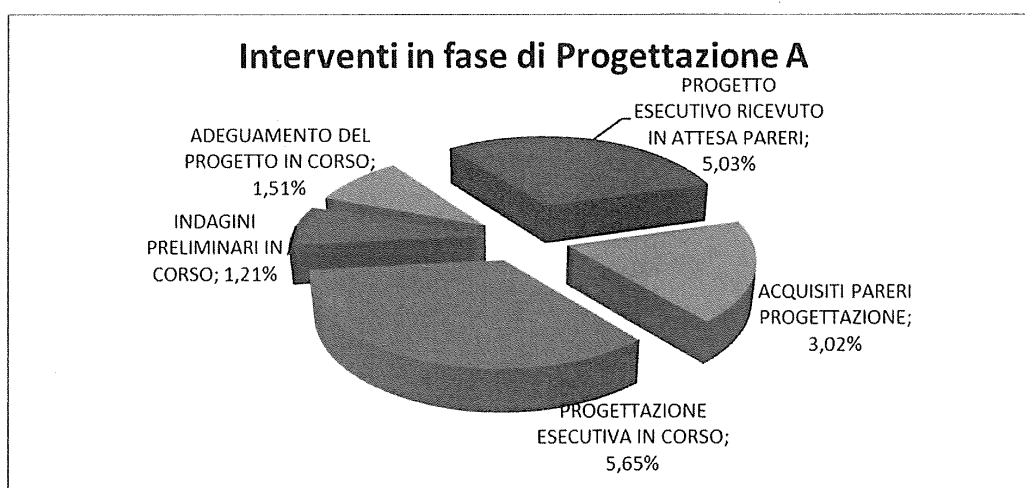


#### Interventi in fase di attuazione

<i>Interventi in fase di Attuazione A</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
5	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	5,62%	€ 9.292.500,00
13	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	10,39%	€ 17.180.000,00
32	AVVIATI LAVORI	29,38%	€ 48.579.085,92
3	SOSPENSIONE LAVORI	2,00%	€ 3.300.000,00
<b>53</b>	<b>TOTALE in fase di attuazione intervento</b>	<b>47,38%</b>	<b>€ 78.351.585,92</b>

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

- n. 05 interventi per i quali sono in fase di predisposizione i relativi atti di gara;
- n. 13 interventi per i quali sono state già espletate le procedure di gara per la realizzazione, è già stato stipulato il relativo contratto e si è in attesa di consegnare i lavori;
- n. 32 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione;
- n. 3 interventi per i quali i lavori sono stati sospesi.



Pag. 39 di 49




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:

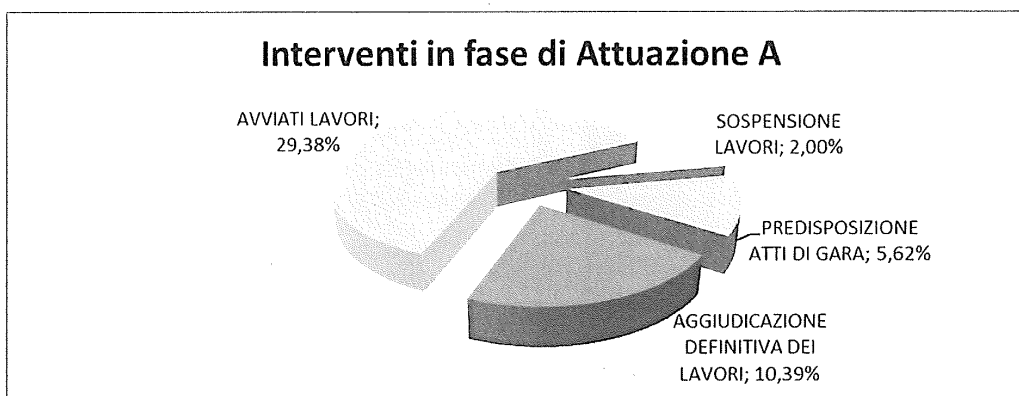

#### Interventi ultimati

<i>Interventi Ultimati A</i>			
N. Interventi	Stato	%	€
22	LAVORI ULTIMATI	35,88%	€ 59.332.874,00
<b>22</b>	<b>TOTALE interventi ultimati</b>	<b>35,88%</b>	<b>€ 59.332.874,00</b>

Gli interventi ultimati si riferiscono alle opere realizzate nei Comuni di Ribera ricadente nella provincia di Agrigento; alle opere realizzate nei comuni Misterbianco, Piedimonte Etneo, Ramacca e Randazzo ricadenti nella provincia di Catania; alle opere realizzate nei comuni San Fratello, Giampileri, Caprileone, Castel di Lucio, Basicò ed Alcara Li Fusi ricadenti nella provincia di Messina; alle opere ricadenti nei comuni Valledolmo, Polizzi Generosa, Termini Imerese e Blufi ricadenti nella provincia di Palermo; alle opere realizzate nei comuni di Avola e Buscemi ricadenti nella provincia di Siracusa; alle opere realizzate nel Comune di San Vito Lo Capo ricadente nella Provincia di Trapani.

#### **5.2 INTERVENTI LETTERA B (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)**

Il complemento di Programmazione del suddetto PO FESR prevedeva che gli unici Enti beneficiari di tali risorse fossero le Amministrazioni locali che erano le uniche a fungere da stazioni appaltanti, sotto il controllo di gestione della Direzione Generale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della regione Sicilia.

Pag. 40 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

La rimodulazione del complemento di Programmazione del suddetto PO FESR, approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011, adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012, prevede anche quale Ente Beneficiario l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.

In virtù di tale rimodulazione, la Regione ha indicato 24 interventi, per un importo complessivo pari a € 39.522.214,39, corrispondenti circa al 25% degli interventi di propria competenza per i quali il Commissario Straordinario è stato individuato quale soggetto beneficiario.

Stante infatti l'approssimarsi delle date di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di difficile risoluzione da parte Enti Beneficiari precedentemente individuati.

Si riportano di seguito gli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, che vengono pertanto individuati con la Lettera B\*.

- con nota prot. N. 13607 del 02.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	124	Terme Vigliatore	Fondi Regionali	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00

- con nota prot. N. 13611 del 02.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	130	Tusa	Fondi Regionali	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00

- con nota prot. N. 18003 del 21.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	106	S. Alessio Sticula	Fondi Regionali	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato	€ 5.000.000

- con nota prot. N. 31329 del 29.05.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
CL	106	Caltanissetta	Fondi Regionali	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della colline Sant'Anna, centro storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato	€ 4.160.000

- con nota prot. N. 35347 del 15.06.2012:

Pag. 41 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
AG	4	Cattolica Eraclea	Regione	Mitigazione Rischio Idrogeologico - Croli Costone Roccioso Eraclea Minoa	€ 1.480.000,00
AG	14	Santo Stefano di Quisquina	Regione	Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale	€ 2.360.195,11
AG	174	Cattolica Eraclea	Regione	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)	€ 1.170.000,00
CL	17	Butera	Regione	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00
CL	18	Butera	Regione	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	€ 800.000,00
CT	28	Licodia Eubea	Regione	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	€ 880.000,00
CT	38	Santa Venerina	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago	€ 1.000.000,00
CT	39	Sant'Agata Li Battiatì	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi	€ 1.000.000,00
ME	65	Ficarra	Regione	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne	€ 1.028.981,00
ME	68	Forza D'Agrò	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 414.163,28
ME	105	Rometta	Regione	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	€ 1.000.000,00
ME	127	Tortorici	Regione	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona S.Paolo	€ 2.300.000,00
PA	148	Mezzojuso	Regione	Opere di consolidamento - Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00
PA	151	Partinico	Regione	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	€ 950.000,00
RG	158_1	Modica	Regione	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	€ 2.000.000,00
SR	166	Rosolini	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00
TP	190	San Vito Lo Capo	Regione	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00

Pag. 42 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

- con nota prot. N. 36531 del 21.06.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
PA	152	Petralia Sottana	Regione	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello	€ 1.200.000,00

- con nota prot. N. 40645 del 10.07.2012:


PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	131	Ucria	Regione	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile-Belvedere	€ 1.261.000,00

Si precisa che per gli interventi sopra elencati alla Struttura Commissariale compete:

- l'istruttoria e l'iter autorizzativo propedeutico all'emissione del Decreto di Finanziamento che rimane a carico della Regione;
- la funzione di Stazione Appaltante.

Si evidenzia di seguito lo stato di attuazione degli interventi B\* al momento del passaggio al Commissario Straordinario.

INTERVENTI B* AL MOMENTO DEL PASSAGGIO AL COMMISSARIO			
12	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO B *	34,68%	€ 13.705.358,39
11	PROGETTAZIONE ALLA FASE PRELIMINARE B*	62,72%	€ 24.787.875,00
1	LAVORI ULTIMATI B*	2,60%	€ 1.028.981,00
24		<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.522.214,39</b>

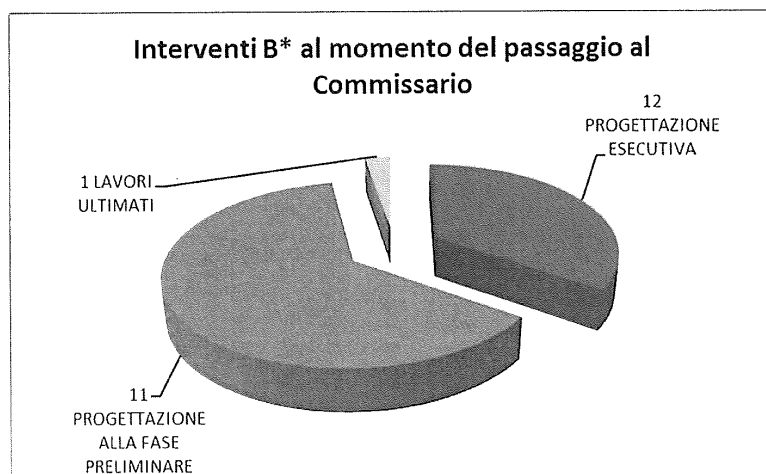

Pag. 43 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato




REGIONE SICILIANA

Si riporta di seguito il dettaglio dello stato attuale degli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, denominati con la Lettera B\*.

INTERVENTI B* COMMISSARIO (ENTE ATTUATORE)			
0	PROGETTAZIONE IN FASE PRELIMINARE	0%	€ 0,00
18	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	67%	€ 27.589.358,39
5	IN FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTO	30%	€ 12.403.875,00
1	LAVORI ULTIMATI	3%	€ 1.028.981,00
24	<b>TOTALE</b>		<b>€ 41.022.214,39</b>

- n. 18 interventi che risultano in fase di progettazione esecutiva;
- n. 5 interventi per i quali è in corso la predisposizione degli atti di gara o l'attuazione dei lavori;
- n. 1 intervento per il quale i lavori sono stati conclusi.

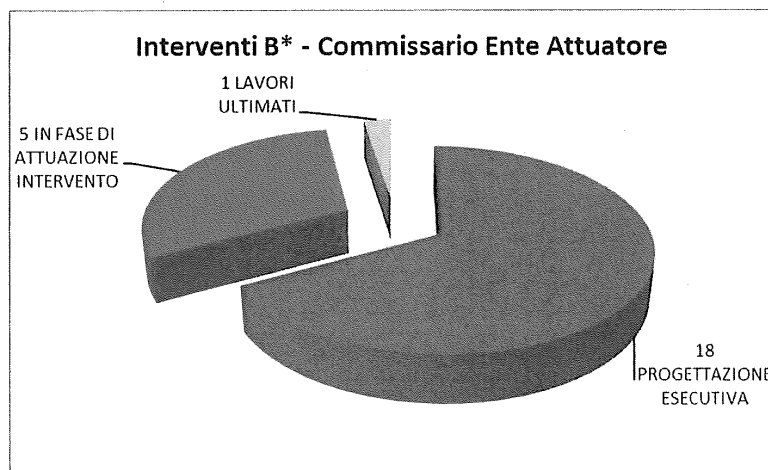






Il Commissario Straordinario Delegato

**STATO COMPLESSIVO INTERVENTI B+B\*:**

Complessivamente, gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi messi a disposizione dalla regione Sicilia sono 107, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 9 interventi che risultano in fase di Progettazione alla fase preliminare;
- n. 19 interventi che risultano in fase di progettazione;
- n. 73 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara o in fase di attuazione dei lavori;
- n. 6 interventi per i quali i lavori sono stati conclusi.

<i>Interventi B</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
9	<i>Istruttoria in Corso</i>	8,68%	€ 13.900.000,00
19	<i>In fase di Progettazione</i>	36,37%	€ 26.161.196,43
73	<i>In fase di Attuazione Intervento</i>	50,36%	€ 112.801.687,04
6	<i>Interventi Ultimati</i>	4,60%	€ 7.364.102,68
<b>107</b>	<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 160.226.986,15</b>

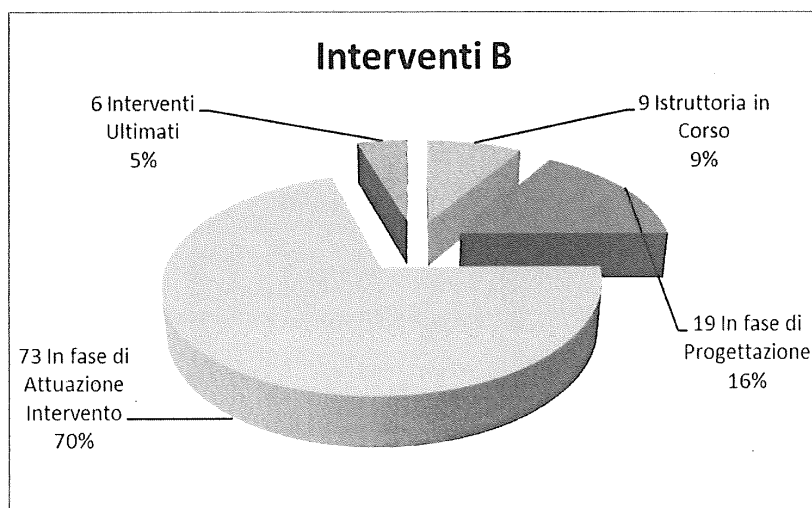

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

## 6 CONCLUSIONI

In questo paragrafo vengono riportate le considerazioni conclusive relative alle attività svolte dal Commissario Delegato per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia nel periodo dal 10.12.2010 al 20.11.2013.

Come già detto nei paragrafi precedenti l'Accordo di Programma stipulato in data 30.03.2010 ed il successivo Atto Integrativo hanno previsto la suddivisione degli interventi in due distinte lettere ("A" e "B") a seconda dell'origine dei finanziamenti. In entrambi i casi la regione Sicilia ha utilizzato come fonte di finanziamento i fondi provenienti dal *PO FESR 2007-2013*, linea d'intervento 2.3.1. Il Ministero dell'Ambiente ha utilizzato propri fondi di bilancio per la stipula dell'AdP del 30.03.2010 mentre ha messo a disposizione i propri fondi FAS per il successivo Atto integrativo.

Le risorse complessive stanziare per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano pertanto ad € **325.588.362,76**, ripartiti tra fondi Ministeriale e Regionale come riassunto nella tabella seguente.

Fondi Ministeriali (lettera A)	
AdP	€ 152.692.572,11
AdP integrativo	€ 12.756.002,61
<b>Totale</b>	<b>€ 165.448.574,72</b>
Fondi Regionali (lettera B)	
AdP	€ 151.644.604,81
AdP integrativo	€ 8.495.183,23
<b>Totale</b>	<b>€ 160.139.788,04</b>

Prima dell'adozione della Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 da parte della Giunta Regionale di Governo, sancita solo nel gennaio 2012, i vincoli derivanti dai fondi comunitari messi a disposizione dalla Regione Sicilia hanno, di fatto, diviso in due l'AdP in quanto gli stessi non potevano essere nella disponibilità dell'Ufficio del Commissario, né in termini di cassa né in termini di gestione ed attuazione dei relativi interventi.

Tale distinzione ha fatto sì che la fase attuativa degli interventi di cui alla lettera "B" è stata gestita direttamente dalle Amministrazioni comunali (beneficiarie del finanziamento) esclusivamente in regime ordinario e con tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente che disciplina i contratti pubblici sia sul territorio nazionale che europeo.



REPUBBLICA ITALIANA


Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA


Il risultato complessivo dello stato d'avanzamento della spesa dell'intero AdP e del successivo Atto integrativo viene riportato qui di seguito, sia in formato tabellare che grafico:

RIEPILOGO INTERVENTI A + B			
n. Interventi	Stato	%	€
0	Istruttoria in Corso A	0,00%	€ 0,00
9	Istruttoria in Corso B	4,27%	€ 13.900.000,00
9	<b>Totale interventi istruttoria in corso</b>	<b>4,27%</b>	<b>€ 13.900.000,00</b>
19	In fase di Progettazione A	8,34%	€ 27.151.010,50
19	In fase di Progettazione B	8,04%	€ 26.161.196,43
38	<b>Totale Interventi in fase di Progettazione</b>	<b>16,37%</b>	<b>€ 53.312.206,93</b>
53	In fase di Attuazione Intervento A	24,06%	€ 78.351.585,92
73	In fase di Attuazione Intervento B	34,65%	€ 112.801.687,04
126	<b>Totale Interventi in fase di attuazione</b>	<b>58,71%</b>	<b>€ 191.153.272,96</b>
22	Interventi Ultimati A	18,22%	€ 59.332.874,00
6	Interventi Ultimati B	2,26%	€ 7.364.102,68
28	<b>totale interventi ultimati</b>	<b>20,49%</b>	<b>€ 66.696.976,68</b>
	Economie derivanti da revoche int A	0,16%	€ 525.906,19
<b>201</b>	<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 325.588.362,76</b>

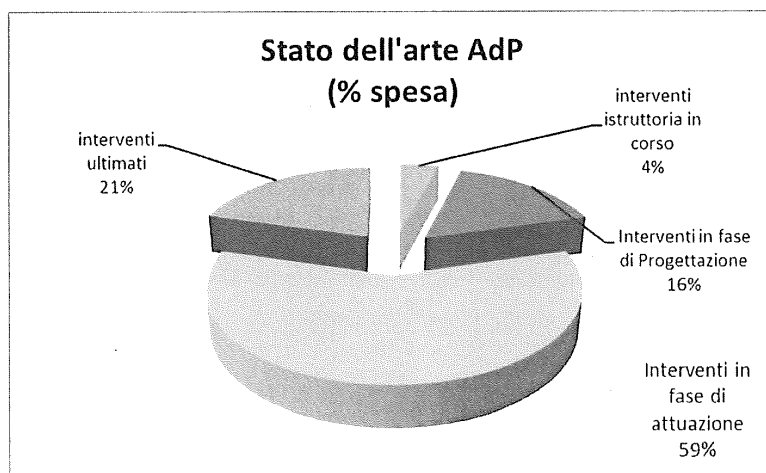



Il Commissario Straordinario Delegato


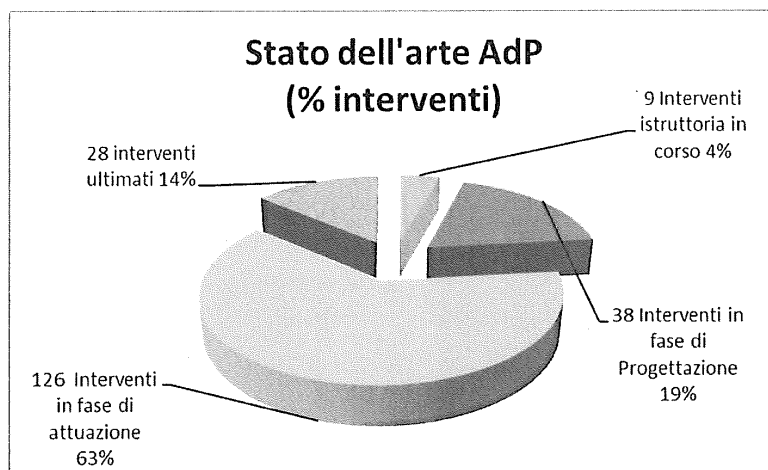


Per maggiore dettaglio, si riporta, qui di seguito, sia in formato tabellare che grafico, lo stato d'avanzamento degli interventi finanziati dalla Delibera Cipe n. 8/2012 facenti parte dell'atto integrativo all'AdP:

RIEPILOGO INTERVENTI ATTO INTEGRATIVO			
n. interventi	Stato	%	€
4	In fase di Progettazione A	21,13%	€ 4.490.000,00
2	In fase di Progettazione B	14,59%	€ 3.100.000,00
6	<b>Totale Interventi in fase di Progettazione</b>	<b>35,72%</b>	<b>€ 7.590.000,00</b>
6	In fase di Attuazione Intervento A	37,96%	€ 8.066.002,61
4	In fase di Attuazione Intervento B	25,39%	€ 5.395.183,23
10	<b>Totale Interventi in fase di attuazione</b>	<b>63,34%</b>	<b>€ 13.461.185,84</b>
1	Interventi Ultimati A	0,94%	€ 200.000,00
0	Interventi Ultimati B	0,00%	€ 0,00
1	<b>totale interventi ultimati</b>	<b>0,94%</b>	<b>€ 200.000,00</b>
17	<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 21.251.185,84</b>



Il Commissario Straordinario Delegato

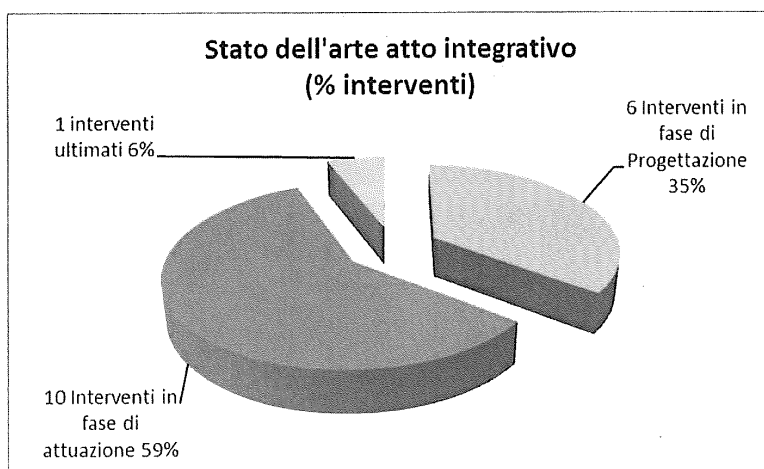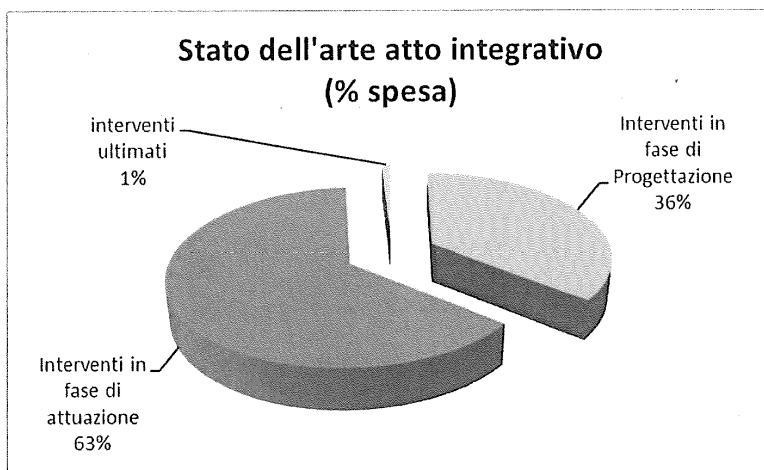

Si allegano alla presente relazione le schede riassuntive di tutti gli interventi previsti nell'accordo di programma (allegato 5).

**Il Commissario Straordinario Delegato**

(Dott. Maurizio Croce)

PAGINA BIANCA



*Il Commissario Straordinario Delegato*



## ALLEGATO 1

---

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo

Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

PAGINA BIANCA





**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

e

**Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL  
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E  
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO .**

A handwritten signature or set of initials is located in the bottom left corner of the page, within the rectangular border.

A handwritten signature or set of initials is located on the right side of the page, extending from the middle towards the bottom.

PAGINA BIANCA



## PREMESSE

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DPR 3 agosto 2009, n. 140;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

**VISTA** la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile";

**VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo" a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

**VISTA** la Legge 31 luglio 2002, n. 179, recante "Disposizioni in campo ambientale", ed in particolare l'art. 16 relativo a "Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico";

**VISTO** il comma 432 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 ;

**VISTO** il comma 321 dell' art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



**CONSIDERATO** che lo stesso articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede altresì che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale;

**VISTO** il Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenza nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** Decreto Ministeriale n. GAB/DEC/2010/34 del 15 marzo 2010 di autorizzazione provvisoria all'adozione di provvedimenti di spesa emanato nelle more dell'adozione della Direttiva sull'azione amministrativa per l'anno 2010;

**CONSIDERATO** che uno studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha evidenziato che il 9,8% del territorio nazionale è interessato da aree ad alta criticità idrogeologica e che 540 chilometri di linea di costa risulta a potenziale rischio di erosione per i beni esposti;

**RAVVISATA** la necessità di considerare in modo unitario tutte le risorse affini e contigue presenti nel bilancio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche per attivare un piano di azione che garantisca la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

**RITENUTO** indispensabile utilizzare tali risorse attraverso una sequenza di singoli accordi di programma che consentano alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico;

**RITENUTO** necessario dare avvio a tale serie di accordi di programma intervenendo, immediatamente, per fronteggiare le situazioni di maggiore emergenza e criticità;

**CONSIDERATI** i gravi eventi calamitosi che hanno di recente colpito la Regione Siciliana con perdita di vite umane e danni economici notevolissimi che hanno comportato l'emanazione di una serie di Ordinanze di Protezione Civile;


**CONSIDERATO** che la Regione nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013 con una dotazione di Euro 151.644.604,81 per le specifiche linee d'intervento 2.3.1.1. e 2.3.1.2. prevede di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;

**QUANTIFICATI** in complessivi Euro di provenienza dagli esercizi finanziari 2008 e 2009, le risorse da utilizzare nel presente Accordo di Programma da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTA** la nota prot. n. 754 del 30 Marzo 2010 con la quale la Regione Siciliana ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, la proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che tiene conto anche delle richieste pervenute direttamente al Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare dagli enti locali e consegnate alla Regione competente nel corso delle riunioni tecniche svoltesi presso il Ministero;

**RILEVATO** che la Regione Siciliana, con la stessa nota n. 754 del 30 Marzo 2010 ha reso noto l'importo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento degli interventi oggetto della presente intesa;

**ACQUISITI** gli esiti dell'istruttoria tecnica condotta congiuntamente dalla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM, dalla competente struttura regionale e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;



### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana,  
(di seguito denominate *Parti*)

si conviene e si stipula il presente

## ACCORDO DI PROGRAMMA

### Articolo 1

(*Premesse*)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

### Articolo 2

(*Oggetto e finalità*)

Il presente Accordo è finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana.

### Articolo 3

(*Programma degli interventi*)

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana vengono elencati nell'Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### Articolo 4

(*Copertura finanziaria degli interventi*)


La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 è analiticamente descritta nella seguente Tabella n.1. In particolare,

- per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Euro 55.500.000,00 sul capitolo 8640 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2008; Euro 13.993.170,00 sul capitolo 8531 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2008; Euro 1.500.000,00 sul capitolo 8531 (PG 05) di provenienza dall'esercizio finanziario 2008; Euro 62.514.881,54 sul capitolo 8640 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2009; Euro 15.602.830,00 sul capitolo 8531 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2009; Euro 3.581.690,57 sul capitolo 8531 (PG 03) di provenienza dall'esercizio finanziario 2009;
- per la Regione Siciliana, Euro 151.644.604,81 sul capitolo 892057 del Bilancio regionale.

Tabella 1 Copertura finanziaria

	FOINI	RISORSE
MATTM	cap. 8640 (01) e.f. 2008	Euro 55.500.000,00
	cap. 8531 (01) e.f. 2008	Euro 13.993.170,00
	cap. 8531 (05) e.f. 2008	Euro 1.500.000,00

*Handwritten signature/initials*



	cap. 8640 (01) e.f. 2009	Euro 62.514.881,54
	cap. 8531 (01) e.f. 2009	Euro 15.602.830,00
	cap. 8531 (03) e.f. 2009	Euro 3.581.690,57
	<b>TOTALE RISORSE MATTM</b>	<b>Euro 152.692.572,11</b>
REGIONE SICILIANA	Cap.892057	Euro 151.644.604,81
	<b>TOTALE RISORSE REGIONE</b>	<b>Euro 151.644.604,81</b>

#### Articolo 5

*(Modalità di attuazione - Soggetti attuatori)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
2. Le aree oggetto d'intervento, ove già non lo siano, dovranno essere comprese nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico in corso di predisposizione, predisposti, adottati o vigenti.

#### Articolo 6

*(Soggetti responsabili)*

1. I soggetti responsabili dell'Accordo sono individuati nella figura del Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche del MATTM e nella figura del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana.
2. I soggetti responsabili dell'Accordo provvedono di concerto a promuovere, con i Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.
3. I soggetti di cui all'art. 5 che saranno individuati quali responsabili dell'attuazione delle opere oggetto del presente Accordo, promuoveranno le attività necessarie per ottenere i progetti esecutivi e provvedere all'acquisizione dei pareri necessari a rendere i progetti immediatamente cantierabili.

#### Articolo 7

*(Attività di coordinamento)*

Le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonché quella di verifica si attuano secondo quanto indicato dal comma 2, art. 17 del citato DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26.

#### Articolo 8

*(Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo)*

1. E' costituito il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" (di seguito Comitato) a cui è demandato, senza oneri a carico del presente Accordo, il compito di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.
2. Il Comitato è coordinato dal Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche del MATTM o suo delegato che può avvalersi delle strutture di cui all'articolo 17, comma 2 del citato DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n.



26, ed è composto da un rappresentante dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente e da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Responsabile dell'Accordo può invitare i Soggetti attuatori alle sedute del Comitato in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Al "Comitato per la gestione dell'Accordo" spetta il compito di:

- a) Governare e controllare il processo complessivo di programmazione e realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
- b) assicurare, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al successivo articolo 10 la ricognizione sull'attuazione degli interventi, con cadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna annualità, evidenziando le eventuali situazioni di criticità;
- c) garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale interessato, che avverrà in coincidenza con le scadenze di cui al punto precedente;
- d) promuovere l'eventuale attivazione delle procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi ;
- e) indicare ai Soggetti Attuatori ed ai Responsabili dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
- f) definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie accertate sugli stessi - compresi i ribassi d'asta - nonché definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.

5. Il Comitato ha altresì il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione dei Responsabili dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei Soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

#### Articolo 9

##### *(Monitoraggio degli interventi)*

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, come individuate al presente Accordo, la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM, di concerto con il Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana, provvede al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio, di cui al comma precedente, è attuato con il supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA e mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).
3. I Soggetti Attuatori sono tenuti a rispettare la localizzazione dell'interventi. Per ogni eventuale modifica totale o parziale della localizzazione dell'intervento per motivate e documentate esigenze sopravvenute, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione al Comitato di cui all'art.9.
4. I Soggetti Attuatori di cui all'art. 5, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ISPRA gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato di attuazione degli interventi stessi.



Fatte salve le eventuali diverse modalità integrative individuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 5, i Soggetti Attuatori adempiono a quanto previsto dal precedente comma 3 entro 15 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti attraverso le modalità di comunicazione telematica integrate nel sistema ReNDiS- web, ed in particolare:

- comunicano la nomina del R.U.P. e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
  - trasmettono l'atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento;
  - comunicano l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, inviandone la relativa delibera ed il quadro economico risultante;
  - trasmettono la comunicazione inizio lavori;
  - forniscono, su richiesta di ISPRA, anche per le vie brevi, informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici;
  - comunicano gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
  - comunicano l'avvenuta conclusione dei lavori e trasmettono il certificato di collaudo delle opere (o il C.R.E.) corredato del quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie residue;
  - trasmettono copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale ovvero in modalità telematica.
6. I dati, le informazioni ed i documenti acquisiti nel sistema informativo ReNDiS-web saranno accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli interventi, anche ai fini delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di cui al precedente articolo 8.

#### Articolo 10

*(Impegni delle parti)*

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo devono essere realizzati assicurando il coordinamento con le azioni volte a conseguire un adeguato livello di sicurezza, anche attraverso il raccordo con la pianificazione di bacino o distretto.
2. Gli interventi strutturali e le azioni di mitigazione dovranno inoltre essere coordinati e tener conto degli sviluppi collegati ad altri atti regionali di programmazione.
3. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
  - a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - c) rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
  - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
  - e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
  - f) condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

#### Articolo 11





*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Accordo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.

In Roma, li 30 marzo 2010

Letto, approvato, sottoscritto.


Per il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministro On. Stefania Prestigiacomo

Per la Regione Siciliana

L'Assessore del Territorio e dell'Ambiente

On. Giovanni Di Mauro




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico


ALLEGATO 1

CODICE	COMUNE	TITOLO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
AG 001 B	Agrigento - Genio Civile	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 2.000.000,00
AG 002 B	Castellolibata	Interventi di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 600.000,00
AG 003 A	Cammarata	Quartiere Santa Lucia	Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia	€ 1.050.000,00
AG 004 A	Catolica Eraclea	Eraclea minore	Opere di consolidamento - Zona Eraclea Minore	€ 1.480.000,00
AG 005 B	Cianciana	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante ovest del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 942.838,00
AG 006 A	Favara	Zona tra le vie De Gasperi e De Pretis	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis	€ 1.500.000,00
AG 007 A	Luca Sicula	Centro Urbano	Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.500.000,00
AG 008 B	Montallegro	Consolidamento della parete Est del Monte Lupo sovrastante il centro abitato	Comprensorio urbano	€ 2.407.326,00
AG 009 B	Ravanusa	Consolidamento zona Est Centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
AG 010 B	Ribera	Completamento consolidamento centro abitato secca grande	Comprensorio urbano	€ 2.600.000,00
AG 011 A	Ribera	Centro Urbano	Opere di consolidamento centro urbano	€ 939.021,00
AG 012 A	Sambuca di Sicilia	Quartiere "Saraceno"	Opere di consolidamento delle cavità sotterranee con sostegni metallici e in c.a. - chiodatura - Quartiere "Saraceno"	€ 1.025.000,00
AG 013 B	San Giovanni Gemini	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 2.500.000,00
AG 014 A	Santo Stefano di Quisquina	Zona a valle villa comunale	Opere di consolidamento e rifacimento fregimazione idrica zona a valle villa comunale	€ 2.360.195,00
AG 015 A	Sciaccia	Parete coda di Volpe	Opere di consolidamento parete Coda di Volpe	€ 800.000,00
CL 016 B	Acquaviva Platani	Consolidamento della parete rocciosa a monte della Via Merino Mistretta	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
CL 017 B	Butera	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
CL 018 A	Butera	Pendici del centro Storico	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	€ 800.000,00
CL 019 A	Callinissetta	Zona collina S. Anna, centro storico, quartiere Saccara	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della Collina S. Anna, Centro Storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato	€ 4.160.000,00
CL 020 B	Serradifalco	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.700.000,00
CT 021 B	Acicatenà	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Vampolieri	Comprensorio urbano	€ 450.000,00
CT 022 A	Bronte	C.da Fontanelle	Consolidamento frana	€ 1.092.500,00
CT 023 A	Calatabiano	Lapide-Pastoria	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide-Pastoria	€ 250.000,00
CT 024 A	Castel di Iudica	Frazione Cinquegrana	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti	€ 3.000.000,00
CT 025 A	Giarre	Fraz. S. Maria la Strada	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada	€ 1.000.000,00
CT 026 A	Giarre	Codavolpe	Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe	€ 1.400.000,00
CT 027 A	Grammichele	Scarpata sottostante la via B. Buozzi	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi	€ 300.000,00






PROVINCIA	COMUNE	TITOLO	LOCALIZZAZIONE INSUBRIAMENTO	IMPORTO
CT 028 B	Licodia Eubea	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	Comprensorio urbano	€ 880.000,00
CT 029 B	Maniace	Consolidamento Sponda sinistra T. le Martello	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
CT 030 A	Maniace	Contrada Galatese-petrosino	Opere di regimazione idraulica e consolidamento delle scarpate - C.da Galatese-Petrosino	€ 1.000.000,00
CT 031 A	Misterbianco	Fraz. Poggio Lupo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo	€ 500.000,00
CT 032 B	Motta Sant'Anastasia	Opere di consolidamento del centro abitato: Area Nord Est	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
CT 033 A	Piedimonte Etneo	Fraz. Presa	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa	€ 500.000,00
CT 034 A	Raddusa	C.da San Nicolò	Opere di consolidamento del versante	€ 2.000.000,00
CT 035 A	Raddusa	Centro abitato	Trincea drenante a monte del centro abitato e paratie di pali	€ 2.500.000,00
CT 036 A	Ramasca	Centro abitato	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato	€ 1.200.000,00
CT 037 B	Randazzo	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 960.000,00
CT 038 B	Santa Venerina	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
CT 039 B	Sant'Agata Li Batriati	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucalia - Via Einaudi	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
CT 040 B	Trecastagni	Interventi di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 460.000,00
EN 041 B	Barrabianca - Genio Civile di Enna	Mitigazione del rischio zona Bivio Catena	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
EN 042 B	Conturipe	Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario	Comprensorio urbano	€ 770.000,00
EN 043 B	Gagliano C.	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.560.000,00
EN 044 A	Gagliano Castelferrato	C.da Urga	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga	€ 800.000,00
EN 045 A	Leonforte	Monte Cemigliere (zona soprastante scuola Verga) - Monte Cemigliere (zona soprastante la via Trieste)	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cemigliere - Zona soprastante scuola Verga e la via Trieste	€ 400.000,00
EN 046 B	Piazza Armerina	Interventi nel quartiere Itria	Comprensorio urbano	€ 1.130.000,00
EN 047 B	Regalbuto	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
ME 048 B	Alcara Li Fusi	Consolidamento costone roccioso sovrastante Centro Abitato	Comprensorio urbano	€ 1.880.000,00
ME 049 A	Alcara Li Fusi	C.da Cappuccini	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini	€ 1.200.000,00
ME 050 B	Ali	Opere di salvaguardia centro abitato	Comprensorio urbano	€ 900.000,00
ME 051 B	Ali Terme	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 900.000,00
ME 052 A	Basilico	C.da Badiazza	Drenaggi e opere di convogliamento - C.da Badiazza	€ 300.000,00
ME 053 A	Briolo	C.da Jannello	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - C.da Jannello	€ 3.690.000,00
ME 054 B	Capizzi	Interventi di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
ME 055 B	Capo d'Orlando	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 056 A	Capri Leone	Frazione Rocca	Opere di risagomatura e protezione versanti - Frazione Rocca	€ 550.000,00
ME 057 A	Capri Leone	Capri Leone Centro	Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali - Capri Leone Centro	€ 600.000,00
ME 058 A	Caronia	Centro abitato	Consolidamento centro abitato	€ 3.000.000,00
ME 059 B	Casalvecchio Stelvio	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.363.853,00
ME 060 B	Castel di Lucio	Completamento degli interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico in località Calvario per la S.P. 176 e per il Centro Abitato - Via S. D'Acquisto	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 061 A	Castel di Lucio	Via Durante e Via S. Lucia	Consolidamento via Durante e Via S. Lucia	€ 1.500.000,00



INDICE	COMUNE	TITOLO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
ME 062 A	Castell'Umberto	Contrada Sfaranda Inferiore	Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sfaranda Inferiore	€ 300.000,00
ME 063 B	Castroreale	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato - Completamento	Comprensorio urbano	€ 1.650.000,00
ME 064 B	Cesaro	Consolidamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del Centro Abitato in zona Castello Colonna-Rocca a Sud dell'Abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 065 A	Ficarra	Contrada gremie	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada gremie	€ 1.028.981,00
ME 066 A	Ficarra	Contrada Rinella - San Noto	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto	€ 1.450.000,00
ME 067 B	Pondachelli Fantina	Opere di salvaguardia centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 068 B	Forza D'Agro	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.250.000,00
ME 069 A	Frazzanò	Centro abitato - Via San Filippo di Fragala' - Zona Piazzale S.Lorenzo	Lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via S. Filippo di Pragala' - Zona Piazzale S.Lorenzo	€ 1.165.000,00
ME 070 A	Frazzanò	Centro abitato	Opere di consolidamento ad est del centro abitato	€ 2.500.000,00
ME 071 A	Frazzanò	Centro abitato	Monitoraggio delle aree in frana del centro abitato e delle aree ad elevato rischio idrogeologico (R4)	€ 300.000,00
ME 072 A	Galati Mamertino	C.da Galini	Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante - C.da Galini	€ 500.000,00
ME 073 A	Galati Mamertino	Pilieri	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pilieri	€ 1.100.000,00
ME 074 A	Giardini Naxos	Orto Grande	Consolidamento versante Località Orto Grande	€ 2.200.000,00
ME 075 B	Gualtieri Sicaminò	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.651.000,00
ME 076 A	Itala	Frazione Borgo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Frazione Borgo	€ 1.500.000,00
ME 077 A	Leni	Rinella	Opere di difesa costiera a difesa del centro abitato	€ 1.500.000,00
ME 078 B	Letojanni	Opere di difesa costiera	Comprensorio urbano	€ 2.000.000,00
ME 079 A	Librizzi	Librizzi centro - C.da Nasidi e Via Fraiale	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale	€ 2.150.000,00
ME 080 A	Librizzi	Librizzi centro	Opere di contenimento Librizzi centro	€ 150.000,00
ME 081 A	Librizzi	Ronco Marurà	Opere di consolidamento versante e sistemazione - Zona Ronco Marurà	€ 500.000,00
ME 082 B	Limina	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.666.000,00
ME 083 B	Lungi	Interventi di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.303.100,00
ME 084 B	Malta	Messa in sicurezza e consolidamento del costone in località Torricella della Frazione Capo	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 085 B	Malvagna	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 086 B	Mandanoici	Opere di salvaguardia centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.770.000,00
ME 087 B	Messina	Opere di consolidamento località Giampileri	Comprensorio urbano	€ 240.000.000,00
ME 088 B	Messina	Opere di salvaguardia centro abitato	Comprensorio urbano	€ 8.000.000,00
ME 089 A	Messina	Ponte Schiavo, Mili, Santo Stefano, Santa Margherita, Galati Marina	Opere di consolidamento località Ponte Schiavo, Mili, Santo Stefano, Santa Margherita, Galati Marina	€ 4.000.000,00
ME 090 B	Miltello Rosmarino	Consolidamento all'interno del centro abitato in c/da Ramisi	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
ME 091 A	Mirto	Centro abitato	Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000,00



NUMERO	COMUNE	TITOLO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
ME 092 A	Mistretta	Centro abitato di Mistretta - Torrente Santa Domenica	Regimentazione a ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta - Torrente Santa Domenica	€ 800.000,00
ME 093 B	Monforte San Giorgio	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
ME 094 B	Motta Camastra	Completamento consolidamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Marcusa	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 095 A	Naso	Gattina	Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Gattina	€ 600.000,00
ME 096 B	Novara di Sicilia	Consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 400.000,00
ME 097 B	Pagliara	Interventi di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 098 B	Patti	Consolidamento frazione Sorrentino	Comprensorio urbano	€ 1.300.000,00
ME 099 A	Piraino	Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Clavole	Opere di consolidamento - Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Ciami, Portiera, Torre delle Clavole	€ 1.100.000,00
ME 100 A	Raccuja	Centro abitato - C. da Zappa	Opere di consolidamento - Zona Centro abitato	€ 5.000.000,00
ME 101 B	Resitano	Opere di consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 980.000,00
ME 102 B	Roccalumera	Consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 850.000,00
ME 103 B	Roccalvaldina	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.885.000,00
ME 104 B	Roccella Valdemone	Opere di salvaguardia centro abitato	Comprensorio urbano	€ 875.000,00
ME 105 A	Rometta	Lungomare centro abitato	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	€ 1.000.000,00
ME 106 A	S. Alessio Sicule	Centro abitato	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato	€ 5.000.000,00
ME 107 B	San Fratello	Opere di consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 18.000.000,00
ME 108 B	San Pier Niceto	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.550.000,00
ME 109 A	San Pier Niceto	Centro abitato	Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato	€ 600.000,00
ME 110 A	San Piero Patti	Centro abitato - Via L. Da Vinci, Via Catania, Via Umbria, Via Roma, SP. 122 San Piero Patti - Favoscuaro	Opere di consolidamento e regimentazione idraulica del centro abitato	€ 1.850.000,00
ME 111 B	Santa Lucia del Mela	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.300.000,00
ME 112 B	Santa Lucia del Mela	Consolidamento ed eliminazione rischio idrogeologico perimetro urbano in Contrada Grazia in prossimità del Viale dei Pini	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
ME 113 A	Santa Marina Salina	Fraz. Lingua e zona del Faro	Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro	€ 2.000.000,00
ME 114 B	Sant'Agata di Militello	Intervento di difesa idraulica del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.710.000,00
ME 115 A	Sant'Angelo di Brolo	Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona Via Vallonello e Via Trento e centro urbano	Opere di consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona Via Vallonello e Via Trento e centro urbano	€ 8.000.000,00
ME 116 B	Savoca	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
ME 117 B	Scaletta Zanclea	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della e/da Guidomandri Superiore	Comprensorio urbano	€ 5.000.000,00
ME 118 A	Scaletta Zanclea	Centro abitato - T. Divieto	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torrente Divieto	€ 1.400.000,00
ME 119 A	Sinagra	Contrada Farano	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Farano	€ 3.000.000,00
ME 120 A	Sinagra	Martini	Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini	€ 1.000.000,00
ME 121 A	Sinagra	Contrada Mulinazzo	Drenaggi e gabbioni - C/da Mulinazzo	€ 2.500.000,00
ME 122 B	Spadafora	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.330.000,00



	COMUNE	TITOLO	LOCALIZZAZIONI ESTERMINIO	IMPORTO
ME 124 A	Spadafora	Fraz. S. Martino	Consolidamento dell'orca - Fraz. S. Martino	€ 1.500.000,00
ME 124 A	Terme Vigliatore	Terme Marchesana	Ripascimento scogliere - Zona Terme Marchesana	€ 3.833.875,00
ME 125 A	Tortorici	Lembo - Pellizza	Muri e parato montevalle e opere idrauliche - Zona Lembo-Pellizza	€ 1.500.000,00
ME 126 A	Tortorici	S. Antonio Sciertino	Muri su pali e raccolta acque - Zona S. Antonio-Sciertino	€ 500.000,00
ME 127 A	Tortorici	S. Paolo	Muri e parato montevalle e opere idrauliche - Zona S. Paolo	€ 3.300.000,00
ME 128 A	Tortorici	Batana - Pagliara - S. Leone	Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliara-S. Leone	€ 500.000,00
ME 129 A	Tortorici	Via Zappulla	Opere di consolidamento, regimazione idraulica e drenaggi - Zona via Zappulla	€ 4.000.000,00
ME 130 A	Tusa	Castel di Tusa (Viale Europa Unita)	Proseguimento della barriera soffiata a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00
ME 131 B	Ucria	Consolidamento del Centro Urbano in località Vastie Belvedere	Comprensorio urbano	€ 1.261.000,00
ME 132 A	Ucria	Via Annunziata	Consolidamento mediante parati a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio - Zona via Annunziata	€ 2.500.000,00
ME 133 B	Valdina	Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	Comprensorio urbano	€ 2.000.000,00
ME 134 B	Venetico	Consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.554.100,81
PA 135 B	Altofonte	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 800.000,00
PA 136 A	Belmonte Mezzagno	Centro urbano	Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano	€ 3.000.000,00
PA 137 A	Blufi	Centro urbano	Opere di consolidamento del centro urbano	€ 2.000.000,00
PA 138 B	Caltavuturo	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 811.000,00
PA 139 A	Campofelice di Rocca	C/da Belvedere	Opere di consolidamento - C/da Belvedere	€ 1.300.000,00
PA 140 A	Camporeale	Centro abitato	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00
PA 141 B	Capaci	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
PA 142 A	Carini	Zona industriale	Barriere paramassi - Zona Industriale	€ 1.000.000,00
PA 143 A	Castelbuono	C/da Liccia	Opere di drenaggio consolidamento - C/da Liccia	€ 2.000.000,00
PA 144 B	Castronovo di S.	Opere di consolidamento del centro abitato: versante Est a difesa della Scuola Elementare di Via Mazzini, ecc.	Comprensorio urbano	€ 1.600.000,00
PA 145 A	Castronovo di Sicilia	Centro Urbano	Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.344.000,00
PA 146 B	Geraci Siculo	Progetto di consolidamento della zona nord orientale	Comprensorio urbano	€ 1.057.000,00
PA 147 B	Marinico	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 2.257.528,00
PA 148 A	Mezzojuso	Collina Brigna	Opere di consolidamento - Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00
PA 149 A	Mistineti	C/da piano Stoppa	Opere di regimazione idraulica - C/da piano Stoppa	€ 2.000.000,00
PA 150 A	Palermo	C/da Belmonte Chiavelli	Opere di regimazione idraulica - C/da Belmonte Chiavelli	€ 4.300.000,00
PA 151 B	Partinico	Consolidamento annesso roccioso Colle Cesarò-torzo straleto	Comprensorio urbano	€ 950.000,00
PA 152 A	Petralia Sottana	Quartiere Casale e Scavarello	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello	€ 1.200.000,00
PA 153 B	Polizzi Generosa	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 920.000,00
PA 154 A	Polizzi Generosa	Via G. Borgego	Opere di consolidamento - Zona via G. Borgego	€ 500.000,00
PA 155 B	Termini Imerese	Intervento di monitoraggio del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 198.625,00



	COMUNITA'	TITOLO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
PA 156 A	Termini Imerese	Foce Fiume Torto	Risegomatura argini e opere di pulitura - Zona foce Fiume Torto	€ 800.000,00
PA 157 A	Valledolmo	C/da Ronella	Opere di consolidamento - C/da Ronella	€ 500.000,00
RG 158 B	Modica	Consolidamento e messa in sicurezza colline Giacanta e Monserrato	Comprensorio urbano	€ 3.000.000,00
RG 159 A	Modica	Torrente S. Liberale	Opere di sistemazione idraulica e dei versanti - Zona Torrente S. Liberale	€ 800.000,00
RG 160 B	Ragusa	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.692.234,00
SR 161 A	Avola	C/da cavagrande del cassibile	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C/da Cavagrande del Cassibile	€ 600.000,00
SR 162 A	Carlentini	Centro abitato via venezia via 4 novembre via dei caduti	Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000,00
SR 163 B	Pachino	Intervento in Contrada Raneddi	Comprensorio urbano	€ 2.000.000,00
SR 164 B	Potto Palo di Capo Passero	Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 719.000,00
SR 165 A	Portopalo di Capo Passero	C/da casuzze-scalo mandrie	Ripristino e stabilizzazione scarpate - ripristino e protezione litorale - Zona C/da Casuzze-Scalo mandrie	€ 800.000,00
SR 166 B	Rosolini	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
SR 167 A	Rosolini	Vallone ristallo-masiugno	Consolidamento versante e sistemazione idraulica - Zona vallone Ristallo-Masiugno	€ 1.500.000,00
TP 168 A	Erice	Crocifissello	Consolidamento costone roccioso - Zona Crocifissello	€ 500.000,00
TP 169 A	Mazara del Vallo	Tonnarella	Opere di protezione consolidamento o ripristino funzionalità infrastrutture - Zona Tonnarella	€ 800.000,00
TP 170 B	Poggioreale	Consolidamento versante orientale dell'abitato	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
TP 171 A	Salemi	C/da Monte Rose	Sistemazione del costone roccioso Monte Rose a monte della via Marsala - Zona C/da Monte Rose	€ 1.500.000,00
TP 172 A	San Vito Lo Capo	Makari	Collocazione rete paramassi - Zona Makari	€ 450.000,00
TP 173 A	Trapani	Salinagrande	Opere di regimazione idraulica - Zona Salinagrande	€ 4.000.000,00

SOMMAMO € 304.337.176,92



PAGINA BIANCA





*Il Commissario Straordinario Delegato*



## ALLEGATO 2



---

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo

Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

PAGINA BIANCA



Mod. 7

*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

15/06/2011 // C. 3. AGG. 2011

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il Regolamento del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DPR 3 agosto 2009, n. 140;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l' articolo 2, comma 240;

**VISTA** la legge di stabilità n. 13.12.2010 n. 220;

**VISTA** la legge 13.12.2010 n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011-2013;

**VISTA** la Direttiva generale sull' attività amministrativa e sulla gestione per il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l' anno 2011 di cui al Decreto Ministeriale n. GAB/DEC/2011/0017 del 18/02/2011;

**VISTO** l' Accordo di Programma tra il Ministero dell' Ambiente e la Regione Siciliana, sottoscritto il 30 marzo 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 3/5/2010, Reg. n. 4 Fog. 297, finalizzato all' individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Siciliana;


**VISTO** l' Atto Integrativo all' Accordo di Programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana per un importo complessivo di Euro 21.251.185,84, di cui risorse nazionali pari a Euro 12.756.002,61 e risorse regionali pari a Euro 8.495.183,23;

**CONSIDERATO** che la copertura finanziaria delle risorse nazionali è assicurata per Euro 12.756.002,61 con fondi che periodicamente saranno attribuiti dal Ministero dell' Economia e delle Finanze ai sensi dell' Art. 2, comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 sul capitolo 8531(06) appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**TENUTO CONTO** che la copertura finanziaria delle risorse regionali è assicurata per complessivi Euro 8.495.183,23 con fondi di bilancio della Regione Siciliana sul capitolo 842057.

**RITENUTO** di procedere all' approvazione, con apposito decreto direttoriale, del sopracitato Atto Integrativo;

CORTE DEI CONTI



0019916-12/08/2011-SCCLA-Y30PREV-A

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI  
Add. 26 SET 2011  
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI  
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO  
DEL TERRITORIO  
Reg. N. 109/11  
IL CONSIGLIERE

## D E C R E T A:

Art. 1 – E' approvato l'unito Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, stipulato a valle delle motivazioni specificatamente descritte nelle premesse dell'Atto stesso ed integralmente richiamate nel presente decreto.

Art. 2 – L'onere per la copertura finanziaria dell'Atto Integrativo di cui sopra, quantificato in complessivi Euro 21.251.185,84, è assicurato dalle fonti finanziarie indicate in premessa.

Il presente decreto, corredato da un "Piano di azione esplicativo" dei Piani Straordinari di cui all'art. 2, comma 240 della Legge Finanziaria 2010, sarà trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto riscontro.


IL DIRETTORE GENERALE

(Dot. Marco Lupo)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
presso il MINISTERO AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
VISTO N. 357

Addi, 10.8.2011.....

IL DIRETTORE



Mod. 7

*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE  
IDRICHE

APPUNTO PER LA CORTE DEI CONTI

*Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico*

Piano di azione. Accordi di Programma integrativi

Il Decreto Legge n. 225/2010, convertito con legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ("*Decreto milleproroghe*"), all'art. 2, comma 12 quinquies, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per il 2011 da ripartire tra la regione Liguria, la regione Veneto, la regione Campania e i comuni della provincia di Messina, colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009.

All'onere derivante da tale previsione si dovrà provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), che sono corrispondentemente ridotte di pari importo.

Tale disposizione impone al Ministero dell'Ambiente di intervenire sul Piano di azione già elaborato, "integrando" gli Accordi di Programma sottoscritti. Si ricorda che l'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria 2010 aveva destinato 1.000 milioni di euro, successivamente ridotti a 900 milioni di euro per l'effetto dell'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legge 195/2009 convertito, con modificazioni, in legge 26/2010, alla realizzazione di Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Autorità di Bacino e il Dipartimento della protezione civile nazionale. La stessa norma aveva altresì individuato, quale strumento privilegiato per l'utilizzo delle risorse, l'accordo di programma da sottoscrivere con le regioni interessate. Nell'occasione, il Ministero dell'Ambiente aveva incrementato la dotazione di 1.000 milioni di euro, originariamente prevista dalla legge finanziaria, con le risorse direttamente disponibili sul proprio bilancio per le finalità di difesa del suolo pari a circa 386 milioni di euro, destinando, pertanto, al finanziamento dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, un totale complessivo di 1.386 milioni di euro. Ciò, con l'obiettivo di programmare in maniera unitaria le risorse disponibili realizzando un complesso di interventi quanto più possibile organico e coordinato ed evitando, al contempo, duplicazioni di atti programmatici e procedure di spesa aventi medesime finalità. Si è inteso, quindi, ripartire una parte delle risorse,

pari a circa il 70% del totale, tra tutte le regioni sulla base di specifici criteri elaborati nell'ambito di uno studio effettuato dagli Uffici del Ministero dell'Ambiente; si è deciso, altresì, di ripartire l'altra parte delle risorse, pari a circa il 30% del totale, tra le regioni del Mezzogiorno, in considerazione del fatto che le risorse assegnate con la citata disposizione provenivano originariamente dai Fondi per le aree sottoutilizzate e che per queste, normalmente, trova applicazione un criterio di ripartizione territoriale (85% alle Regioni del Mezzogiorno-15% alle restanti Regioni) che tiene conto degli squilibri economico-sociali fra le diverse zone del Paese (art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009). In particolare, sono stati utilizzati i coefficienti tradizionali, opportunamente ricalibrati anche in funzione della misura della compartecipazione finanziaria al programma da parte delle regioni interessate (allegato 1).

Ora, alla luce della recente ed ulteriore riduzione operata dal decreto *milleproroghe*, è necessario riconsiderare la quantificazione delle risorse da attribuire alle singole regioni (allegato 2). La tabella dà evidenza, tra l'altro, di un "recupero" di circa 60 milioni di euro a valere sugli Accordi di Programma sottoscritti con le regioni del Nord che potranno essere ridistribuiti alle regioni del Mezzogiorno che si vedranno assegnati complessivamente oltre 708 milioni di euro.

Il valore complessivo degli Accordi di Programma sarà pari ad Euro 2.146.152.538,63; le risorse statali, pari ad Euro 1.200.939.376,59, sono comprensive di risorse FAS (Euro 800.000.000,00) e di risorse di bilancio 2008, 2009, 2010 (Euro 386.080.415,23) nonché, limitatamente alla quota di Euro 14.858.961,36, di risorse di bilancio 2011.


IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Marco Lupo



Allegato I

REGIONE	Riparto secondo i coefficienti relativi: Superf. 25% Popolazione 25% Criticità idrogeol. 35% Erosione coste 15%	RIPARTO RICALIBRATO SOLO PER REGIONI FAS	RIPARTO DEFINITIVO PREMIABITA REGIONI FAS (*)
Abruzzo	3,154%	8%	5%
Basilicata	1,856%	5%	3%
Calabria	6,795%	17%	21%
Campania	7,632%	19%	16%
Molise	1,701%	4%	2%
Puglia	6,155%	16%	19%
Sardegna	3,790%	10%	9%
Sicilia	8,471%	21%	26%
<b>TOTALE</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

(\*) che tiene conto anche della compartecipazione



Allegato 2

REGIONE	RISORSE secondo i coefficienti di cui: a) spesa per risorse 85% b) spesa di progetto 15%	ACCORDI SOTTOSCRITTI					REGIONI CENTRO E NORD				REGIONI SUD			VALORI FINALI DEGLI ACCORDI	
		FONDI PER SANITÀ	ASSEGNAZIONE IN BASE ALL'ESISTENTE DI RISORSE	ATTIVITÀ PREVALITE*	FONDAZIONE REGIONALE	TOTALE OAP	FONDI ATTO INTEGRAZIONE BIMANICORRE	PREVALITE IN ATTO INTEGRAZIONE	PREVALITE* DEFINITIVA REGIONI SUD	TOTALE MATTERIA RUBERIFIO REGIONI SUD	TOTALE MATTERIA RUBERIFIO	TOTALE OAP RUBERIFIO			
1. Abruzzo	30.750.000,00	30.750.000,00	114.000,00	10.500.000,00	40.250.000,00	-	-	12.155.752,30	17.289.766,26	47.505.762,26	47.505.762,26	57.905.762,26			
2. Basilicata	21.000.000,00	21.000.000,00	2.155.000,00	6.735.000,00	24.290.000,00	-	-	8.165.000,00	10.465.000,00	24.660.000,00	24.660.000,00	28.490.000,00			
3. Calabria	115.000.000,00	115.000.000,00	44.970.000,00	110.000.000,00	260.000.000,00	-	-	23.235.000,00	51.263.000,00	135.263.000,00	135.263.000,00	173.192.000,00			
4. Campania	115.000.000,00	115.000.000,00	35.552.000,00	116.000.000,00	260.000.000,00	-	-	14.246.479,28	50.584.224,28	124.246.352,28	124.246.352,28	173.492.727,28			
5. Emilia Romagna	96.000.000,00	96.000.000,00	28.500.000,00	6.285.000,00	130.785.000,00	-	-	5.800.000,00	25.155.000,00	136.940.000,00	136.940.000,00	172.095.000,00			
6. Lazio	23.420.000,00	23.420.000,00	331.000,00	30.000.000,00	54.000.000,00	-	-	2.500.000,00	30.000.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	66.000.000,00			
7. Liguria	30.750.000,00	30.750.000,00	-	117.370.000,00	224.590.000,00	-	-	7.732.000,00	56.432.338,25	132.022.000,00	132.022.000,00	168.754.000,00			
8. Marche	15.300.000,00	15.300.000,00	10.000,00	3.000.000,00	19.310.000,00	-	-	7.437.000,00	7.437.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	29.337.000,00			
9. Molise	35.300.000,00	35.300.000,00	-	3.000.000,00	38.300.000,00	-	-	-	-	38.300.000,00	38.300.000,00	41.300.000,00			
10. Piemonte	110.000.000,00	110.000.000,00	50.384.000,00	102.000.000,00	260.000.000,00	-	-	10.452.000,00	54.718.404,37	130.432.404,37	130.432.404,37	170.822.404,37			
11. Puglia	35.000.000,00	35.000.000,00	25.800,00	5.000.000,00	70.000.000,00	-	-	28.500.000,00	27.605.058,02	64.391.058,02	64.391.058,02	68.366.058,02			
12. Sardegna	151.500.000,00	151.500.000,00	78.500.572,11	151.414.601,31	304.417.074,42	-	-	11.556.202,64	82.337.374,72	155.448.574,72	155.448.574,72	207.000.000,00			
13. Sicilia	67.000.000,00	67.000.000,00	433.000,00	58.578.545,00	125.911.545,00	-	-	5.700.000,00	27.000.000,00	132.911.545,00	132.911.545,00	169.911.545,00			
14. Toscana	21.000.000,00	21.000.000,00	2.300.000,00	11.384.450,00	34.684.450,00	-	-	7.000.000,00	11.000.000,00	45.684.450,00	45.684.450,00	56.684.450,00			
15. Valle d'Aosta	10.000.000,00	10.000.000,00	300.000,00	11.384.450,00	21.684.450,00	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	61.684.450,00	61.684.450,00	71.684.450,00			
16. Veneto	55.350.000,00	55.350.000,00	730.000,00	11.384.450,00	57.464.450,00	-	-	132.253.000,48	224.704.875,59	703.478.376,59	703.478.376,59	815.943.376,59			
TOTALE	2.195.524.577,11	2.195.524.577,11	265.071.572,11	945.212.162,04	2.824.855.741,15	-	-	132.253.000,48	224.704.875,59	703.478.376,59	703.478.376,59	815.943.376,59			

DISPONIBILI\* 2008, 2009, 2010  
SOSTANZIALMENTE

1.186.088.415,23  
14.652.961,56  
96.618,00

DISPONIBILI\* 2008, 2009, 2010  
SOSTANZIALMENTE

1.186.088.415,23  
14.652.961,56  
96.618,00

DISPONIBILI\* 2008, 2009, 2010  
SOSTANZIALMENTE

1.186.088.415,23  
14.652.961,56  
96.618,00

REGIONE	RISORSE	DISPONIBILI* ECCEZIONALI TOTALI	DISPONIBILI* ECCEZIONALI TOTALI (che tiene conto anche della quota di compartecipazione)
1. Abruzzo	30.750.000,00	755.343.157,05	755.343.157,05
2. Basilicata	21.000.000,00	1.285.000.415,13	1.285.000.415,13
3. Calabria	115.000.000,00	170.600.000,00	170.600.000,00
4. Campania	115.000.000,00	1.285.000.415,23	1.285.000.415,23
5. Emilia Romagna	96.000.000,00	103.095.005,20	103.095.005,20
6. Lazio	23.420.000,00	1.186.088.415,23	1.186.088.415,23
7. Liguria	30.750.000,00	-	-
8. Marche	15.300.000,00	-	-
9. Molise	35.300.000,00	-	-
10. Piemonte	110.000.000,00	-	-
11. Puglia	35.000.000,00	-	-
12. Sardegna	151.500.000,00	-	-
13. Sicilia	67.000.000,00	-	-
14. Toscana	21.000.000,00	-	-
15. Valle d'Aosta	10.000.000,00	-	-
16. Veneto	55.350.000,00	-	-
TOTALE	2.195.524.577,11	-	-





***Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare***

**e**

***Regione Siciliana***

**ATTO INTEGRATIVO  
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30 MARZO 2010  
FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL  
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E  
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO**

PAGINA BIANCA

**PREMESSE**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

**VISTO** il Regolamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DPR 3 agosto 2009, n. 140;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l’articolo 2, comma 240 che aveva previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, venissero assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la legge 13.12.2010 n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011-2013;

**VISTA** la legge di stabilità n. 13.12.2010 n. 220;

**VISTA** la Direttiva generale sull’attività amministrativa e sulla gestione per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l’anno 2011 di cui al Decreto Ministeriale n. GAB/DEC/2011/0017 del 18/02/2011 registrata alla Corte dei Conti il 28 marzo 2011, Registro n. 2, Foglio n. 142;

**VISTO** l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Siciliana, sottoscritto il 30 marzo 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 3/5/2010, Reg. n. 4 Fog. 297, finalizzato all’individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Legge 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, che, all’art. 2, comma 12-quinquies, ha ridotto di un importo pari ad euro 100 milioni le risorse stanziati dall’art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, già divenute 900 milioni per l’effetto dell’articolo 17, comma 2-bis, del decreto legge 195/2009 convertito, con modificazioni, in legge 26/2010;

**QUANTIFICATE** in complessivi Euro 12.756.002,61 le ulteriori risorse statali rese disponibili ai sensi dell’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 da attribuire alla Regione Siciliana per il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** il verbale della riunione del 24 marzo 2011 del Comitato di indirizzo e controllo dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Siciliana, nell’ambito della quale la Regione Siciliana ha comunicato la disponibilità di Euro 8.495.183,23 provenienti dalla revoca di finanziamenti nell’ambito del POR-FESR 2007-2013 – Linee di intervento 2.3.1.1 e 2.3.1.2 disposta con DDG n. 156 del 18.3.2011, per il finanziamento di ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da utilizzare nel presente Atto integrativo all’Accordo di Programma del 30 marzo 2010;

**RAVVISATA** quindi la necessità di procedere alla programmazione delle menzionate risorse attraverso l’individuazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzare nel territorio della Regione Sicilia.

**VISTO** il verbale della riunione del 24 marzo 2011 del Comitato di indirizzo e controllo dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Siciliana, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del...

*[Handwritten signature]*

territorio e delle Risorse Idriche, la Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente che è competente anche per la gestione dei bacini regionali e il Dipartimento della Protezione Civile hanno concordato l'individuazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico integrativi dell'Allegato 1 all'Accordo di programma del 30 marzo 2010, individuando gli interventi a valere sui fondi ministeriali (lettera A) e quelli di competenza regionale (lettera B);

**VISTA** la nota del Commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 30 marzo 2011 Prot. n. 371/UC del 30 marzo 2011;

**VISTA** l'integrazione al verbale della riunione del 24 marzo 2011 del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, la Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RIA/24234 del 12 aprile 2011 con la quale lo stesso Dipartimento ha preso atto che gli interventi identificati nell'ambito della menzionata riunione del 24 marzo 2011 hanno la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione del rischio ed hanno un effettivo impatto per la tutela dell'incolumità della vita umana.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana (di seguito denominate *Parti*)

si conviene e si stipula il presente

### ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30 MARZO 2010

#### Articolo 1

(*Premesse*)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

#### Articolo 2

(*Oggetto e finalità*)

Il presente Atto Integrativo è finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana.

#### Articolo 3

(*Programma degli interventi*)

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana vengono elencati nell'Allegato 1 al presente Atto Integrativo, che ne costituisce parte integrante, per un importo complessivo di Euro 21.251.185,94. Tale elenco rappresenta una integrazione di quello riportato in Allegato 1 dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, registrato dalla Corte dei Conti in data 3/5/2010, Reg. n. 4 Fog. 297.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa - sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria - che saranno

regolati con le modalità di cui all'articolo 5 del citato Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010.

#### Articolo 4

*(Copertura finanziaria degli interventi)*

La copertura finanziaria del fabbisogno, pari a complessivi Euro 21.251.185,84 è analiticamente descritta nella successiva Tabella n.1, che integra l'omologa Tabella n. 1 dell'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010.

Tabella 1

	FONDI	RISORSE
MATTM	Art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191	12.756.002,61
	<b>TOTALE RISORSE MATTM</b>	<b>12.756.002,61</b>
REGIONE SICILIANA	Cap. 842057	8.495.183,23
	<b>TOTALE RISORSE REGIONE</b>	<b>8.495.183,23</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>21.251.185,84</b>

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare metterà a disposizione le risorse di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei tempi in cui le stesse saranno direttamente disponibili nel proprio bilancio.

#### Articolo 5

*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma, comprendente come parti integranti e sostanziali l'Allegato 1 e l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.
3. Per quanto non riportato nel presente Atto Integrativo, si rimanda all'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010.

Letto, approvato, sottoscritto.

In Roma, il 3 maggio 2011

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministro


Stefania Prestigiacomo



Per la Regione Siciliana

L'Assessore del Territorio e dell'Ambiente

Calogero Spatola



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO  
 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
 PRESSO IL MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 VISTO N. 541  
 Addì, 10.5.2011

IL DIRETTORE




DEPARTAMENTO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 REGIONALE  
 OPERATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30 MARZO 2010 FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA  
 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
 (dati per Provincia e Comune)

N°	Cod	Provincia	Comune	Localizzazione intervento	Titolo	Importo (Euro)
174	B	AG	Naro	Zone adiacenti la via rotabile Agrigento o tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla SS 576	Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato	1.067.000,00
175	B	AG	Palma di Montechiaro	Centro urbano	Lavori di rinaturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano	1.800.000,00
176	B	CT	Sant'Alfio	Torrente Tagliaborse	Completamento consolidamento costone	1.900.000,00
177	A	ME	Brolo	C.da Iannello Alto	Consolidamento e salvaguardia fabbricati	600.000,00
178	A	MR	Capri Leone	Centro abitato	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)	1.000.000,00
179	A	PA	Altofante	Centro abitato	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	600.000,00
180	A	PA	Cefalù	Località Testardita	Messa in sicurezza movimenti franosi	90.000,00
181	A	PA	Cefalù	Località Testardita - Proprietà Greco	Messa in sicurezza movimenti franosi	400.000,00
182	B	PA	Corleone	Contrada San Giovanni	Messa in sicurezza costone roccioso	1.578.183,73
183	B	PA	Pollina	Rupe San Pietro	Consolidamento	800.000,00
184	A	SR	Avola	Linea di costa di Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	2.000.000,00
185	A	SR	Buscemi	Santuario della Madonna del Mosso	Consolidamento costone sottostante il Santuario	200.000,00
186	A	SR	Porto Palo di Capo Passero	Casuzza - Scalo Mandrie	Regimazione acque e consolidamento scarpata	600.000,00
187	A	SR	Rosolini	Centro abitato	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	1.800.000,00
188	A	SR	Siracusa	Falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio - 2° lotto	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	3.456.002,61
189	A	TP	Mazara del Vallo	Bacino portuale e del retrostante porto canale Zona Foce fiume Mazzaro	1° stralcio lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	2.000.000,00
190	B	TP	San Vito lo Capo	Cala di Grottazza nel territorio comunale	Consolidamento del tratto di costa	1.350.000,00
<b>Totale</b>						<b>21.251.185,84</b>



*Il Commissario Straordinario Delegato*



### ALLEGATO 3



---

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo

Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

PAGINA BIANCA





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

PROT. N. 32454/TRI/Δ1

14 DIC. 2010

RACCOMANDATA A/R

All'Ing. Santi Muscarà  
Via Capodiceci 51  
SIRACUSA  
fax 091 581683

Al dott. Maurizio Croce  
Via San Paolo dei Disciplinanti, 10  
98122 MESSINA  
fax 06 89280585

Al Ministero infrastrutture e trasporti  
c. a. Capo di Gabinetto Dott. C. Iafolla  
ROMA  
fax 06 44267370

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Dip. della Protezione civile  
c. a. Capo del Dipartimento  
Via Ulpiano, 11  
ROMA  
fax 06 68897696

Al Presidente della Regione Siciliana  
Commissario delegato ai sensi delle  
OPCM 3815/2009 e 3865/2010  
c. a. Dott. Raffaele Lombardo  
PALERMO  
fax 091 7075199

Alla Regione Siciliana  
Assessore Territorio e Ambiente  
c. a. Dott. G. Sparma  
PALERMO  
Fax 091 7078607

ANTICIPATA VIA FAX

**Oggetto:** interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana.  
Notifica del DPCM del 10 dicembre 2010.

Si comunica che con DPCM del 10 dicembre u.s., trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, il dott. Maurizio Croce è stato nominato commissario straordinario, in sostituzione del dimissionario ing. Santi Muscarà (già nominato con DPCM del 16 luglio 2010), ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dall'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, tra questo Ministero e la Regione Siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marco Lupo



H00



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

su proposta  
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

VISTA la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenza nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile";



VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuate nel territorio della Regione Siciliana, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana – Assessorato del territorio e dell'ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010 con il quale è stato nominato l'ing. Santi Muscarà commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato in premessa da effettuare nel territorio della Regione Siciliana;

VISTA la nota dell'ing. Santi Muscarà n. 650 del 24 novembre 2010 nella quale il medesimo rassegna le proprie dimissioni dall'incarico in questione per motivi familiari e di salute;

RITENUTO pertanto che sia necessario provvedere alla nomina di un nuovo commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 al suddetto Accordo di Programma, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana;

RITENUTO che in sostituzione del dimissionario ing. Santi Muscarà possa essere nominato il dott. Maurizio Croce, in considerazione dell'alta e specifica professionalità e comprovata esperienza posseduta, requisiti indispensabili per lo svolgimento dell'incarico;

SENTITI il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Regione Siciliana;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

## DECRETA

### ART. 1

1. Il dott. Maurizio Croce è nominato, in sostituzione dell'ing. Santi Muscarà, commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato in premessa da effettuare nel territorio della Regione Siciliana.

2. L'incarico ha durata triennale, prorogabile, a decorrere dalla data del presente decreto.



## ART. 2

1. Il commissario straordinario delegato attua gli interventi di cui all'articolo 1, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 citato in premessa e delle norme ivi richiamate.

2. Il suddetto commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data del presente decreto di nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

3. Il menzionato commissario, per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presenta al Parlamento, annualmente ed al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

## ART. 3

1. Il commissario è tenuto a presentare un cronoprogramma di attuazione degli interventi ai soggetti responsabili dell'Accordo di Programma di cui al comma 1 e, qualora non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma medesimo, provvederà a comunicare senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## ART. 4

1. Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tale attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art 92 del D. lgs. n. 163 del 2009 e s.m.i. e di cui all'art 17 del D.P.R. n. 554 del 1999.

2. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario straordinario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.



## ART. 5

1. Il commissario straordinario invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione trimestrale sull'attività svolta, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione delle opere.

## ART. 6


1. Con successivi provvedimenti, su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri per la determinazione e la corresponsione del compenso spettante al commissario straordinario.

2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1.


Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 DIC 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



PAGINA BIANCA



*Il Commissario Straordinario Delegato*



## ALLEGATO 4



---

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo

Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

PAGINA BIANCA





*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche*

## FAX

**A: Ai Commissari Straordinari Delegati per l'attuazione  
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.**

REGIONE PUGLIA  
Dott. MAURIZIO CROCE  
0802140585

**Da: Direzione Generale per la tutela del territorio e delle  
risorse idriche Div. X**

**Data: 07/12/11**

**Messaggio: D.P.C.M. 20 luglio 2011.**

**Pagg.compresa la presente.: 8**

MODULARIO  
Ambiente - 7



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

*Autografo*

37190/GR/DI/X

e p.c.

7 DIC. 2011 Mod. 7

*Roma,*

Ai Commissari straordinari delegati  
per l'attuazione degli interventi di  
mitigazione del rischio idrogeologico  
LORO SEDI

Alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo sui Ministeri istituzionali  
Via V. Talli, 141

00139 ROMA

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

**OGGETTO:** D.P.C.M. 20 luglio 2011. Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi.

Come noto alle SS.LL., sul decreto in oggetto indicato la Corte aveva formulato alcuni rilievi, a cui la Direzione aveva dato riscontro con nota del 27 ottobre 2011, n. 32745/TRI/DI.

In seguito a contatti intercorsi direttamente con la Corte, la Direzione, al fine di poter dotare quanto prima le SS.LL. dei poteri necessari ad operare con urgenza per l'attuazione degli accordi, ha inviato una nota alla Magistratura di controllo, il cui contenuto è stato condiviso informalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata data assicurazione che, in caso di registrazione del D.P.C.M., sarebbe rimasta inoperante la facoltà accordata con il medesimo decreto, di affidare incarichi di consulenza e che in tal senso, a registrazione avvenuta, sarebbe stata impartita specifica disposizione a tutti i Commissari straordinari.

File:direttivacommissariacorteconti.doc

Ora, nel comunicare che la Corte ha provveduto a registrare il provvedimento, in data 16 novembre 2011, reg. 19, fg. 243, che si allega, si segnala alle SS.LL. l'**impossibilità di avvalersi della facoltà di conferire incarichi di consulenza, di cui al comma 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. in oggetto**, e la conseguente responsabilità, anche erariale, che deriverebbe dall'avvalersi della suddetta previsione.

Si coglie, infine, l'occasione per informare che la scrivente sta predisponendo apposito quesito al fine di chiarire se il disposto dell'art. 15, comma 2 e 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge 15.7.2011, n. 111, trovi applicazione anche nei riguardi dei Commissari delegati per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.


Si fa riserva di ulteriori notizie al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM  
Dr. Renato Grimaldi





0020887-26



0020887-26/06/2011-SCOLA-Y30PREV-A

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

su proposta  
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;


VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

VISTO, in particolare, l'articolo 20 del predetto decreto legge n. 185 del 2008 concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;

VISTA la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile";



VIOLETA, MINISTRO, DEL PREVISIONE, SPESA, FINANZIAMENTO, ECONOMIA, ENERGIA, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVATIONE

consente, per l'attuazione degli interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvalgano di uno o più commissari straordinari di cui al sopra citato articolo 17 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, è necessario assicurare, alla luce della complessità delle procedure nonché dei riflessi connessi alla salvaguardia delle vite umane nonché della sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, una gestione commissariale capace di accelerarne la realizzazione, anche attraverso l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 13 del decreto legge 29 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 155, richiamato dal già citato art. 20 del decreto legge n. 185 del 2008;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono stati nominati i commissari straordinari per la velocizzazione delle procedure relative all'attuazione dei suddetti interventi, finalizzati ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti nei Piani straordinari menzionati, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i provvedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;

NO. 131 05

07/12/2011 11:47 MIN AMBIENTE DIR GEN TRI

VISTO in particolare l'art. 2 dei suddetti decreti di nomina che dispone che i commissari straordinari, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, possono avvalersi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del citato decreto legge n. 195 del 2009;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 del citato decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, cui fa richiamo il summenzionato art. 17, con il quale si dispone che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina dei commissari contengano l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare;

RITENUTO, pertanto, in ossequio al più volte citato art. 20 ed anche al fine di garantire le situazioni giuridiche soggettive dei terzi e la trasparenza dell'azione amministrativa, di dover provvedere alla suddetta specificazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo all'art. 17 del citato decreto-legge n.195 del 2009, i Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui ai citati Accordi di Programma;

CONSIDERATO che i citati Commissari straordinari hanno ripetutamente segnalato l'esigenza di poter disporre di una dotazione di mezzi e personale strettamente necessaria all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti;

VISTO l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, richiamato dall'art. 4, primo comma, dei decreti di nomina dei commissari straordinari, che consente di ricomprendere soltanto le spese relative ai costi e alle attività svolte dai soggetti che ricoprono ruoli connessi con la progettazione e realizzazione delle opere;

RITENUTO, pertanto, al fine di corrispondere alle richieste dei Commissari, di dover prevedere la possibilità di sostenere ulteriori costi funzionali all'espletamento dell'incarico, quali quelli connessi all'espletamento delle funzioni di monitoraggio ed impulso richiamati dal combinato disposto degli articoli 20 del citato decreto-legge 185/2008 e art. 17 del decreto-legge 195/2009, che non rientrano nell'ambito di applicazione del sopra citato articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

CONSIDERATO che il comma 3 del menzionato art. 20 del decreto-legge 185/2008 prevede che il commissario straordinario delegato, per l'espletamento delle attività ivi contemplate, utilizza le risorse disponibili assegnate a tal fine;

RITENUTO che si possa far fronte ai costi sopra menzionati — in una percentuale definita — a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di programma, in analogia con quanto già previsto per la corresponsione dei compensi dei citati Commissari straordinari;

RITENUTO, altresì, di dover dettare ulteriori disposizioni per accelerare lo svolgimento dei compiti dei citati Commissari straordinari;

SENTITI il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed i Presidenti delle Regioni interessate;


SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



## DECRETA

## ART. 1

1. I commissari straordinari delegati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui agli Accordi di Programma citati in premessa, i commissari straordinari delegati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immersione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri enti territoriali interessati.
4. I commissari straordinari, se dipendenti di Società a totale capitale pubblico e/o di Società dalle stesse controllate, anche in deroga ai Contratti collettivi nazionali di lavoro delle Società di appartenenza, sono collocati, in analogia a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di



servizio, a far data dal decreto di nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico.

5. Una quota, non superiore all'1,5 %, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di Programma, può essere impiegata, ove ritenuto indispensabile, dai commissari straordinari per lo svolgimento di missioni, nonché per l'acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio incarico, anche mediante conferimento di incarichi di consulenza, in misura comunque non superiore a tre unità, e corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite oltre i limiti già fissati dalla vigente normativa, al personale delle Amministrazioni pubbliche e degli altri enti dei quali gli stessi possono avvalersi ai sensi dei rispettivi decreti di nomina.
6. La quota di cui al comma che precede verrà fatta gravare sui quadri economici dei singoli interventi previsti nel singolo Accordo di programma.
7. La quota di cui ai commi precedenti non incide sulla quota prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, richiamato dall'art. 4, primo comma, dei rispettivi decreti di nomina dei commissari straordinari.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 5 OTTOBRE 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Nikola Pisanò*

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

*Stefano*

N. 285  
28.08.2011

*[Signature]*

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI  
Addi. 16 NOV. 2011  
Reg. n. 19 Fog. n. 343

*[Signature]*

*[Stamp]*





REPUBBLICA ITALIANA

*Il Commissario Straordinario Delegato*



REGIONE SICILIANA

## ALLEGATO 5

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

---

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo

Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

PAGINA BIANCA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR161	Avola	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da Cavagrande del Cassibile						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012	Importo Finanziato	€ 600.000,00	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 193 el 14/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 479.164,03		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 600.000,00</b>	Decreto impegno e pagamento MAV	Decreto Commissariale n. 577 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto Impegno ulteriore somma	Decreto Commissariale n. 245 del 03/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 43.418,12		
						<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 522.807,15</b>		
								Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	€ 0,00

CONVENZIONI DRPC

#### Figure Tecniche

RUP	Dott. Geol. Gaetano Marino (DRPC SR)	Decreto di Incarico	D.C. n. 169 del 16/04/2012	allegato al DRPC		Decreto di Incarico	
Progettista	DRPC SR	Ing. Davide Di Grazia	Nota di Incarico	prot. n. 45374 del 25/09/2008	coord. idrogeologico fase progetto	Nota di Incarico	
Geologo			Determina di incarico				
Direttore Lavori	Ing. Davide Di Grazia (DRPC SR)	Nota di Incarico	prot. n. 45374 del 25/09/2008	Assistente al DC		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Nota di Incarico				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.ar.l.	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 661 del 03/12/2012	data contratto	11-dic-12
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	18-dic-12	data presunta di termine lavori	16-apr-13

REGIONE  
SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REPUBBLICA  
ITALIANA

SR161	Avola	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da Cavagrande del Cassibile	Importo ApQ € 600.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 300 del 28/09/2010, al DRPC SR che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot.n. 1223 del 25.07.2011. A seguito della verifica degli elaborati e della richiesta di apportare modifiche da parte del Commissario con nota prot.n. 1974 del 04.10.2011, il DRPC di SR ha trasmesso le integrazioni al progetto con nota acquisita al protocollo n.1063 del 29.03.2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 661 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012</p> <p>In data 18/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei lavori, la cui ultimazione, essendo stati previsti a tal fine 120 giorni naturali e consecutivi, è fissata entro il 16/04/2013</p> <p>Con nota protocollo n.1263 del 28/02/2013 Il Commissario, stante la relazione del D.L. condivisa dal RUP nella quale sono evidenziate le motivazioni correlate a sopravvenute circostanze imprevedute e non prevedibili in fase di progettazione, si autorizza alla redazione della Perizia di Variante Suppletiva.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 193 del 14 marzo 2013 Si Impegna la somma di € 479.164,03 per la realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota protocollo 1690 del 18/03/2013 il RUP trasmette la PVS.</p> <p>con nota prot. n. 2462 del 29/04/2013 Il D.L. Ing. Davide Di Grazia convoca la Consorzio Stabile Vitruvio SCARL e per il giorno 02/05/2013 alle ore 10,00 per procedere alla formale redazione del certificato di ultimazione lavori.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR162	Carlentini	Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti					Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 506 del 03/07/2013	Importo Finanziato	€ 763.402,88	Decreto di Impegno	Decreto n. 768 del 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 569.730,05	
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto n. 438 del 03/09/2012	Importo Finanziato	€ 36.491,85	Decreto di Impegno indagini preliminari	Decreto n. 316 del 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 24.012,06	
Decreto di Finanziamento plottaggio tavole	Decreto n. 436 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 105,27	Decreto di Impegno plottaggio tavole	Decreto n. 436 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 105,27	
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 800.000,00</b>	Decreto di disimpegno	Decreto n. 316 del 07/05/2013	Importo del disimpegno	€ 229,78	
						<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 594.077,16</b>	
							Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	€ 0,00

<b>CONVENZIONI</b>	INVITALIA	CGIAM
--------------------	-----------	-------

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Francesco Ingalisi	Decreto di incarico	D.C. n. 329 del 10/07/2012	Responsabile RUP	Arch. Francesco Giuseppe Fricano Ing. Gianluca Coroneo (Fino al 29/01/2013)	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 361 del 17/05/2013 (revoca con Decreto Commissariale n. 329 del 10/07/2012)
Progettista	INVITALIA Ing. Domenico Imbroglia@ Ing. Rossella Zumbè Ing. Alberto Peligra	Nota di Incarico	prot. n.2119 del 11/06/2012	Coord. Sicurezza fase Progetto	INVITALIA Ing. Rossella Zumbè	Nota di Incarico	prot. n.2119 del 11/06/2012
Geologo	CGIAM (Alessio D'Urso)	Determina di Incarico	prot. n. 1342 del 20/04/2012				
Direttore Lavori	Ing. Francesco Freni	Decreto di Incarico	D.C. n. 711 del 09/09/2013	Assistente al DC		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Francesco Freni	Decreto di Incarico	D.C. n. 711 del 09/09/2013				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

<b>SR162</b>	<b>Carlentini</b>	<b>Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti</b>				<b>Importo ApQ</b>	<b>€ 800.000,00</b>
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI n. 484 del 21/09/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	TRISCARI COSTRUZIONI S.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 601 del 26/07/2013	data contratto
contratto	27/09/2012	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

Con nota prot. N.

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La progettazione è stata inizialmente affidata al D.P.R.C. di Siracusa con nota n. 616 del 17/11/2010: non avendo avuto alcun riscontro e atteso il carattere di urgenza, il Commissario con nota prot. n.478 del 15/02/2012, ha revocato l'incarico.</p> <p>Con nota prot. n. 1342 del 20/04/2012 è stata incaricata la CGIAM per la predisposizione del piano di indagini preliminari, mentre la progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 1343 del 20/04/2012, ad INVITALIA.</p> <p>Le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini preliminari sono state trasmesse dalla CGIAM con nota acquisita agli atti al prot. 2875 del 25/07/2012 e sono state approvate con Decreto Commissariale n. 438 del 03 Settembre 2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 484 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari e le indagini sono ad oggi concluse.</p> <p>La CGIAM con nota protocollo n. 486 del 23/01/2013 trasmette la relazione geologica propedeutica alla fase di progettazione.</p> <p>Con nota prot. n.2483 del 29/04/2013 la Società Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati progettuali esecutivi.</p> <p>In sede di CdS tenutasi in data 06/06/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Il RUP con le note prot. n.3948del 01/07/2013 e prot. n. 3953 del 02/07/2013 trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Triscari Costruzioni srl a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 32,0000%.</p> <p>Il Commissario invita l'aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto in data 04/09/2013.</p> <p>Con Decreto n. 768 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
------------------------	--	-----	--------------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR163	Pachino	Intervento in Contrada Raneddi						Importo ApQ	2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Comitato di Indirizzo e Controllo del 24/02/2011 l'intervento transita dalla lettera B alla lettera A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di finanziamento DHI Italia rilievi batimetrici	Decreto n. 208 del 10/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 35.090,00	Decreto di impegno e pagamento DHI Italia rilievi batimetrici	Decreto n. 208 del 10/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 35.090,00		
Decreto di finanziamento Università di catania DICA	Decreto n. 302 del 28/06/2012	Importo finanziato	€ 24.200,00	Decreto di impegno e pagamento Università di catania DICA	Decreto n. 302 del 28/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 24.200,00		
Decreto di finanziamento Università di Messina	Decreto n. 228 del 27/03/2013	Importo finanziato	€ 18.150,00	Decreto di impegno e pagamento Università di Messina	Decreto n. 228 del 27/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 18.150,00		
Decreto di Finanziamento polizze assicurative per le attività dei R. U.P. eper le verifiche della progettazione	Decreto n. 326 del 08/05/2013	Importo finanziato	€ 631,10	Decreto di impegno e pagamento polizze assicurative per le attività dei R. U.P. eper le verifiche della progettazione	Decreto n. 326 del 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 631,10		
Decreto di Finanziamento plottaggio tavole	Decreto n. 437 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 893,71	Decreto di Impegno plottaggio tavole	Decreto n. 437 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 893,71		
Decreto di Finanziamento avviso procedura VIA	Decreto n. 730 del 12/09/2013	Importo Finanziato	€ 1.234,20	Decreto di impegno e pagamento avviso procedura VIA	Decreto n. 730 del 12/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.234,20		
		TOTALE FINANZIATO	€ 80.199,01			TOTALE IMPEGNATO	€ 80.199,01		
								Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	€ 0,00
CONVENZIONI	INVITALIA	Università degli Studi Catania	Università degli Studi Messina	Università degli Studi Palermo	DHI Italia	CNR			
<b>Figure Tecniche</b>									
	Dott. Giuseppe Lombardo	Nota di incarico	Decreto n. 74 del 01/02/2013	Supporto al RUP	Dott. Gaetano Vinci	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 78 del 31 maggio 2011		



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR163	Pachino							Intervento in Contrada Raneddi		Importo ApQ	2.000.000,00
RUP	Ing. Marco Calogero Dott. Maurizio Liberatore		Nota di incarico	D.C. n. 29 del 23 gennaio 2012 (revoca con D.C. n. 74 del 01/02/2013) D.C. n.78 del 31 maggio 2011 (revoca con D.C. n. 29 del 23 gennaio 2012)	Comune di Pachino	Ing. Pietro Viviano		Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 235 del 20/09/2011		
Progettista	INVITALIA	Imbroglia © Peligra Pulizzi	Nota di incarico	Prot. N. 621 del 03/05/2011	Comune di Pachino	INVITALIA	Imbroglia © Peligra Pulizzi	Nota di incarico	Prot. N. 621 del 03/05/2011		
Collaboratore	INVITALIA	Dott. Geol. Gianluca Sabatini	Nota di incarico	Prot. N. 621 del 03/05/2011							
Direttore Lavori			Nota di incarico		Assessorato D.L.			Nota di incarico			
Coord. Sicurezza fase Esecuzione			Nota di incarico								
Collaudatore Statico			Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di incarico			

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata a INVITALIA, mentre con Decreto n. 121 del 23/03/2012 sono state approvate convenzioni e contratti con le università di Catania, Messina, Palermo e con la DHI Italia.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2793 del 6/12/2011 il DICA ha trasmesso la relazione su "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini", l'Università di Messina con nota acquisita al prot. n. 303 del 01/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Analisi diacronica delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra Punta Castellazzo e Punta delle Formiche", la DHI Italia acquisita al prot 363 del 07/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Acquisizione e processamento dei dati del modello d'onda Mar Mediterraneo di MeP Office per tre celle situate a largo della costa Sud-Orientale della Sicilia".</p> <p>Con Decreto n. 194 del 26/04/2012 è stata approvata la convenzione con CNR per la "ricerca, l'individuazione e caratterizzazione di cave di sabbie relitte sulla piattaforma siciliana nell'area prospiciente il golfo di Gela" e con Decreto Commissariale n. 408 del 02 Agosto 2012 è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 19/04/2012.</p> <p>Con nota protocollo n. 3925 del 08/10/2012 il CNR ha trasmesso il Rapporto Tecnico Finale delle attività relative alla Convenzione del 30/03/2012.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4085 del 16/10/2012, ha trasmesso al Commissario gli elaborati relativi alle tre nuove ipotesi d'intervento.</p> <p>Con nota protocollo n. 5026 del 29/11/2012 il Commissario ha chiesto all'ARPA - DAP di Ragusa la trasmissione dei risultati della caratterizzazione dei sedimenti portuali da esso effettuati nel porto di Pozzallo, a supporto delle scelte progettuali che dovranno essere definite dai tecnici incaricati dal Commissario.</p> <p>Con nota protocollo n. 1355 del 05/03/2013 Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati progettuali esecutivi.</p> <p>Con nota protocollo n. 2739 del 13 maggio 2013 il Commissario convoca per il giorno 21/05/2013 alle ore 11,00 una Conferenza dei Servizi, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi di giorno 21/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri di assenso per la realizzazione dell'intervento fatta eccezione per l'ARTA Serv. 3, peraltro, l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS ritiene necessario che il progetto venga sottoposto alla valutazione d'impatto ambientale.</p> <p>Con nota prot. n. 3504 del 12/06/2013 l'ARTA Serv. 3 trasmette il proprio parere favorevole con prescrizioni.</p>	SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	---	-----	--





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR165	Portopalo di Capo Passero	<b>Ripristino e stabilizzazione scarpate - ripristino e protezione litorale – Zona C.da Casuzze-Scalo mandrie</b>					Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno		
							Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	€ 0,00

Figure Tecniche								
RUP	Geom. Mario Poidomani (Comune)		Decreto di incarico	D.C. n. 147 del 02/04/2012	Supplente al RUP	Arch. Giampiero Di Magro	Nota di incarico	D.C. n.300 del 27-06-2012
Progettista	COMUNE	Ing. Antonio Lanza	Nota di incarico	Determina Dirigenziale n. 3/70 del 06/03/2012	Coord. Sicurezza fase Progett.	Ing. Antonio Lanza	Nota di incarico	Determina Dirigenziale n. 3/70 del 06/03/2012
Geologo	Dott. Geol. Corrado Avarino		Determina di incarico	Determina Dirigenziale n. 27/376 del 16/11/2010				
Direttore Lavori			Nota di incarico		Aspirante al DL		Nota di incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione			Nota di incarico					
Collaudatore Statico			Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune di Portopalo di Capo Passero. Si è in attesa del progetto esecutivo in quanto necessita della Verifica di assoggettabilità alla VIA presso il Servizio 1 VIA-VAS dell'ARTA, per cui il comune ha già avviato la procedura di verifica. Il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv 1 VIA/VAS con nota prot. n. 3466 del 12/09/2012. Il Commissario convoca gli enti in indirizzo per il tavolo tecnico del 30/10/2012. L'ARTA Serv. 1 comunica al Comune l'attivazione della procedura di danno ambientale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006, pertanto dispone la demolizione di quanto realizzato ed il ripristino dei luoghi.</p>	SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	-----	--


REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

<b>SR166</b>	<b>Rosolini</b>	<b>Opere di consolidamento del centro abitato</b>					Importo ApQ	<b>€ 1.500.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	€ 1.500.000,00
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Arch. Giovanni Calabrese (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 687 del 11/12/2012	Supplente al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 687 del 11/12/2012
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase progetto		Incarico conferito tramite:	
Calcolo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2296 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso il progetto e la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto al Commissario invitando il Comune di Rosolini a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.</p> <p>Con nota protocollo n. 3117 del 09/08/2012 il RUP ha comunicato che tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto è stata consegnata all'Ufficio del Commissario in data 08/08/2012.</p> <p>Con nota acquisita al protocollo n. 2614 del 07/05/2013 il RUP Arch. Giovanni Calabrese trasmette il parere favorevole del GC di Siracusa</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6439 del 28/10/2013 il RUP trasmette la documentazione integrativa richiesta ai fini dell'approvazione del progetto.</p>	SAL	<p>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> 
-----------------	--	-----	---

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

SR167	Rosolini	Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 427 del 22/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.315.000,00	Decreto di Impegno	n. 653 del 28/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 975.912,96		
		TOTALE FINANZIATO	€ 1.315.000,00	Decreto di Impegno e pagamento spese di pubblicazione GURI	Decreto n. 555 del 23/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 979,11	Economie da finanziamento	
						TOTALE IMPEGNATO	€ 976.892,07		
								Economie da ribasso	€ 0,00

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Vindigni Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 225 del 16/05/2012	Supplente al RUP	Ing. Fabio Ferla (FINO AL 30/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 225 del 16/05/2012	
Progettista	COMUNE	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012	Coord. Sicurezza e Direzione Lavori	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012
Problema			Determina di Incarico					
Direttore Lavori	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012	Assistente al D.L.	Arch. Giuseppe Calvo	Nota di Incarico	Nota di accettazione prot. N. 33731 del 30/10/2012	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Giuseppe Calvo	Nota di Incarico	prot. n. 33731 del 30/10/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Francesco Tabacco	Decreto di incarico	D.C. n. 100 del 18/02/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Francesco Tabacco	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 100 del 18/02/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Unifica Soc Coop.	Decreto Affidamento Lavori	D.C. 534 del 15/10/2012	data contratto
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	19-dic-12	data presunta di termine lavori



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

SR167	Rosolini	Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno	Importo ApQ	€ 1.500.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita agli atti al prot. n. 657 del 12/05/2011 ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>Il Commissario con nota prot n. 2796 del 6 /12/2011 ha chiesto alcuni chiarimenti al Comune e rappresentato la mancanza di alcuni pareri necessari all'approvazione e finanziamento progetto nonché della comunicazione del RUP relativa ai vincoli presenti sull'area oggetto dell'intervento.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 16/05/2012, e nei giorni successivi, sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni utili per l'approvazione dell'intervento, tra cui il parere del GC di SR che ha chiesto integrazioni per poter esprimersi.</p> <p>Le integrazioni sono state trasmesse dal Comune con note acquisite ai prot. n. 1947 del 31/05/2012 e n. 2176 del 14/06/2012.</p> <p>Con Decreto n. 427 del 22/08/2012 è stato finanziato del progetto esecutivo dell'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>In data 19/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei Lavori</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 3759 del 21/06/2013 trasmette la concessione di proroga di 30gg data all'Impresa Uniffica Soc. Coop. per l'ultimazione dei lavori.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR177	Carlentini	Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)						Importo ApQ	2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 MAR 2011 COMITATO 15 SET 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 247 del 28/05/2012	Importo Finanziato	€ 2.500.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 307 del 06/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.047.454,02		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	Decreto n. 307 del 29/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.027,47		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione Publikompass Spa e A. Manzoni & C. Spa	Decreto n. 415 del 08/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 3.820,58		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI esito gara	Decreto n. 435 del 03/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 895,23		
				Decreto Impegno e pagamento MAV	Decreto Commissariale n. 377 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		TOTALE FINANZIATO	€ 2.500.000,00			TOTALE IMPEGNATO	€ 2.047.454,02		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	€ 0,00	

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Francesco Ingalisi	Nota di Incarico	D.C. n. 191 del 26/04/2012	Supplente RUP	Ing. Diego Li Calzi	Nota di Incarico	D.C. n. 191 del 26/04/2012
Progettista	COMUNE Geom. Santi di Stefano Geom. Francesco Incontro	Determina di incarico	Determina Sindacale n. 70 del 18/11/2011	Ass. Sind. n. 1 del 23/01/2012	Arch. Daniele Lentini	Determina di incarico	Determina Sindacale n.1 del 23/01/2012
Coordinatore	Dott. Geol. Salvatore Antonio Sciara	Determina di incarico	Determina Sindacale n. 70 del 18/11/2011				
Direttore Lavori	Ing. Antonio Lanza	Decreto di Incarico	D.C. n. 637 del 22/11/2012	Ass. Direz. n. 1 del 23/01/2012		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonio Lanza	Decreto di Incarico	D.C. n. 637 del 22/11/2012				
Collaudatore Statico	Ing. Gaetano Montana	Decreto di Incarico	D.C. n. 108 del 20/02/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Gaetano Montana	Nota di Incarico	D.C. n. 108 del 20/02/2013

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Urania Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 429 23/08/2012	data contratto	26-set-12
controllo	data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

REGIONE  
SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REPUBBLICA  
ITALIANA

SRI77	Carlentini <b>Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)</b>	Importo APQ	2.500.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita al prot. n. 459 del 11/04/2011 ha trasmesso gli elaborati progettuali.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1511 del 12/08/2011, il Comune ha trasmesso variazioni tecniche ritenute necessarie, ma che non hanno modificato gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico dell'area oggetto di intervento.</p> <p>A seguito dell'accoglimento dell'istanza di variante tecnica nel corso del comitato del 15/09/2011, il Commissario, con nota prot. 1823 del 21 set 2011, ha autorizzato il comune a procedere alle modifiche progettuali richieste.</p> <p>Con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo rivisitato. In sede di Conferenza dei Servizi del 09/03/2012 sono stati espressi tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, che è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 247 del 28/05/2012.</p> <p>Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori; il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 307 del 06/05/2013 si impegna la somma di € 2.047.454,02 per la realizzazione dell'intervento.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/05/2013.</p>	SAL	AVIATI LAVORI

REPUBBLICA ITALIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA



SR184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa						Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno			
Decreto di Finanziamento e Impegno acquisizione progettata. Esecut.	n. 268 del 10/04/2013	Importo Finanziato	€ 35.156,27	Decreto di Finanziamento e Impegno acquisizione progettata. Esecut.	n. 268 del 10/04/2013	Importo dell'impegno	€ 35.156,27	Economie da finanziamento	
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	n. 509 del 04/07/2013	Importo Finanziato	€ 44.492,23						
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	€ 79.648,50			<b>TOTALE IMPEGNATI</b>	€ 35.156,27		
								Economie da ribasso	€ 0,00

Figure Tecniche


RUP	Arch. Gaetano Brex (Dirigente Area 4 del Comune di Avola)	Decreto di Incarico	D.C. n. 358 del 17/07/2012	Responsabile DU	Geom. Romina Sparacino	Decreto di Incarico	D.C. n. 358 del 17/07/2012
Progettista	COMUNE	Nota di Incarico	prot. n. 231 del 25/01/2012	Responsabile APQ		Nota di Incarico	
Profilo		Determina di Incarico					
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Responsabile DL		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Geomerid srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 597 del 25/07/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

SR184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	Importo ApQ	€ 2.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>L'intervento è inserito dell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune il quale, con nota prot. n. 2938 del 20/12/2011, è stato invitato a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 231 del 25/01/2012, ha rappresentato di essere in attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva generale di un intervento più ampio, e che provvederà alla trasmissione del progetto definitivo generale approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, per un importo pari a 2.000.000,00.</p> <p>Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale di un importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario, con nota prot. n. 5313 del 12/12/2012, ha convocato un tavolo tecnico l'08/01/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 268 del 10/04/2013 viene disposto il finanziamento e impegno per l'acquisizione del progetto esecutivo 1° stralcio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 597 del 25/07/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari a favore della Geomerid srl a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 40,2000%. In data 01/08/2013 è prevista la stipula del contratto.</p>	SAL	INDAGINI PRELIMINARI IN CORSO	





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR185	Buscemi	Consolidamento costone sottostante il Santuario						Importo ApQ	€ 200.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n.319 del 09/07/2012	Importo Finanziato	€ 200.000,00	Decreto di Impegno	n. 566 del 30/10/2012	Importo dell'impegno	€ 162.190,54		
						TOTALE IMPEGNATI	€ 162.190,54		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	€ 0,00	

## CONVENZIONI


## Figure Tecniche

RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di incarico	D.C. n. 176 del 19/04/2012	Supplente al RUP	Ing. Giovanni Donetti	Nota di incarico	D.C. n. 176 del 19/04/2012
Progettista	COMUNE	Nota di incarico	prot. n.2888 del 15/12/2011	Coord. Sicurezza Ob. Boperta	Arch. Aldo Aprile	Nota di incarico	Determina Dirigenziale n. 24 del 05/03/2012
Geologo	Dott. Geol. Giuseppe Peluso	Determina di incarico	Determina Dirigenziale n. 198 del 28/12/2011	Geologo		Nota di incarico	convenzione CGIAM
Direttore Lavori	Ing. Giovanni Donetti	Nota di incarico	prot. n. 4144 del 18/10/2012	Assistente al DL		Nota di incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Aldo Aprile	Nota di incarico	D.C. n. 535 del 15/10/2012	Direttore Operativo	Arch. Aldo Aprile	Decreto di incarico	D.C. n. 535 del 15/10/2012
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Bordonaro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 28 del 16/01/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Salvatore Bordonaro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 28 del 16/01/2013

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	TECNO COSTRUZIONI S.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	Decreto Commissariale n. 449 del 07/09/2012	data contratto	26-set-12
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	23-ott-12	data di fine lavori	29-gen-13



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

SR185	Buscemi	Consolidamento costone sottostante il Santuario	Importo ApQ. € 200.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata dell'area di intervento. Tali rilievi sono stati trasmessi dalla CGIAM con nota acquisita al prot. n. 498 del 16/02/2012. Il Comune, con nota acquisita al prot. n.1263 del 13/04/2012 ha trasmesso il progetto esecutivo. In sede di Conferenza di Servizi del 26/04/2012 sono stati acquisiti gli assenti da parte degli enti interessati all'approvazione del progetto, ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2308 del 25/06/2012 ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo. Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012, il Commissario comunica alla CGIAM la revoca dell'incarico conferito per SR 185.</p> <p>Con Decreto n. 319 del 09/07/2012 è stato finanziato il progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 449 del 07 09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.</p> <p>I lavori sono stati avviati in data 23/10/2012 e l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 29/01/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 176 del 11/03/2013 si provvede alla Presa d'Atto della Perizia di Variante e Suppletiva e rimodulazione impegno.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR186	Portopalo di Capo Passero		Regimazione acque e consolidamento scarpata				Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 498 del 28/06/2013	Importo Finanziato	€ 397.797,49	Decreto di Impegno	n. 908 del 28/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 319.038,58	
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	Decreto n. 452 del 11/09/2012	Importo Finanziato	€ 18.028,15	Decreto di Impegno e Pagamento Indagini Preliminari	Decreto n. 92 del 08/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 11.786,20	
Decreto di finanziamento plottaggio tavole di progetto	Decreto n. 438 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 248,29	Decreto di impegno plottaggio tavole di progetto	Decreto n. 438 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 248,29	
Decreto di defianziamento differenza tra il D.C n.452 e il D.C. n. 92	Decreto n. 498 del 28/06/2013	Importo Defianziato	€ 6.241,95	Decreto di impegno e pagamento plottaggio elaborati	Decreto n. 539 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 38,30	
Decreto di finanziamento plottaggio elaborati	Decreto n. 539 del 10/07/2013	Importo Finanziato	€ 38,30	Decreto di impegno e pagamento commissione gara	Decreto n. 641 del 05/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.774,66	
				Decreto di impegno e pagamento commissione gara	Decreto n. 812 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.334,20	
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 409.870,28</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 334.220,23</b>	
						Economie da finanziamento		
						Economie da ribasso		€ 0,00

CONVENZIONI	CGIAM	INVITALIA
-------------	-------	-----------

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Mario Poidomani	Decreto di incarico	D.C. n.313 del 06/07/2012	Assistente al RUP	Arch. Giampiero Di Magro	Decreto di Incarico	D.C. n.313 del 06/07/2012
Progettista	INVITALIA	Ing. Domenico Imbroglio Ing. Alberto Peligra Ing. Rossella Zumbè	Nota di Incarico	prot. n. 533 del 20/02/2012	Coordinatore Lavori Progettisti	Ing. Alberto Peligra	Decreto di incarico D.C. n. 853 del 11/10/2013
Geologo	INVITALIA CGIAM	Dott. Geol. Gianluca Sabatini Dott. Geol. Alessio D'urso	Determine di incarico	convenzione CGIAM			
Direttore Lavori	Ing. Alberto Peligra	Decreto di incarico	D.C. n. 853 del 11/10/2013	Assistente al DL			Nota di Incarico
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Alberto Peligra	Decreto di incarico	D.C. n. 853 del 11/10/2013				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 511 del 04/10/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	PULLARA CALOGERO	Decreto Affidamento Lavori	n. 595 del 24/07/2013	data contratto	24-set-13
contratto	09/10/2012	data conclusione lavori				verbale inizio attività	05-nov-13	data presunta di termine lavori	




REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art. 1

REGIONE  
SICILIANA



Portopalo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	Importo ApQ	€ 600.000,00
<p><b>SR186</b></p>	<p>L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 553 del 20/02/2012. L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata. La CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha trasmesso la restituzione parziale degli elaborati con nota acquisita al protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM, a seguito della presa d'atto del RUP, ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini.</p> <p>Il RUP, con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012, ha trasmesso la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva, approvate e finanziate con Decreto n. 452 del 11/09/2012.</p> <p>Con Decreto n. 511 del 4/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto il contratto.</p> <p>I risultati delle indagini eseguite sono state acquisite al prot. n. 4362 del 26/10/2012.</p> <p>Con nota 1203 del 26/02/2013 la Società Invitalia trasmette gli elaborati progettuali esecutivi.</p> <p>Con nota protocollo n. 3018 del 21 maggio 2013 il Commissario trasmette il verbale della CdS tenutasi in data 21/05/2013 e rimane in attesa delle integrazioni da parte dei progettisti e del parere della Provincia Regionale di Siracusa Serv. VIII e della Soprintendenza entro e non oltre 7gg dalla presente.</p> <p>Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA Serv. 3 in sede di CdS tenutasi in data 21/05/2013, il commissario trasmette la suddetta alla Provincia e resta in attesa di valutazioni.</p> <p>A seguito della nota della Provincia Regionale Serv. VIII nella quale si reiterava il parere già espresso in precedenza, il GdL di Invitalia con nota prot. n. 3770 del 24/06/2013, trasmette gli elaborati progettuali integrativi stralciati della parte idraulica, al fine di superare le prescrizioni del sopraccitato servizio.</p> <p>Con nota prot. n. 3800 del 24/06/2013 il RUP trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 498 del 28/06/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari ad € 397.797,49.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 595 del 24/07/20123 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Pullara Calogero</p> <p>che ha offerto un ribasso pari al 31,2727%. In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 908 del 28/10/2013 sono state impegnate le somme</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 6484 del 29/11/2013 invita l'impresa ed il DL per il giorno 05 Novembre 2013 alle ore 10,00 per procedere alla formale consegna dei lavori.</p> <p>Con nota prot. n. 6778 del 12/11/2013 il Commissario invita il RUP a sospendere ulteriori attività propedeutiche all'inizio dei lavori, nelle more dell'acquisizione di comunicazione da parte della Prefettura di Palermo.</p>	SAL	<p>AVVIATI I LAVORI</p> 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR187	Rosolini	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato						Importo ApQ	€ 1.800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di impegno	-	Importo dell'impegno			
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto n. 434 del 31/08/2012		€ 38.614,00						
Decreto di Finanziamento intervento	Decreto n. 867 del 18/10/2013		€ 1.800.000,00						
		TOTALE FINANZIATO	€ 1.800.000,00			TOTALE IMPEGNATO	€ 0,00		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	€ 0,00	

CONVENZIONI	CGIAM
-------------	-------

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Giuseppe Vindigni	Decreto di incarico	D.C. n. 198 del 02/05/2012	Supplente al RUP	Ing. Fabio Fera (FINO AL 30/01/2013)	Decreto di Incarico	D.C. n. 198 del 02/05/2012
Progettista	COMUNE Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	determina n. 3 del 24/01/2012	Coord. Sicurezza Progetto		Nota di Incarico	
Progetto	Dott. Geol. Alessio D'Urso (CGIAM)	Determina di Incarico	convenzione CGIAM				
Direttore Lavori	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	determina n. 3 del 24/01/2012	Assistente al RUP		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 485 del 21/09/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	26/09/2012	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	




REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA



SR187	Rosolini	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	Importo ApQ	€ 1.800.000,00
<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>Con nota prot. n. 130 del 18/01/2012 il Comune ha riferito che per la definire la progettazione esecutiva aveva necessità di avvalersi di consulenze specifiche (indagini idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, coordinamento della sicurezza) e ha chiesto autorizzazione.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 169 del 19/01/2012, ha comunicato al Comune di aver già incaricato la CGIAM per la realizzazione delle indagini geologiche, autorizzando il conferimento delle altre consulenze specifiche richieste.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 485 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4427 del 31/10/2012 l'impresa ha trasmesso il verbale di consegna delle aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della mappatura dei sottoservizi già richiesta al comune.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4506 del 08/11/2012 l'impresa ha comunicato di non essere ancora in possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, ha chiesto la sospensione dei lavori.</p> <p>A seguito della risoluzione delle problematiche incontrate, l'impresa ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 5135 del 05/12/2012, gli elaborati tecnici delle indagini effettuate.</p> <p>Con nota protocollo n. 4237 del 12/07/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo.</p> <p>L'ARTA Serv.3. con nota prot. n. 5172 del 03/09/2013 trasmette il proprio parere favorevole, precisando che in futuro per un eventuale aggiornamento delle aree si richiederà un adeguato studio idraulico.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 6244 del 16/10/2013 trasmette il Verbale di Verifica e Validazione del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 867 del 17/10/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari ad € 1.800.000,00.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 897 del 24/10/2013 si approva lo schema lettera di invito e avvio della Procedura di gara.</p>	<p>SAL</p>	<p>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</p> 	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



RG158_1	Modica	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato					Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento acquisizione progettazione	Decreto n. 190 del 14/03/2013	Importo Finanziato	€ 86.920,77	Decreto di Impegno	COMITATO 24 MAR	Importo dell'impegno		
Decreto integrazione al Finanziamento acquisizione progettazione	Decreto n. 300 del 19/04/2013	Importo Finanziato	€ 22.950,48				Economie da finanziamento	
			€ 109.871,25				Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche							
RUP		Incarico conferito tramite:		Assessore al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Assessore alla Pubblica Istruzione		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assessore al PL		Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta dal Comune.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2369 del 27/06/2011, l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso al Commissario in quanto Ente Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.</p> <p>Il Comune con nota acquisita al prot. n. 4298 del 24/10/2012 ha trasmesso gli elaborati progettuali.</p> <p>Il Commissario convoca una riunione presso gli Uffici della Struttura Commissariale per il giorno 26/03/2013 alle ore 16,00, al fine di discutere su alcune criticità emerse in merito al progetto.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 23/05/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n. 5733 del 25/09/2013 l'Artec Associati trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo validato e verificato.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	--	-----	--------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>RG159</b>	<b>Modica</b>	<b>Opere di sistemazione idraulica e dei versanti – Zona Torrente S.Liberale</b>						Importo ApQ	<b>€ 800.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	<b>A</b>	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	<b>€ 800.000,00</b>	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>	


<b>CONVENZIONI</b>	<b>GC</b>	<b>CGIAM</b>
--------------------	-----------	--------------

<b>Figure Tecniche</b>								
RUP			Nota di incarico		Responsabile RUP		Nota di Incarico	
Progettista	GC RG		Nota di Incarico	nota prot. N. 465 del 27/10/2010	Consul. Ingegnere Progetto		Nota di Incarico	
Geologo			Determina di Incarico					
Direttore Lavori			Nota di Incarico		Aspirante AI DL		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione			Nota di Incarico					
Collaudatore Statico			Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI				Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto		data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		verbale inizio attività		data presunta di termine lavori





**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

RG159	Modica	Opere di sistemazione idraulica e dei versanti – Zona Torrente S. Liberale	Importo ApQ	€ 800.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il Commissario ha rappresentato al Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 /09/2011 le problematiche legate alle scelte progettuali indicate dal GC, evidenziando che l'intervento NON E' RISOLUTIVO per l'intera problematica.</p> <p>A seguito del Tavolo Tecnico del 26/09/2011 si rimane in attesa di ricevere uno stralcio del progetto di importo pari a quello dell'Adp per la valutazione e approvazione da parte del Comitato.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.20 del 09/01/2012, il GC di Ragusa ha comunicato che l'intervento risultava ancora in fase di progettazione.</p> <p>In data 11/04/2012 si è tenuta una riunione presso gli Uffici dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS, dalla quale sono emerse delle problematiche di carattere ambientale per cui si è ritenuto necessario procedere ad una rielaborazione delle scelte progettuali.</p> <p>Il GC di Ragusa ha trasmesso con nota prot. n. 5348 del 14/12/2012 la rappresentazione tecnica dell'idea progettuale, chiedendo l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi al fine di definirne la fattibilità.</p> <p>In data 10 /01/ 2013 si è tenuta una Conferenza dei Servizi Preliminare, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n. 5767 del 26/09/2013 il Commissario incarica la Società Invitalia allo sviluppo di tutte le attività di progettazione per la realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n. 5941 del 04/10/2013, il Commissario comunica alla CGIAM l'integrazione all'elenco allegato al Piano Esecutivo del 30.11.2011, tramite l'inserimento dell'intervento RG 159 Modica " Opere di sistemazione idraulica e dei versanti - Zona Torrente S. Liberale". Importo 800.000,00"</p>	<p style="text-align: center;">SAL</p>		<p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO</p> 

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

PA136	Belmonte Mezzagno	Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano					Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011	note: Comitato del 24 febbraio 2011: l'intervento passa alla lettera B Comitato del 24 marzo 2011: transita nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
Decreto di Finanziamento Indagini	n.460 del 18/06/2013	Importo Finanziato	€ 10.947,60	Decreto di Impegno	n.460 del 18/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 10.947,60	
							Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	
<b>CONVENZIONI</b>								
	DRPC							
<b>Figure Tecniche</b>								
RUP	Ing. Angelo Alferi (DRPC PA)	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n.42 del 22/01/2013	Disegno al RUP	Sig.ra Teresa Marano (DRPC)	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n.42 del 22/01/2013	
Progettista	DRPC PA	Nota di Incarico	prot. n.694/UC del 24/11/2010	Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico		
Incarico		Determina di Incarico						
Direttore Lavori		Nota di Incarico						
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico						
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto	05/06/2013	data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di Palermo con nota prot. n. 694 del 24/11/2010. A seguito della nota del Commissario prot. n. 3298 del 03/09/2012, con cui sollecitava il DRPC di Pa a trasmettere il progetto esecutivo, con nota acquisita al prot. n. 5511 del 21/12/2012 il RUP trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 07/02/2013 si resta in attesa dei pareri non ancora pervenuti.</p> <p>Con nota prot. n. 1869 del 27/03/2013 il Commissario sollecita l'ARTA Serv.1 al rilascio del parere di competenza</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva inerente il Piano di indagini Preliminari a favore della Geo Services Trivellazioni e Sondaggi srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 43,1999%.</p> <p>Con D.C. n. 460 del 18/06/2013 si è provveduto a finanziare ed impegnare le somme necessarie per la realizzazione del piano di indagini.</p> <p>In data 30/07/2013, con nota prot.n. 4616, l'aggiudicataria delle indagini trasmette alla Struttura Commissariale i risultati delle stesse.</p>					SAL	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA137_1	Blufi	Opere di sistemazione idraulica burrone San Domenico Malpasso e consolidamento del centro urbano					Importo ApQ	€ 1.310.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'intervento originario di € 2.000.000,00 "consolidamento del Centro Urbano" viene, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato 24 febbraio 2011, stralciato in due progetti	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento	n. 67 del 24/05/2011	Importo Finanziato	€ 1.310.000,00	Decreto di Impegno	n. 348 del 30/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.067.015,52	
				Decreto di Impegno pagamento GURI	n.193 del 10/08/2011	Importo dell'Impegno	€ 991,76	
				Decreto di Impegno pagamento GURI	n.304 del 04/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.104,91	
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	n.312 del 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 375,00	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 1.310.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 1.069.487,19	
								Economie da finanziamento € -
								Economie da ribasso

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di incarico	D.C. n.25 del 23/02/2011	Supplente di RUP	Geom G. Ferrante Geom P. Nicollicchia Dott. F. Barranco	Decreto di incarico	D.C. n.25 del 23/02/2011		
Progettista	Comune	Arch. Vincenzo Vaccarella (Resp area tecnica)	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.01 del 11/01/2011	Coord. Sicurezza Fase Progett.	Comune	Arch. Vincenzo Vaccarella (Resp area tecnica)	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.01 del 11/01/2011
Qualificati	Dott. Giuseppe Abbate	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.4 del 10/02/2011	Supplente n.3	Ing. Michele Zafonti	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.3 del 10/02/2011		
Direttore Lavori	Ing Michele Zafonti	Decreto di Incarico	D.C. n. 208 del 31/08/2011	Supplente n.01		Nota di Incarico			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing Michele Zafonti	Decreto di Incarico	D.C. n. 208 del 31/08/2011						
Collaudatore Statico	Arch. Laura Oleni	Decreto di incarico	D. C. n. 193 del 26.04.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Arch. Laura Oleni	Decreto di incarico	D. C. n. 193 del 26.04.2012		
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.300 del 27/10/2011	data contratto	15-nov-11	
contratto	data conclusione lavori				verbale Inizio attività	06-dic-11	data fine lavori	31-ott-12	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 29/03/2011.</p> <p>A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento di gara con Decreto Commissariale n. 300 del 27/10/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI; La consegna dei lavori è avvenuta il 06/12/2011.</p> <p>A seguito della richiesta avanzata dalla D.L. di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, autorizzata dal RUP con nota prot. n.1934 del 31/05/2012, la stessa DL ha trasmesso la perizia assunta al prot. n. 2863 del 24/07/2012 ed approvata dal RUP in data 29/08/2012</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 443 del 06/09/2012 si è provveduto a prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e della rimodulazione del quadro economico di impegno delle somme.</p> <p>I lavori sono ultimati in data 31/10/2012.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	-----	-----------------

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA137_2	Blufi Opere di consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli						Importo ApQ	€	690.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'intervento originario di € 2.000.000,00 "consolidamento del Centro Urbano" viene, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato 24 febbraio 2011, stralciato in due progetti	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 87 del 10/6/2011	Importo Finanziato	€ 690.000,00	Decreto di Impegno	n.246 del 28/09/2011 così come modificato dal Decreto n. 146 del 2/04/2012 di prescrizione PVS e rimodulazione QE	Importo dell'Impegno	€ 558.878,57		
								Economie da finanziamento	€ -
								Economie da ribasso	€ 131.121,43

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 24 del 23/02/2011	Supplente al RUP	Dott. Francesco Barranto Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicollicchia	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 24 del 23/02/2011	
Progettista	Comune	Arch. Vincenzo Vaccarella (responsabile area tecnica)	Determina di Incarico	Determina sindacale n.2 del 11/01/2011	Coord. Sicurezza fase Progett.	Nota di Incarico		
Calcolo	Dott. Giuseppe Abbate	Determina di Incarico	Determina sindacale n.6 del 14/02/2011	Responsabile	Ing. Michele Zafonti	Determina di Incarico	Determina sindacale n.6 del 14/02/2011	
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti	Decreto di incarico	D.C. n.207 del 31/08/2011	Validazione calcoli		Nota di Incarico		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Michele Zafonti	Decreto di incarico	D.C. n.207 del 31/08/2011					
Collaudatore Statico	Prof. Angelo Milone	Decreto di incarico	D.C. n. 355 del 02/12/2011	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Arcobaleno 3000 Srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.158 del 29/07/2011	data contratto	10-ago-11
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	7-set-11	fine lavori	29-mar-12

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 29/03/2011.</p> <p>A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 87 del 10/06/2011</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 158 del 29/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori avviati in data 07/09/2011.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.493 del 16/02/2012 la D.L. ha evidenziato la necessità di effettuare nuovi lavori da inserire in una perizia di variante e suppletiva, la cui stesura è stata autorizzata dal RUP con nota prot. n.549 del 20/02/2012.</p> <p>La PVS è stata trasmessa dalla DL con nota acquisita al prot. n. 843 del 15/03/2012, approvata dal RUP in data 19/03/2012 e ratificata dal Commissario con Decreto n. 146 del 02/04/2012. I lavori sono ultimati in data 29/03/2012.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	-----	-----------------



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*[Handwritten signature]*

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA140		Camporeale		Opere di consolidamento centro abitato				Importo ApQ	Importo ApQ
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 15 SETT 2011	note:	A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 15/09/2011 l'intervento transita in B	Importo Rimodulato	€ 1.500.000,00
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato	-	Decreto di Impegno	Importo dell'impegno	-	-	Economie da finanziamento	-
-	-	-	-	-	-	-	-	Eventuali Economie da ribasso	-
<b>Figure Tecniche</b>									
RUP	Ing. Manlio Murafo (GC Pa)	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 17/04/2013	Arch. Giovanni Lo Cascio	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	-	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013
Progettista	Ing. Giuseppe Nogara GC Pa	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	-	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	-	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013
Direttore Lavori	Dott. Geol. Claudio Venturilla	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	Geom. Marco Imburgia	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	-	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	-	Incarico conferito tramite:	-	Sig. Francesco Sunseri	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	-	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013
Collaudatore Statico	-	Incarico conferito tramite:	-	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:	-	-	Incarico conferito tramite:	-
INDAGINI preliminari affidate a:	-	Decreto di affidamento INDAGINI	-	Collaudatore Tecnico amministrativo	Decreto Affidamento Lavori	-	-	data contratto	-
contratto	-	data conclusione lavori	-	AFIDATARIA Esecuzioni Lavori	verbale inizio attività	-	-	data presenta di termine lavori	-
STATO DELL'ARTE	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4858 del 07/08/2013 l'ART. 3 comunica che l'Ufficio del Commissario è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento				Il GC di Pa con nota acquisita agli atti al prot. n. 5130 del 30/08/2013 trasmette n.5 copie del progetto esecutivo				PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
	A seguito del tavolo tecnico si resta in attesa che il Comune proceda a richiedere l'ampliamento dell'area PAI.				SAL				

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA141	Capaci	Consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 410 del 02/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.200.000,00	Decreto di Impegno	n. 179 del 11/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 944.262,41		
				Decreto di Impegno e pagamento progettazione geotecnica	n. 523 del 08/10/12	Importo dell'Impegno	€ 25.554,04		
				Impegno e pagamento spese di pubblicazione sulla GURI	n. 537 del 16/10/12	Importo dell'Impegno	€ 979,11		
				Impegno e pagamento spese di pubblicazione Publikompass Spa, Gruppo 24Ore Spa	n. 724 del 20/12/12	Importo dell'Impegno	€ 1.861,89		
				Impegno e pagamento espletamento dei servizi tecnico-amministrativi	n. 102 del 18/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 4.751,67		
Finanziamento polizze assicurative attività di RUP	n. 829 del 08/10/2013	Importo Finanziato	€ 522,75	Impegno polizze assicurative attività di RUP	n. 829 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 522,75		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.200.522,75</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 977.931,87</b>		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso		


## Figure Tecniche

RUP	Ing. Giuseppe Lo Iacono	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.131 del 22/02/2013	Supplente al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 347 del 11/07/2012		
Progettista	Dott Ing Carlo Barbuza (fig. esterna)	Delibera di Incarico	Giunta Municipale n.376 del 26-06-1990	Coord. Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico			
Geologo	Dott.ssa Geol. Palma Pralini (fig. esterna)	Incarico conferito tramite:	ai sensi dell'art.9 del disciplinare di incarico del progettista	Geotecnico	Ingg. Proff. Guido Umiltà e Fabio Cafiso (fig. esterne)	Delibera di Incarico	Giunta Municipale n.376 del 26-06-1990		
Direttore Lavori	Dott Ing Carlo Barbuza (fig. esterna)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 29 del 16/01/2013	Assistente al DL		Nota di Incarico			
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Carlo Barbuza (fig. esterna)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 29 del 16/01/2013						
Collaudatore Statico	Arch. Francesco Barbato	Nota di Incarico	D. C. n. 327 del 08/05/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Arch. Francesco Barbato	Nota di Incarico	D. C. n. 327 del 08/05/2013		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ZACCARIA COSTRUZIONI Srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.522 del 08/10/2012	data contratto	23/01/2013
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	24/05/2013	data presunta di termine lavori	

REGIONE  
SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art. 1

REPUBBLICA  
ITALIANA

PA141	Capaci	Consolidamento centro abitato	Importo ApQ €	1.200.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Facendo seguito alle determinazioni del Comitato del 24/02/2011 che hanno determinato il passaggio dell'intervento in A, l'ARTA, con nota acquisita al prot. n. 528 del 18/04/2011 ha trasmesso tutta la documentazione tecnico-amministrativa dell'intervento.</p> <p>La progettazione è stata effettuata da progettisti esterni incaricati dal Comune.</p> <p>In data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni per la definizione delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 180 del 23/04/2012 il Commissario ha acquisito il progetto I stralcio esecutivo.</p> <p>A seguito della conferenza dei servizi del 30/05/2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di approvazione e validazione del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 410 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 522 del 08/10/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1519 del 11/03/2013, il D.L. comunica all'impresa Zaccaria Costruzioni che in data 18/03/2013 si procederà alla consegna dei lavori.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 179 del 11/03/2013 si è provveduto ad impegnare le Somme.</p> <p>A seguito della CdS del 12/09/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione della Perizia di Variante.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI	

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA


PA142	Carini		Barriere paramassi - Zona Industriale				Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 583 del 18/07/2013	Importo Finanziato	€ 976.967,14	Decreto di impegno		importo dell'Impegno		
Decreto di Finanziamento Indagini	n. 589 del 07/11/2012	Importo Finanziato	€ 32.546,39	Decreto di impegno pagamento indagini preliminari	n. 318 del 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 22.941,53	
Decreto di finanziamento plottaggio tavole grafiche	n. 435 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 90,75	Decreto di Impegno plottaggio tavole grafiche	n. 435 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 90,75	
Decreto di definanziamento somma residua delle indagini	n. 583 del 18/07/2013	Importo Definanziato	€ 12.677,54	Decreto di Impegno pubblicazione GURI	n. 689 del 05/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 917,58	
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazione quotidiano	n. 787 del 27/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 617,10	
				Decreto di Impegno pagamento spese pubblicazione esito gara	n. 917 del 31/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.089,00	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 996.926,74</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 25.655,96</b>	
							Economie da finanziamento Economie da ribasso	
<b>CONVENZIONI</b>	<b>CGIAM</b>	<b>INVITALIA</b>						
<b>Figure Tecniche</b>								
RUP	Geom. Salvatore Bellia	Decreto di incarico	D.C. n. 850 del 11/10/2013	Responsabile RUP	Dott. Francesco Barrante Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto di incarico	D.C. n.35 del 23/01/2012	
RUP	Ing. Antonino Cracchiolo	Decreto di incarico	D.C. n. 179 del 09/08/2011 (revocato con D.C. n. 850 del 11/10/2013)					
Progettista	INVITALIA	Ing. Marco Calogero @ Ing. Giuseppe Morganti	Nota di Incarico	prot. n.520/UC del 18/04/2011	Coord. Sicurezza fase Progettazione	Nota di incarico		
Coordinatore	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM					
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti.	Decreto di Incarico	prot. n. 872 del 10/10/2013	Assistente a D.		Nota di Incarico		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Michele Zafonti.	Decreto di Incarico	prot. n. 872 del 10/10/2013					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO R.A.S. S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 663 del 03/12/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO TRIVENETO	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 677 del 27/08/2013	data contratto
contratto	19/12/2012	data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori



REGIONE  
SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REPUBBLICA  
ITALIANA

PA142	Carini	Barriere paramassi - Zona Industriale	Importo ApQ € 1.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Con nota prot. n. 520 del 18/04/2011 la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, mentre con nota prot. n. 2759 del 05/12/2011, i rilievi propedeutici alla progettazione sono stati affidati al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM".</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3513 del 17/09/2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardante il programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il Piano di Indagini Preliminari e con Decreto Commissariale n. 663 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle stesse a favore dell'Impresa GEO R.A.S. S.r.l., in data 19/12/2012 è stato stipulato il contratto.</p> <p>In data 29/12/2012 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 723 del 01/02/2013, la GEO RAS trasmette n. 3 copie cartacee degli elaborati inerenti ai report delle indagini svolte.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2642 del 08/05/2013 il Gdl IAP ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Co Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013 si provvede ad approvare e finanziare l'intervento per un importo complessivo pari ad € 976.967,14.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 590 del 22/07/2013 viene predisposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 677 del 27/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa CONSORZIO TRIVENETO che ha offerto un ribasso pari al 35,8978%.</p>	SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI  

REPUBBLICA  
ITALIANA


UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA143	Castelbuono						Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia			Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato			
Decreto di Finanziamento	n. 808 del 08/10/2013	Importo Finanziato	€ 1.978.972,49	Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno					
Decreto di Finanziamento Indagini	n. 203 del 19/03/2013	Importo finanziato	€ 38.862,54					Economie da finanziamento			
Definanziamento di cui al D.C. n.203 del 19/03/2013	n.480 del 26/06/2013	Importo Definanziato	€ 17.835,03	Impegno somme realizzazione piano di indagini	n.480 del 26/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 21.027,51	Economie da ribasso			
				Disimpegno somme realizzazione piano di indagini	n.650 del 06/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 289,37	Economie da ribasso			
				Impegno somme plottaggio	n. 912 del 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 762,25	Economie da ribasso			
				Impegno somme pagamento GURI	n. 950 del 08/11/2013	Importo dell'Impegno	€ 861,46	Economie da ribasso			
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 22.940,59</b>				
<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM	INVITALIA									
<b>Figure Tecniche</b>											
RUP	Ing. Santi Sottile	Decreto di Incarico	D.C. n. 576 del 06/11/2012	Supplente al RUP	Dot. Angelo Nicastro	Decreto di Incarico	D.C. n. 576 del 06/11/2012				
Progettista	INVITALIA	Ing. Rossella Zumbà © Ing. Adriano Grassi; Ing. Gianluca Coroneo; Ing. Fabio Ferla; Dot. Gianluca Sabatini.	Nota di Incarico	prot. n. 4370 del 29/10/2012	Coordinatore Tecnico	Nota di Incarico					
Coordinatore	Dott. Giuseppe Bonomo (informazione estrapolata dal verbale di riunione)	Determina di Incarico									
Direttore Lavori	Incarico revocato con nota prot. n. 4370 del 29/10/2012	Ingg. G. Nogara	Nota di Incarico	prot. n. 484/UC del 03/11/2010	Assistenti al D.L.	Nota di Incarico					
Coord. Sicurezza fase Esecuzione			Nota di Incarico								
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico					
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	D. C. n. 273 del 11/04/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	FERRARO IGNAZIO	Decreto Affidamento Lavori	n.922 del 31/10/2013	data contratto			
contratto	16/04/2013	data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori			

REPUBBLICA  
ITALIANAREGIONE  
SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

PA143	Castelbuono	<b>Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia</b>	Importo ApQ	€ 2.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è affidata al GC di Palermo.</p> <p>Con nota prot. n.978 del 28/06/2011 è stato sollecitato il GC alla trasmissione del progetto esecutivo.</p> <p>Con nota del 02/11/2011 il GC Pa ha chiesto al Dott. Antonio Rubino di poter acquisire lo studio geologico-tecnico eseguito per conto della Procura della Repubblica e di poterlo utilizzare a supporto della progettazione esecutiva.</p> <p>A tutt'oggi è in corso una campagna di monitoraggio finanziata dal DRPC di PA di cui si resta in attesa dei risultati.</p> <p>Il Commissario, facendo seguito alla nota prot. n. 3961 del 09/10/2012, con la quale concedeva al GC di Pa 20 giorni per la trasmissione del progetto esecutivo PA 143 A- Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia", con nota prot. n. 4369 del 29/10/2012 ha revocato tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, compreso quello di RUP.</p> <p>Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 ha affidato la progettazione a INVITALIA, che ha comunicato il Gdl con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 ha chiedo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, di poter acquisire copia della consulenza tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1280 del 28/02/2013 la CGIAM trasmette n. 2 dischi DVD contenenti i prodotti risultanti dai rilievi aerei</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 273 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di indagini Preliminari a favore dell'impresa GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l. (ribasso percentuale del 46,9999 %)</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3799 del 24/06/2013 la CGIAM trasmette all'Ufficio del Commissario i documenti relativi all'approvazione della relazione geologica ed i relativi elaborati riguardanti le "Opere di drenaggio e consolidamento C.da Liccia nel Comune di Castelbuono".</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4131 del 09/07/2013 la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dal Gdl.</p> <p>A seguito delle richieste di integrazioni emerse in sede di Cds del 31/07/2013 e richieste dal RUP, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4772 del 02/08/2013, il Gruppo di progettazione IAP, trasmette gli elaborati integrativi.</p> <p>A seguito della Cds del 12/09/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 808 del 08/10/2013 è stato finanziato l'intervento;</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n.922 del 31/10/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva a favore dell' impresa FERRARO IGNAZIO</p>	SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA148	Mezzojuso Opere di consolidamento – Zona Collina Brigna							Importo ApQ	€ 2.144.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010	note:	A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21/10/2010 l'intervento transita in B	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento acquisizione progettazione	n. 224 del 26/03/2013	Importo Finanziato	€ 129.278,25					Economie da finanziamento	
Decreto di finanziamento polizza assicurativa per le verifiche della progettazione	n. 868 del 17/10/2013	Importo Finanziato	€ 650,24	Decreto di impegno e pagamento polizza assicurativa per le verifiche della progettazione	n. 868 del 17/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 650,24	Eventuali Economie da ribasso	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 129.928,49</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 650,24</b>		

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Calogero Foti	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 192 del 14/03/2013	Numero di RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 192 del 14/03/2013
Progettista	Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl	Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza Fase Progettazione		Incarico conferito tramite:	
Collaudo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza Fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2295 del 22/06/2012 l'ARTA ha trasmesso all'Ufficio del Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento invitando il Comune trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto in proprio possesso. L'ARTA Serv. 3, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dal Commissario con nota prot. n. 724 del 04/02/2013, trasmette il parere favorevole sulla coerenza dell'efficacia degli interventi previsti nel progetto ai fini della mitigazione della pericolosità e del rischio geomorfologico.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 224 del 26/03/2013 si è provveduto ad acquisire tutta la documentazione tecnica progettuale redatta dalla Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico Ing. salvatore Miliziano.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2770 del 13/05/2013 la Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl ha trasmesso in formato cartaceo e digitale il progetto esecutivo rielaborato ed adeguato al nuovo prezzario regionale OO.PP. per l'anno 2013. A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti i pareri necessari e con nota acquisita agli atti al prot. n. 4405 del 22/07/2013 il Dipartimento Azienda Foreste Demaniali conferma il parere positivo alla realizzazione dell'intervento e rimanda per le eventuali determinazioni di competenza alla nota a suo tempo inviata all'ARTA Serv.6.</p> <p>Con nota prot. n. 5231 del 05/09/2013 il Commissario comunica i componenti del gruppo di verifica del progetto esecutivo.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	---	-----	--------------------------------

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA149	Misilmeri	Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa					Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno		
Decreto di finanziamento indagini preliminari	n. 678 del 27/08/2013	Importo Finanziato	€ 48.302,19				Economie da finanziamento	
Decreto di finanziamento pagamento AVCP	n. 572 del 17/07/2013	Importo Finanziato	€ 30,00	Decreto di Impegno pagamento AVCP	n. 572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 30,00	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 48.332,19</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 30,00</b>	
							Economie da ribasso	
<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM							

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di incarico	D.C. n. 126 del 22/02/2013	Approvato dal RUP		Nota di Incarico	
Progettista	ATP ING. DOMENICO MAIOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013	Com. Siciliano 22/04/2013	ATP ING. DOMENICO MAIOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013
Qualifica	Dott. Giorgio Milazzo (professionista esterno)	Determina di Incarico	Provvedimento del sindaco n.46 del 22/06/2011				
Direttore Lavori	ATP ING. DOMENICO MAIOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013	Approvato dal DL		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	ATP ING. DOMENICO MAIOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID S.r.l	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 733 del 12/09/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	24/09/2013	data conclusione lavori				verbale inizio attività	data presunta di termine lavori


REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA149	Misilmeri	Importo ApQ	€ 2.000.000,00
<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><b>Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa</b></p> <p>La Progettazione esecutiva è stata eseguita da progettisti esterni incaricati dal Comune di Misilmeri che con nota acquisita al prot. n. 1650 del 06/09/2011, ha trasmesso il progetto.</p> <p>Con nota prot. n.4707 del 07/02/2012 il comune ha trasmesso all'ARTA copia del progetto esecutivo per l'emissione del parere di competenza, parere poi acquisito al prot. 1011 del 26/03/2012 con esito negativo.</p> <p>Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 22/06/2012 con cui il RUP ha trasmesso unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 19/06/2012 di approvazione amministrativa, il progetto esecutivo-1° lotto funzionale, senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle procedure dell'affidamento dell'incarico professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle opere richieste dall'ARTA Serv.3, ha ribadito che avrebbe provveduto ad avviare nuove procedure per il conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 149 Misilmeri.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 274 del 12/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecuzione, D.L. misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dell'Associazione Temporanea di Professionisti ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO (ribasso percentuale pari al 51,1861 %).</p> <p>In data 27/08/2013, con Decreto n. 678, è avvenuta l'approvazione delle specifiche tecniche afferenti il Piano di Indagini preliminari.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 733 del 12/09/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini a favore della GEOMERID Srl (ribasso percentuale pari al 51,5000 %) in data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.</p>	<p>SAL</p>	<p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO</p> 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA151	Partinico	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio					Importo ApQ	€ 950.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	Importo dell'impegno	Economie da finanziamento		
						Eventuali Economie da ribasso		
<b>CONVENZIONI</b>								
<b>Figure Tecniche</b>								
RUP		Incarico conferito tramite:		Supplente al RUP		Incarico conferito tramite:		
Progettista		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza Fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente RUP		Incarico conferito tramite:		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:						
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	
STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto all'Ufficio del Commissario ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2531 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.2883 del 26/07/2012 il Comune ha informato di non essere in grado di rispettare i termini di consegna richiesti per la progettazione.</p> <p>Con nota prot. n. 2983 del 01/08/2012 l'Ufficio del Commissario ha comunicato al Comune che in qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, avrebbe proceduto alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Con nota prot. n. 4350 del 25/10/2012 il Commissario revoca l'incarico precedentemente conferito alla CGIAM con nota prot. n. 3339/UC del 06/09/2012.</p> <p>L'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 6315 del 21/10/2013 chiede al Comune di Partinico, la trasmissione del progetto preliminare.</p>					SAL	<p>PROGETTAZIONE IN CORSO</p>	

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

PA152	Petraia Sottana	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello					Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note:	Comitato del 21 ott 2010: transita alla Lettera B; Comitato del 24 feb 2011: l'intervento transita nuovamente alla lettera A	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento	433 - 29/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.200.000,00	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
				Decreto di Impegno pagamento GURI	S20 del 09/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.127,25	
				Decreto di Impegno pagamento pubblicazione gara	n.860 del 11/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.706,10	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 1.200.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 2.833,35	
								Economie da finanziamento
								Economie da ribasso

## Figure Tecniche

RUP	Comune	Geom. Sabatino Giovanni	Decreto di Incarico	D.C. n. 488 del 27/06/2013	Impiegato RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di Incarico	D.C. n.127 del 22/02/2013
RUP	Comune	Geom. Croce Salvatore Scelfo	Decreto di Incarico	D.C. n.137 del 20/07/2011	Supplente RUP (Comune)	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di Incarico	prot. N. 5317/JC del 13/12/2012
Progettista	Comune	Ing. Alessandro Sammataro (UTC)	Nota di Incarico	prot. n.6086 del 30/05/2011	Responsabile Progettazione		Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Torre Alessandro		Determina di Incarico	Determina sindacale n.25 del 11/07/2011	Geologo	Ing. Michele Zafonti	Determina di Incarico	Sindacale n. 24 del 11/07/2011
Direttore Lavori	Ing. Alessandro Sammataro		Nota di Incarico	D.C. n. 715 del 10/09/2013	Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Alessandro Sammataro		Nota di Incarico	D.C. n. 715 del 10/09/2013				
Collaudatore Statico			Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI			AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 504 del 02/07/2013	data contratto 04/09/2013
contratto		data conclusione lavori			GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l.	verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>A seguito del Comitato del 21/10/2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B.</p> <p>Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale.</p> <p>Nella seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 18/05/2012 l'intervento transita in lettera B.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2254 del 21/06/2012 l'ARTA ha comunicato di aver individuato il Commissario Straordinario Delegato quale Ente Beneficiario</p> <p>In data 06.08.2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 360 del 22.06.2012 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo per i lavori.</p> <p>Con D.C. n. 433 del 29.08.2012 il Commissario prende atto del DDG n. 360 del 22.06.2012 dell'ARTA inerente il finanziamento dell'intervento</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Con Decreto Commissariale n. 504 del 02/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l. (ribasso pari al 30,8684%), in data 04/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4566 del 26/07/2013 il RUP trasmette il verbale di attestazione sull'eseguibilità dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 del Regolamento n. 207/2010.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5924 del 03/10/2013, il RUP invita la D.L. e l'Impresa aggiudicataria per il giorno 10/10/2013 per effettuare la consegna dei lavori.</p>					SAL	AFFIDAMENTO LAVORI
-----------------	---	--	--	--	--	-----	--------------------



REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA154	Polizzi Generosa	Opere di consolidamento – Zona via G. Borgese						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n.39 del 31/03/2011	Importo Finanziato	€ 366.497,75	Decreto di Impegno	n.245 del 28/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 407.990,10		
				Decreto di Disimpegno	n. 632 del 20/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 41.492,35	Economie da finanziamento € 133.502,25	
						Importo dell'Impegno dopo il disimpegno e definanziamento	€ 366.497,75	Economie da ribasso (definanziamento D.C. n. 632 del 20/11/2012) € 133.502,25	

CONVENZIONI	GC
-------------	----

Figure Tecniche								
RUP	Ing. Vincenzo Di Rosa (Ing. Capo GC PA)	Nota di Incarico	prot. n. 483/UC del 03 novembre 2010	Autore del RUP		Nota di Incarico		
Progettista	GC PA	Nota di Incarico	prot. n. 483/UC del 03 novembre 2010	Responsabile del Progetto		Nota di Incarico		
Geologo		Determina di Incarico						
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe Nogara Genio Civile di PA	Nota di Incarico		Autore del DL		Nota di Incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico						
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Dragotta	Decreto di Incarico	D.C. n. 359 del 02/12/2011	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.168 del 03/08 2011	data contratto	10-ago
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	14/09/2011	fine lavori	23-apr-12

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Palermo.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara con Decreto Commissariale n. 168 del 03 /08/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>I lavori sono stati avviati 14/09/2011 e sono stati completati in data 23/04/2012.</p> <p>Il Collaudatore Statico ha prodotto il Certificato di Collaudo Statico delle opere redatto in data 09/05/2012</p> <p>Il GC PA, con nota acquisita al protocollo con n. 1921 del 30/05/2012, ha trasmesso la Perizia di Assestamento Finale, la cui presa d'atto è avvenuta con Decreto Commissariale n.263 del 07 /06/2012.</p> <p>Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori è stato redatto dalla DL in data 12/07/2012.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	-----	-----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



PA156	Termini Imerese	Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto						Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:			Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n.108 del 15/03/2012	Importo Finanziato	€ 800.000,00	Decreto di Rimodulazione Impegno	Decreto n. 606 del 15/11/2012	Importo dell'impegno	€ 547.274,70		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione Gara	n.317 del 06/07/2012	Importo dell'impegno	€ 636,30		
				Decreto di Impegno e Pagamento AVCP	n. 387 del 24/07/2012	Importo dell'impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 800.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 548.136,00</b>		
								Economia da finanziamento	€ -
								Economia da ribasso	

CONVENZIONI	DRPC								
-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Calogero Foti (DRPC Pa)	Decreto di incarico	D.C. n.116 del 20 marzo 2012	Supplente al RUP				Nota di Incarico	
Progettista	DRPC Pa	Nota di Incarico	prot. n. 298/UC del 28/09/2010	Coord. Sicurezza fase Progettazione				Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Geol. Rosario Di Praza	Nota di Incarico	prot. n. 6553 del 31/10/2013						
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL				Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico							
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo				Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI			AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	SILGEO srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012	data contratto	08-giu-12
contratto	data conclusione lavori					verbale inizio attività	28-giu-12	data di termine lavori	25-ott-12

STATO DELL'ARTE	<p>La Progettazione è stata affidata al D.R.P.C. di Palermo che ha trasmesso il progetto con nota acquisita al prot. n. 1116 del 11/07/2011 e successiva integrazione con nota acquisita al prot. 1779 del 19/09/2011 . A seguito della ricezione di tutti i pareri necessari il Commissario ha finanziato l'intervento con Decreto n.108 del 15/03/2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 28/06/2012 sono stati consegnati i lavori.</p> <p>Con D.C. n. 606 del 15/11/2012 di presa atto perizia di variante si è avuta una rimodulazione e riduzione dell'impegno di spesa</p> <p>In data 25/10/2012 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.</p>						SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA157	Valledolmo	Opere di consolidamento - C.da Renella						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	D.C. n. 02 del 23/11/2010	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	D.C. n.50 del 18/04/2011 come rimodulato dal D.C. n.108 del 29/06/2011	Importo dell'impegno	€ 465.000,00		
Decreto di Definanziamento	D.C. n. 152 del 01/03/2013	Importo defanziato	43.212,35,	Decreto di disimpegno	D.C. n. 152 del 01/03/2013	Importo disimpegnato	€ 8.212,35		
	D.C. n. 152 del 01/03/2013	Importo a seguito definanziamento	€ 456.787,65				€ 456.787,65	Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	
								€ -	
<b>CONVENZIONI</b>									
	COMUNE								
<b>Figure Tecniche</b>									
RUP	Geom. Orazio Pizzolanti (Capo UTC)	Determina di incarico	Determina sindacale n° 227 del 10 agosto 2010	Responsabile RUP				Nota di Incarico	
Progettista	Comune	Nota di Incarico		Com. di Progettazione Pizzolanti				Nota di Incarico	
Collaudo	Dott. Geol. Alfonso Spera	Determina di Incarico	Determina sindacale n. 21 del 27/08/2010	Collaudatore	Ing. Spina Pietro			Determina di Incarico	
Direttore Lavori	Ing. Gioacchino Muscato	Nota di Incarico		Responsabile DL				Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico							
Collaudatore Statico	Ing. Francesco Carollo	Nota di Incarico	prot. n. 442/UC del 07/04/2011	Collaudatore Tecnico amministrativo				Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CO.GEN.AP. Srl	Decreto Affidamento Lavori	Determina Dirigenziale n.65 del 18/02/2011; Determina di Modifica n.102 del 18/03/2011		data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale Inizio attività	14-mar-11		fine lavori	
								04-lug-11	
STATO DELL'ARTE	<p>La Progettazione è stata affidata al Comune.          A seguito dell'espletamento delle procedure di gara il Comune ha provveduto ad affidare i lavori.          Con nota acquisita al prot. n. 1266 del 26/07/2011 il Comune ha comunicato la fine dei lavori in data 04/07/2011 e l'avvenuto collaudo statico in data 07/07/2011.</p>						SAL	LAVORI ULTIMATI	

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA


PA179	Altofonte	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto					Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento n. 449 del 17/06/2013		Importo Finanziato	€ 578.022,01	Decreto di Impegno n. 735 del 12/09/2013		Importo dell'Impegno	€ 428.662,50	
Decreto di definanziamento n. 449 del 17/06/2013		Importo Definanziato	€ 1.814,19					
Decreto di finanziamento specifiche tecniche n. 233 del 21/05/2012		Importo Finanziato	€ 23.549,50	Decreto di Impegno e pagamento Indagini Preliminari n. 652 del 28/11/2012		Importo dell'Impegno	€ 21.735,31	
Decreto di finanziamento Polizza Assicurativa RUP n. 326 del 08/05/2013		Importo Finanziato	€ 242,68	Decreto di Impegno Polizza Assicurativa RUP n. 326 del 08/05/2013		Importo dell'Impegno	€ 242,68	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 603.628,38</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 450.640,49</b>	
								Economie da finanziamento Economie da ribasso

CONVENZIONI	CGIAM							

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Giuseppe La Placa		Decreto di incarico	D.C. n.211 del 10/05/2012	Supplente RUP	Dott. Gaetano Vinci	Decreto di incarico	n.32 del 23/01/2012	
	Comune	Arch. Salvatore Butera	Nota di incarico	D.C. n.16 del 17.01.2012					
Progettista	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO		Decreto di incarico	D.C. n. 596 del 09/11/2012	Coord. Sicurezza fase Progett.	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO	Nota di incarico	n. 3964 del 09/10/2012	
Studenti	CGIAM Dott. Geol Giacomo Anselmo		Determina di incarico						
Direttore Lavori	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO		Decreto di incarico	D.C. n. 596 del 09/11/2012	Assistenti RUP		Nota di incarico		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO		Decreto di incarico	D.C. n. 596 del 09/11/2012					
Collaudatore Statico			Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	CGIAM GEO R.A.S Srl (Indagini integrative preliminari)	Decreto di affidamento INDAGINI	CGIAM Accordo Quadro del 29/11/2011. (GEO RAS Srl D.C. n. 285 del 18 giugno 2012)	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	URANIA srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 561 del 15/07/2013	data contratto	10-set
contratto	GEO R.A.S. srl	data conclusione lavori	03/08/2012			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

REPUBBLICA  
ITALIANAREGIONE  
SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA179	Altofonte	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	Importo ApQ	€ 600.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto all'affidamento a progettisti esterni.            Le indagini preliminari alla progettazione sono invece state affidate dal Commissario alla CGIAM che con nota assunta al prot. n. 1256 del 12/04/2012 ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari.            A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 285 del 18/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari ed in data 03/07/2012 è stato sottoscritto il contratto.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 10/07/2012, nel quale è emersa la problematica inerente la presenza di una folta vegetazione che non consentiva l'esecuzione di un idoneo rilievo, ha chiesto all'impresa aggiudicataria di trasmettere un atto aggiuntivo al contratto principale per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni.</p> <p>L'impresa, con nota acquisita agli atti al prot.n. 3040 del 03.08.2012, ha trasmesso copia degli elaborati tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.521 del 24/01/2013 la CGIAM trasmette tutta la documentazione relativa alla Relazione Geologica.</p> <p>Il Commissario con nota prot. n. 564 del 29/01/2013 trasmette alla Mediterraneo Engineering le indagini e la relativa relazione geologica propedeutici alla progettazione.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1899 la PRO-GEO trasmette n. 4 copie del progetto esecutivo.            A seguito della CdS del 09/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3486 del 12/06/2013 il D.L. trasmette attestazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.P.R. n.207/2010 di conformità del progetto esecutivo e il permanere delle condizioni di esecuzione dell'opera.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 449 del 17/06/2013 è stato finanziato l'intervento.            A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 561 del 15/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della URANIA srl., in data 10/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.</p>	SAL		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI

REPUBBLICA  
ITALIANA


UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

PA180	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita						Importo ApQ	€	90.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno				
Decreto di finanziamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo Finanziato	€ 502,72	Decreto di impegno e pagamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 502,72	Economie da finanziamento		
Finanziamento somme plottaggio tavole	Decreto n. 913 del 30/10/2013	Importo Finanziato	€ 16,48	Impegno somme plottaggio tavole	n. 913 del 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 16,48	Economie da ribasso		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 519,20</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 519,20</b>			
								Economie da ribasso		
<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM	INVITALIA								
<b>Figure Tecniche</b>										
RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto di incarico	D. C. n. 71 del 01/02/2013	Suggerito al RUP		Decreto di Incarico				
	Ing. Giuseppe Morganti	Decreto di incarico	D.C. n.130 del 27/03/2012 (revocato con D.C. n. 71 del 01/02/2013)	Suggerito al RUP		Decreto di Incarico				
Progettista	INVITALIA	Arch Fabio Pullizzi Ing. Rossella Zumbie Dott. Gianluca Sabatini	Nota di Incarico	prot. 2494 del 04/07/2012	Sicurezza fase Progett.	Nota di Incarico				
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM							
Direttore Lavori		Nota di Incarico			Assistente ai DL	Nota di Incarico				
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico								
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico			Collaudatore Tecnico amministrativo	Nota di Incarico				
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto		
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori		

REPUBBLICA  
ITALIANAREGIONE  
SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

PA180	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita	Importo ApQ €	90.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>A seguito della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha incaricato la CGIAM di predisporre le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini geologiche.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 2711 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.</p> <p>In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP, con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012, ha invitato il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.</p> <p>A seguito della nota prot. n. 3351 del 06/09/2012, con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.</p> <p>Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 71 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento.</p> <p>A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l'attivazione della procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.</p>	<p>SAL</p> <p>ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE</p> 		



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




PA181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco					Importo ApQ	€	400.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento Indagini	n.132 del 30-03-2012		€ 48.395,70	Decreto di Impegno e pagamento indagini	Decreto n. 444 del 06/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 30.827,42		
Decreto di finanziamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo Finanziato	€ 502,72	Decreto di impegno e pagamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 502,72		
Finanziamento somme plottaggio tavole	Decreto n. 913 del 30/10/2013	Importo Finanziato	€ 16,48	Impegno somme plottaggio	n. 913 del 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 16,48	Economie da ribasso	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 48.914,90</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 31.346,62</b>		
								Economie da finanziamento Economie da ribasso	
<b>CONVENZIONI</b>	<b>CGIAM</b>	<b>INVITALIA</b>							
<b>Figure Tecniche</b>									
RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto di incarico	D. C. n. 71 del 01/02/2013	Supplente al RUP		Decreto di incarico			
	Ing. Giuseppe Morganti	Decreto di incarico	D.C. n.130 del 27/03/2012 (revocato con D.C. n. 71 del 01/02/2013)	Supplente al RUP		Decreto di incarico			
Progettista	INVITALIA	Ing. Domenico Imbroglia Ing. Gianluca Coroneo Arch. Fabio Pullizzi Ing. Rossella Zumbà Dott. Gianluca Sabatini	Nota di Incarico	prot. n.2494 del 04/07/2012	Coord. Sicurezza e Progettista	Nota di Incarico			
Coordinatore	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM						
Direttore Lavori		Nota di Incarico			Assistente al DL			Nota di Incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico							
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico			Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO PLANTS srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 196 del 02/05/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	Importo ApQ € 400.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il Commissario con nota prot. n. 2723 del 02/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA in virtù della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha affidato alla CGIAM la redazione delle indagini geologiche, trasmesse con nota acquisita agli atti al prot. n. 953 del 21/03/2012. Con Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari.</p> <p>Le attività di indagine hanno avuto inizio in data 14/05/2012 e sono state completate in data 20/06/2012. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.</p> <p>In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012 ha invitato il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.</p> <p>A seguito della prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.</p> <p>Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 70 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento.</p> <p>In data 08/05/2013 si è svolto un tavolo Tecnico</p> <p>A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l'attivazione della procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.</p>	SAL	 <p>ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE</p>

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

CT	Castel di Judica	Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato					Importo ApQ	€ 900.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	-	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Domenico Faranda	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 06 del 29/02/2012	Comune di Castel di Judica	-	Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE Ing. Giovanni Amato, Ing. Giuseppe Vaccaro- Incarico esterno	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 1496 del 15/12/2010	Comune di Castel di Judica		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Salvatore Cavallaro	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 1401 del 01/12/2010	Comune di Castel di Judica		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assessorato di C.d.S.		Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza Fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori		Esecuzioni Lavori	verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta dal Comune. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2291/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette all'Ufficio del Commissario, in quanto Ente Beneficiario, il progetto, e la relativa documentazione tecnico/amministrativa, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con nota acquisita al prot. n. 273/UC del 16/01/2013, il RUP chiede al Commissario l'indizione della CdS. Considerato che durante la CdS del 07/03/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, il Commissario con nota prot. n.2330 del 19/04/2013 trasmette all'ARTA Serv. 3 tutta la documentazione amministrativa e l'unico progetto trasmesso, per la definizione dell'iter di finanziamento dell'intervento.</p>				SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	--	--	--	--	-----	--------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT 022	Bronte	Consolidamento frana						Importo ApQ	€ 1.092.500,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
		TOTALE FINANZIAMENTI				TOTALE IMPEGNATO			
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Santo Saitta (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 10/07/2012	Supplente al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 10/07/2012
Progettista	Comune	Nota di Incarico	Prot.n.559 del 10/11/2010	Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Comune	Nota di Incarico	Prot.n.559 del 10/11/2010
Collaudatore	Dott. Geol. Giovanni Cavallaro	Determina di incarico	Determina Dirigenziale n. 33 del 21/02/2011	Collaudatore Statico		Nota di Incarico	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistenti all'OP		Nota di Incarico	
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	data presunta di termine lavori
STATO DELL'ARTE	<p>Con nota prot. n. 559 del 10/11/2010 il Commissario autorizza il Comune a redigere il progetto esecutivo. Il Comune trasmette il Progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al n. 2892 del 15/12/2011. A seguito di incontri e colloqui, il Commissario, con nota protocollo n. 2182 del 14/06/2012, sollecita il comune a trasmettere il progetto esecutivo, debitamente munito dei pareri e documenti economici. Il RUP, con nota assunta al protocollo con n. 2377 del 27/06/2012, trasmette copia del progetto esecutivo con le integrazioni richieste, già inviato dallo stesso all'ARTA Serv. 3 per il relativo parere di competenza in quanto l'area oggetto dell'intervento è stata classificata R4, giusto Decreto n° 296/41 del 04.07.2000 (prot. n. 2376 del 27/06/2012). In sede della Conferenza dei Servizi del 18/07/2012, essendo stati acquisiti tutti i pareri e/o atti autorizzativi per la realizzazione dell'intervento, il Comune comunica di aver già avviato le procedure espropriative, come da documentazione trasmessa con nota acquisita al prot/UC n. 195 del 11/01/13.</p>					SAL	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT023	Calatabiano	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria						Importo ApQ	€ 250.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	note:	Nel comitato del 21/10/2010 l'intervento transita in lettera B Nel comitato del 24/02/2011 l'intervento transita di nuovo in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 374 del 22/05/2013	Importo Finanziato	€ 250.000,00	Decreto di Impegno	619 - 30/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 189.722,07		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 250.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNATI</b>			
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00

CONVENZIONI	INVITALIA
-------------	-----------

#### Figure Tecniche

RUP	Dott. Gaetano Cani	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 356 del 17/07/2012	Responsabile RUP	Ing. Fabio Ferla (FINO AL 29/01/2013)	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n. 356 del 17/07/2012
Progettista	INVITALIA	Arch. Fabio Pulizzi Ing. Alberto Peligra Ing. Gianluca Coroneo	Nota di incarico (in virtù della convenzione stipulata il 18/02/2011)	prot. N. 667 del 28/02/2012	Responsabile Progettazione	INVITALIA	Nota di incarico (in virtù della convenzione stipulata il 18/02/2011) prot. N. 667 del 28/02/2012
Collaudatore	INVITALIA	Dott. Geol. Gianluca Sabatini	Nota di incarico (in virtù della convenzione stipulata il 18/02/2011)	prot. N. 667 del 28/02/2012			
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Faro	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 565 del 16/07/2013				
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Salvatore Faro	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 565 del 16/07/2013			Nota di Incarico	
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	G.C. COSTRUZIONI S.R.L.	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 508 del 04/07/2013 data contratto 23/07/2013
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	06-ago-13 data presunta di termine lavori 29-gen-14

STATO DELL'ARTE	<p>A seguito del Comitato del 21/10/2011 l'intervento diventa di competenza dell'ARTA, alla quale si trasmette tutta la documentazione;</p> <p>Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale. A seguito della rinuncia del Comune, la Progettazione viene affidata ad INVITALIA con nota prot. n.667 del 28/02/2012.</p> <p>Con nota protocollo n. 5295 del 12/12/2012 la Società Invitalia trasmette all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07 febbraio 2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del parere ambientale dell'ARTA Serv. 1 VIA/VAS.</p> <p>Con nota prot. n. 2485 del 30/04/2013 L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica che non è necessario attivare le procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. N. 152/06, poiché le opere previste non ricadono tra quelle elencate negli allegati n. III e IV del suddetto decreto.</p> <p>L'Ufficio del Commissario con nota 2705 del 10/05/2013 comunica al RUP che alla data odierna non risulta ancora pervenuto il parere dell'ARTA Serv. 3, pertanto, in ossequio ai poteri di deroga del Commissario, lo stesso si intende acquisito favorevolmente e lo invita a redigere il verbale di verifica e validazione dell'intervento.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 2930 del 20/05/2013 trasmette al Commissario la verifica e validazione dell'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 374 del 22/05/2013 viene approvato e finanziato l'intervento per un importo pari ad € 249.978,03.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 508 del 04/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Società "G.C. COSTRUZIONI S.R.L." (ribasso percentuale del 31,7898%), in data 23/07/2013 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 619 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.</p> <p>In data 06/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale Consegna Lavori.</p> <p>Con nota prot. n. 5457 del 16/09/2013 il RUP trasmette tutta la documentazione inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	--	-----	----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




CT024	Castel di Iudica	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 640 del 22/11/2012	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di impegno	Decreto n. 490 del 27/05/2013	Importo dell'impegno	€ 2.227.552,38		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	€ 3.000.000,00	Decreto di impegno e pagamento GURI	Decreto n. 727 del 20/12/2012	Importo dell'impegno	€ 2.006,50	Economie da finanziamento	
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazione avviso gara	Decreto n. 112 del 20/02/2013	Importo dell'impegno	€ 1.887,60		
				Decreto di impegno e pagamento MAV	Decreto n. 202 del 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 600,00		
				Decreto di impegno e pagamento relazione geologica	Decreto n. 237 del 28/03/2013	Importo dell'impegno	€ 61.181,44		
				Decreto di impegno pubblicazione quotidiano di sicilia	Decreto n. 260 del 05/04/2013	Importo dell'impegno	€ 605,00		
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 297 del 08/04/2013	Importo dell'impegno	€ 916,20		
				Decreto di impegno e pagamento commissione di gara	Decreto n. 385 del 24/05/2013	Importo dell'impegno	€ 8.536,27		
				Decreto di impegno e pagamento coordin. Sicurezza. Fase progett.	Decreto n. 171 del 08/03/2013	Importo dell'impegno	€ 22.431,95		
				Decreto di impegno pubblicazione quotidiano	Decreto n. 492 del 28/06/2013	Importo dell'impegno	€ 1.706,10		
						<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	€ 2.327.423,44		
								Eventuali Economie da ribasso	
								€ 0,00	

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Domenico Faranda	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n.096 del 16 giugno 2011 (revocato con Decreto n. 476 del 24/06/2013)	Supplente al RUP				
	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n.476 del 24/06/2013	Ing. Federica Bottini	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n.096 del 16 giugno 2011 (revocato con Decreto n. 476 del 24/06/2013)		
Progettista	COMUNE	Nota di Incarico	Da acquisire determine di incarico ai singoli professionisti	Capo Sicurezza Fase Progetto	Ing. Lorenzo Moschetto	Determina di Incarico	Determina U.T.C. n° 858 del 08/07/2011	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Determina di Incarico	Determina U.T.C. n° 856 del 08/07/2011	Giulio de Santis	Ing. Roberto Barbagallo	Determina di incarico	Determina U.T.C. n° 857 del 08/07/2011	
Direttore Lavori	Geom. Domenico Faranda	Decreto di nomina	Decreto n. 479 del 25/06/2013	Assistente a.D.		Nota di Incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Francesco Freni	Decreto di nomina	Decreto n. 479 del 25/06/2013					
Collaudatore Statico	Ing. Fabrizio Greco	Decreto di Incarico	Decreto n. 634 del 01/08/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Fabrizio Greco	Decreto di Incarico	Decreto n. 634 del 01/08/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ATI Mammana Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	n. 251 del 04/04/2013	data contratto
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

CT024	Castel di Iudica	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti	Importo ApQ.	€ 3.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune, che con nota prot. n.984 del 23/03/2012 trasmette copia del progetto esecutivo.</p> <p>Il Comune ha attivato le procedure ambientali, al termine delle quali si è tenuta, in data 18/07/2012, la Conferenza di Servizi finalizzata ad ottenere il rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Il Comune, con nota prot.n. 7557 del 08.08.2012, trasmette al GC copia del progetto opportunamente modificato ed integrato, così come richiesto, ai fini del rilascio di apposito parere, dal GC di CT, con nota acquisita al prot. n. 2778 del 18/07/2012</p> <p>Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012, l'ARTA Serv. 3 comunica di non poter esprimere il parere di competenza in quanto l'area d'intervento non ricade in zone a pericolosità identificata nel vigente PAI e per assenza di adeguata relazione idraulica per la definizione delle interferenze con le opere da realizzare. Le relazioni idrauliche vengono inviate all'ARTA dal Commissario con nota prot. n. 3387 del 10/09/2012.</p> <p>L'intervento viene finanziato con Decreto n. 640 del 22/11/2012 e con Decreto n.251 del 04/04/2013 viene disposta l'Aggiudicazione Definitiva a favore della ATI Mammana Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl, eredi di Anello Andrea srl che hanno offerto un ribasso percentuale pari al 29,6650%.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 492 del 28/06/2013 si provvede ad impegnare la somma di € 2.227.552,38 necessaria per la realizzazione dell'intervento.</p>	SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI 	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT025	Giarre	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada					Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno		
		TOTALE FINANZIAMENTI				TOTALE IMPEGNATO		
						Economie da finanziamento		
						Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

<b>Figure Tecniche</b>							
RUP	Precedente R.U.P. Ing. Giuseppa Rita Leonardi	Nota di incarico	Nomina: determina sindacale n.88 del 8.10.2010 (Revocato con determina n. 111 del 2.12.2011)	Comitato di OD	Ing. Antonino Cancelliere	Determina di incarico	Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012
	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della 111A Area	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012				
Progettista	Comune	Nota di incarico	prot. N. 414 del 19/10/2010	Consorzio di OD	Comune	Determina di incarico	prot. N. 414 del 19/10/2010
Coordinatore		Determina di incarico					
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assemblea OD		Nota di incarico	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina					
Collaudatore Statico		Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori		Esecuzioni Lavori	verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Il Comune, con nota prot. 2823/UC del 7/12/2011, alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico del 17/11/2011, trasmette il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071/UC del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p> <p>Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti interessati.</p> <p>Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2136/UC del 12.06.2012, adempimento cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con con nota prot. n. 4024 del 12/10/12 e fornendo successivamente, con nota prot. n. 5159/UC del 6/11/12, i chiarimenti richiesti dall'ARTA Serv. 1 VAS/VIA. L'avviso pubblico per la consultazione degli elaborati progettuali relativamente alla verifica ambientale è stato pubblicato sulla GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. n. 5085 del 28/08/2013 comunica al Comune che l'intervento non necessita della procedura di assoggettabilità ambientale.</p> <p>Con nota prot. n. 5372 del 10/09/2013 il RUP chiede ai progettisti di procedere alla validazione del progetto avendo già ottenuto tutti i pareri necessari, al fine di consentire l'emissione del Decreto Commissariale di finanziamento e la relativa gara d'appalto.</p>	SAL	AFFIDATARIA	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	---	-----	-------------	--------------------------------




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT026	Giarre	Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe					Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 695 del 13/12/2012	Importo Finanziato	€ 1.000.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 446 del 14/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 734.670,35	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 1.000.000,00	Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 295 del 18/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.083,94	
						TOTALE IMPEGNATO	€ 735.754,29	
						Economie da finanziamento		
						Eventuali Economie da ribasso		€ 0,00
<b>Figure Tecniche</b>								
RUP	nomina di R.U.P. all'Ing. Giuseppa Rita Leonardi	Nota di incarico	Determina sindacale n.88 del 8.10.2010 (revocato con determina n. 111 del 2.12.2011)	Comune di Giarre	Ing. Enrico Foti	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 293 del 25/06/2012	
	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della 111A Area	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 293 del 25/06/2012					
Progettista	Comune	Nota di Incarico	prot. N. 413 del 19/10/2010	Comune di Giarre	Comune	Nota di Incarico	prot. N. 413 del 19/10/2010	
Geologo		Determina di Incarico						
Direttore Lavori	Ing. Leonardi Giuseppa Rita	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 225 del 26/03/2013	Comune di Giarre	Geom. Rompineve Sorbello Roberto Geom. Torrissi Carmelo	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 225 del 26/03/2013	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Licciardello Vito	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 225 del 26/03/2013					
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Caradonna	Decreto di Incarico	Decreto n. 332 del 10/05/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Giuseppe Caradonna	Decreto di Incarico	Decreto n. 332 del 10/05/2013	
INDAGINI preliminari affidate ai:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Soc. Operae srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 270 del 11/04/2013	data contratto 09/05/2013
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	17/05/2013	data presunta di termine lavori



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

CT026	Giarre	Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe	Importo ApQ. € 1.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il Comune, con nota prot. 2824 del 7/12/2011, trasmette, alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico del 17/11/2011, il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste, ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071 del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p> <p>Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti pareri degli enti.</p> <p>Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2135/UC del 12.06.2012, prescrizione cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con nota prot. n. 4026/UC del 12/10/12. Le pubblicazioni sono state effettuate sulla GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica con nota acquisita al prot. n. 4811 del 20/11/2012 che il progetto non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dettando tuttavia delle prescrizioni.</p> <p>Il Comune, con nota prot. n. 5257/UC del 11/12/2012 trasmette il progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto n. 695 del 13/12/2012 il Commissario approva e finanzia l'intervento per un importo pari a € 1.000.000,00.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della società Operae srl che ha offerto un ribasso percentuale pari ad € 30,2283%.</p> <p>Con Decreto n. 444 del 14/06/2013 vengono impegnate le somme per un importo pari ad € 734.344,35.</p>	<p>SAL</p> <p>AVVIATI LAVORI</p> 	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT027	Grammichele <b>Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B.Buozzi</b>							Importo ApQ	€ 700.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012	Importo Finanziato	€ 700.000,00	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 303 del 19/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 549.978,26		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	€ 700.000,00	Decreto di impegno e pagamento MAV	Decreto n. 202 del 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
						<b>TOTALE IMPEGNI</b>	€ 550.203,26		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Michele Iudica UTC	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.325 del 10/07/2012	Responsabile RUP	Ing. Rossella Zumbè (FINO AL 29/01/2013)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.325 del 10/07/2012
Progettista	Comune	Ing. Biagio Ventura UTC	Determina di Incarico	Determina Sindacale n. 42 del 03/11/2003 Determina Dirigenziale n. 677 del 24/11/2003	Coord. Tecnico e RUP	Comune Geom. Michele Iudica UTC	Determina di Incarico Determina Sindacale n. 42 del 03/11/2003 Determina Dirigenziale n. 677 del 24/11/2003
Coordinatore			Determina di Incarico				
Direttore Lavori	Ing. Biagio Ventura	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 107 del 19/02/2013	Assessore ADL			Nota di Incarico
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Franco Giuseppe	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 216 del 25/03/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Celona	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 402 del 05/06/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	GLOBALGEO S.R.L.	Decreto Affidamento Lavori n. 27 del 15/01/2013	data contratto	10-apr
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	24/06/2013	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che trasmette il progetto esecutivo nell'aprile del 2011. Da una prima visione del progetto sono emerse delle criticità.</p> <p>Con nota prot. n. 1870 del 28/05/2012 il Commissario ha richiesto un adeguamento del progetto, rielaborato con integrazioni richieste.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2120 del 11/06/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato con le integrazioni richieste.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 10/07/2012 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, tra i quali il parere dell'ARTA serv 3 che prescrive un piano di monitoraggio dell'intervento.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4875/UC del 22/11/2012, trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della GLOBALGEO S.R.L. che ha offerto un ribasso percentuale del 29,7999 % ed il contratto è stato stipulato in data 10/04/2013;</p> <p>In data 24/06/2013 sono stati avviati i lavori.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	---	-----	----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT028	Licodia Eubea	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi					Importo ApQ	€ 880.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno		
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Arch. Salvatore Lentini	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n. 587 del 07/11/2012	Responsabile RUP	Sig.ra Stefania Vallone	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n. 587 del 07/11/2012
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Coord. Tecnico Fase Progettata		Incarico conferito tramite:	
Coordinatore		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è in capo al Comune.</p> <p>Con nota prot. n.2293/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario, in quanto Ente Beneficiario il progetto, la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.</p> <p>Con nota prot. n. 3442/UC del 12/09/2012, il Comune trasmette al Commissario copia del verbale di sopralluogo congiunto con il DPPC CT ed il GC CT, in cui si considera prioritario l'intervento sul "Versante Duca degli Abruzzi".</p> <p>Con nota protocollo n. 5073 del 03/12/2012, il RUP trasmette il progetto esecutivo aggiornato. In sede di CdS del 19/12/2013 vengono acquisiti tutti i necessari pareri, tranne quello dell'ARTA serv. 3 che il Commissario, con nota prot. n. 409 del 22/01/13, considera comunque acquisito positivamente, stante la mancata ricezione nel termine assegnato di 7 gg.</p> <p>Il Comune, con nota protocollo n. 90 del 08/01/2013, trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS del 19/12/2013.</p> <p>Il RUP con nota prot. n.912 del 12/02/2013 trasmette il verbale di verifica e validazione dell'intervento.</p>	SAL	<p>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</p>
-----------------	--	-----	-------------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT031	Misterbianco <b>Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo</b>							Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 130 del 13/7/2011	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 331 del 21/11/2011 come modificato dal Decreto n. 371 del 18/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 387.388,21		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	Decreto Commissariale n. 312 del 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno Somma aggiuntiva Collaudatore	Decreto Commissariale n. 494 del 26/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.157,99		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 388.771,20</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	€ 112.386,79


<b>CONVENZIONI</b>	DRPC CT
--------------------	---------

Figure Tecniche									
DIR.	Dott. Aldo Bonina(DRPC)	Nota di incarico	prot. n. 53823 del 14.12.2010	Supplente di DRPC	Ing. Giocchino Marino Geom. Antonino Sciuto	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035317 del 08/09/2011		
Progettista	DRPC CT (Dott. Aldo Bonina, Arch. Fabio Borzi, Arch. Paolo Licandri)	Nota di Incarico	prot. n. 305 del 28/09/2010	Supplente di DRPC	DRPC di Catania	Nota di Incarico	prot. n. 305 del 28/09/2010		
Responsabile		Determina di incarico		DRPC Catania	responsabile UTC (ing. Vincenzo Orlando)	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 109 del 29/06/2011		
Direttore Lavori	Arch. Fabio Borzi(DRPC) Paolo Licandri	Arch.	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035317 del 08/09/2011	Assistente al D.L.	Geom. Antonio Sciuto	Nota di Incarico	prot. n. 035317 del 08/09/2011	
Coord. Sicurezza Fase Esecuzione			Decreto di nomina						
Collaudatore Statico	Ing. Giovanna Baratta	Nota di incarico	Prot. N. 298 del 31/01/2012	Decreto Conferma incarico	Decreto Commissariale n. 149 del 02/04/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	SGM srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Pippo Pizzo	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 249 del 03/10/2011	data contratto	15/11/2011
contratto	08/02/2011	data conclusione lavori	11/03/2011			verbale inizio attività	07/11/2011	data termine lavori	25/05/2012



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT031	Misterbianco	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo	Importo ApQ	€ 500.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 249 del 03/10/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.                      Il Contratto è stato stipulato il 15/11/2011. I lavori sono stati consegnati il 7/11/2011 e sono stati ultimati in data 25/05/2012.                      Durante lo svolgimento delle attività si è resa necessaria una Perizia di Variante e Suppletiva e di conseguenza una rimodulazione del quadro economico dell'intervento.                      Il Commissario ha preso atto della perizia con Decreto Commissariale n. 371 del 18/07/2012. Con Decreto n. 494 del 26/09/2012, è ulteriormente modificato il Q.E. a seguito dell'impegno della somma aggiuntiva di € 1.157.99 relativo alla voce B/5 (Collaudo Statico e prove su materiali).                      Con nota protocollo n. 3036 del 03/08/2012 l'ing. Giovanna Baratta trasmette la relazione-certificato di collaudo statico.                      A seguito dell'invito del Commissario a relazionare sull'attività svolta, di cui alla nota prot. n. 4792 del 19/11/12, il RUP Espropri comunicata, con nota n. 5355 del 14/12/12, di aver eseguito lo stato di consistenza ed occupazione temporanea delle aree oggetto di espropriazione nonché di aver calcolato l'indennità di espropriazione, di occupazione e di servizi da corrispondere ai proprietari delle aree espropriate</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT033	Piedimonte Etneo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa					Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 265 del 07/10/2011	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 36 del 25/01/2012	Importo dell'Impegno	€ 402.969,16	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 500.000,00			TOTALE IMPEGNATO	€ 402.969,16	
						Economie da finanziamento		
						Eventuali Economie da ribasso	€ 97.030,84	

CONVENZIONI	DRPC CT
-------------	---------

Figure Tecniche									
RUP	Dott. Aldo Bonina (DRPC)	Nota di incarico	prot. n. 54711 del 20/12/2010	Direttore RUP	Ing. Gioacchino Marino Antonino Sciuto	Geom.	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035316 del 08/09/2011	
Progettista	DRPC CT	Nota di incarico	prot. n. 364/UC del 12/10/2010	Coord. Sicurezza Fase Progettazione	Dipartimento Protezione Civile Catania		Nota di incarico	prot. n. 364/UC del 12/10/2010	
Geologo		Determina di incarico		DRPC CT	Geom. Giuseppe Del Popolo UTC		Decreto Commissariale	Decreto Commissariale n. 211 del 06/09/2011	
Direttore Lavori	Ing. Gioacchino Marino	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035316 del 08/09/2011	Assistente al D.L.	Geom. Antonino Sciuto		Nota di conferimento incarico	prot. n. 035316 del 08/09/2011	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	DRPC CT	Decreto di nomina	prot. n. 364/UC del 12/10/2010						
Collaudatore Statico	Ing. Maurizio Artale	Nota di incarico	prot. n. 294 del 31/01/2012	Decreto Conferma incarico	Decreto Commissariale n. 150 del 02/04/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Nota di incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ARCHAS s.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 303 del 03/11/2011	data contratto	18/01/2012
contratto	28/04/2011	data conclusione lavori	15/03/2011			verbale inizio attività	25/01/2012	data conclusione lavori	09/08/2012

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di CT che ha trasmesso il progetto in data 22/08/2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 303 del 03/11/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato stipulato in data 18/01/2012. I lavori sono stati avviati in data 25/12/2012 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto, era fissata entro il 22/07/2012; tuttavia, con nota acquisita al prot. n. 2921 del 31/07/2012, il DRPC di Catania ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal direttore dei lavori ed il parere favorevole del RUP. Con nota prot.n. 3014 del 02.08.2012, il Dirigente del Servizio del DRPC di Catania ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia degli Ordini di Servizio del Direttore Lavori e del Verbale di Consegna della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, approvata con Decreto Commissario n. 409 del 02/08/2012. Con nota prot. n. 3265/UC del 30/08/2012, il RUP comunica l'ultimazione dei lavori, come accertato dal direttore dei lavori in data 09/08/2012. Il DRPC CT con nota prot. n. 5141 del 30/08/2013 trasmette la documentazione inerente lo Stato Finale e l'attestazione e certificato di regolare esecuzione.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	-----	-----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>CT034</b>	<b>Raddusa</b>	<b>Opere di consolidamento del versante</b>						Importo ApQ	<b>2.000.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		importo dell'impegno			
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>	

Figure Tecniche								
RUP	Geom. Roberto Antonio La Mastra	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 292 del 25/06/2012	Capogruppo RUP	Ing. Federica Bottini	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 292 del 25/06/2012	
Progettista	Comune	Nota di Incarico		Capogruppo della fase Progett.		Determina di incarico		
Coordinatore		Determina di incarico						
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Appaltatore (Art. 101)		Nota di incarico		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina						
Collaudatore Statico		Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico		

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 27/07/2011.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. 2277 del 26/10/2011, ha invitato il RUP a trasmettere all'ARTA la documentazione progettuale, al fine di avviare le procedure VIA/VAS.</p> <p>Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 3000/UC del 23/12/2011, ha ritenuto necessaria l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06, richiedendo la necessaria documentazione.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi del 26/06/2012, vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione per il parere dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS che attende dei chiarimenti sulle scelte progettuali, nonché dell'Ispr. Ripartimentale delle Foreste di Catania.</p> <p>Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 2882/UC del 26/07/2012, ha comunicato la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/06, esprimendo dubbi sulle scelte progettuali.</p> <p>Il Comune, ritenuto pertanto di dover modificare le scelte progettuali precedentemente adottate, ha chiesto, con nota acquisita al prot. n. 3254 del 29/08/2012, l'autorizzazione ad affidare all'esterno gli incarichi di progettazione, studio geologico, indagini geognostiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 3380 del 10/09/2012, ha concesso la relativa autorizzazione, successivamente revocata, con nota prot. n. 302/UC del 17/01/13, limitatamente all'incarico di progettazione, affidato invece, in forza della convenzione del 18/02/2011, ad Invitalia. Quest'ultimo incarico viene a sua volta revocato dal Commissario, con nota prot.482 del 23/01/13, in considerazione della nota del Comune, assunta al prot. n. 457/UC del 22/01/13, di comunicazione dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei servizi tecnici.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 2418 del 24/04/2013 comunica al Commissario che ha invitato il Capogruppo della R. T.P. a presentare nel più breve tempo possibile tutta la documentazione per la stipula del disciplinare d'incarico e che alla stessa saranno assegnati come da disciplinare trenta giorni di tempo per ottemperare alla progettazione esecutiva.</p> <p>Con nota prot. n. 3090 del 24/05/2013 il Comune trasmette al Commissario il Progetto Esecutivo.</p> <p>Il Commissario convoca una Cds per il giorno 04/06/2013 al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. N. 6441 del 28/10/2013 esaminati gli elaborati progettuali ritiene che non si debbattivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	--	-----	--------------------------------

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

CT036	Ramacca	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato						Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 89 del 01/03/2012	Importo Finanziato	€ 1.176.008,88	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 458 del 12/09/2012	Importo dell'impegno	€ 951.340,42		
				Decreto di Impegno somme integrativo	n.830 del 08/10/2013	Importo dell'impegno	€ 46.634,65		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto Commissariale n. 170 del 03/08/2011	Importo Finanziato	€ 23.991,12	Decreto di Impegno indagini preliminari	n.224 del 14/09/2011	Importo dell'impegno	€ 19.088,12		
				Decreto di Impegno spese pubblicazione GURI	n.151 del 03/04/2012	Importo dell'impegno	€ 958,14		
				Decreto di Impegno spese pubblicazione quotidiani	n. 266 del 08/06/2012	Importo dell'impegno	€ 3.115,75		
				Impegno e pagamento Commissione di Gara	n.334 del 10/07/2012	Importo dell'impegno	€ 307,93		
				Decreto di Impegno e pagamento contributo AVCP	n. 387 del 24/07/2012	Importo dell'impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 1.021.820,01</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

CONVENZIONI INVITALIA

## Figure Tecniche

RUP	Geom.Salvatore Sottosanti (UTC)	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.136 del 20/07/201	Subordinata a RUP	Ing. Federica Bottini Rag. Domenica Patrizia Arcidiacono	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.136 del 20/07/2011		
Progettista	INVITALIA	Ing. Fabio Ferla © Ing. Gianluca Coroneo Ing. Rossella Zumbè	Nota di Incarico	Prot. N. 255 del 08/03/2011	Coord. Sicurezza fase Progettazione	INVITALIA	Ferla © Coroneo Zumbè	Nota di Incarico	Prot. N. 255 del 08/03/2011
Geologo	INVITALIA	Dott. Geol. Matteo Del Mastro	Determina di incarico	Prot. N. 255 del 08/03/2011					
Direttore Lavori	Ing. G. Coroneo	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.210 del 10/05/2012	Assistente al DL	Ing. R. Zumbè	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.210 del 10/05/2012		
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. D. Imbroglia	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.210 del 10/05/2012	Collaboratore Tecnico Amministrativo al D.L.	Geom. Domenico La Piana (in servizio presso l'UTC di Ramacca)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.288/bis del 22/06/2012		





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT036		Ramacca		Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato		Importo Apq		€ 1.200.000,00			
Collaudatore Statato		LUIGI BOERI INGEGNERE & ASSOCIATI		Decreto di nomina		D.C. n. 312 del 06/07/2012		Decreto di nomina		D.C. n. 312 del 06/07/2012	
Collaudatore Tecnico amministrativo		LUIGI BOERI INGEGNERE & ASSOCIATI		Decreto di nomina		D.C. n. 312 del 06/07/2012		Decreto di nomina		D.C. n. 312 del 06/07/2012	
INDAGINI preliminari affidate a:		I.G.E.M. INDAGINI GEOLOGICHE MENDIONALI s.r.l.		Decreto di affidamento INDAGINI		Decreto n. 224 del 14 settembre 2011		Decreto Affidamento Lavori		10/05/2012	
contratto		21/09/2011		data conclusione lavori		21/11/2011		verbale inizio attività		21/03/2013	
STATO DELL'ARTE		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		CO.E.S.I srl		Decreto n. 125 del 26/03/2012		Decreto n. 125 del 26/03/2012		data contratto	
LAVORI ULTIMATI		SAL		SAL		08/06/2012		08/06/2012		data presunta di termine lavori	
<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia.                      A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 224 del 14/09/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini Preliminari alla progettazione.                      A seguito della restituzione delle risultanze delle indagini, con nota acquisita al prot.n. 95 del 16/01/2012, la Soc. INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo.                      Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 89 del 01/03/2012.                      Con Decreto n. 125 del 26/03/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.                      In data 02/04/2012 si è emesso Decreto per l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dall'intervento.                      Il contratto è stato firmato in data 10/05/2012 e i lavori hanno avuto inizio in data 08/06/2012.                      Con Decreto n. 458 del 12/09/2012 si è preso atto della Perizia di Variante n. 1 migliorativa ed in diminuzione.                      A seguito di comunicazione del RUP in merito ad uno smottamento della parte superficiale del terreno con fuoriuscita di acqua di ignota provenienza, il Commissario, con nota prot. n. 4532 del 04/07/2012, ha richiesto ad Invitalia di predisporre un piano di indagini integrativo, successivamente acquisito al prot. n.2553 del 09/07/2012. Le indagini integrative sono state affidate dal RUP al Dott. Domenico Boso, come comunicato con nota acquisita agli atti al prot. n. 3055 del 06/08/2012. A seguito dell'espletamento delle indagini, così come attestato dal RUP con nota prot. 5292/UC del 12/12/12, e dalla nota tecnica integrativa del Geologo Dott. Boso, dalla quale si ravvisa "la necessità e l'urgenza di interventi mirati a stabilizzare il pendio ed evitare danni", il Comune ha chiesto, con nota prot. 4602/UC del 8/11/12, di utilizzare le economie risultanti dal ribasso d'asta per la risoluzione della problematica.                      Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4670 del 13/11/2012, ha trasmesso copia della perizia di variante e supplementa n. 2, di cui il Commissario ha preso atto con D. C. n. 610 del 15/11/2012. Con nota prot. 525 del 11/12/12 il Commissario ha invitato il Comune a presentare un progetto preliminare, con la quantificazione delle spese, per trasmetterlo al Comitato di Indirizzo e Coordinamento ai fini di un'eventuale riprogrammazione delle risorse residue dei lavori.                      I lavori - sospesi come da verbale del 19/12/2012, a causa dello spostamento, da parte dell'ENEL, dell'impianto di media tensione - sono stati ripresi il 15/01/2013, come da relativo verbale, trasmesso dal D.L. con nota n. 271/UC del 16/01/13.</p>											

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

CT037	Randazzo	Opere di consolidamento del centro abitato					Importo ApQ	€ 960.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	A seguito del Comitato del 24 Febbraio 2011 l'intervento transita dalla lettera B alla lettera A	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento	197 - 23/8/2011	Importo Finanziato	€ 960.000,00	Decreto di Impegno	83 del 27/02/2012	Importo dell'impegno	€ 765.181,07	
				Decreto di Impegno spese pubblicazione GURI	336 del 28/11/2011	Importo dell'impegno	€ 1.042,01	
				Decreto di Impegno spese progettazione	388 del 19/12/2011	Importo dell'impegno	€ 60.808,04	
				Decreto di Rimodulazione Impegno dopo PVS	553 del 24/10/2012	Importo dell'impegno	€ 102.248,40	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 960.000,00			TOTALE IMPEGNATO	€ 929.279,52	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	


## Figure Tecniche

RUP	Geom. Vincenzo Patorniti	Nota di incarico	Decreto n. 340 del 28 novembre 2011 (Rinuncia all'incarico con nota prot. N. 2706 del 01.12.2011)	Segretario RUP	Ing. Marco Calogero (FINO AL 29/01/2013)	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 363 del 5 dicembre 2011		
	Ing. Domenico Imbroglia	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 363 del 5 dicembre 2011						
Progettista	COMUNE	Ing. Antonino Romano	Nota di incarico	Determina Sindacale n. 24 del 16/05/2007	Consulente Tecnico Amministrativo	Ing. Romano Antonino	Nota di incarico	Determina Sindacale n. 24 del 16/05/2007	
Geologo		Dott.ssa Geol. Sabrina Foti	Determina di incarico	Determina Sindacale n. 18 del 10/05/2007 incarico studio geologico;	Consulente Tecnico Amministrativo	Ing. Antonino Romano	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 624 del 31 luglio 2013	
Direttore Lavori	Ing. Antonino Romano	Decreto di nomina	Decreto N. 374 del 13 dicembre 2011	Assegnato all'ID			Nota di incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonino Romano	Decreto di nomina	Decreto N. 374 del 13 dicembre 2011						
Collaudatore Stativo	Ing. Clemente Francesco	Decreto di incarico	Decreto N. 219 del 14 maggio 2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Clemente Francesco	Nota di incarico	Decreto N. 219 del 14 maggio 2012		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI				Decreto Affidamento Lavori	Decreto n.333 del 24 novembre 2011	data contratto	29/11/2011
contratto		data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	COTESP SRL	verbale inizio attività	20-dic-11	data conclusione lavori	07-set-12

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

CT037	Randazzo	Opere di consolidamento del centro abitato	Importo App.	€ 960.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 333 del 24/11/2011 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 29/11/2011.</p> <p>La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto era fissata entro il 18/04/2012;</p> <p>A seguito dei verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata, con possibili ripercussioni sul buon andamento dei lavori, è emersa la necessità di una Perizia di Variante e supplementiva, trasmessa dal DL con nota prot. 1387/UC del 23/04/2012, per la cui approvazione si è tenuta apposita Conferenza dei Servizi in data 16.05.2012.</p> <p>La PVS viene approvata con Decreto Commissariale n.236 del 24/05/2012 ed a seguito della rimodulazione dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori, il nuovo termine di ultimazione è stato fissato al 09/09/2012.</p> <p>I lavori si sono conclusi in data 07/09/2012.</p> <p>Il RUP Ing. Domenico Imbroglia, a seguito della nota del Comune prot/UC n. 3719 del 27/09/2012, di segnalazione di alcune carenze circa la corretta e completa esecuzione dei lavori, ordina, con nota prot. 3882 del 5/10/12, ulteriori lavori, concedendo altri 15 gg., in aggiunta a quelli concessi dal D.L. nel certificato di ultimazione lavori del 12.09.2012.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT038	Santa Venerina	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago					Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
Decreto di Finanziamento acquisizione progettazione	Decreto Commissariale n. 862 del 14/10/2013	Importo Finanziato	€ 48.721,92				Economie da finanziamento	
Decreto di Finanziamento acquisizione studio geologico	Decreto Commissariale n. 863 del 14/10/2013	Importo Finanziato	€ 47.689,67				Eventuali Economie da ribasso	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 96.411,59</b>					

Figure Tecniche							
RUP	-	Incarico conferito tramite:	-	Comune di Santa Venerina		Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Comune di Santa Venerina	Progetto	Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:			Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori		Esecuzioni Lavori	verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	La progettazione è stata redatta dal Comune. Con nota acquisita al protocollo al n. 2294 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con Decreto Commissariale n. 862 e 863 del 14/10/2013 vengono acquisite la progettazione esecutiva e lo studio geologico.				SAL	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	--	--	--	-----	------------------------------------

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

CT039	Sant'Agata Li Battiati	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi					Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di impegno	-	Importo dell'impegno	-	
Decreto di finanziamento acquisizione progettazione	Decreto n. 292 del 18/04/2013	Importo Finanziato	€ 43.314,79	Decreto di Impegno acquisizione progettazione	Decreto N. 367 del 20/05/2013	Importo dell'impegno	€ 43.314,79	
Decreto di finanziamento acquisizione studio geologico	Decreto n. 293 del 18/04/2013	Importo Finanziato	€ 29.664,42	Decreto di Impegno acquisizione studio geologico	Decreto N. 366 del 20/05/2013	Importo dell'impegno	€ 29.668,42	
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 72.979,21</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 72.983,21</b>	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Adele Giusto	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 314 del 07/05/2013	Responsabile RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE (Ing. Pietro Agnello, Studio Di Mino Ing. Ass., Ing. Vincenzo Miceli)	Incarico conferito tramite:	Provvedimento Dirigenziale n. 542 R.G. del 21/05/2010	Responsabile Progettista		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	Provvedimento Dirigenziale n. 552 R.G. del 27/05/2010			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente all'DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta dal Comune.            Con nota acquisita al protocollo al n. 2290 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnica/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.            Con nota prot. n.3089 del 24/05/2013 l'Ing. Pietro Agnello trasmette al Commissario il progetto esecutivo. I progettisti trasmettono le integrazioni al piano di sicurezza richieste in sede di CdS tenutasi in data 04/06/2013, pertanto sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento</p>					SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	---	--	--	--	--	-----	--------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



TP168	Erice		Consolidamento costone roccioso – Zona Crocifissello					Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	-	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 223 del 16/05/2012	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	n. 90 del 08/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 389.833,73		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	€ 500.000,00	Decreto impegno e pagamento MAV	Decreto Commissariale n. 577 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Integrazione Impegno	n. 427 del 12/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 40.103,16		
						<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	€ 430.161,89		
						Economie da finanziamento			
						Economie da ribasso		€ 0,00	

CONVENZIONI DRPC

Figure Tecniche

RUP	Ing. Giovanni Indelicato (DRPC TP)	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.107 del 15/03/2012	Supporto al RUP	Ass. Amm.vo Antonina Minaudo	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012
Progettista	DRPC TP Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio	Nota di incarico	nota prot. N. 478 del 03 nov 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio (DRPC TP)	Nota di Incarico	nota prot. N. 478 del 03 nov 2011
Geologo	Dott. Geol. Giuseppe Baiata	Determina di Incarico	Determina Sindacale n. 42 del 20/08/2010	direttore operativo	Funz. Dir. Giovanni Basciano	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012
Direttore Lavori	Arch. Vincenzo Loria	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012	ispettore di cantiere	Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico	Ing. Antonio Minutella	Decreto di Incarico	n. 07 del 08/01/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI				Decreto Affidamento Lavori	428 - 23/08/2012	data contratto 09/10/2012
contratto	data conclusione lavori			AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori Renzo Costruzioni srl	verbale inizio attività	28/11/2012	data presunta di termine lavori 25-feb-13

<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di TP.          Con nota prot. 1541 del 23/08/2011, il DRPC TP ha trasmesso gli elaborati progettuali, successivamente integrati dalla documentazione trasmessa con nota prot. n. 2106/UC del 14/10/2011.          In sede di Conferenza dei Servizi del 28/02/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed il DRPC TP, con nota n. 1635/UC del 11/05/2012, trasmette la verifica del progetto esecutivo, il rapporto conclusivo sulla verifica e la validazione dello stesso.          Con Decreto Commissariale n. 223 del 16/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.          Con Decreto Commissariale n. 428 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.          Con nota acquisita al prot. n. 3219/UC del 24.08.12, il RUP ha nominato un nuovo gruppo di Direzione Lavori.          Il contratto è stato stipulato in data 09/10/2012 ed i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2012 e dovranno concludersi entro il 25/02/2013.          Il Commissario, con Decreto n. 90 del 08/01/2013, ha preso atto della perizia di variante e suppletiva - approvata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs.163/2006, dal DRPC con determina n. 122 del 20/12/2012 - provvedendo all'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 389.833,73          L'ing. Antonio Minutella in data 07/02/2013 effettuerà la visita di collaudo.</p>		SAL	LAVORI CONCLUSI
---	--	-----	-----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>TP169</b>	<b>Mazara del Vallo</b>	<b>Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona Tonnarella</b>					Importo ApQ	<b>€ 800.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	-	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 216 - 11/05/2012	Importo Finanziato	€ 800.000,00	Decreto di Impegno	603 - 13/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 741.500,00	
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 800.000,00</b>	rimodulazione impegno	618 25/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 800.000,00	Economie da finanziamento
								Economie da ribasso
								<b>€ 0,00</b>

**CONVENZIONI** Provv.to Int.le OO.PP.

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Pietro Viviano	Nota di Incarico	prot. N. 515/UC del 04/11/2010	Supporto al RUP		Nota di Incarico	
Progettista	Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia	Nota di Incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Geol. Santi Eugenio Diliberto	Nota di Incarico	prot. N. 535 del 19/04/2011				
Direttore Lavori	Ing. Leonardo Tallo	Nota di Incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010	Assistente al DL	funzionario Provveditorato OO.PP. Ufficio genio civile OO.MM.	Nota di Incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010
	Geom. Daidone (in sostituzione dell'Ing. Tallo)						
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

**PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 176 DPR 207/2010)**

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SC A.R.L.	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La progettazione è stata affidata al Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot. n. 1539 del 23/08/2011. A seguito della Conferenza dei Servizi del 20.10.2011 (nella quale è stato esposto il progetto generale dell'intervento che però presentava un importo delle opere da realizzare superiore a quanto stanziato dall'APQ) e del 29.11.2011 (nella quale è stato discusso uno stralcio funzionale il cui importo risultava conforme alle somme stanziato dall'APQ) sono stati acquisiti tutti i pareri, di cui alcuni con prescrizioni, necessari alla realizzazione dell'intervento dello Stralcio Funzionale.</p> <p>In virtù della Convenzione stipulata con il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria, le procedure di affidamento dei lavori sono state espletate dallo stesso Ente, che tra l'altro, con verbale del 03/11/2011, ha dichiarato la somma urgenza ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 216 del 11/05/2012 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo. Con nota acquisita agli atti al prot. n.1805 del 22/05/2012, il Comune ha comunicato l'avvenuta consegna dei lavori da parte dell'Ufficio Opere Marittime in data 26.04.2012, nelle more della stipula del contratto di appalto.</p> <p>Con nota acquisita al prot n. 4619 del 09/11/2012, il RUP ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B del D.Lgs. 163/2006 munita del Decreto Dirigenziale di approvazione in linea tecnica. L'ing. Pietro Viviano ha comunicato che i lavori sono stati ultimati in data 24/06/2013 e che non essendoci opere strutturali potrà procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del D.L. ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006</p>					SAL	<b>LAVORI CONCLUSI</b>
------------------------	--	--	--	--	--	-----	------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



TP172	San Vito Lo Capo	Collocazione rete paramassi – Zona Makari					Importo ApQ	€ 450.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 62 del 14 febbraio 2012	Importo Finanziato	€ 450.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 401 del 02/08/2012	Importo dell'impegno	€ 366.819,04	
				Decreto di Impegno contributo AVCP	Decreto n. 387 del 24/07/2012	Importo dell'impegno	€ 225,00	
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 450.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 367.044,04	
							Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	€ 0,00

CONVENZIONI DRPC

#### Figure Tecniche

RUP	Ing. Giovanni Indelicato (DRPC TP)	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 70 del 15 febbraio 2012	Supporto al RUP	Ass. Amm.vo Giuseppa Giacalone	Nota di Incarico	nota DRPC acquisita al prot. N.983 del 23/03/2012
Progettista	DRPC TP Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio	Nota di Incarico	prot. N. 477 del 03/11/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio (DRPC TP)	Nota di Incarico	prot. N. 477 del 03/11/2010
Geologo	Dott. Geol. Caterina Caradonna	Nota di Incarico da repertorio DRPC TP	Rep. N. 41 del 08/02/2011	direttore operativo	Funz. Dir. Geom. Rosario Grammatico	Nota di Incarico	nota DRPC acquisita al prot. N.983 del 23/03/2012
Direttore Lavori	Arch. Maria Di Girolamo (DRPC TP)	Nota di Incarico	nota DRPC acquisita al prot. N.983 del 23/03/2012	ispettore di cantiere	Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo	Nota di Incarico	nota DRPC acquisita al prot. N.983 del 23/03/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di incarico					
Collaudatore Statico	Arch. Stefano Lucido	Decreto di Incarico	n. 575 del 06/11/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 146 DPR 554/99)

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Torsten Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto Commissariale N. 102 del 13/03/2012	data contratto	10/05/2012
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	20/08/2012	data presunta di termine lavori	18-nov-12




REGIONE  
SICILIANAREPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

TP172	San Vito Lo Capo	Collocazione rete paramassi – Zona Makari		Importo ApQ	€ 450.000,00
	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di TP che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al prot. n. 1540 del 23/08/2011. Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 62 del 14/02/2012. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 102 del 13/03/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Con Decreto Commissariale n. 114 del 19 marzo 2012 si è autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza. Il Contratto è stato sottoscritto in data 10/05/2012. In data 20/08/2012 sono stati avviati i lavori. Il RUP, con nota n. 4571 del 07/11/2012, ha trasmesso la determina n. 111 del 29/10/2012 di approvazione della 1° perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 9 art. 161 del D.P.R. 207/2010, e la relazione generale dell'intervento. Con Decreto Commissariale n. 693 del 12/12/2012 il Commissario ha preso atto della PVS redatta dalla D.L. e approvata dal RUP ai sensi dall'art. 132 comma 1 lett. B del D. Lgs 163/2006, rimodulando l'impegno di spesa. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 687 del 31/01/2013 il RUP ha trasmesso i documenti contabili relativi al SAL n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 16/01/2013 e il certificato di ultimazione dei lavori. Con nota acquisita al prot. n. 2290 del 17/04/2013, il DL trasmette alla Struttura Commissariale n. 2 copie della Relazione a struttura ultimata, ai sensi dell'art. 6 della L. 1086/71. Il RUP Ing. Giovanni Indelicato con nota prot. n. 3264 del 04/06/2013 trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva.</p>		SAL	LAVORI ULTIMATI	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>TP189</b>	<b>Mazara del Vallo</b>	<b>Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale</b>					Importo ApQ	<b>€ 2.000.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	ADP Integrativo	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno		
Decreto di finanziamento per piano di caratterizzazione ambientale	Decreto n. 485 del 27/06/2013	Importo Finanziato	€ 398.918,85	Decreto di impegno e pagamento per piano di caratterizzazione ambientale	Decreto n. 485 del 27/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 398.918,85	
		TOTALE FINANZIATO				TOTALE IMPEGNATO		
						Economie da ribasso	€ 0,00	

CONVENZIONI

Prov.to Int.le  
OO.PP.

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Pietro Viviano Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia	Nota di Incarico	D. C. n. 244 del 03/04/2013	Supporto al RUP		Nota di Incarico
Progettista	Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia	Nota di Incarico	prot. N. 2959 del 20/12/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico
Geologo		Nota di Incarico				
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI				Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO  
DELL'ARTE

Il Commissario, con nota prot. n. 2728 del 05/12/2011, ha comunicato al Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria - Ufficio IV - l'avvenuto inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo del maggio 2011, invitandolo a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni.  
 Il Provveditorato - ufficio IV OO.MM per la Sicilia, con nota assunta al prot. n.2926 del 20.12.2011, ha confermato la propria disponibilità a redigere la progettazione dell'intervento.  
 Il Commissario, con nota prot. n. 3299 del 03/09/2012, stante la mancata ricezione del progetto esecutivo, ne sollecita la trasmissione al Provveditorato che vi ottempera con nota 3683 del 25/09/2012, proponendone l'affidamento allo IAMC-CNR di Capo Granitola.  
 Conseguentemente il Provveditorato, con nota prt. 4919/UC del 23/11/12, ha trasmesso lo schema di convenzione aggiornato con IAMC-CNR di Capo Granitola per le indagini preliminari, attendendo la necessaria autorizzazione alla sottoscrizione.  
 Con nota acquisita agli atti al prot. n. 580 del 29/01/2013 il Dott. Giorgio Tranchida dell'IAMC ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il piano di caratterizzazione dell'area del Porto Canale di Mazara del Vallo.  
 A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti i pareri relativi al piano di Caratterizzazione ambientale propedeutico ai lavori da effettuare nell'ambito dell'intervento TP 189 "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale", ad eccezione del parere dell'ISPRA.  
 In data 07/10/2013 avranno inizio i lavori per il campionamento di sedimenti all'interno dell'area portuale di Mazara del Vallo

SAL

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN  
CORSO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



TP190	San Vito Lo Capo	Consolidamento del tratto di costa						Importo ApQ	€ 1.350.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		
<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM	INVITALIA							
<b>Figure Tecniche</b>									
RUP			Incarico conferito tramite:		Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:		
Progettista	INVITALIA		Incarico conferito tramite:	prot. n. 3260/UC del 04/06/2013	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	CGIAM		Incarico conferito tramite:	nota n.3339 del 05/09/2012			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori			Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:						
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI				Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	
STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2372 l'ARTA ha comunicato al Comune di San Vito Lo Capo che l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento, invitandolo a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Data l'impossibilità dell'UTC a redigere il progetto esecutivo, il Commissario, con nota prot.n. 3015 del 02.08.2012, ha portato a conoscenza l'Ente che sarà la struttura commissariale a redigere il progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, inserendo l'intervento - TP 190 B S. Vito Lo Capo e, quindi, incaricando gli stessi per la redazione dello studio geologico.</p> <p>Con nota prot. n. 3260 del 04/06/2013 si incarica la Società Invitalia per la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento.</p>					SAL	PROGETTAZIONE IN CORSO		

Dott. Maurizio Croce



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO/DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA

EN042	Centuripe	Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario						Importo ApQ	€ 770.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 692 del 12/12/2012	Importo Finanziato	€ 770.000,00	Decreto di impegno	Decreto n. 542 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 598.087,00		
		TOTALE FINANZIATO				TOTALE IMPEGNATO	€ 598.087,00		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	
<b>Figure Tecniche</b>									
RUP	Geom. Salvatore Di Benedetto	Decreto di Nomina	D.C. n. 385 del 24/07/2012	Supporto al RUP	Ing. Mario Giuseppe Palazzolo	Decreto di Nomina	D.C. n. 385 del 24/07/2012		
Progettista	COMUNE	Ing. Claudio Faranna	Incarico conferito tramite:	determina sindacale n. 08 del 12/02/2009	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Giancarlo Campagna	Incarico conferito tramite:	determina sindacale n. 10 del 25/02/2009	
Geologo			Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Claudio Faranna	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 232 del 27/03/2013	Assistente al DL			Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Claudio Faranna	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 232 del 27/03/2013						
Collaudatore Statico	Ing. Ugo Maria Alongi	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n. 3253 del 04/06/2013	Collaudatore Tecnico amministrativa			Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	C.S. COSTRUZIONI S.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	n. 263 del 08/04/2013	data contratto	
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	24/05/2013	data presunta di termine lavori	
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune di Centuripe a libero professionista esterno.          Con nota acquisita al prot. n. 1438 del 26/04/2012, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo.          A seguito della Cds del 26/09/2012 il Commissario, con nota prot.n. 3937 del 09/10/2012, ha invitato il RUP a porre in essere le attività necessarie all'approvazione del progetto, propedeutiche all'emissione del Decreto di Finanziamento.          Con nota 4881 del 22/11/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione delle verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente.          Con Decreto Commissariale n. 692 del 12/12/2012 è stato finanziato l'intervento.          A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 263 del 08/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa C.S. COSTRUZIONI S.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,0897 %.          In data 24/05/2013 è avvenuta la consegna dei lavori e l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro 181 giorni naturali e consecutivi, quindi entro il 20/11/2013.          Con Decreto Commissariale n. 542 del 10/07/2013 si impegnano le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 598.087,00.          Con nota prot. n.6668 del 07/11/2013 l' Impresa C.S. Costruzioni srl comunica che in data 06 novembre 2013 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.</p>						SAL	LAVORI ULTIMATI	

Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

EN044	Gagliano Castelferrato	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga						Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
Decreto di finanziamento indagini preliminari	n. 98 del 21/06/2011	Importo Finanziato	€ 22.300,26	Decreto di Impegno indagini preliminari	n. 141 del 21/07/2011	Importo dell'impegno	€ 16.348,31		
Decreto di finanziamento indagini preliminari integrative	n. 314 del 11/11/2012	Importo Finanziato	€ 47.950,86	Decreto di Impegno e pagamento indagini preliminari integrative	n. 207 del 10/05/2012	Importo dell'impegno	€ 34.736,30		
				Decreto di disimpegno somme	n. 567 del 31/10/2012	Importo del disimpegno	€ 1.094,63		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 70.251,12</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 49.989,98</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

CONVENZIONI INVITALIA


## Figure Tecniche

RUP	Geom. Michele Corrente	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 90 del 14.6.2011	Supporto al RUP	Arch. Diego Mammo Zagarella	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 90 del 14.6.2011		
Progettista	INVITALIA	Zumbè © Coroneo Imbroglia Grassi	Nota di incarico	prot. N. 647 del 09/03/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	INVITALIA	Zumbè © Coroneo Imbroglia Grassi	Nota di incarico	prot. N. 647 del 09/03/2011
Geologo			Nota di incarico						
Direttore Lavori			Nota di incarico		Assistente al DL			Nota di incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Nota di incarico						
Collaudatore Statico			Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	GIA EXPLORING SAS GEOMERID SRL	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto 141 del 22 lug 2011 Decreto 361 del 2 dicembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	26/07/2011 5/12/2011	data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA  
ITALIANAREGIONE  
SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

EN044	Gagliano Castelferrato	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga	Importo ApQ.	€ 800.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione dell'intervento è stata affidata ad INVITALIA S.p.A.            A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 141 del 22/07/2011 è stata disposta l'Aggiudicazione Definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione.            A seguito sia della consegna delle risultanze delle indagini geognostiche che dei successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati della progettazione e dalle osservazioni formulate dal geologo, l'area di intervento è risultata essere notevolmente più estesa rispetto a quanto previsto dal PAI in prima istanza.            Alla luce delle criticità emerse, con nota del Commissario n. 2440 del 09/11/2011, sono state autorizzate ulteriori indagini preliminari integrative delle precedenti, affidate a seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 361 del 02/12/2011.            Il Progetto esecutivo è stato trasmesso da INVITALIA con nota acquisita al prot. n. 779 del 09/03/2012. In sede di Conferenza dei Servizi del 19/03/2012, in cui sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati, è emerso che gli importi stimati nel progetto esecutivo risultano superiori a quelli contenuti nell'Accordo di Programma. La problematica è stata discussa in sede di Comitato del 18/05/2012 che si è riservato di valutarla nella futura programmazione.            A seguito delle determinazioni del Comitato potranno essere avviate le procedure di gara.            Il Comune ha trasmesso alla struttura commissariale la nota prot. n. 42660 del 19/07/2012 dell'ARTA Serv. 3 con cui è stata comunicata la modifica del Piano Straalcio del PAI relativo ai dissesti di C.da Fontanelle-Urga portando il grado di pericolosità da P0 a P3. La struttura Commissariale, con nota prot. n. 3067 del 07.08.12, a trasmesso quanto sopra al Comitato di Indirizzo e Controllo del Ministero.            Al fine di risolvere le problematiche relative all'intervento, gli uffici dell'ARTA Serv. 3, hanno invitato il Comune, il DRPC e l'ufficio del Commissario a partecipare alla riunione di giorno 08/10/2013 presso i propri uffici.</p>	<p>SAL</p>	<p>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</p> 	




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



EN047	Regalbuto		Opere di consolidamento del centro abitato					Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	A seguito del comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n.30 del 16/01/2013	Importo Finanziato	€ 1.453.710,54	Decreto di Impegno	Decreto n. 771 del 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.097.217,01		
				Decreto di Impegno e pagamento spese di pubblicazione quotidiani	Decreto n. 401 del 05/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.539,12		
				Decreto di Impegno e pagamento GURI	Decreto n. 317 del 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.021,04		
				Decreto di Impegno e pagamento commissione gara	n. 571 del 16/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.486,56		
				Decreto di Impegno e pagamento AVCP	n. 572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.453.710,54</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.101.638,73</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00
<b>Figure Tecniche</b>									
RUP	Arch. Vito Palazzolo (Responsabile area tecnica)	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 355 del 17/07/2012	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 355 del 17/07/2012		
Progettista	COMUNE Ing. Giglio Ignazio Geom. Arnone Giuseppe	Determina di incarico	Delibera di Giunta Municipale n.224 del 09 maggio 1988	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Giglio Ignazio e Geom. Arnone Giuseppe	Determina di incarico	Delibera di Giunta Municipale n.224 del 09 maggio 1988		
Geologo	Geologi Alberto Unti e La Spina Giuseppe	Determina di incarico	Delibera di Giunta Municipale n.224 del 09 maggio 1988 Delibera G.C. n.94 del 24/05/2012 revoca incarico Dott. Geol. Alberto Unti	Geotecnico	Geologi Alberto Unti e La Spina Giuseppe e Ing. Giglio Ignazio	Determina di incarico	Delibera di Giunta Municipale n.224 del 09 maggio 1988 Delibera G.C. n.94 del 24/05/2012 revoca incarico Dott. Geol. Alberto Unti		
Direttore Lavori	Ing. Giglio Ignazio Pio Aldo	Decreto di incarico	Decreto n. 484 del 27/06/2013	Assistente al DL		Nota di incarico			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Giuseppe Arnone	Decreto di incarico	Decreto n. 484 del 27/06/2013						
Collaudatore Statico		Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico			
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -CCC Societa' Cooperativa	Decreto Affidamento Lavori	n. 262 del 08/04/2013	data contratto		
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività		data presunta di termine lavori		



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

EN047	Regalbuto	Opere di consolidamento del centro abitato	Importo ApQ	€ 1.500.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale di Regalbuto (EN).</p> <p>A seguito di richiesta del Commissario, in data 7/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni per la definizione delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina, prevedendo l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.</p> <p>Con Decreto Commissariale del 01/08/2012 è stato acquisito il progetto dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3361 del 07/09/2012, il gruppo di progettazione ha trasmesso gli elaborati integrativi redatti in aderenza alle prescrizioni richieste dall'ANAS in sede di CdS del 24/08/2012.</p> <p>Il Comune con nota prot. n. 4940 del 26/11/2012 ha trasmesso il Verbale di Verifica e Validazione dell'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 30 del 16/01/2013 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 262 del 08/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Società Cooperativa che ha offerto un ribasso pari al 32,1923 %.</p> <p>Il Commissario con nota prot. n. 5558 del 17/09/2013 chiede al comune di indicare un nominativo di un tecnico interno al proprio UTC a cui potere affidare l'incarico di responsabile per le procedure espropriative.</p> <p>Con Decreto n. 771 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento. Relativamente alle procedure espropriative è stato redatto dalla struttura commissariale il decreto di occupazione temporanea d'urgenza ed è stata conseguenzialmente effettuata la consegna dei lavori.</p>	SAL	INIZIO DEI LAVORI  	



Dott. Maurizio Croce



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



EN175	Barrafranca	Mitigazione rischio idrogeologico (zona a monte dell'intervento già finanziato con Accordo di Programma del 30 marzo 2010)					Importo ApQ	€	1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 MAR 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	352 - 5/12/2011	Importo Finanziato	€ 1.500.000,00	Decreto di Impegno	245 - 28/05/2012	Importo dell'impegno	€ 1.208.482,15		
				Decreto di Impegno Pubblicazione GURI	Decreto Commissariale n. 19 del 18/01/2012	Importo dell'impegno	€ 1.188,78		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	Decreto Commissariale n. 95 del 07/03/2012	Importo dell'impegno	€ 600,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.210.270,93</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		€ 0,00

## Figure Tecniche

RUP	Arch. Francesco Costa	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 335 del 28.11.2011	Supporto al RUP	geom Nicollicchia e geom Ferrante	Nota di incarico	Decreto n. 31 del 23 gennaio 2012
Progettista	COMUNE Arch. Salvatore La Terra	Nota di incarico	Determina Sindacale n. 4 del 29/01/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Comune	Nota di incarico	
Geologo	Dott. Geol. Salvatore Palillo	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 7 del 01/02/2010			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Arch. Salvatore La Terra	Nota di incarico	Decreto n. 45 del 01 febbraio 2012	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Salvatore La Terra	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 45 del 01 febbraio 2012				
Collaudatore Statico	Ing. Clemente Francesco	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 218 del 14/05/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Clemente Francesco	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 218 del 14/05/2012

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.L.P. Srl	Decreto Affidamento Lavori	n. 10 del 16 gennaio 2012	data contratto	26/01/2012
Contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	23/03/2012	data presunta di termine lavori	15/03/2013

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione degli interventi è stata affidata dal Comune di Barrafranca a tecnici professionisti esterni. Con nota acquisita al prot. n. 425 del 05/04/2011, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.930.000,00 e quindi per un importo superiore a quanto stanziato dall'APQ (€ 1.500.000,00).</p> <p>Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 743 del 25/05/2011, uno stralcio funzionale esecutivo di importo pari a quello dell'Accordo di Programma, che però risulta redatto ai sensi di normativa obsoleta, così come evidenziato dal Commissario con nota prot. 1436 del 05/08/2011. Il progetto esecutivo, rimodulato ai sensi della vigente normativa, è stato trasmesso dal Comune, con nota acquisita al prot. n. 2117 del 18/10/2011, e finanziato dal Commissario con Decreto n. 352 del 05/12/2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 10 del 16/01/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, della durata di 357 giorni naturali e consecutivi, avviati in data 23/03/2012.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1977 del 04/06/2012, il D.L. comunica che in data 22/05/2012 sono stati sospesi i lavori.</p> <p>In riscontro alla nota prot. n. 3107 del 09/08/2012 in cui il Commissario chiede di notificare in merito allo stato di avanzamento dell'intervento, il RUP ha sollecitato, con nota acquisita al prot. n. 3180 del 23/08/2012, la DL a produrre apposita perizia di variante al fine di consentire la ripresa dei lavori.</p> <p>In data 17/10/2012 il DL, con nota assunta al prot. n. 4135 in pari data, ha trasmesso la Perizia di Variante in corso d'opera del 1° Stralcio Funzionale</p> <p>In data 11/12/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, in cui sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva.</p> <p>Il Comune con nota prot. n. 1014 del 18/02/2013 trasmette il parere tecnico n. 1 del 07/02/2013 di approvazione della perizia di variante già anticipato via email.</p> <p>In data 26/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei Lavori.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	--	-----	----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CL017	Butera	Consolidamento centro abitato					Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	—	Importo Finanziato	-	Decreto di Impegno	—	Importo dell'impegno		
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Geom. Filippo Trainiti	Incarico conferito tramite:	Supporto al RUP	Incarico conferito tramite:
Progettista	Comune	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:
Geologo		Incarico conferito tramite:		Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:		Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:	Collaudatore Tecnico amministrativa	Incarico conferito tramite:

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2364 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3086 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto corredato della documentazione amministrativa.</p> <p>Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, a seguito della documentazione integrativa richiesta, ha trasmesso in data 17 ottobre 2013 il parere di coerenza al PAI favorevole con prescrizioni.</p>	SAL	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	-----	------------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

Cl018		Butera		Opere di consolidamento pendici del centro storico				Importo AqQ
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno	€ 800.000,00	
							€ 800.000,00	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	
<b>Figure Tecniche</b>								
RUP		Incarico conferito tramite:		Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:		
Progettista	Comune	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:		
Collaboratore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaboratore tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività		
STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2365 del 27/06/12, l'ARTIA Serv.3 comunica al Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3085 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto, corredato della documentazione amministrativa.</p> <p>Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi sul progetto generale preliminare di giorno 10/07/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari.</p>						<p>ACQUISTI PARERI PROGETTAZIONE</p> <p>SAL</p>	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CL019	Caltanissetta	<b>Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della collina Sant'Anna, centro storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato</b>			Importo AdQ	€ 4.160.000,00	Importo Rimodulato	
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 MAR 2011		note:	
Decreto di finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di impegno		importo dell'impegno		eventuali economie

**CONVENZIONI**

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Armando Amico Dirigente dell'UTC	Incarico conferito tramite	D.C. n. 556 del 24/10/2012	Supporto al RUP Progettista	Geom. Nicola Giovanni Buffone (UTC Caltanissetta) Ing. E. Garito (UTC Caltanissetta)	Incarico conferito tramite Nota di Incarico	D.C. n. 556 del 24/10/2012
Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico	
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Collaudatore Statico		Nota di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari	Decreto di			Decreto Affidamento		data contratto	
controllo	data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è affidata al Comune.</p> <p>In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 marzo 2011, l'intervento transita all'ARTA (B).</p> <p>Durante la riunione del 07/05/2012, si forniscono indicazioni al Comune in merito ad alcuni adeguamenti del progetto.</p> <p>L'ARTA, con nota acquisita al prot. n.1939 del 31/05/2012, trasmette al Commissario, individuato come Ente Beneficiario, tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento.</p> <p>Con note prot. n. 1258 del 13/06/2012 e n.2334 del 26/06/2012, il Commissario sollecita il Comune alla trasmissione degli elaborati progettuali, adeguati alle richieste di cui alla riunione del 07/05/12.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2873 del 25/07/2012, trasmette il progetto stralcio funzionale dell'intervento di importo pari a quanto previsto dall'Adp.</p> <p>Il progetto generale è trasmesso dal Comune, sia all'ARTA (Serv. 1) che all'Ufficio del Commissario (acquisito al prot. n.2997 del 02/08/2012).</p> <p>Il RUP, in data 19/09/2012, trasmette all'Ufficio del Commissario copia dell'estratto della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 35 del 31.08.2012 della verifica di assoggettabilità a V.I.A.</p> <p>A seguito della CdS del 07/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari relativi al progetto generale, ad eccezione del parere dell'ARTA Serv.3, che si riserva di produrre entro 7gg il parere su problematiche attinenti il concetto di pericolosità geologica per cause profonde, per il quale si rende necessario uno studio investigativo e di monitoraggio.</p> <p>In data 14/11/2012, con nota prot.n. 4696, l'Arta (Serv. 3) esprime parere favorevole, con prescrizioni, di coerenza al PAI.</p> <p>Il Comune con nota prot. n. 4970 del 27/11/2012 trasmette il progetto di 1° stralcio esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri ad eccezione del parere ARTA Serv.3 che ha richiesto le integrazioni al progetto stralcio esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni per l'emissione del parere di competenza.</p> <p>Il Comune con nota prot. n. 1340 del 04/03/2013 trasmette gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS e in data 13/03/2013 con nota prot. n. 1571 l'ARTA Serv. 3 trasmette il parere favorevole di coerenza al PAI.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	--	-----	--------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CL020	Serradifalco	<b>Progetto per lo studio ed il monitoraggio dell'area a rischio "R4" interessata da cavità sotterranee e perimetrata con il dissesto 063-2SR-082 nel comune di Serradifalco (CL)</b>				Importo AdQ	€ 1.700.000,00	Importo Rimodulato	€ 0,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011		note:	INTERVENTO REVOCATO	
Decreto di finanziamento		Importo Finanziato	-	Decreto di impegno		Importo dell'impegno	-	eventuali economie	

**CONVENZIONI** INVITALIA

RUP	Arch. Giampiero Di Magro	Nota di Incarico	D.C. n. 299 del 27.06.2012	Supporto al RUP	-	Nota di Incarico	
				Progettista	INVITALIA	Ing. Gianluca Coroneo Arch. Fabio Pulizzi Ing. Alberto Peligra Dott. Geol. Gianluca Sabatini.	prot. n. 1829 del 21/09/2011
Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico	
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DI		Nota di Incarico	
Collaudatore Statico		Nota di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Nel corso della riunione del 15/09/2011 il Comitato, su proposta del Commissario, dispone la revoca del finanziamento e contestualmente incarica il Commissario della predisposizione di un piano di monitoraggio, da sottoporre all'ARTA per il relativo finanziamento a gravare sulla linea 2.3.1,3 PO FERS 2007-2013. Il Comitato si riserva la possibilità di rivalutare il progetto a seguito dell'avvenuto monitoraggio.</p> <p>Il Commissario, con nota prot 1829 del 21 set 2011, incarica INVITALIA della redazione e realizzazione del piano di monitoraggio dell'area R4 ricadente nel centro abitato del Comune di Serradifalco.</p> <p>Con nota prot n. 2360 del 27/06/2012 il Commissario affida le attività di consulenza geologica necessaria all'attività di progettazione dello studio e monitoraggio dell'intervento ad un funzionario della Struttura.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot.n.2782 del 18/07/2012, IAP trasmette gli elaborati progettuali per lo "STUDIO ED IL MONITORAGGIO DELL'AREA A RISCHIO "R4" INTERESSATA DA CAVITA' SOTTERRANEE E PERIMETRATA CON IL CODICE DI DISSESTO PAI 063-2SR-082 NEL COMUNE DI SERRADIFALCO", trasmessi dal Commissario all'ARTA Serv.3 con nota prot. n. 2807 del 20/07/2012</p>				SAL	INTERVENTO REVOCATO
-----------------	---	--	--	--	-----	---------------------

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

AG001	Agrigento	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato						Importo ApQ	€	2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011		note: Nel Corso del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita alla lettera A per un importo pari a € 1.520.000 Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento passa sotto la copertura finanziaria del Ministero per l'intero importo (trasferiti anche i restanti 480.000)	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di impegno	n. 576 del 17/07/2013	Importo dell'impegno	€	534.077,76		
Decreto di Finanziamento Indagini	n.394 del 21/12/2011	Importo Finanziato	€	55.840,00	Decreto di Impegno e Pagamento Indagini preliminari	n. 446 del 06/09/2012	Importo dell'impegno	€	44.070,45	
Decreto di Finanziamento Lavori di somma urgenza	n. 639 del 22/11/2012	Importo Finanziato	€	683.300,00	Decreto di impegno pagamento AVCP	n. 202 del 19/03/2013	Importo dell'impegno	€	225,00	
				Decreto di impegno pagamento commissione di Gara	n.213 del 25/03/2013	Importo dell'impegno	€	740,47		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€</b>	<b>738.140,00</b>		<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€</b>	<b>579.113,68</b>		
									Economie da finanziamento	
									Eventuali Economie da ribasso	

## CONVENZIONI

GC

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC AG)	Nota di Incarico	n.1344/JC del 01/08/2011	Supporto al RUP	Geom. Francesco Mirabelli				
Progettista	GC AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Genio Civile AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011		
Geologo	Genio Civile AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011	RUP Espropri.	Avv. Antonio Insalaco (Comune Ag) con il supporto dell' Arch. Elvira Quintini (Comune Ag)	Decreto di Nomina	D.C. n. 887 del 21/10/2013		
Direttore Lavori	Genio Civile AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011	Assistente al DL		Nota di Incarico			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Genio Civile AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011						
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Forte	Incarico conferito:	D. C. n. 156 del 06/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico			
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID Srl	Determina di affidamento INDAGINI	Determina del 02/12/2011	AFFIDATARIA Esecuzione Lavori	CO.GE.MA.IA. S.r.l. (Lavori di estrema urgenza)	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 680 del 10/12/2012	data contratto	11/12/2012
contratto		data conclusione lavori	03/06/2012			verbale inizio attività	12/12/2012	data termine lavori	08/08/2013

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OFCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

AG001	Agrigento	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	Importo ApQ € 2.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Agrigento il quale, a seguito di gara del 25/11/ 2011, ha affidato i lavori relativi alle indagini preliminari, finanziate con Decreto Commissariale n. 394 del 21/12/2011 e ad oggi conclusi.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1455 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di approfondimenti a ridosso del marciapiede in Via Empedocle (Area di progetto), in corrispondenza dell'antica chiesa di S. Lucia, ha richiesto un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e pianificare gli interventi da realizzare.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag ha comunicato all'Ufficio del Commissario che, a seguito del violento nubifragio del 24/10/2012, è stato necessario rivedere la scelta progettuale, nonché adeguarla alla nuova situazione determinatasi.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4622 del 09/11/2012, il GC ha trasmesso copia del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei Lavori di somma urgenza.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri a favore della CO.GE.MA.LA. S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 29,8866%.</p> <p>Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012.</p> <p>In data 12/12/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che dovranno concludersi in giorni 150 naturali e consecutivi pertanto l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 07/05/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 243 del 03/04/2013 è stata impegnata la somma di € 511.376,29</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2532 del 03/05/2013 il D.L. propone una proroga di giorni 28 naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 04/06/2013.</p> <p>Il GC di Agrigento con nota prot. n. 4279 del 16/07/2013 trasmette la relazione a struttura ultimata redatta ai sensi dell'art. 6 della Legge 1086/71.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 si procede alla presa d'atto della PVS e rimodulazione impegno somme.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>AG004</b>	<b>Cattolica Eraclea</b>	<b>Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa</b>					Importo ApQ	<b>€ 1.480.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010	note:	A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21/10/2010 l'intervento transita in B.	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato	-	Decreto di impegno	-	Importo dell'impegno	-	
Decreto di finanziamento acquisizione progettazione	n. 231 del 27/03/2013	Importo Finanziato	€ 87.365,51					Economie da finanziamento
								Eventuali Economie da ribasso
<b>CONVENZIONI</b>		GC						

Figure Tecniche							
RUP	Arch. Caterina Stampone GC Ag	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 482 del 26/06/2013	Supporto al RUP	Geom. Francesco Mirabelli GC Ag	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013
RUP	Ing. Lorenzo Calamo GC Ag	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013				
Progettista	Esterna	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:		Collaboratore amministrativo	Signora Croce Rita Di Caro GC Ag	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2373 del 22/06/2012, L'ARTA Serv. 3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente Beneficiario del finanziamento relativo all'intervento.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012, L'ARTA Serv. 3 ha trasmesso due copie del progetto e la relativa documentazione amministrativa inviata dal Comune.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 è stato nominato l' Ing. Lorenzo Calamo RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Croce Rita di Caro Collaboratore Amm.vo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 231 del 27/03/2013 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall'Ing. Ing. Attilio Santini e dal Dott. Geol. Matteo Vento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6723 del 08/11/2013 il RUP ha trasmesso l'elenco degli Enti preposti a salvaguardia dei vincoli insistenti sull'area di intervento, e pertanto questa struttura si accinge ad indire la conferenza dei servizi.</p>	 SAL	<b>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</b>
------------------------	---	--	---





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




AG006	Favara	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis					Importo ApQ	€	1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n.175 del 18/04/2012	Importo Finanziato	€ 1.500.000,00	Decreto di Impegno	n. 581 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.192.811,88		
				Decreto di Impegno pubblicazione GURI	n. 271 del 11/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 937,17		
				Decreto di Impegno e Pagamento Componenti Commissione di Gara	n.335 del 11/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 410,58		
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazioni esito quotidiani	n. 403 del 02/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.268,75		
				Decreto di impegno e pagamento AVCP	n.577 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.196.803,38</b>		
							Economie da finanziamento	€ -	
							Eventuali Economie da ribasso		

CONVENZIONI	GC							
-------------	----	--	--	--	--	--	--	--

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC Ag)	Nota di Incarico	n. 369/UC del 12/10/2010	Supporto al RUP				
Progettista	GC Ag	Nota di Incarico	n. 369/UC del 12/10/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Genio Civile	Nota di Incarico	n. 369/UC del 12/10/2010	
Geologo	Genio Civile	Nota di Incarico	n. 369/UC del 12/10/2010	RUP Espropri	Ing. Alberto Avenia (Dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Favara)	Decreto di Incarico	D.C. n.283 del 19/10/2011	
Direttore Lavori	Genio Civile	Nota di Incarico	n.369 del 12/10/2010	Tecnico per procedure catastali di frazionamento	Geom. Atanasio Piritore	Nota di Incarico	D.C. n. 724 del 11/09/2013	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Genio Civile	Nota di Incarico	n.369 del 12/10/2010					
Collaudatore Statico	Ing. Pietro Agnello	Decreto di Incarico	D.C. n. 568 del 31/10/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Pietro Agnello	Decreto di Incarico	D.C. n. 568 del 31/10/2012	
INDAGINI preliminari affidate a:	IMGA s.a.s	Nota di affidamento INDAGINI	n.3411 del 21/02/2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.	Decreto Affidamento Lavori	n. 251 del 30/05/2012	data contratto 03/07/2012
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	21-ago	data di termine lavori 04/10/2013

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Genio Civile di AG che, con nota acquisita al prot. n. 2000 del 5/10/2011, ha trasmesso il Progetto Definitivo dell'intervento.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 10/02/2012 sono stati acquisiti i pareri necessari per l'approvazione del progetto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1112 del 03/04/2012, il GC di Ag ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 si è provveduto a finanziare l'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 251 del 30/05/2012 si sono aggiudicati definitivamente i lavori a favore della BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2050 del 07/06/2012, il GC di Ag ha comunicato che in data 06/06/2012 sono stati redatti il verbale di immissione in possesso delle aree da espropriare nonché il verbale sulle verifiche per l'immediata esecuzione dei lavori.</p> <p>In data 03/07/2012 è stato stipulato il contratto con l'impresa Bollita Costruzioni Soc. Coop.</p> <p>In data 21/08/2012 sono stati consegnati i lavori, che dovranno concludersi entro il 21/08/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 732 del 20/12/2012 è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 e del SAL n. 2 alla</p>	SAL	 LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	-----	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>AG007</b>	<b>Lucca Sicula</b>	<b>Opere di consolidamento centro urbano</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.500.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 461,24	Decreto di Impegno Attività di RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 461,24		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

<b>Figure Tecniche</b>							
RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto di Incarico	D.C. n. 29 del 23-02-2011	Supporto al RUP	Geom. Ferrante Geom. Nicollicchia Dott. Barranco	Decreto di Incarico	D.C. n. 29 del 23-02-2011
Progettista	Comune Geom. Silvestre Giarratano (resp UTC)	Determinazione del Sindaco	n. 11 del 31/08/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di Incarico	
Geologo	Dott. Domenico Palumbo Piccionello	Determinazione Dirigenziale	n.94 del 01/09/2011	Geotecnico	Ing. Michele Buscarnera	Determinazione Dirigenziale	n.95 del 01/09/2011
RUP Espropri	Geom. Silvestre Giarratano (Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lucca Sicula)	Decreto di nomina	D.C. n. 341 del 28 novembre 2011				
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La Progettazione è stata affidata al Comune di Lucca Sicula.</p> <p>Con Decreto Commissariale n.34 del 28/11/2011 è stato nominato RUP per le procedure espropriative il Dirigente dell'UTC del Comune di Lucca Sicula. Ad oggi sono in corso le procedure di esproprio e la determinazione dell'indennità di Espropriazione per la definizione della quale il Comune, con nota prot. n. 169 del 12/01/2012, acquisita al prot. n. 101 del 17/01/2012, ha richiesto alla Commissione per la Determinazione dell'indennità di Espropriazione il parere ai sensi dell'art. 41 DPR 327/2011, già pervenuto al Comune di Lucca Sicula.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 286 del 16/01/2013 il progettista, geom. Silvestre Giarratano, trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS del 30/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1328 del 04/03/2013 il Geom. Silvestre Giarratano, responsabile delle procedure espropriative, trasmette copia delle comunicazioni di avvio del procedimento, per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle ditte presenti nel piano partecellare di esproprio.</p>	SAL	<b>ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE</b>
------------------------	--	-----	---------------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



AG010	Ribera	Completamento consolidamento centro abitato secca grande						Importo ApQ	€	2.600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:		Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 870 del 18/10/2013	Importo Finanziato	€ 2.467.663,33	Decreto di Impegno			Importo dell'Impegno			
Decreto di Acquisizione progettazione definitiva ed esecutiva	n. 350 del 11/07/2012	Importo Finanziato	€ 130.119,12							
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 806,16	Decreto di Impegno Attività di RUP	n. 326 del 08/05/2013		Importo dell'Impegno	€ 806,16		
				Decreto di Impegno pagamento spese pubblicazione GURI	n.903 del 28/10/2013		Importo dell'Impegno	€ 2.145,65		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 2.598.588,61</b>				<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 2.951,81</b>		
									Economie da finanziamento	
									Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche


RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013	Supporto al RUP	Arch. Giovanni Piero Di Magro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013
	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.453 del 11/09/2012	Supporto al RUP	Ing. Rossella Zumbè	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 354 del 17/07/2012
Progettista	Ing. M.Vella Arch. L. Foderà (Arch. Antonuccio: Delibera di G.M. n.152 del 25/05/2012 presa d'atto della sopravvenuta mancanza di partecipazione alla progettazione esecutiva)	Delibera di Incarico	G.M. n°332 del 06.06.1989 e successiva Delibera di G.M. n°158 del 29.08.1996;	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Maurizio Vella	Delibera di Incarico	G.M. n°332 del 06.06.1989 e successiva Delibera di G.M. n°158 del 29.08.1996;
Geologo		Determina di Incarico					
Direttore Lavori		Delibera di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Maurizio Vella	Delibera di Incarico	G.M. n°332 del 06.06.1989 e successiva Delibera di G.M. n°158 del 29.08.1996;				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

REGIONE  
SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art. 1

REPUBBLICA  
ITALIANA

AG010	Ribera	Completamento consolidamento centro abitato secca grande	Importo ApQ. €	2.600.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale di Ribera.</p> <p>A seguito di richiesta del Commissario, in data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha dato indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.</p> <p>A seguito di vari incontri e colloqui, con Decreto Commissariale n. 350 del 11/07/2012 è stata effettuata l'acquisizione del progetto dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.</p> <p>Il progetto è stato trasmesso dai progettisti ed acquisito agli atti al prot. n. 2903 del 27/07/2012</p> <p>A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe La Plata e del Supporto Ing. Rossella Zumbè, con Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 è stato nominato il Geom. Giuseppe Ferrante RUP dell'intervento, con il Supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro.</p> <p>Con nota prot. n. 5236 del 05/09/2013 il Commissario comunica i nominativi del gruppo di verifica del progetto esecutivo.</p> <p>Il RUP geom. Giuseppe Ferrante con nota prot. n. 5841 del 30/09/2013 trasmette la documentazione inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 è stato finanziato l'intervento. In data 22 ottobre 2013 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 888 del 22/10/2013 è stato approvato il bando e disciplinare di gara.</p>	<p>SAL</p>	<p>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</p> 	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



AG011	Ribera	Opere di consolidamento centro urbano						Importo ApQ	€ 939.021,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n.33 - 8/3/2011	Importo Finanziato	€ 939.021,00	Decreto rimodulazione Impegno	n.183 del 12/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 640.129,86		
				Decreto di Impegno	n.13 del 17/01/2012	Importo dell'Impegno	€ 771.049,00		
				Decreto di Impegno spese pubblicazione GURI	n.240 del 22/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.042,01		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	n.312 del 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
				Decreto di Impegno	n.280 del 14/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 640.129,86		
				Decreto di Disimpegno	n. 280 del 14/06/2013	Importo Disimpegnato	€ 625.900,81		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 939.021,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 786.695,06</b>		
								Economie da finanziamento	€ 0,00
								Eventuali Economie da ribasso	


## CONVENZIONI


## Figure Tecniche

RUP	Arch. Gesua Palumbo (a seguito revoca dell'Ing. Cimino)	Nota di incarico	n. 39459 del 9 settembre 2010 del Dirigente Generale del DRPC	Supporto al RUP	Collaboratore amministrativo al RUP Coll. "B" Giovanna Chianetta	Nota di incarico	n.13292 del 29/03/2011
	Ing. Maurizio Cimino	Nota di incarico	n. 5591 del 07 settembre 2008 del Dirigente Generale del DRPC				
Progettista	DRPC Ag	Nota di incarico	314/UC del 29/09/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	DRPC Ag	Nota di incarico	314/UC del 29/09/2010
Geologo		Determina di Incarico					
Direttore Lavori	Ing. Carmelo Arcieri DRPC	Nota di Incarico	n. 171/UC del 23/02/2011 n. 13292 del 29/03/2011	Assistente al DL	Direttore di Cantiere e Coontabile: Geom Diego Sberna Direttore Operativo e Contabile: Geom. Emanuele Milio	Nota di Incarico	n. 13292 del 29/03/2011
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Davide Di Piazza DRPC	Nota di Incarico	n. 171/UC del 23/02/2011 n. 13292 del 29/03/2011				
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Di Mino	Nota di Incarico	D.C. 395 del 01/08/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Salvatore Di Mino	Nota di Incarico	D.C. 395 del 01/08/2012
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI			C. & P. SRL	Decreto Affidamento Lavori	D.C n. 200 del 03/05/2012	data contratto 26/06/2012
contratto	data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	GATTOPARDO COSTRUZIONI D.C. n. 163 del 11/04 2012 Revoca provvedimento di aggiudicazione	verbale inizio attività	28-giu-12	data ultimazione dei lavori 31-gen-13



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

AG011	Ribera	Opere di consolidamento centro urbano	Importo ApQ	€ 939.021,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di AG. Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 33 del 08/03/2011 e, a seguito delle procedure di gara, la realizzazione dei lavori è stata affidata alla Gattopardo Costruzioni s.r.l., giusto Decreto n.237 del 21/09/2011. I lavori sono stati avviati in data 26/10/2011. Con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione, risoluzione del contratto e la sospensione immediata dei lavori alla Soc. Gattopardo Costruzioni s.r.l., a seguito della nota della Prefettura di Agrigento prot. n. 0013013 del 26/03/2012, acquisita al prot.n. 1192 del 10 /04/2012. Con Decreto Commissariale n. 200 del 03.05.2012 è stata disposta pertanto l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa successiva in graduatoria C&amp;P srl. Con nota prot. n. 32160 del 08/05/2012 acquisita al prot. n. 1570 del 09/05/2012 il DRPC di Agrigento ha trasmesso gli atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e delle scorte a tutto il 27/04/2012. In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto con la C&amp; P Srl. In data 28/06/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che avrebbero dovuto concludersi entro 120 giorni naturali e pertanto entro il 26/10/2012. Il RUP, tenuto conto delle speciali circostanze segnalate dall'impresa C&amp;P Srl, visto il parere del D.L., con nota acquisita agli atti al prot. n. 4612 del 08/11/2012 trasmette la concessione di proroga richiesta di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori. In data 31/01/2013 sono stati ultimati i lavori. Con nota prot. n. 2263 del 16/04/2013 il RUP trasmette al Commissario i certificati di ultimazione lavori e di avvenuta efficacia del certificato di ultimazione lavori.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI 	

REPUBBLICA ITALIANA		REGIONE SICILIANA	
<p>UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO                      "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico                      nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"                      Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1</p>			
<b>Santo Stefano di Quisquina</b>		<b>Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale</b>	
AG014	Lettera ATTUALE	Lettera Originaria (APQ)	Importo ApQ
	B*	A	€ 2.360.195,11
	Decreto di Finanziamento	Importo Finanziato	Importo Rimodulato
		Decreto di Impiego	€ 2.360.195,11
		Eventuali variazioni determinate dal Comitato	
		COMITATO 21 OTT 2010	
		note: A seguito del Comitato di indirizzo e controllo del 21/10/2010 l'intervento transita in B.	
		Importo dell'Impugno	Economie da finanziamento
			Eventuali Economie da ribasso
<b>Figure Tecniche</b>			
RUP	Incarico conferito tramite:	Supporto al RUP	Incarico conferito tramite:
Progettista	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:
Geologo	Incarico conferito tramite:		Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori	Incarico conferito tramite:	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:		Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico	Incarico conferito tramite:	Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	INDAGINI	Decreto Affidamento Lavori
contratto	data conclusione lavori		data contratto
			data presunta di termine lavori
STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2370 del 27/06/2012 l'ARTIA.Serv.3 comunica al Comune di Santo Stefano di Quisquina che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio sopradetto e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3119 del 09.08.2012, trasmette agli Uffici del Commissario tutta la documentazione in suo possesso.</p> <p>Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.</p>		<p>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> <p>SAL</p> 



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




AG015	Sciacca	Opere di consolidamento parete Coda di Volpe					Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011	note: Nel Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento originariamente in A transita in B. Nel Comitato del 24 marzo 2011 l'intervento torna in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno		
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	GC
-------------	----

Figure Tecniche							
RUP		Nota di incarico		Supporto al RUP			
Progettista	GC Ag	Nota di incarico	Nota prot. N. 5455 del 19/12/2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di Incarico	
Geologo	Geologo Emanuele Siracusa	Determina di Incarico	Sindacale n.82 del 11/10/2007				
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti incaricati dal Comune di Sciacca. In sede di Conferenza di Servizi del 12/05/2008, convocata dallo stesso Comune, sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni da parte degli Enti intervenuti. A seguito della revisione del progetto, in adempimento alle prescrizioni formulate in sede di CdS, da parte dei progettisti, il C.S. ha ritenuto opportuno, considerate le notevoli variazioni introdotte, chiedere nuovamente il parere dell'ARTA serv 3.</p> <p>Acquisito il parere dell'ARTA serv 3, al prot 1785 del 19/09/2011, il Commissario ha chiesto al Comune l'adeguamento del progetto alle prescrizioni formulate. Gli elaborati aggiornati e la stesura finale del progetto, sono stati trasmessi dal Comune con note acquisite agli atti con prot. n.460 del 14/02/2012 e con prot. n.1561 del 08/05/2012.</p> <p>A seguito della CdS del 01.08.2012, l'UTC, con nota acquisita al prot. n. 3091 del 08.08.2012, comunica l'impossibilità di rielaborare il progetto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3416/Uc del 11/09/ 2012 il Genio Civile di Agrigento si dichiara disponibile, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione del 10.11.10, a collaborare per la definizione del progetto, così come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 3292 del 03/09/2012</p> <p>Con nota prot. n. 5455 del 19/12/2012, il Commissario autorizza il GC di Ag a procedere celermente alle attività tecniche richieste.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6636 del 05/11/2013 il GC di Ag trasmette il progetto esecutivo. Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS per il giorno 19/11/2013</p>	SAL	<p>PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> 
-----------------	---	-----	---





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




AG174	Cattolica Eraclea	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)					Importo ApQ	€ 1.170.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 MAR 2011	note:	Importo Rimodulato	€ 1.170.000,00
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato	-	Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno	-	
Decreto di Finanziamento Indagini	n. 206 del 21/09/2013	Importo Finanziato	€ 48.189,82	Decreto di Impegno Indagini	n. 713 del 10/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 23.995,13	Economie da finanziamento
		TOTALE FINANZIAMENTI	€ 48.189,82			TOTALE IMPEGNI		
							Eventuali Economie da ribasso	
CONVENZIONI	CGIAM	INVITALIA	GC					

## Figure Tecniche

RUP	Arch. Caterina Stampone	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013	Supporto al RUP	Geom. Francesco Mirabelli	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013
Progettista	INVITALIA Ing. Gianluca Coroneo G; Arch. Fabio Pulizzi; Ing. Rossella Zumbà; Dott. Gianluca Sabatini.	Incarico conferito tramite:	nota prot. n.4263/UC del 23/10/2012,	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:		Collaboratore amministrativo	Signora Carmelina Scifo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO GAV S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 281 del 16/04/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2366 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota prot. n. 2537 del 06/07/2012 di sollecito da parte del Commissario al Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa, l'UTC comunica, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4203 del 19/10/2012, di non essere in condizione di redigerlo, demandandolo al Commissario.</p> <p>Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012, il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, aggiungendo l'intervento AG 174 Cattolica Eraclea B* "Crolli costone roccioso centro abitato - Loc. Zagarella" importo € 1.170.000,00</p> <p>Con nota prot. n. 4279 del 23/10/2012, il Commissario comunica al Comune che, nella qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, procederà alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Con nota prot. n. 4263 del 23/10/2012, il Commissario incarica la Soc. IAP, in base alla convenzione del 18/02/2011, delle attività di progettazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4309 del 24/10/2012 IAP comunica i nominativi del GdL.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 è stato nominato l' Arch. Caterina Stampone RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Carmelina Scifo collaboratore amministrativa. Relativamente alle indagini geognostiche, a seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 281 del 16/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di indagini Preliminari a favore della dell'impresa GEO GAV S.r.l. (ribasso percentuale pari al 51,0001%). In data 13/05/2013 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3880 del 27/06/2013 la GEOGAV ha trasmesso gli elaborati.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5166 del 02/09/2013 la CGIAM trasmette l'approvazione della relazione geologica.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6157 del 11/10/2013, il Gruppo di Progettazione IAP trasmette gli elaborati progettuali.</p> <p>Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS, indetta il giorno 19.11.2013 alle ore 12.00.</p>	SAL	<p>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> 
-----------------	--	-----	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME049	Alcara Li Fusi	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini						Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012		Nel corso del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento passa alla lettera B  Nel corso del Comitato di Indirizzo e note: Controllo del 18/05/2012 l'intervento torna sotto la copertura finanziaria ministeriale (A)	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	392 - 20/12/2011	Importo Finanziato	€ 834.921,87	Decreto di Impegno	366 - 17/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 677.774,45		
				Decreto di Impegno pagamento GURI	30 - 23/01/2012	Importo dell'Impegno	€ 979,11		
Decreto di Finanziamento Indagini Preliminari	80 - 08/06/2011	Importo Finanziato	€ 23.923,43	Decreto di Impegno pagamento AVCP	95 - 07/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
				Decreto di Impegno Indagini Preliminari	104 - 27/06/2011	Importo Impegnato € 16.617,67 poi disimpegnato con Decreto n. 366 del 17/07/2012			
		TOTALE Finanziamenti	€ 858.845,30			TOTALE IMPEGNI	€ 679.128,56		
								Economie da finanziamento	€ 341.154,70
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA

Figure Tecniche

RUP	Ing. Basilio Sanseverino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 77 del 30 mag 2011	Supporto al RUP	Geom Salvatore Bontempo (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 77 del 30 mag 11
Progettista	INVITALIA Ing. Pulizzi, Ing. Grassi, Ing. Zumbè	Incarico conferito tramite:	Notadi incarico prot.n. 253 del 08 marzo 2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Arch. Fabio Pulizzi	Incarico conferito tramite:	decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012	Assistente al DL	Ing. Rossella Zumbè Dott. Geol. Gianluca Sabatini	Incarico conferito tramite:	decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012				
Collaudatore Statico	Ing. Luciano Taranto	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot. 1405 del 24/04/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Luciano Taranto	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot. 1405 del 24/04/2012

INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	104 - 27/06/2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	SA.MA srl	Decreto Affidamento Lavori	aggiudicazione Definitiva Decreto commissariale n. 18 del 18/01/2012	data contratto	01/03/12
contratto	28/06/2011	data conclusione lavori	15/07/2011			verbale inizio attività	13/04/2012	data termine lavori	26/10/2012

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.            A seguito di procedure di gara, con Decreto n.104 del 27.06.2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari ad oggi concluse.            Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2011 e finanziato con Decreto n. 392 del 20.12.2011.            A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 18 del 18/01/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.            La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012.            Con nota acquisita al prot. n. 2888 del 26/07/2012 il Comune ha chiesto di riutilizzare le economie per estendere l'area di intervento.            Con nota acquisita al prot. n. 4215 del 22/10/2012, il D.L. certifica l'ultimazione lavori, avvenuta in data 13/10/2012.            Con nota prot. n. 5266 del 11/12/2012 il D.L. ha trasmesso al Collaudatore amministrativo e statico la relazione a strutture ultimate e tabulato con le prove di carico sui pali di fondazione.</p>						SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	--	--	--	--	--	-----	-----------------

*me*



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME051	Alì Terme	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 900.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note:	Nel Comitato del 24.02.2012 si decide il transito dell'intervento in lettera A  Nel Comitato del 18.05.2012 viene rimodulato l'importo dell'intervento (€ 421.050,50)	Importo Rimodulato	€ 1.321.010,50
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno		Economie da finanziamento Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE DRPC ME	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	DRPC ME						
Geologo	Dott. Geol. Rosario Caminiti	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE DRPC ME			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina che ha trasmesso il progetto in data 14/11/2011. In sede di Conferenza Servizi del 18/11/2011, il DRPC comunica che - a seguito delle prescrizioni dettate dal GC di Me sul progetto, delle indagini geognostiche e della nuova normativa sismica - il progetto generale ha un costo pari a circa 3.073.000 euro. Il Commissario invita il DRPC a valutare l'opportunità di redigere uno stralcio funzionale rientrante nell'importo previsto in AdP di euro 900.000.</p> <p>Con nota prot. n. 3045 del 31/12/2011 il DRPC trasmette lo stralcio funzionale del progetto esecutivo, rappresentando l'impossibilità di rimodulare il progetto per un importo inferiore ad euro 1.321.010,50.</p> <p>Con nota prot. n. 223 del 25/01/12, il Commissario trasmette la documentazione relativa allo stralcio funzionale al Comitato di Indirizzo e Controllo, che, nel corso dell'incontro del 18/05/2012 dispone l'incremento dei fondi per l'intervento pari a €421.050,50, come richiesto dallo stralcio funzionale presentato dal DRPC.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 1091 del 02/04/2012, il DRPC trasmette la documentazione inerente il piano di indagini per "Adeguamento del tombino di convogliamento acque".</p> <p>Il MATTM invita RFI ed ANAS ad interfacciarsi con il Commissario per la problematica dei tombini, ed i Commissario, non avendo avuto riscontro, sollecita gli stessi direttamente con nota prot. n. 2409 del 28/06/2012 e nota prot.n. 4720 del 15/11/2012.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5042 del 30/11/2012, la Direzione Commerciale ed Esercizio di rete di RFI comunica l'avvenuto inoltro delle richieste all'ufficio RFI competente.</p>	SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI 
--------------------	---	-----	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME052	Basico	Drenaggi e opere di convogliamento - C/da Badiazza						Importo ApQ	€ 300.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011		note: Nel corso del Comitato del 21 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla lettera B. Nel corso del Comitato del 24 febbraio 2011 transita nuovamente in A l'importo viene incrementato, passando da € 300.000 a € 1.300.000	Importo Rimodulato	€ 1.300.000,00
Decreto di Finanziamento	65 - 14/02/2012	Importo Finanziato	€ 1.291.603,12	Decreto di Impegno (PVS e Rimodulazione)	698 - 13/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.046.941,73		
				Decreto di Impegno pagamento GURI	152 - 3/04/2012	Importo dell'Impegno	€ 979,11		
				Decreto di Impegno pagamento post informazione quotidiani	265 - 08/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.244,55		
				Decreto Impegno e pagamento AVCP	387 - 24/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 1.291.603,12			TOTALE IMPEGNI	€ 1.050.540,39		
								Economie da finanziamento	€ 8.396,88
								Eventuali Economie	

## Figure Tecniche

RUP	Arch. Giuseppe Trifilò (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 324 del 15/11/2011	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 324 del 15/11/2011	
Progettista	Dott. Ing. Renato Cilona (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n.22 del 28.04.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Antonino Savoca (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 23 del 28.04.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Renato Cilona	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 118 del 21 marzo 2012	Direzione Lavori di carattere geologico	Dott. Antonino Savoca	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 454 del 11/09/2012	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Renato Cilona	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 118 del 21 marzo 2012					
Collaudatore Statico	Ing. Maurizio Coroneo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 343 del 11/07/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Maurizio Coroneo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 343 del 11/07/2012	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		I.Co.Li di Li Destri	Decreto Affidamento Lavori	n. 128 - 26.03.2012	data contratto	04-apr
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività	30/05/2012	data presunta di termine lavori	29/05/2013


STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune a progettista esterno con Determina Sindacale n.22 del 28.04.2012.</p> <p>A seguito dell'acquisizione e della validazione del progetto esecutivo trasmesso, con Decreto n. 65 del 14.02.2012, si è finanziato l'intervento, e con il successivo Decreto n. 128 del 26.03.2012 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il contratto è stato firmato in data 04/04/2012.</p> <p>I lavori sono stati avviati in data 30/05/2012 e l'ultimazione dovrà avvenire entro il 29/05/2013. In data 21/12/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori n. 1, ed in data 10/04/2013 sono stati ripresi gli stessi.</p> <p>La I.Co.Li. di Li Destri, aggiudicataria dei lavori, in data 19/06/2013 con nota prot.n. 3715, comunica l'ultimazione dei lavori.</p>						SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----------------

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

ME053	Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - C.da Jannello						Importo ApQ	€ 3.630.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	237 - 24/05/2012	Importo Finanziato	€ 3.630.000,00	Decreto di Impegno	547 del 19/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.813.578,07		
				Decreto di presa d'atto della PVS, rimodulazione QE ed integrazione Impegno di spesa	481 del 26/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 286.421,93		
				Decreto di impegno pagamento GURI	279 del 14/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.069,39		
				Decreto di Impegno Pagamento spese di pubblicazione	412 del 06/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 6.676,18		
				Decreto di Impegno pagamento GURI	439 del 04/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 874,28		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	577 - 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 3.630.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 3.110.219,85		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie	

## Figure Tecniche

RUP	Arch. Mario Messina (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determina n.05 del 08/03/2011	Collaboratore Tecnico RUP	Geom. Adriano Giuseppe (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n.140 del 28 giugno 2011		
	Ing. La Placa Giuseppe	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.47 del 06 febbraio 2012	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.346 del 11/07/2012		
Progettista	UTC Arch. Mario Messina	Incarico conferito tramite:	Atto n. 113/LL.PP. del 23.01.2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Geom. Carmelo Silvera (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 19 del 12 aprile 2011		
Geologo	Dott.ssa Geol. Caterina Cucinotta (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 14 del 21 marzo 2011	Ingegnere Geotecnico di supporto	Ing. Gianluca Coroneo	Incarico conferito tramite:	Nota di Incarico prot.n.342 del 6 febbraio 2012		
Direttore Lavori	Ing. Basilio Ridolfo (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 519 del 08.10.2012	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Carmelo Silvera	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 45 del 18/10/2012						
Collaudatore Statico	Ing. Basilio Ceraolo (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 05 del 08/01/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Basilio Ceraolo (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 05 del 08/01/2013		
INDAGINI preliminari affidate a:	TRIGEO Srl	Incarico conferito tramite:	Le indagini sono state seguite dall'amministrazione comunale	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Geo Perforazioni srl	Decreto Affidamento Lavori	431 - 29/08/2012	data contratto	26-set
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	22/10/2012	data presunta di termine lavori	31/10/2013

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>La progettazione esecutiva è stata affidata dal Comune all'UTC con Delibera di G.M. n. 174 del 06.12.2010.</p> <p>Con nota 9225 del 16.06.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. Con atto n. 113/LL-PP. del 23.01.2012 l'UTC ha nominato un nuovo progettista, che ritiene di dover apportare modifiche al progetto, chiedendo la nomina di un Ingegnere Geotecnico di supporto alla progettazione.</p> <p>L'Ufficio del Commissario, con Decreto Commissariale n.47 del 06.02.2012, nomina il RUP e, con nota prot.n.343 del 06.02.2012, l'Ingegnere Geotecnico da affiancare al progettista.</p> <p>Il progetto rivisitato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012.</p> <p>In sede di Conferenza Servizi del 24.04.2012 sono stati acquisiti i pareri degli enti coinvolti e si è provveduto a finanziare l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012.</p> <p>Con D. C. n. 261 del 07/05/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n.431 del 29/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'impresa GEO PERFORAZIONI Srl.</p> <p>Il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012 ed i lavori avviati in data 22/10/2012.</p> <p>Con Decreto n. 481 del 26/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la rimodulazione del quadro economico, l'integrazione dell'impegno di spesa e la proroga dell'ultimazione dei lavori di giorni 30.</p>	<p>SAL</p>	 <p>AVVIATI LAVORI</p>
------------------------	--	------------	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME056	Capri Leone	Opere di risagomatura e protezione versanti - Frazione Rocca						Importo ApQ	€ 550.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 96 del 08/03/2012	Importo Finanziato	€ 516.698,04	Decreto di Rimodulazione Impegno	Decreto n. 101 del 18/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 386.810,69		
				Decreto di Impegno e pagamento Progettazione, Coord. Sicurezza in fase di progettazione, rilievi	560 del 25/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 23.766,23		
				Decreto di Impegno pagamento Componente Commissione Gara	336 del 11/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 136,35		
				Decreto Impegno e pagamento AVCP	387 - 24/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 516.698,04</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 410.938,27</b>		
							Economie da finanziamento	€ 33.301,96	
							Eventuali Economie da ribasso		

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Gluffrè Gaetano (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 34 del 13 ago 2010				
	Ing. Domenico Imbroglia		D. C. n. 339 del 28.11.2011				
	Arch. Giovanni Piero Di Magro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 72 del 01/02/2013	Supporto al RUP	Dott. Barranco	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 34 del 23 gennaio 2012
Progettista	Ing. Salvatore Russo (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 44 del 12-10-10	Coord Sicurezza fase Progett.	Geom. Biagio Contiguglia (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 35 del 16 ago 2010
Geologo	Geol.Salvatore Armeli (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina sindacale n°16 23/02/2011			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Russo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 303 del 28 giu 2012	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Salvatore Russo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 303 del 28 giu 2012				
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - EUROVEGA COSTRUZIONI	Decreto Affidamento Lavori	n. 287 del 20/06/2012	data contratto	26/06/2012
Contratto		data conclusione lavori					Verbale inizio attività	19/07/2012	data di fine lavori



STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 44 del 12.10.2010.</p> <p>Il progetto, dopo varie modifiche e integrazioni, viene trasmesso nella versione definitiva con nota assunta al prot. n. 136 del 18/01/2012 e, a seguito dell'acquisizione pareri, viene finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/03/2012.</p> <p>Con Decreto n. 99 del 13/03/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 287 del 20/06/2012 sono stati aggiudicati i lavori.</p> <p>Il contratto è stato sottoscritto in data 26/06/2012 ed i lavori consegnati il 19/07/2012.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot. con n. 3438 del 12/09/2012, tra l'altro, ha comunicato che i lavori sono concretamente iniziati solo in data 11.09.12.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5258 del 11/12/2012, il RUP trasmette la Relazione di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 resasi necessaria durante lo svolgimento dei lavori.</p> <p>Con nota prot. n. 897 del 11/02/2013 l'Ing. Salvatore Russo trasmette il certificato di ultimazione lavori del 21/01/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 101 del 18/02/2013 il Commissario prende atto dell'approvazione della PVS e della conseguente rimodulazione dell'impegno, e con Decreto n. 103 e 241 del 18/02/2013 e 29/03/2013 lo stesso Commissario dispone il pagamento del SAL n. 1 e 2.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2775 del 13/05/2013 il D.L. ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e dell'art. 237 del Regolamento n. 207/2010.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	-----	-----------------






UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME057	Capri Leone	Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali - Capri Leone Centro						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	252 - 03/10/2011	Importo Finanziato	€ 573.816,18	Decreto di Impegno	678 - 10/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 424.452,22		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	95 - 07/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	135 - 30/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 788,19		
				Decreto di Impegno pagamento progettista e geologo	138 - 02/04/2012	Importo dell'Impegno	€ 33.809,99		
				Decreto di Impegno pagamento indagini	232 - 18/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 13.609,74		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 573.816,18</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 472.885,14</b>		
								Economie da finanziamento	€ 26.183,82
								Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Gaetano Giuffrè (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.233 del 21 settembre 2011	Supporto al RUP	Arch. Diego Mammo Zagarella	Ing. Salvatore Acampora Decreto Commissariale n.233 del 21 settembre 2011	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 28 del 23 gennaio 2012	
Progettista	Ing. Amalfi Maurizio (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 42 del 12/10/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Amalfi Maurizio (Figura Esterna)		Incarico conferito tramite:	Determina n. 42 del 12/10/2010	
Geologo	Geol. Michelangelo Napoli (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina n. 43 del 12/10/2010				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Studio Tecnico Ing. Falzea (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 329 del 17/11/2011	Assistente al DL			Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Studio Tecnico Ing. Falzea (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 329 del 17/11/2011						
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Butera (Direttore Tecnico Beta Servizi Ingegneria S.r.l.)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 612 del 30/07/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo			Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	TRIGEO Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	Determina sindacale n. 58 del 7/12/2010	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l. con un ribasso 23,8878%	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 302 del 03/11/2011	data contratto	15/11/2011
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	17/12/2011	data presunta di termine lavori	25/04/2012

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 42 del 12.10.2010.</p> <p>Lo stesso Comune ha provveduto ad affidare la realizzazione delle indagini preliminari con Determina Sindacale n. 58 del 07.12.2010.</p> <p>A seguito del completamento delle indagini, in data 30.03.2011 è stato trasmesso il progetto esecutivo che, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 252 del 03.10.2011.</p> <p>A seguito di espletamento delle procedure di Gara avviate con Decreto n. 268 del 10/10/2011, con Decreto n. 302 del 03.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla Bo.No. Costruzioni Srl e i lavori sono stati avviati in data 17/12/2011.</p> <p>In data 03/07/2012 il D.L. ordina all'impresa Bo.No. Costruzioni Srl di sospendere i lavori e di riprenderli quando verrà approvata la perizia di Variante e Suppletiva.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot.con n. 3301 del 03.09.2012, trasmette al Commissario copia dell'autorizzazione a redigere la PVS trasmessa al DL.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 3347 del 06/09/2012, il RUP trasmette gli elaborati della PVS.</p> <p>In data 10/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale Ripresa Lavori e con D.C. n. 678 del 10/12/2012 l'Ufficio del Commissario ha preso atto della PVS e della rimodulazione del quadro economico. Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 3346 del 06/09/2012, ha chiesto il finanziamento delle opere di completamento per una spesa pari ad € 70.000.</p>	<p>SAL</p>	<p>AVIATI LAVORI</p> 
------------------------	--	------------	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME058	Caronia						Importo ApQ	€ 3.000.000,00	
Consolidamento centro abitato									
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 18 MAG 2012	note:	Nel Comitato del 18.05.2012 viene rimodulato l'importo dell'intervento (€ 750.000)	Importo Rimodulato	€ 3.653.083,31
Decreto di Finanziamento	31 - 1/3/2011	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di Impegno	71 - 26/5/2011 come rimodulato dal Dacr 92 del 02/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.903.083,31		
Decreto di Finanziamento Importi aggiuntivi concessi dal Comitato	490 - 24/09/2012	Importo Finanziato	€ 653.083,31	Decreto di Impegno	189 - 14/3/2013	Importo dell'Impegno	€ 709.268,27		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 3.653.083,31</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 3.612.351,58</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 10390 del 15 ottobre 2010	Supporto RUP		Incarico conferito tramite:	
				RUP Espropri	Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Caronia o in caso di carenza della suddetta qualifica, il Dirigente	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 540 del 16/10/2012
Progettista	DRPC Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 10390 del 15 ottobre 2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Geol. Giuseppe Basile (Serv. RIA).	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 10390 del 15 ottobre 2010	Supporti al Geologo	Arch. Marinella Panebianco e dell'Arch. Orsola Bonanno (SERV. RIA).	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 10390 del 15 ottobre 2010
Direttore Lavori	Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti (DRPC ME)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 539 del 16/10/2012	Assistente al DL	Ing. La Rocca, Nicolosi, Raciti, Geom. Di Bella (DRPC ME)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 2733 del 29 aprile 2011
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. A. Ferraro (DRPC ME)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 561 del 26/10/2012				
Collaudatore Statico	Ing. Luigi Boeri (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n.1217 del 25 luglio 2011	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Luigi Boeri (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n.1217 del 25 luglio 2011

PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 146 DPR 554/99)


INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	PRESAL COSTRUZIONI SRL	Decreto Affidamento Lavori	Decreto di aggiudicazione def. n.38 del 31 marzo 2011 (€ 2.857.152,76)	data contratto	12/04/2011
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	01/04/2011	data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>La progettazione è stata affidata all'Ufficio del Commissario OPCM 3865/10. Il progetto, trasmesso in data 10.02.2011, a seguito di validazioni e approvazioni, è stato finanziato con Decreto n. 30 del 01.03.2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 38 del 31.03.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori che hanno avuto inizio il 01/04/2011.</p> <p>Con Decreto n. 92 del 02/03/2012 il Commissario ha preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 con conseguente rimodulazione del Quadro economico dell'intervento.</p> <p>In data 13.01.2012 i lavori sono stati sospesi in attesa di riscontro per un ulteriore finanziamento da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo per la realizzazione di lavori complementari.</p> <p>In sede di Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento è stato incrementato di € 750.000 per lavori indispensabili a garantire la funzionalità delle opere già realizzate.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2598 del 10/07/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto di completamento dell'intervento.</p> <p>Il Commissario, con nota prot.n. 2750 del 17.07.2012, ha autorizzato il RUP a procedere all'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti.</p> <p>Al fine di procedere all'emissione del Decreto di finanziamento, propedeutico al contratto aggiuntivo dei lavori, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3046 del 06/08/2012, il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto e del verbale di Validazione completo di tutti gli atti a corredo necessari.</p> <p>In data 03/09/2012 è stato sottoscritto dall'impresa Presal e dal DL il Verbale di Ripresa Lavori principali ad oggi conclusi.</p> <p>Con D.C. n. 490 del 24/09/2012 sono finanziati i lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato, e con D.C. n. 189 del 14/03/2013 è stato impegnato l'importo aggiuntivo degli stessi.</p> <p>In data 22/08/2013, con D.C. n. 673, è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 alla ditta Presal Costruzioni per i lavori complementari affidatele</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
------------------------	---	------------	--

REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

ME059	Casalvecchio Siculo	Consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 1.363.853,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 296 del 25/06/2012	Importo Finanziato	€ 1.363.853,00	Decreto di Impegno	n.38 del 22/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 954.358,27		
				Decreto di presa d'atto della PVS, rimodulazione QE ed integrazione Impegno di spesa	496 del 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 195.265,13		
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 662,26	Decreto di Impegno Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 662,26		
				Decreto di Impegno Studio Geologico e Indagini	578 - 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 28.601,96		
				Decreto di Impegno Pubblicazione GURI	488 - 24/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 937,17		
				Decreto di Impegno Progettazione	524 - 08/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 45.931,60		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	577 - 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
				Decreto di Impegno Pubblicazione esiti di gara	615 - 15/11/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.560,90		
				Decreto di Impegno rimodulazione QE ed impegno di spesa	545 del 11/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 118.319,40		
		TOTALE Finanziamenti	€ 1.364.515,26			TOTALE IMPEGNI	€ 1.346.011,69	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Romina Sparacino	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 73 del 01/02/2013	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.22 del 20 gennaio 2012
RUP	Ing. Domenico Imbroglia Geom. Carmelo Moschella (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n.394 del 01 agosto 2012 D.C. n.22 del 20 gennaio 2012	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.22 del 20 gennaio 2012
Progettista	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina del RUP n. 57 del 07 mag 2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina del RUP n. 57 del 07 mag 2012
Geologo	Dott. Geol. Fabio Uchino (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina del RUP n. 56 del 07 mag 2012	Direzione Lavori di carattere geologico	Dott. Geol. Fabio Uchino (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.400 del 04 giugno 2013
Direttore Lavori	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 550 del 23/10/2012	Assistenza Geologica alla DL	Geol. Fabio Uchino (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 2626 del 08/05/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 550 del 23/10/2012				
Collaudatore Statico	Giuseppe Quattrocchi	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 165 del 08/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Giuseppe Quattrocchi	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 165 del 08/03/2013
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ITINERA s.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 464 del 13/09/2012	data contratto
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	10-dic	data presunta di termine lavori

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>Il Comune ha affidato la progettazione a professionisti esterni con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 28.08.2007.</p> <p>Lo stesso Comune, con nota prot.n. 54 del 12.01.2012, ha chiesto l'autorizzazione alla nomina di due consulenze esterne (Progettazione/Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Studio Geologico) a causa di mancanza di professionisti all'interno dell'Amministrazione.</p> <p>Il Comune, con note acquisite ai prot.n. 689 del 01.03.2012 e 1374 del 23.04.2012, ha trasmesso i preventivi inerenti le consulenze esterne, ed il Commissario le ha autorizzate rispettivamente con nota prot. n. 1231 del 11/04/2012 e 1479 del 02.05.2012</p> <p>A seguito della Conferenza dei servizi del 11/06/2012 e successive integrazioni sono state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione dell'intervento.</p> <p>Con nota prot.n.2286 del 22.06.2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto esecutivo (con Verifica, Validazione e Delibera di G.M. di approvazione dello stesso) finanziato Con Decreto n. 296 del 25.06.2012.</p> <p>Con Decreto n. 397 del 1/08/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 464 del 13/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 634 del 21/11/2012 il Commissario ha disposto l'occupazione anticipata d'urgenza ed individuato il dirigente dell'UTC quale responsabile delle attività espropriative.</p> <p>In data 20/03/2013 e 17/04/2013 il Coordinatore della Sicurezza ha effettuato i primi due sopralluoghi. Con Decreto n. 394 del 03/06/2013 è disposto il pagamento del I SAL.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, e dei 7 gg per esprimersi concessi agli Enti, il Commissario.</p> <p>Con Decreto n. 496 del 28/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la rimodulazione del quadro economico e l'integrazione dell'impegno di spesa.</p> <p>In data 20/09/2013, con nota prot.n. 5635, il DL trasmette copia del Certificato di Ultimazione Lavori.</p>	<p>SAL</p>	<p>LAVORI ULTIMATI</p> 
------------------------	--	------------	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME061	Castel di Lucio	Consolidamento via Durante e Via S. Lucia						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	32 - 7/3/2011 come modificato dal Decr. n. 91 del 14/06/2011	Importo Finanziato	€ 1.500.000,00	Decreto di Impegno	238 - 22/09/2011 come rimodulato dal Decreto 457 del 12/09/2012	Importo dell'impegno	€ 1.239.256,58		
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 453,31	Decreto di Impegno Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo dell'impegno	€ 453,31		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.500.453,31</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.239.709,89</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Giuseppe La Plata	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 69 del 25.5.11	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 69 del 25.5.11
Progettista	S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina n. 51 del 3 dicembre 2010	Coord Sicurezza fase Progett.	S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina n. 51 del 3 dicembre 2010
Geologo	Dott. Pasquale Marena (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n.47 del 17.11.2010			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Studio Tecnico Associato Ing. Mineo e Scavaglieri (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 199 del 25 agosto 2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Studio Tecnico Associato Ingg. Mineo e Scavaglieri (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 199 del 25 agosto 2011				
Collaudatore Statico	Ing. Marcello D'Alia	Incarico conferito tramite:	D.C. 298 del 26.06.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Marcello D'Alia	Incarico conferito tramite:	D.C. 298 del 26.06.2012

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI			Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 163 del 1 agosto 2011	data contratto	10/08/2011
Contratto	data conclusione lavori	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	Verbale inizio attività	23/09/2011 sospesi il 25/01/2012 ripresa lavori il 16/04/2012	data presunta di termine lavori	15/01/2013

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta da progettisti esterni incaricati dal Comune con Determina n. 51 del 3/12/2010.</p> <p>Il progetto è stato acquisito in data 01.02.2011 e, a seguito della validazione, è stato finanziato con Decreto n.32 del 07.03.2011, come rimodulato dal Decreto 91 del 14/06/2011.</p> <p>A seguito di espletamento di procedure di gara è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori con Decreto n. 163 del 01.08.2011.</p> <p>I lavori sono stati avviati 23/09/2011 e sono stati sospesi in data 25/01/2012 per permettere l'esecuzione di indagini integrative nelle more della redazione di una perizia di variante.</p> <p>I lavori sono stati ripresi in data 16.04.2012.</p> <p>Con nota prot. 1966 del 01/06/2012 il D.L. chiede al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva, concessa dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2054 del 07/06/2012 a condizione che non comporti modifiche sostanziali che alterino la sostanza del progetto e di trovare copertura nelle somme già impegnate per l'esecuzione dell'opera con D.C. n° 238 del 22/09/2011.</p> <p>Il DL ha trasmesso, con nota acquisita al prot.n. 2798 del 19.07.2012, copia della perizia di variante approvata dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2836 del 23/07/2012.</p> <p>Con Decreto n. 457 del 12/09/2012 si è preso atto della PVS con conseguente rimodulazione del Quadro Economico.</p> <p>Con nota protocollo n. 383 del 21/01/2013 la Torsten Costruzioni comunica che in data 15 Gennaio 2013 sono stati ultimati i lavori.</p> <p>Con Decreto n. 422 del 07/06/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 alla Torsten Costruzioni srl.</p>	SAL	 LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	-----	--





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programmazione siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME062	Castell'Umberto	Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sfaranda Inferiore						Importo ApQ	€ 300.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	702 - 17/12/2012	Importo Finanziato	€ 300.000,00	Decreto di Impegno	772 - 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 223.185,12		
				Decreto di Impegno Commissione di Gara	215 - 25/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 333,06		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 300.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 223.743,18		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax)	Supporto al RUP	Arch. Carmelo Blancato	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax)		
Progettista	DRPC (Arch. Francesco Benedetti)	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax)	Supporto alla progettazione	Ing. A. Ferraro- C. La Rocca- V. Nicolosi- E. Raciti- Geom. M. Di Bella	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax)		
Geologo		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. A. Ferraro	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012		
Direttore Lavori	Arch. Francesco Benedetti (DRPC)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012	Supporto alla DL	C. La Rocca- V. Nicolosi- E. Raciti- Geom. M. Di Bella	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. A. Ferraro	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012	Collaboratori Amministrativi	Geom. Fortunata Zingale e Geom. Claudio Bartolotta	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012		
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	A.B.M. Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	59 - 28/01/2013	data contratto	12/03/2013	
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori		

STATO DELL'ARTE	<p>In data 09.11.2010 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina, che ha trasmesso il progetto in data 24.05.2011.</p> <p>A seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura Commissariale sono state richieste integrazioni al progetto trasmesso, inviate dal DRPC in data 24.11.2011 e 12.01.2012. Con nota prot.n. 395 del 09.02.2012 la Struttura Commissariale, analizzati gli allegati progettuali, ha sollecitato la consegna del progetto esecutivo, debitamente verificato e validato, tenendo conto delle osservazioni tecniche formulate.</p> <p>Con nota prot. n. 2148 del 13/06/2012 il Commissario ha sollecitato il DRPC di Me a trasmettere il progetto rielaborato entro 7 giorni, debitamente verificato e validato, specificando che trascorso infruttuosamente tale termine, avrebbe attivato i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del D.L. 195/2009.</p> <p>A seguito di osservazione da parte del Commissario in merito alla difformità tra il Titolo del Progetto in corso di redazione e quello inserito nell'AdP, il Commissario 3865 trasmette la Con Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.06.2012 che conferma la riconducibilità del progetto di "Somma urgenza per la realizzazione di opere di raccolta, convogliamento acque superficiali e regimentazione idraulica del torrente Battagliaiola nella Contrada Sfaranda - Comune di Castell'Umberto" all'intervento ME062.</p> <p>Il progetto è stato trasmesso nel mese di novembre 2012 e finanziato con Decreto n. 702 del 17/12/2012.</p> <p>Con D. C. n. 59 del 28/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della A.B.M. Costruzioni srl.</p> <p>In data 12/03/2013 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con Decreto n. 772 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
-----------------	--	-----	--------------------------------------






UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME063	Castroreale	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento					Importo ApQ	€ 1.650.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'intervento transita dalla copertura finanziaria regionale a quella Ministeriale	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento	564 del 26/10/2012	Importo Finanziato	€ 1.585.394,53	Decreto di Impagno	n. 113 del 21/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.166.313,41	
				Decreto di Impagno GURI	n. 730 del 20/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.021,04	
				Decreto di Impagno Progettazione	n. 11 del 09/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 89.096,45	
		TOTALE Finanziamenti	€ 1.585.394,53			TOTALE IMPEGNI	€ 1.256.430,90	
								Economie da finanziamento
								Eventuali Economie da ribasso

Figure Tecniche								
RUP	Arch. Gaetano Buccheri (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 264 del 07/06/2012	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 332 del 10.07.2012	
Progettista	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 11 del 16-02-2007	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Sutura Antonino (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 11 del 16-02-2007	
Geologo	Dott. Geol. Salvatore Sangiorgi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 11 del 16-02-2007	Assistenza Geologica alla DL	Geol. Salvatore Sangiorgi	Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 718 del 19/12/2012	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 718 del 19/12/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Lo Porto Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 615 del 30/07/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Lo Porto Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 615 del 30/07/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	C.N.T. srl	Decreto Affidamento Lavori	662 - 03/12/2012	data contratto	24-gen
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	02-apr	data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>La progettazione è affidata dal Comune a professionisti esterni Con Determina Sindacale n.11 del 16.02.2007.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 903 del 17/06/2011 il Comune ha comunicato essere in corso l'aggiornamento del progetto esecutivo alla vigente normativa.</p> <p>A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 1950 del 31/05/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto n. 297 del 26.06.2012 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori dai progettisti incaricati precedentemente dal Comune.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/07/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del GC di Me che ha richiesto la trasmissione di elaborati integrativi.</p> <p>In data 18.07.2012 il Progettista ha trasmesso al GC le integrazioni richieste in sede di CdS ed il GC ha espresso il proprio parere con nota acquisita al prot. n. 2877 del 25/07/2012.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot.n.3164 del 21.08.2012 ha trasmesso copia del Verbale di Verifica e Validazione del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 564 del 26/10/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 662 del 03/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della C.N.T. srl.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 113 del 21/02/2013 si è provveduto ad impegnare le somme.</p> <p>In data 02/04/2013 è avvenuta la formale Consegna dei Lavori.</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
----------------------------	---	------------	--




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME065	Ficarra	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne						Importo ApQ	€ 1.028.981,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	economie	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 1 del 23.11.2010	Importo Finanziato	€ 1.028.981,00	Decreto di Impegno	81 - 8/6/2011 così come modificato dal Decr 382 - 15/12/2011	Importo dell'impegno	€ 873.488,22		
		TOTALE Finanziamenti	€ 1.028.981,00			TOTALE IMPEGNI	€ 873.488,22		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie	

CONVENZIONI		COMUNE							
<b>Figure Tecniche</b>									
RUP	Ing. Fabio Marino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determina del Responsabile Area Tecnica n.300 del 04.11.2009	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:			
Progettista	Comune: professionista esterno	ATP Capogruppo Ing. Vincenzo Messina - Associato Ing. Francesco Castelli (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n.10 del 06.10.2009	Coord Sicurezza fase Progett.	ATP Capogruppo Ing. Vincenzo Messina - Associato Ing. Francesco Castelli (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n.10 del 06.10.2009	
Geologo	Geol. Filippo Cappotto (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n.7 del 16.09.2009				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Francesco Cappotto (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Responsabile del Servizio n.292 del 25.11.2010	Assistente al DL			Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	ATP Capogruppo Ing. Vincenzo Messina - Associato Ing. Francesco Castelli (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n.10 del 06.10.2009						
Collaudatore Statico	Arch. Carmelo Fiorenzo Landro (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n. 169 del 23.02.2011	Collaudatore Tecnico amministrativo			Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	Geo Sicilia	Affidamento INDAGINI	Determina del Responsabile Area Tecnica n.111 del 06.05.2009	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	EDILTECNICA COSTRUZIONI	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	12/01/2011
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	20/01/2011 sospesi il 30/08/2011 ripresi il 18/10/2011	data di finelavori	03/11/2011

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010. Il progetto è stato finanziato con Decreto n.1 del 23.11.10. I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11. A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento è transitato alla lettera B (copertura finanziaria regionale) ma continuando ad essere gestito dal Commissario, in quanto i lavori erano già avviati. I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011 a meno di lavori accessori, completati, come richiesto dal RU,P entro 60 gg e quindi il 03/01/2012 Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2367 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 ratifica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI 
--------------------	---	-----	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME066	Ficarra	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto						Importo ApQ	€ 1.450.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:	Importo Rimodulato	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 44 del 7/4/2011	Importo Finanziato	€ 1.358.580,64	Decreto di Impegno (rimodulazione QE)	Decreto n. 161 del 07/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.089.005,82		
				Decreto di Impegno GURI	209 - 31/08/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.033,34		
				Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.358.580,64</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.090.414,16</b>		
							Economie da finanziamento	€ 91.419,36	
							Eventuali Economie da ribasso		

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Fabio Marino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 232 del 21/09/2011	Supporto al RUP	Arch. Diego Mammo Zagarella	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 232 del 21/09/2011		
Progettista	ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni Ricciardo (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 7 del 23/08/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni Ricciardo (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 7 del 23/08/2010		
Geologo	Geol. Giuseppe Maria Pizzuto (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n.8 del 23/08/2010			Incarico conferito tramite:			
Direttore Lavori	Ing. Francesco Cappotto (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 231 del 21 settembre 2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Francesco Cappotto (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 231 del 21 settembre 2011						
Collaudatore Statico	ING. NUNZIO IMPELLIZZERI (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 353 del 1 dicembre 2011 a valle dell'accettazione dell'incarico conferito con nota prot. 2508 del 15/11/2011	Collaudatore Tecnico amministrativo	ING. NUNZIO IMPELLIZZERI (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 314 del 06.07.2012		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	RENZO COSTRUZIONI	Decreto Affidamento Lavori	D. C. n.198 del 25 agosto 2011 di aggiudicazione definitiva	data contratto	01/09/2011
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	27/09/2011	data presunta di termine lavori	24/05/2012

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune di Ficarra a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 7 del 23.08.2010.</p> <p>Il progetto è stato consegnato in data 23.03.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 44 del 07.04.2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 198 del 25.08.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il Contratto è stato firmato in data 01/09/2011 ed i lavori hanno avuto inizio in data 27/09/2011</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3222 del 24/08/2012, ritenuto necessario eseguire lavori complementari, ha chiesto autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche preliminari, trasmettendo al contempo elaborati tecnici dei lavori complementari previsti, ma il Commissario, atteso la quasi ultimazione dei lavori, non ha ritenuto accettabili le richieste avanzate.</p> <p>Con D.C. n. 161 del 07/03/2013 è avvenuta la presa d'atto approvazione PVS e la rimodulazione del QE dell'intervento.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	---	-----	----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME068	Forza d'Agrò	Opere di consolidamento del centro abitato						Importo ApQ	€ 1.250.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 15 SETT 2011	note:	Importo Rimodulato	€ 414.163,28	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno			
						TOTALE IMPEGNI	€ 0,00		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

## Figure Tecniche

RUP		Incarico conferito tramite:		Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI			Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2368 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2533 del 06/07/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.</p> <p>In data 20/07/2012 si è tenuto un tavolo tecnico con Commissario, Provincia, ARTA e Comune.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3359 del 07/09/2012 il Comune, come concordato nel tavolo tecnico del 20.07.2012, trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto oltre la documentazione amministrativa dello stesso.</p> <p>Con nota protocollo n. 3793 del 01/10/2012 il DRPC di ME sentito il Commissario convoca una riunione operativa per il giorno 05/10/2012 al fine di esaminare la problematica dell'intervento.</p> <p>In data 20/02/2013, con nota prot.n. 1073, il Commissario trasmette all'ARTA (Serv. 3) copia del progetto necessario all'acquisizione del parere preventivo dello stesso.</p> <p>L'ARTA (Serv. 3), con nota prot.n. 1786 del 25/03/2013, invita il Comune ad integrare il progetto secondo specifiche indicazioni.</p>	SAL	PROGETTAZIONE IN CORSO
-----------------	--	-----	------------------------





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME071	Frazzanò	Progetto di consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del Quartiere Serro						Importo ApQ	€ 300.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 15 SETT 2011	note:	valutazioni in merito alla possibilità di finanziare un progetto alternativo	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	N. 91 DEL 08-02-2013	Importo Finanziato	€ 286.765,17	Decreto di Impegno	656 - 08/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 242.164,33		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	41 - 26-01-2012	Importo Finanziato	€ 27.226,15	Decreto di Impegno e pagamento Commissione di Gara	323 - 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.978,55		
				Decreto di Impegno e pagamento indagini preliminari	n. 392 - 30/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 13.234,83		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 313.991,32</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 257.602,71</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA

Figure Tecniche

RUP	Ing. Fabio Marino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.2 del 12.01.2012	Supporto al RUP	Geom. Piero Nicolicchia	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 33 del 23 gennaio 2012	
Progettista	INVITALIA	Ing. Grassi ed Ing. Calogero	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.010 del 09.01.2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:		
Geologo	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Fabio Marino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.608 del 29.07.2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Fabio Marino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.608 del 29.07.2013					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO PLANTS	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 61 del 13.02.2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Soc. SCANCARELLO GAETANO	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 275 del 15/04/2013	data contratto
Contratto	16/02/2012	data conclusione lavori	28/03/2012			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE.	<p>In data 09.01.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 61 del 13.02.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione.</p> <p>In data 18.04.2012 sono stati acquisiti gli elaborati inerenti le indagini effettuate. Come comunicato dal Commissario al Comune con nota prot. n. 3296 del 03/09/2012, in base alle indagini svolte ed agli studi effettuati sull'area, è emersa una criticità molto più ampia e complessa rispetto all'inquadramento dei bersagli di intervento e, pertanto, l'attività di progettazione dell'intervento, correlata alla disponibilità economica di finanziamento prevista in fase di progettazione preliminare, determina necessariamente una tempistica di studio maggiore di quella prevista.</p> <p>In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4241, Invitalia trasmette copia del Progetto Esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 06/11/2012 e del parere di coerenza al PAI espresso dall'ARTA (Serv. 3) risultano acquisiti tutti i pareri necessari.</p> <p>Con D.C. n. 91 del 08/02/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 178 del 11/03/2013 è stato Approvato lo schema lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell'art. 122 del d.lgs 163/2006</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D.C. n. 275 del 15/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Società 'SCANCARELLO GAETANO (ribasso percentuale del 30,2430%), ed in data 12/06/2013 è stato sottoscritto il contratto.</p> <p>Con Decreto n. 656 del 08/08/2013 è disposto l'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
------------------	---	-----	--------------------------------------





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME072	Galati Mamertino	Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante - C.da Galini					Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	15 - 17/01/2012	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	114 - 21/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 362.140,56	
				Decreto di Impegno integrativo somme	858 - 11/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 69.788,57	
				Decreto di Impegno Progettazione	675 - 07/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 41.870,79	
				Decreto di Impegno AVCP	387 - 24/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00	
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 474.024,92</b>	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche							
RUP	Arch. Giuseppa Cavolo (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 14 del 17 gennaio 2012	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	Arch. Felice Testagrossa (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Det. Sind. n. 72 del 5-10-10	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Geol. Michele Orifici (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 63 del 28-5-10			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Arch. Felice Testagrossa (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Det. Sind. n. 72 del 5-10-10	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico	Ing. Luciano Taranto	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 1827/UC del 24/05/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	D&D	Decreto Affidamento Lavori n. 103 del 14.03.2012	data contratto	04/04/2012	
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	22/05/2012	data presunta di termine lavori	19/09/2012

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto ad affidarla a professionisti esterni con Determina Sindacale n.72 del 05.10.2010.</p> <p>Il progetto è stato acquisito in data 02.11.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 15 del 17.01.2012.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con decreto n.103 del 14/03/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori .</p> <p>Il Contratto è stato firmato in data 04/04/2012 ed i lavori sono stati avviati in data 22/05/2012.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2258 del 21.06.2012, ha trasmesso copia del Decreto di Occupazione Temporanea.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3399 del 10.09.2012, ha autorizzato il DL a redigere perizia di variante.</p> <p>A seguito dell'autorizzazione del RUP, in data 12/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori .</p> <p>Con nota prot. n. 5053 del 03/12/2012, il DL ha chiesto al RUP autorizzazione al fine di poter procedere alla redazione della PVS II.</p> <p>Con D.C. n. 114 del 21/02/2013 è stato disposto l'impegno somme ed il pagamento del I SAL.</p> <p>In data 18/04/2013 il RUP, con nota prot.n. 2317, trasmette copia dell'approvazione PVS n. 2 e Verbale di ripresa lavori datata 16/04/2013.</p> <p>Con D.C. n. 351 del 16/05/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	--	-----	----------------



REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

ME073	Galati Mamertino	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pileri				Importo AdQ	€	1.100.000,00	Importo Rimodulato	€ 1.100.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato				note:	Nel Comitato del 18 maggio 2012 si è deciso di far rimanere l'intervento in lettera A	
Decreto di finanziamento	406 - 02/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.100.000,00	Decreto di impegno	495 - 28/06/2013	importo dell'impegno	€	767.340,53		
				Decreto di impegno Commissione di Gara	212 - 25/03/2013	importo dell'impegno	€	555,15		
				Decreto di impegno Progettazione	150 - 01/03/2013	importo dell'impegno	€	24.862,47		
				Decreto di impegno Indagini e Studi	673 - 06/12/2012	importo dell'impegno	€	49.459,46		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	importo dell'impegno		€ 375,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 1.100.000,00			TOTALE IMPEGNI		€ 842.592,61		
									eventuali economie	

## Figure Tecniche

RUP	Arch. Giuseppa Cavolo	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 262 del 07/06/2012	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe Morganti (Dimessosi con nota prot.n. 611 del 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 348 del 11/07/2012
Progettista	Comune Ing. Mario Saitta	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n.54 del 26/10/2010 (Acquisito dal Commissario con Decreto n. 153 del 03/04/2012)	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Salvatore Sangiorgi	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale del 03/08/2007 (Acquisito dal Commissario con Decreto n. 349 del 11/07/2012)			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Mario Saitta	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 527 del 10/10/2012	Direttore Operativo di Cantiere	Geom. Calogero Sirna	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 91 del 19/03/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Mario Saitta	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 527 del 10/10/2012				
Collaudatore Statico	Ing. Franchina Alberto	Incarico conferito tramite:	nota prot. n. 1131/UC del 21/02/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Franchina Alberto	Incarico conferito tramite:	nota prot. n. 1131/UC del 21/02/2013
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ARCOBALENO 3000 srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 514 del 04/10/2012	data contratto
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	19-ott	data presunta di termine lavori



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME073	Galati Mamertino	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pillieri			importo AdQ	€	1.100.000,00	Importo Rimodulato	€ 1.100.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Nel Comitato del 18 maggio 2012 si è deciso di far rimanere l'intervento in lettera A	
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n.54 del 26/10/2010.</p> <p>Con nota prot. 2770 del 5/12/2011 il Commissario ha trasmesso la documentazione dell'intervento all'ARTA al fine di provvedere al finanziamento su fondi europei PO FESR 2007-2013 destinati alla Regione Sicilia.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.234 del 25/01/2012 l'ARTA comunica che l'intervento non possiede i requisiti necessari per l'ammissibilità al finanziamento e restituisce tutta la documentazione perché il Commissario si faccia carico della realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con Decreto n. 153 del 03.04.2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto n. 349 del 11/07/2012 si è acquisito lo studio geologico e le indagini geognostiche effettuati dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.</p> <p>Con D.C. n. 406 del 02.08.2012 è stato finanziato l'intervento, con Decreto n. 448 del 2/09/2012 sono state avviate le procedure di affidamento lavori e con D.C. n. 514 del 04/10/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.</p> <p>In data 19/10/2012 è avvenuta la consegna dei Lavori.</p>					SAL	AVVIATI LAVORI		




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME078	Letojanni		Opere di difesa costiera					Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	686 - 11/12/2012	Importo Finanziato	€ 2.000.000,00	Decreto di Impegno	770 - 25/09/2013	Importo dell'impegno	€ 1.310.143,30		
				Decreto di Impegno e Pagamento GURI	64 - 30/01/2013	Importo dell'impegno	€ 1.083,94		
				Decreto di Impegno Progettazione	110 - 20/02/2013	Importo dell'impegno	€ 68.844,50		
				Decreto di Impegno Pagamento rata Polimi	198 - 15/03/2013	Importo dell'impegno	€ 79.860,00		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 600,00		
				Decreto di Impegno spese di pubblicazione avviso di esito di gara	259 - 05/04/2013	Importo dell'impegno	€ 275,88		
				Decreto di Impegno spese di pubblicazione avviso di esito di gara	319 - 07/05/2013	Importo dell'impegno	€ 968,00		
				Decreto di Impegno e Pagamento Commissione giudicatrice di gara	515 - 08/07/2013	Importo dell'impegno	€ 989,47		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.462.765,09</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Francesca Usticano	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 657 del 08/08/2013	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 345 del 11/07/2012
RUP	Arch. Pietro Bonsignore (UTC) Richiesta sostituzione	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 124 del 26 marzo 2012	RUP	Geom. Giuseppe Runci	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 330 del 09/05/2013 Dimessosi con nota prot.n. 4831 del 06/08/2013
Progettista	Ing. Sascaro Agostino e Geom. Sascaro Sabrina (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Delibera di giunta n. 194 del 11.10.2002 (Acquisito dal Commissario con Decreto 120 del 23/03/2012)	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Vadalà Lucio (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Deliberazione di Giunta Municipale n. 267 del 18-12-2002
Studio Sedimentologico mineralogico e modello idraulico	Geol. Randazzo, Prof. Triscari, Ing. Turbolente (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Delibera di giunta n. 228 del 27.11.2002 (Acquisito dal Commissario con Decreto 327 del 10/07/2012)	Studio geologico meteorarino geognostico	Dott Geol. S. Arancio e D.ssa K. Tribulato (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Delibera di giunta n. 227 del 27.11.2002 (Acquisito dal Commissario con Decreto 327 del 10/07/2012)
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Zaccaro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 60 del 29/01/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Salvatore Zaccaro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 60 del 29/01/2013				

Collaudatore Statico	Incarico conferito tramite:	Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori
Contratto	data conclusione lavori	Valori S.C.a R.L. Consorzio stabile	Verbale inizio attività
			n. 34 del 21/01/13
			data contratto
			data presunta di termine lavori
STATO DELL'ARTE	<p><i>Il progetto è stato affidato dal Comune a progettista esterno con Delibera di Giunta n. 194 del 11.10.2002.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 120 del 23.03.2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto 327 del 10/07/2012 si è acquisito lo studio geologico dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.</i></p> <p><i>Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario ha preso atto di quanto richiesto dalle amministrazioni presenti ed ha disposto che il progettista integresse gli elaborati progettuali con quanto richiesto.</i></p> <p><i>Con nota prot. n.2147 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso al progettista il parere con prescrizioni della Soprintendenza del Mare per le opportune modifiche e integrazioni.</i></p> <p><i>Il Progettista, con nota acquisita al prot. n. 2682 del 12/07/2012 ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste, inoltrate dal Commissario, con nota prot.n. 2896 del 26/07/2012 all'ARTA Serv 3 per il parere di competenza.</i></p> <p><i>Il RUP con nota acquisita al prot. n. 3393 del 10/09/2012 ha trasmesso gli atti di validazione del progetto.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 686 del 11/12/2012 è stato finanziato l'intervento.</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 34 del 21/01/13 i lavori vengono aggiudicati definitivamente alla Valori S.C.a R.L. Consorzio stabile con ribasso percentuale offerto del 29,5000 %.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 770 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</i></p>		
		SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
			





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME079	Librizzi	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale					Importo ApQ	€ 2.150.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	471 - 20/06/2013	Importo Finanziato	€ 2.128.085,55	Decreto di Impegno	838 - 09/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.587.238,81	
Decreto di Finanziamento somme plottaggio tavole grafiche	431 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 766,66	Decreto di Impegno somme plottaggio tavole grafiche	431 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 766,66	
Decreto di Finanziamento Indagini	473 - 17/09/2012	Importo Finanziato	€ 21.222,70	Decreto di Impegno Indagini	141 - 27/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 21.147,79	
				Decreto di Impegno GURI	621 - 30/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.022,42	
				Decreto di Impegno e pagamento Commissione di Gara	Decreto n. 813 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.506,96	
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 2.150.074,91</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.612.682,64</b>	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

#### Figure Tecniche

RUP	Geom. Cilona Carmelo (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 339 del 11.07.2012	Supporto al RUP	Arch. Giovanni Piero Di Magro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 175 del 11.03.2013		
Progettista	INVITALIA	Ing. Grassi, Pulizzi, Zumbo, Peligra e Geol. Sabatini	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n.2514 del 15 nov 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:			
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:			
Direttore Lavori	Ing. Basilio Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 669 del 21/09/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:							
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO GAV Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 521 del 08/10/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Nuova costruzione siciliana srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 596 del 25/07/2013	data contratto	24/09/2013
Contratto	10/10/2012	data conclusione lavori				Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, il 15/11/2011.</p> <p>La realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione è stata affidata dal DRPC ed i risultati sono stati trasmessi in data 23.02.2012.</p> <p>L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), che, in data 16/02/2012, ha trasmesso i prodotti di restituzione dei voli aerei effettuati.</p> <p>A seguito dell'acquisizione della relazione geologica redatta dal Dott. Basile, rivista a seguito delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC e secondo quanto discusso nel tavolo tecnico del 21/03/2012, il geologo della CGIAM, con nota acquisita al prot.n. 1157 del 04.04.2012, ha richiesto integrazioni alla relazione.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.2041 del 07/06/2012 il geologo ha trasmesso la relazione finale di sintesi della campagna di indagini geognostiche e geotecniche e del monitoraggio strumentale di Contrada Nasidi a Librizzi.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.3283 del 03/09/2012, la CGIAM ha trasmesso agli Uffici del Commissario le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini effettuate.</p> <p>Con D.C. n. 473 del 17/09/2012 sono state finanziate le indagini ed avviate le procedure per l'affidamento delle stesse.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di indagini Preliminari di cui l'Affidataria ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4781 del 19/11/2012.</p> <p>CGIAM ha trasmesso in data 24/01/2013, con nota prot.n. 520, la relazione geologica dell'intervento.</p> <p>In data 05/03/2013, con nota prot.n. 1361, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo dell'intervento.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi del 22/05/2013, e del 7 gg concessi agli Enti per esprimersi, il Commissario, con nota prot.n. 3451 del 10/06/2013, invita il RUP a procedere alla</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
------------------------	--	------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME080	Librizzi	Opere di contenimento Librizzi centro						Importo ApQ	€ 150.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Intervento REVOCATO	Importo Rimodulato	€ 0,00
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno			
						<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 0,00</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche									
RUP	Geom. G. Adamo	Incarico conferito tramite:		Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:			
Progettista		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:			
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:			
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:							
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	
STATO DELL'ARTE	INTERVENTO REVOCATO nel corso della riunione di Comitato del 24 febbraio 2011. Le risorse rese disponibili dalla mancata realizzazione delle opere, pari a € 150.000, sono state destinate all'intervento TP171 Salemi.						SAL	INTERVENTO REVOCATO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME081	Librizzi	Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	707 - 17/12/2012	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	n.635 del 01/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 363.006,46		
Decreto di Finanziamento Indagini	106 - 28.06.2011	Importo Finanziato	€ 23.524,38	Decreto di Impegno Indagini	142 - 21/07/2011	Importo dell'Impegno	€ 16.912,60		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	468 del 20/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.177,64		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 523.524,38</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 381.321,70</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	INVITALIA	CGIAM
-------------	-----------	-------

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Santo di Perna (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 75 del 27 mag 11	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 75 del 27 mag 11
Progettista	INVITALIA Ing. Calogero, Ing. Morganti	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 254 del 08.03.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Mobilia Massimiliano	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 128 del 22/02/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Mobilia Massimiliano	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 128 del 22/02/2013				
Collaudatore Statico	ing. Filippo Gullo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 734 del 12/09/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	GIA EXPLORING SAS	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto 142 del 22 lug 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	TEK Infrastrutture srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 32 del 17/01/2013	data contratto	
Contratto	26/07/2011	data conclusione lavori	08/08/2012			Verbale inizio attività	05-glu	data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 142 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione, ad oggi concluse.</p> <p>L'intervento è stato inserito nell'Accordo Quadro con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo al fine di ottenere un rilievo topografico e una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.</p> <p>Con note assunte al prot. n. 498 del 16/02/2012, 1503 del 03/05/2012 e 2781 del 18/07/2010 la CGIAM ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3724 del 27/09/2012 INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 10/10/2012, ed al parere espresso dall'ARTA (Serv. 3) con nota acquisita al prot. n. 4254 del 23/10/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri.</p> <p>Con D.C. n. 707 del 17/12/2012 viene approvato e finanziato l'intervento</p> <p>Il Commissario con D.C. n. 709 del 18.12.2012, approva la lettera d'invito ed avvio gara.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 32 del 17/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della TEK Infrastrutture srl che ha offerto un ribasso del 29,8833%.</p> <p>In data 09/04/2013 è stato redatto il verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3 Regolamento D.P.R. 207/2010.</p> <p>In data 20/05/2013, con nota prot.n. 2951, il RUP autorizza il DL a procedere alla formale consegna dei lavori.</p> <p>In data 05/06/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Lavori.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 635 del 01/08/2013 si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento.</p> <p>In data 19/09/2013 è avvenuta la sospensione dei lavori.</p>	<p>SAL</p>	<p>SOSPENSIONE LAVORI</p> 
------------------------	--	------------	--

REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REPUBBLICA ITALIANA



MIED87		Messina	Opere di consolidamento località Giampitleri				Importo ApQ	€ 24.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:	Importo Rimodulato			
Decreto di Finanziamento	Lettera Originaria (A/PQ)	Importo Finanziato	Decreto di Impegno	Importo dell'Impegno				
					Eventuali Economie		€ 0,00	

Figure Tecniche

RUP	Incarico conferito tramite:	Supporto al RUP	Incarico conferito tramite:
Progettista	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:
Geologo	Incarico conferito tramite:		Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori	Incarico conferito tramite:	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:		Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico	Incarico conferito tramite:	Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	Declaro Affidamento Lavori	data contratto
Contratto	data conclusione lavori	Verbole inizio attività	data presenta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	LAVORI ULTIMATI	
L'Intervento a seguito dell'OPCM 3886 del 9 luglio 2010, viene gestito dal Commissario Delegato di cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009. I relativi fondi sono stati trasferiti nella contabilità speciale di cui al suddetto Commissario.		SAL




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME088	Messina	Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento Bordonaro						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 15 SETT 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	192 - 26/04/2012	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di Impegno	D.C. n. 169 del 08/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.239.939,74		
				Decreto di Impegno Pagamento GURI	230 - 18/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.146,92		
				Decreto di Impegno Pagamento Presidente Commissione di Gara	393 - 30/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 3.603,24		
				Decreto di Impegno Pagamento Progettazione	396 - 01/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 109.307,26		
				Decreto di Impegno Pagamento Pubblicazione estratto avviso gara	404 - 02/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 6.419,05		
				Decreto di Impegno Pagamento GURI	405 - 02/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 874,28		
				Decreto Impegno e pagamento publikompass	503 del 02/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 4.522,38		
				Decreto di Impegno e pagamento Componenti	507 del 02/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 6.466,58		
				Decreto di Impegno e pagamento RUP e personale UTC	516 del 04/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 10.381,29		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	577 - 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Studio geologico DL	725 del 20/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 64.089,67		
				Decreto di Impegno PVS	372 del 21/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 16.144,30		
		TOTALE Finanziamenti	€ 3.000.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 2.464.494,71	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 203 del 04.05.2012	Supporto al RUP (Lavori)	Dott. Angelo Salvatore Nicastro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 203 del 04.05.2012
RUP Espropri	Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Messina (Dott. Giovanni Bruno)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 562 del 26.10.2012	Supporto al RUP (Progettazione)	Riccardo Contestabile	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 186 del 30.05.2012
Progettista	Comune Ing. Antonino Sutura	Incarico conferito tramite:	Deliberazione Giunta Comunale prot.n. 97 del 22.02.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Vincenzo Pinnizzotto	Incarico conferito tramite:	Deliberazione Giunta Comunale prot.n. 102 del 22.02.2011			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Antonino Sutura	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 328 del 10/07/2012	Assistenza Geologica alla DL	Dott. Geol. Vincenzo Pinnizzotto	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 585 del 07/11/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonino Sutura	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 328 del 10/07/2012				
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Sparacino	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 407 del 02.08.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Salvatore Sparacino	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 407 del 02.08.2012
INDAGINI preliminari affidate a:	SIGEO	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Pettinato Costruzioni	Decreto Affidamento Lavori	382 - 20.07.2012	data contratto

Contratto	data conclusione lavori	Esecuzioni lavori	srl	Verbale inizio attività	31/07/2012	data presunta di termine lavori	25/10/2013
<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 22.02.2011</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2951 del 20.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza dei servizi del 20.03.2012 è stato richiesto al Comune di rimodulare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ARTA Serv. 3.</p> <p>Il Progetto rimodulato è stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16.04.2012 e finanziato con Decreto n. 192 del 26.04.2012.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 382 del 20.07.2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il Contratto è stato sottoscritto il 24/07/2012, i lavori consegnati il 31.07.2012 e dovranno concludersi entro il 27/07/2013.</p> <p>Con D.C. n. 421 del 09.08.2012, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del perfezionamento del procedimento espropriativo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 169 del 08/03/2013 si dispone l'impegno delle somme pari ad € 2.239.939,74.</p> <p>Con D.C. n. 372 del 21/05/2013 viene notificata la presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione QE ed integrazione impegno di spesa dei lavori.</p>			<p>AVVIATI LAVORI</p> <p>SAL</p> 			





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME089_1	Messina	Opere di consolidamento località Galati S. Anna						Importo ApQ	€ 900.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	D.C. n. 593 del 08/11/2012	Importo Finanziato	€ 900.000,00	Decreto di Impegno	D. C. n. 546 del 12/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 632.964,88		
				Decreto di Presa atto PVS e impegno aggiuntivo	D. C. n. 942 del 07/11/2013	Importo dell'Impegno	€ 46.551,60		
				Decreto di impegno GURI	D. C. n. 26 del 15/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.000,07		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
				Decreto di Impegno Commissione di Gara	415 - 06/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 555,17		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 900.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 681.446,72</b>	Economie da finanziamenti	
								Eventuali Economie da ribasso	

## CONVENZIONI

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Antonino Amato (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 379 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Peligrà (FINO AL 31/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 379 del 20.07.2012		
Progettista	Comune Geom. Currò	Incarico conferito tramite:	Incarico interno con nota n. 57 del 13/02/2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:			
Geologo	Comune	Incarico conferito tramite:	Delibera giunta municipale n. 99 del 22/02/2011	supporto alla progettazione	Comune Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Incarico interno con nota n. 74 del 02/03/2012		
Direttore Lavori	Geom. Domenico Currò (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 23 del 15/01/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Domenico Currò (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 23 del 15/01/2013						
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	C&P srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 733 del 21/12/2012	data contratto	
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	06/03/2013	data presunta di termine lavori	02/09/2013

STATO DELL'ARTE	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B</p> <p>Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci.</p> <p>Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 444, trasmette la documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista trasmette all'Ufficio del Commissario copia del Progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 23.08.012 sono stati acquisiti tutti i pareri.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 è stato finalizzato l'intervento, e con Decreto n. 733 del 21/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della C&amp;P srl (ribasso del 28,9554%).</p> <p>In data 06/03/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il termine utile per ultimare i lavori è stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi cosicchè l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 02/09/2013</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 632.964,88.</p> <p>Con Decreto n. 725 del 11/09/2013 è disposto il pagamento del II SAL</p>	SAL	 AVVIATI LAVORI
--------------------	---	-----	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME089_2	Messina	Opere di consolidamento località Mlii San Marco						Importo ApQ	€ 1.390.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			Economie da finanziamento
									Eventuali Economie da ribasso

## CONVENZIONI

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Antonino Amato (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. 381 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe Morganti (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D. C. 381 del 20.07.2012		
Progettista	Comune	Arch. Teresa Donato	Incarico conferito tramite:	Delibera giunta Comunale n. 1538 del 30/12/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Comune	Geol. Sergio Doffin	Incarico conferito tramite:	Delibera giunta Comunale n. 1543 del 30/12/2011	Supporto alla progettazione	Ing. Rossella Zumbè	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n. 464 del 14.02.2012	
Direttore Lavori			Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:		
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA		Decreto Affidamento Lavori		data contratto		
Contratto	data conclusione lavori		Esecuzioni Lavori		Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori		

STATO DELL'ARTE	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B          Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci          Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.          La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 446, ha trasmesso la documentazione amministrativa.          Con nota prot.n. 464 del 14/02/2012 il Commissario, in riscontro alle richieste del Comune, ha nominato un tecnico interno a supporto della progettazione.          Con nota prot.n. 2976 del 01.08.2012, il Geologo incaricato ha trasmesso copia della documentazione integrativa allo studio geologico.          In data 12/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto rielaborato dal progettista in data 30/11/2012.          A seguito della CdS tenutasi in data 20/02/2013, il Progettista trasmette, con nota prot.n. 1172 del 25/02/2013, le integrazioni richieste dall'ARTA Serv. 3, a cui sono concessi 7 gg per esprimere il parere di propria competenza.          In data 27/03/2013, con nota prot.n. 1866, l'Ufficio del Commissario sollecita l'ARTA (serv. 3) al rilascio del parere.</p>						SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	---	--	--	--	--	--	-----	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1


REGIONE  
SICILIANA

ME089_4	Messina	Opere di consolidamento località Santa Margherita						Importo ApQ	€ 650.000,00
	ME089_4a	ME089_4a Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita						Importo	
	ME089_4b	ME089_4b Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel VIII. S.Margherita nel Comune di Messina						Importo	
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B  Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci  Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento ME 089_4a	699 - 13/12/2012	Importo Finanziato	€ 395.650,00	Decreto di Impegno ME 089_4a	258 - 05/04/2013	Importo dell'impegno	€ 306.390,20		
Decreto di Finanziamento ME 089_4b	182 - 12/03/2013	Importo Finanziato	€ 70.000,00	Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 225,00		
				Decreto di impegno Commissione di Gara	516 - 08/07/2013	importo dell'impegno	€ 323,16		
				Decreto di Impegno ME 089_4b	535 del 10/07/2013	importo dell'impegno	€ 50.737,60		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 465.650,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 357.675,96</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## CONVENZIONI

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Salvatore Bartolotta (ME089_4a) Ing. B. Manfrè (ME089_4b)	Incarico conferito tramite:	(ME089_4a) D.C. n. 650 del 27/11/2012 (ME 089_4b) nota in entrata prot. n. 1155 del 22/02/2013	Supporto al RUP (ME089_4a)	(ME089_4a) Dott.ssa Flavia Listro (FINO AL 30/01/2013)  (ME 089_4b) Arch. Carmelo Blancato	Incarico conferito tramite:	(ME089_4a) D.C. n. 650 del 27/11/2012; (ME 089_4b) nota in entrata prot. n. 283195 del 22/01/2013
RUP (ME089_4a)	Geom. Marco Mancuso (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. 378 del 20.07.2012	RUP Espropri (ME089_4a)	Dirigente Ufficio Espropri del Comune	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 43 del 22/01/2013
Progettista (ME089_4a)	Comune Geom. Domenico Currò	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 650 del 27/11/2012	Collaboratore Tecnico alla Progettazione (ME089_4a)	Geom. Giacomo Giacobbe (UTC)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 283195 del 22/11/2012
Progettista (ME089_4b)	DRPC Ing. F. Bongiovanni	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot. n. 1155 del 22/02/2013	Collaboratori amministrativi (ME 089-4b)	Arch. M. Dagro, Geom. A. F. Zingale (DRPC Me)	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Comune Geol. Domenico Pontillo	Incarico conferito tramite:	Delibera giunta comunale n. 103 del 22/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori (ME089_4a)	(ME 089_4a) Geom. Domenico Currò Comune (ME089_4b) Ing. Fabio Bongiovanni DRPC	Incarico conferito tramite:	(ME 089_4a) D.C. n. 650 del 27/11/2012 ME089_4b nota in entrata prot. n. 1155	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L. (ME089_4aA)	Decreto Affidamento Lavori	ME 089_4aA n. 20 del 14/01/2013 ME 089_4bA n. 336 del 10/05/2013	data contratto ME 089_4aA 23/01/2013
Contratto	data conclusione lavori		ECOAMBIENTE Soc. Coop. a r.l. (ME089_4bA)	Verbale inizio attività		20/04/2013	data presunta di termine lavori

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo " del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 443, ha trasmesso la documentazione amministrativa. A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il DRPC a trasmettere, entro 45 giorni, il progetto del rifioramento del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio in località Santa Margherita . A seguito della CdS tenutasi giorno 29/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto. Il DRPC in data 10/12/2012, con nota assunta al prot.n. 5191, trasmette copia del progetto esecutivo di rifioritura massi. Il Commissario con Decreto Commissariale n. 699 del 13/12/2012 approva e finanzia l'intervento Con Decreto Commissariale n. 20 del 14/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME089_4a_Messina, a favore della ROMEO COSTRUZIONI S.R.L. ribasso percentuale del 29,2246 %. In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto. A seguito della CdS dell'intervento ME 089_4b tenutasi in data 23/01/2013 il Commissario concede 7 giorni per esprimersi agli Enti che non hanno ancora comunicato il parere di propria competenza. L'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 874 del 08/12/2012, comunica che l'intervento ricade in aree non perimetrare nel PAI. Con D.C. n. 182 del 12/03/2013 è stato finanziato l'intervento ME089_4b, e con D.C. n. 258 del 05/04/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento ME089_4a. A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 336 del 10/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori relativi</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
------------------------	---	------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME089_3	Messina	Opere di consolidamento località Mili San Pietro						Importo ApQ	€ 510.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n.383 del 20/07/2012	Importo Finanziato	€ 505.354,78	Decreto di Impegno	831 - 08/10/2013	Importo dell'impegno	€ 383.477,82		
				Decreto di Impegno indagini	466 - 20/06/2013	Importo dell'impegno	€ 20.262,28		
				Decreto di Impegno Commissione di Gara	286 - 17/04/2013	Importo dell'impegno	€ 397,23		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 225,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 505.354,78			TOTALE IMPEGNI	€ 404.362,33	Economie da finanziamento	€ 510.000,00
								Eventuali Economie da ribasso	

## CONVENZIONI

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Marco Mancuso (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 226 del 17.05.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Pellgra (FINO AL 31/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 226 del 17.05.2012
Progettista	Comune Ing. Angelo Ermes Di Dio	Incarico conferito tramite:	Determina giunta comunale n. 98 del 22/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Comune Geol. Fabio Nicita	Incarico conferito tramite:	Determina giunta comunale n. 105 del 22/02/2011			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Angelo Di Dio	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 21 del 14/01/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Ditta Projet s.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	24-set
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	

' STATO DELL'ARTE	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B          Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011          l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci          Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.          La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 445, ha          trasmesso la documentazione amministrativa.          Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 1760 del 17.05.2011, copia del progetto          esecutivo aggiornato.          A seguito della conferenza dei servizi del 31/05/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla          realizzazione dell'intervento.          In data 20/07/2012 con Decreto n.383 si è provveduto a finanziare il progetto.          Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 2839 del 23/07/2012 ha trasmesso al Commissario il          Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1.          Con D. C. n. 831 del 08/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione          dell'intervento.</p>						SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
-------------------	---	--	--	--	--	--	-----	--------------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME089_5	Messina	Opere di consolidamento località Santo Stefano Briga						Importo ApQ	€ 550.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## CONVENZIONI

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Domenico Currò (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. 380 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Peligra (FINO AL 31/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D. C. 380 del 20.07.2012		
Progettista	Comune	Geom. Domenico Currò	Incarico conferito tramite:	nota interna n. 73 del 02/03/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:			
Geologo	Comune	Geol. Salvatore Maio	Incarico conferito tramite:	Deliberazione Giunta comunale n. 1544 del 30/12/2011	Supporto alla progettazione	Comune	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	incarico interno con nota n. 73 del 02/03/2012
Direttore Lavori			Incarico conferito tramite:		Assistente al DL			Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:						
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo			Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B          Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci          Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.          La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 442, ha trasmesso la documentazione amministrativa.          A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg.          In data 29/11/2012, con nota prot.n. 5006, il Commissario autorizza il Comune di Messina a procedere alla redazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva dell'intervento.</p>						SAL	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO
-----------------	---	--	--	--	--	--	-----	----------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME091	Mirto	Consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:		Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	531 - 08/07/2013	Importo Finanziato	€ 2.427.687,47	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	116 - 05/07/2011	Importo Finanziato	€ 23.937,27	Decreto di Impegno indagini preliminari	144 - 21/07/2011	Importo dell'Impegno	€ 20.430,35		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari integrative	205 - 08/05/2012	Importo Finanziato	€ 48.375,26	Integrazione Decreto di Impegno Indagini preliminari	455 - 11/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 143,89		
				Decreto di Impegno GURI avviso di gara	592 - 23/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.086,77		
				Decreto di Impegno e Pagamento avviso di gara	782 - 26/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.894,32		
				Decreto di Impegno Indagini preliminari integrative	649 - 27/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 29.821,15		
				Decreto di Impegno GURI avviso di gara	839 - 09/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 854,69		
				Decreto di Impegno pubblicazione esito di gara	920 - 31/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.073,60		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 57.304,77</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

#### Figure Tecniche

RUP	Ing. Giuseppe Nastasi (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 93 del 14 giugno 2011	Supporto al RUP	Ing. Federica Bottini	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 23 del 23 gennaio 2012	
Progettista	INVITALIA	Arch. Fabio Pulizzi, Ing. Fabio Ferla, Ing. Alberto Peligra, Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 646 del 09.05.2011	Coord. Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:		
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM	Collaboratore Amministrativo	Arch. Carmelo Bianco	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 681 del 28/08/2013	
Direttore Lavori	Ing. Antonio Sorge	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 681 del 28/08/2013	Direttore Operativo	Arch. Franco Benedetti Arch. Maurizio Venuti	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 681 del 28/08/2013	
Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Vincenzo Sorce	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 682 del 28/08/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Collaudatore Statico	Ing. Andronico Daniele	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6363 del 20/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Andronico Daniele	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6363 del 20/10/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL GEMERID (Indagini preliminari integrative)	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto 144 del 22 lug 2011 Indagini preliminari integrative D.C. 50 del 30/05/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Colinas Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	790 - 30/09/2013 data contratto	
Contratto	26/07/2011	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	



STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011. Con Decreto n. 144 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione ad oggi concluse.</p> <p>In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche inerenti ulteriori indagini da effettuare sul sito di cui il RUP ha preso atto in data 27.04.2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 205 del 08/05/2012 sono state approvate le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari alla progettazione e dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento delle stesse.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 250 del 30/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative.</p> <p>Le attività sono state avviate il 18/06/2012 e sono state completate in data 16/07/2012, con la trasmissione della relazione sulle indagini integrative effettuate acquisita al prot.n. 2754 in pari data.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3421 del 11/09/2012, la CGIAM ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della relazione geologico-tecnica.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 772 del 05/02/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS tenutasi giorno 06/03/2013 sono acquisiti tutti i pareri con esito positivo, ad eccezione di quelli di competenza dell'ARTA (Serv. 3) che, con nota prot.n. 1576 del 13/03/2013, ha espresso prescrizioni che occorrerà rispettare.</p> <p>In data 07/06/2013 con nota prot.n. 3406, Invitalia trasmette le integrazioni richieste dall'ARTA. In data 09/07/2013, con nota prot.n. 4104, il RUP trasmette al Commissario verifica e validazione del progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto n. 531 del 09/07/2013 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>Con Decreto n. 675 del 26/08/2013 viene nominata la Commissione di Gara.</p> <p>Con Decreto n. 790 del 30/09/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Colnisa Costruzioni srl.</p>	SAL	 <p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p>
-----------------	--	-----	---




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME092	Mistretta	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta – Torrente Santa Domenica						Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	586 - 07/11/2012	Importo Finanziato	€ 778.679,50	Decreto di Impegno	419 - 07/06/2013	Importo dell'impegno	€ 567.419,42		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	Decreto n. 330 del 18/11/2011	Importo Finanziato	€ 21.320,50	Decreto Impegno indagini preliminari	Decreto n. 367 del 12/12/2011	Importo dell'impegno	€ 12.780,44		
				Decreto di pagamento e disimpegno parziale somme decreto 367/2011	Decreto n. 419 del 08/08/2012	Importo dell'impegno	-€ 2,49		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 800.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 580.422,37</b>		
								Economie da finanziamento Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Rosario Mazzurco (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 16.11.2011	Supporto al RUP	Arch. Di Magro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 16.11.2011
Progettista	Geom. Lucio Pani (UTC)	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 746 del 07.03.2012	Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Sebastiano Azzolina	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 313 del 04.05.2012
Geologo	Dr.ssa Mazzarella Grazia	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 319 del 08.05.2012			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Geom. Lucio Pani (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 181 del 12/03/2013	Assistente al DL	Ing. Sebastiano Azzolina	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 181 del 12/03/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Lucio Pani (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determinazione n. 83 del 01/02/2013				
Collaudatore Statico	Arch. Angelo Cellura	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 384 del 24/05/2013 Dimessosi con nota prot.n. 4840 del 06/08/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Basilio Ceraolo	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 663 del 19/08/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO RAS (IAP)	Decreto di affidamento INDAGINI	Prot. n. 806 del 29 novembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Geodesia srl	Decreto Affidamento Lavori	710 - 18/12/2012 data contratto
Contratto	15/12/2011	data conclusione lavori	21/01/2012			Verbale inizio attività	03/04/2013 data presunta di termine lavori

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 la progettazione è stata affidata al Comune. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, ha restituito i dati del rilievo aereo effettuato.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 1526 del 07.05.2012, il Comune ha comunicato che il progetto sarebbe stato redatto da personale interno dell'UTC che verrà affiancato, per la progettazione specialistica, da un supporto tecnico nella qualità di coprogettista, incarico già autorizzato con nota del Commissario prot.n. 1174 del 04.04.2012 purchè eseguito ai sensi delle norme vigenti.</p> <p>Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012, ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha revocato alla CGIAM l'incarico.</p> <p>A seguito della CdS tenutosi in data 25/09/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri/assensi dagli Enti interessati per l'approvazione del progetto.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3910 del 08/10/2012, ha trasmesso copia del Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.</p> <p>L'intervento è stato finanziato con D.C. n. 586 del 07/11/2012 e con D.C. n. 626 del 20/11/2012 sono state avviate le procedure di gara.</p> <p>A seguito delle procedure di gara con D. C. n. 710 del 18/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, e giorno 03/04/2013 ha avuto luogo la formale consegna dei lavori.</p> <p>Con Decreto n. 419 del 07/06/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>In data 23/08/2013 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.</p>	<p>SAL</p>	<p>SOSPENSIONE LAVORI</p> 
------------------------	---	------------	--




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME095	Naso	Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Gattina						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo aumentato con le risorse derivanti dalla mancata realizzazione dell'intervento di Scaletta Zancaea ME117_3 (pari a € 1050.000)	Importo Rimodulato	€ 1.650.000,00
Decreto di Finanziamento	191 - 14/03/2013	Importo Finanziato	€ 1.635.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 579 del 18/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.232.005,50		
				Decreto di Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso esito di gara	363 - 17/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.083,94		
				Decreto di Impegno e Pagamento spese di pubblicazione avviso esito di gara	493 - 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 726,00		
				Decreto di Impegno e Pagamento Presidente Commissione di Gara	497 - 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 629,14		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		TOTALE Finanziamenti	€ 1.635.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 1.235.044,58	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Arch. Mario Sidoti Migliore (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012	Supporto al RUP	Ing. Rossella Zumbè (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012		
Progettista	UTC	Arch. Mario Messina	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n.37 del 1 giugno 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n. 42 del 28.06.2012	
Geologo			Incarico conferito tramite:		Geotecnico	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n. 42 del 28.06.2012	
Direttore Lavori	Arch. Mario Messina	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 459 del 18/06/2013	Assistente al DL			Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:							
Collaudatore Statico	Ing. Giovanni Culici Amato	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 3686 del 18/06/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Giovanni Culici Amato	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 3686 del 18/06/2013		
INDAGINI preliminari affidate a:	Trigeo srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFIDATARIA Esecuzioni Lavori	EVER GREEN SRL UNIPERSONALE	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 341 del 13/05/2013	data contratto	16-lug
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	18-nov

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 37 del 01.06.2011.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 1293 del 16.04.2012 il Comune ha comunicato di voler affidare incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e tali incarichi sono autorizzati dal Commissario con nota prot. n. 1319 del 20/04/2012, purchè conferiti nei rispetti delle norme vigenti.</p> <p>In riscontro alla nota di sollecito del Commissario, con nota acquisita agli atti al prot. n. 227 del 14/01/2013 il Progettista incaricato, ha trasmesso all'Ufficio del Commissario n. 6 copie del Progetto Esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 24/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, ad eccezione del GC di Messina che, con nota prot.n. 1281 del 28/02/2013 richiede integrazioni.</p> <p>In data 28/02/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.</p> <p>Con D.C. n. 191 del 14/03/2013 è stato disposto il Finanziamento dell'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara con D.C. n. 341 del 13/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'Impresa EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,6998%.</p> <p>Giorno 09/07/2013 è stato sottoscritto il contratto.</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
------------------------	--	------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME099	Piraino	Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Partiera, Torre delle Ciavole						Importo ApQ	€ 1.100.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento Lavori S. Leonardo	Decreto n.493 del 25/09/2012	Importo Finanziato	€ 668.652,86	Decreto di Impegno	618 - 30-7-13	Importo dell'Impegno	€ 486.321,04		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari S. Leonardo	Decreto n.79del 07/06/2011	Importo Finanziato	€ 23.210,64	Decreto di Impegno Indagini preliminari S. Leonardo	Decreto n.79del 07/06/2011	Importo dell'Impegno	€ 16.707,42		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari integrative S. Leonardo	Decreto 306 del 04/11/2011	Importo Finanziato	€ 3.049,32	Decreto di pagamento e Impegno Indagini preliminari S. integrative Leonardo	Decreto n. 231 del 18/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.868,62		
				Decreto di pagamento e Impegno GURI (S. Leonardo)	Decreto n. 25 del 15/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.083,94		
				Decreto di pagamento e Impegno esito gara (S. Leonardo)	Decreto n. 219 del 26/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.089,00		
				Decreto di pagamento e Impegno esito gara (S. Leonardo)	Decreto n. 261 del 05/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 442,90		
				Decreto di pagamento e Impegno commissione di gara (S. Leonardo)	Decreto n. 398 del 04/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.158,07		
Decreto di Finanziamento S. Costantino	Decreto 478 del 25/06/2013	Importo Finanziato	€ 321.695,39	Decreto di Impegno S. Costantino	Decreto 767 del 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 239.234,04		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari S. Costantino	Decreto 221 del 16/05/2012	Importo Finanziato	€ 21.610,06	Decreto di Impegno Indagini preliminari S. Costantino	Decreto n. 696 del 18/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 12.468,99		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari Torre delle Ciavole	Decreto 451 del 10/09/2012	Importo Finanziato	€ 17.981,87	Decreto di Impegno e Pagamento Indagini Preliminari	521 - 09/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 11.398,53		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.056.200,14</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 773.147,55</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

#### Figure Tecniche

RUP	Geom. Carmelo Leone (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 89 del 14 giugno 2011	Supporto al RUP	Ing. Adriano Grassi (IAP) (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 26 del 23 gennaio 2012
	Geom. Sarino Giuffrè (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 680 del 28 agosto 2013		Ing. Federica Bottini	Incarico conferito tramite:	Nomina: Decreto n. 89 del 14 giugno 2011 Revoca: Decreto n.37 del 25/01/2012
Progettista	INVITALIA	Ing. Calogero, Morganti, Peligra e Geol. Sabatini	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 646 del 09.05.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	

Geologo (S. LEONARDO - S. COSTANTINO)	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA	Geologo (TORRE CIAVOLE)	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM
Direttore Lavori	Ing. Domenico Gaetano Alampi	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 89 del 07/02/2013				
Direttore Lavori	Ing. Domenico Gaetano Alampi	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 791 del 30/09/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 910 del 30/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 910 del 30/10/2013
Collaudatore Statico	Ing. Carmelo Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 911 del 30/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Carmelo Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 911 del 30/10/2013

INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID SRL GEO PLANTS (Integrative) GEO GAV Srl (S. Costantino) TRIVELISICLIA (Torre della Ciavole)	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto 79 del 7 giu 2011 Decreto 366 del 12 dic 2011 Decreto n. 256 del 04 giu 2012 Decreto n. 529 del 11/10/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Terramare srl (S. Leonardo)	Decreto Affidamento Lavori	735 - 27/12/2012	data contratto
Contratto	09/06/2011 14/12/2011 08/06/2012 GEO GAV	data conclusione lavori	30/07/2011			Verbale inizio attività	13-mag	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.</p> <p><b>SAN LEONARDO:</b></p> <p>- Invitalia ha trasmesso il progetto in data 17.02.2012;</p> <p>- A seguito della Conferenza dei Servizi del 27.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri;</p> <p>Con nota assunta al prot. n.1952 del 31/05/2012 Invitalia ha trasmesso al Commissario il progetto esecutivo con le integrazioni richieste dal parere del GC.</p> <p>Il Progetto consegnato prevedeva, come concordato, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo da parte di RFI. A seguito di rinuncia da parte di RFI al riutilizzo, il Commissario, con nota prot. n. 2623 del 11/07/2012, ha chiesto ad INVITALIA di rimodulare e trasmettere, il Quadro Economico dell'intervento in funzione del mancato riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dalla riprofilatura degli argini del torrente Garofalo.</p> <p>Con nota prot.n. 3232 del 27.08.2012 il RUP ha invitato il GdL a predisporre una variante al progetto, prevedendo la sistemazione del materiale proveniente dagli scavi nel tratto fociale del Torrente Garofalo o, in alternativa, nella medesima area d'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo", e con D. C. n. 660 del 03/12/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso.</p> <p>Con Decreto n. 735 del 27/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Terramare srl, e giorno 14/02/2013 verrà stipulato il contratto..</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 784 del 05/02/2013 il RUP trasmette il verbale di cui all'art. 106</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
STATO DELL'ARTE	<p><b>SAN COSTANTINO:</b></p> <p>Invitalia ha prodotto le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione.</p> <p>Con Decreto n. 256 del 04/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ed il contratto è stato sottoscritto in data 08/06/2012.</p> <p>Le indagini hanno avuto inizio in data 25/07/2012 e sono state completate con la trasmissione dei risultati con nota acquisita al prot.n. 3159 del 21/08/2012</p> <p>In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5110, Invitalia ha trasmesso copia del Progetto Esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi giorno 20/02/2013 risultano acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.</p> <p>Con Decreto n. 478 del 25/06/2013 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con D. C. n. 513 del 05/07/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso.</p> <p>Con D.C. n. 613 del 30/07/2013 è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla TECNO COSTRUZIONI S.r.l. a fronte di un ribasso percentuale pari al 31,4646.</p> <p>In data 10/09/2013 ha luogo la stipula del contratto.</p> <p>Con Decreto n. 767 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>In data 24/10/2013 ha avuto luogo la consegna dei lavori</p>		AVVIATI LAVORI
STATO DELL'ARTE	<p><b>TORRE DELLE CIAVOLE:</b></p> <p>Dopo diversi tentativi con ANAS per la ricerca di collaborazione per il cofinanziamento e la progettazione dell'intervento che interessava un tratto di strada di loro competenza e a seguito della loro mancata disponibilità, il Commissario ha deciso di procedere autonomamente.</p> <p>in virtù dell'Accordo Quadro del 29.11.2011, la CGIAM in data 10/07/2012 ha trasmesso il "Programma Operativo per l'esecuzione del piano di Indagini preliminari" in località Torre delle Ciavole.</p> <p>Con Decreto n. 451 del 10/09/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il piano di indagini preliminari e avviate le procedure di gara.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 529 del 11/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ed in data 09/01/2013 l'aggiudicatario trasmette gli elaborati tecnici.</p>		PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>ME100</b>	<b>Raccuja</b>	<b>Opere di consolidamento – Zona Centro abitato (c.da Zappa)</b>						Importo ApQ	<b>€ 5.000.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Intervento REVOCATO	Importo Rimodulato	<b>€ 0,00</b>
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno		Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	INVITALIA	CGIAM
--------------------	-----------	-------

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Marco Calogero (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 173 del 18.04.2012	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	INVITALIA	Arch. Pulizzi, Ing. Peligra, Ing. Coroneo, Ing. Zumbè	Incarico conferito tramite:	nota n. 425 del 10/02/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP (a seguito di rinuncia del DRPC di Messina precedentemente incaricato).</p> <p>Il DRPC, con nota acquisita al prot.n. 954 del 21.03.2012, ha trasmesso copia del piano delle indagini geognostiche e del monitoraggio strumentale geotecnico dell'intervento da loro stessi effettuate, in virtù dell'incarico precedentemente conferitogli.</p> <p>In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, la stessa ha trasmesso, con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, la restituzione dei dati da rilievo aereo effettuati, e con nota acquisita al prot. n. 1258 del 12 aprile 2012 la stessa ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari alla progettazione da realizzare.</p> <p>Nel Corso del Comitato del 18/05/2012 è stato deciso di sospendere ogni attività.</p>	SAL	INTERVENTO REVOCATO
------------------------	---	-----	---------------------





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

ME105	Rometta	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare				Importo n.p.c.	Importo n.p.c.
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (AQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010	note:	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impiego		Importo dell'Impiego	Economie da finanziamento
							Eventuali Economie da ribasso
<b>Figure Tecniche</b>							
RUP	Ing. Nicolò Camata Comune	Incarico conferito tramite:	decreto n. 578 del 18/07/2013	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	ARTEC Associati srl	Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistenza al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord. Sicurezza fase Esecuzioni		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Cultivatore Strada		Incarico conferito tramite:		Collaboratore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	
INDAGINI preliminari affidate a contratto	Decreto di affidamento INDAGINI	data conclusione lavori	AFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	data presunta di termine lavori
<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2371 del 27/06/2012 l'ARTIA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2532 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto definitivo generale delle opere e della documentazione amministrativa, e con nota prot.n. 4103 del 16/10/2012 il Commissario ha invitato il Comune a trasmettere in tempi brevi copia del progetto esecutivo.</p> <p>In data 07/03/2013, con nota prot.n. 1351, l'UTC trasmette alla Struttura Commissariale il Progetto Definitivo dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n. 3503 del 12/06/2013 l'ARTIA Serv.3 esprime positivamente il parere di propria competenza. A seguito della CdS di giorno 31/07/2013 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento (progetto definitivo).</p> <p>In data 08/11/2013, con nota prot.n. 6724, la ARTEC srl trasmette copia del progetto esecutivo dell'intervento.</p>							
STATO DELL'ARTE	SAL			PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI			



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME106	Sant'Alessio Siculo	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato						Importo ApQ	€ 5.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	Comitato 21 OTT 2010	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno			
Decreto di acquisizione e finanziamento progetto esecutivo	n. 187 del 26/04/2012	Importo Finanziato	€ 191.864,80	Decreto di Impegno competenze di progettazione	n. 340/13 del 10/05/2013	Importo dell'impegno	€ 191.864,80		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	660 - 09/08/2013	Importo dell'impegno	€ 2.149,68		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	785 - 27/09/2013	Importo dell'impegno	€ 2.028,85		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	869 - 17/10/2013	Importo dell'impegno	€ 903,73		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione affidamento DL	932 - 05/11/2013	Importo dell'impegno	€ 3.959,12		
		TOTALE Finanziamenti	€ 191.864,80			TOTALE IMPEGNI	€ 200.906,18		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## CONVENZIONI

Figure Tecniche							
RUP	Arch. Gaetano Farana (Responsabile dell'UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 239 del 24.05.2012	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 239 del 24.05.2012
Progettista	Comune: professionista esterno Ing. Francesco Giordano	Incarico conferito tramite:	Delibera di Giunta Municipale N.167 del 15/07/1997	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Ugo Piacentini	Incarico conferito tramite:	Delibera di Giunta Municipale N.250 del 05/11/1997	Geotecnico	Ing. Calogero Valore	Incarico conferito tramite:	Delibera di Giunta Municipale N.249 del 05/11/1997
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	837 - 09/10/2013	data contratto	
contratto	data conclusione lavori		ATI - Angelo De Cesaris srl	verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi in data 21/10/2010 con nota prot. N.629 del 17/11/2010 l'intervento è stato trasmesso all'ARTA.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, con nota acquisita al prot. N. 996 del 23/03/2012, ha comunicato al Commissario essere l'ente beneficiario dell'intervento e lo invita a raccordarsi con il Comune di S.Alessio Siculo.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1069 del 29/03/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al - 3° Lotto Funzionale Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato I-STRALCIO ESECUTIVO</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 187 del 26/04/2012 è stata acquisita la progettazione definitiva eseguita da progettisti incaricati dal Comune.</p> <p>In sede di conferenza dei servizi del 15/05/2012 sono state richieste integrazioni al fine di attemperare alle prescrizioni formulate dagli Enti.</p> <p>A seguito dell'adeguamento del progetto, con nota prot. n. 2155 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso all'ARTA Serv.3 copia del progetto munito di tutti i visti di approvazione e tutta la documentazione tecnico-amministrativa, ai fini dell'emissione del Decreto di finanziamento.</p> <p>In data 30-05-2013 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 126 del 11.03.2013 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4065 del 08/07/2013 il RUP dichiara che gli elaborati di progetto in formato PDF, messi a gara, sono conformi agli elaborati in formato cartaceo, debitamente sottoscritti da tutti i soggetti interessati.</p> <p>Con Decreto n. 627 del 31/07/2013 si prende atto del DDG n. 126 del 11/03/2013 dell'ARTA di finanziamento dell'intervento, approvazione bando e disciplinare di gara.</p> <p>Con Decreto n. 837 del 09/10/2013 viene comunicata alla Angelo De Cesaris srl l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p>	<p>SAL</p>	<p>Affidamento Lavori</p> 
----------------------------	---	------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME109	San Pier Niceto	Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	734 - 21/12/2012	Importo Finanziato	€ 552.953,81	Decreto di Impegno	364 - 20/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 429.593,24		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto n. 313 del 11/11/2011	Importo Finanziato	€ 47.046,19	Decreto di pagamento e impegno indagini preliminari	Decreto n. 374 del 19/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 33.639,73		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 600.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 463.457,97</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA

Figure Tecniche

RUP	Geom. Francesco Maio (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale N. 301 del 31 ott 2011	Supporto al RUP	Arch. Giovanni Plero Di Magro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale N. 301 del 31 ott 2011
Progettista	INVITALIA	Ing. Imbroglia, Ing. Coroneo, Arch. Pulizzi, Ing. Peligra, Ing. Zumbà	Incarico conferito tramite:	nota prot. n. 425 del 10 feb 2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 76 del 01/02/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 76 del 01/02/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Alongi Ugo Maria	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 200 del 18/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante) (IAP)	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 345 del 30 novembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Gresy Appalti srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 33 del 21/01/2013	data contratto	12/03/2013
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	03-lug	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia. A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 345 del 30.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari, ad oggi concluse.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4359 del 26/10/2012 Invitalia ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari.</p> <p>Con D.C. n. 734 del 21/12/2012 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 33 del 21/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Gresy Appalti srl che ha offerto un ribasso percentuale pari a 29,9559%.</p> <p>In data 04/03/2013 il RUP e la Gresy Appalti srl sottoscrivono Verbale di Accertamento permanenza condizioni per immediata esecuzione dei lavori.</p> <p>In data 20/05/2013, con Decreto n. 364 è stato disposto l'impegno delle somme.</p> <p>In data 03/07/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI 
-----------------	--	-----	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME113	Santa Marina Salina	Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro					Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
Decreto di Finanziamento rilievi batimetrici	Decreto n. 123 del 26/03/2012	Importo Finanziato	€ 22.464,00	Decreto di Impegno e pagamento rilievi batimetrici	Decreto n. 123 del 26/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 22.464,00	
Decreto di Finanziamento Plottaggio Tavole Grafiche	432 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 494,77	Decreto di Impegno Plottaggio Tavole Grafiche	432 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 494,77	
Decreto di Finanziamento pubblicazione Avviso pubblico VIA	Decreto n. 630 del 01/08/2013	Importo Finanziato	€ 1.439,90	Decreto di Impegno pubblicazione Avviso pubblico VIA	Decreto n. 630 del 01/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.439,90	
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 24.398,67</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 24.398,67</b>	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	Prov.to Int.le OO.PP.
--------------------	-----------------------

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.460 del 27.10.2010	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	Prov. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.460 del 27.10.2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Bellomo Sebastiano	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1527 del 07.05.2012			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>In data 27.10.2010 la progettazione è stata affidata al Prov. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria. A seguito della riunione del 21/09/2011, è stata data priorità agli interventi di difesa costiera da via Nero a Punta Lingua.</p> <p>Con nota prot.n. 2234 del 20.06.2012, il Prov. Interr. OO.PP. ha comunicato essere in corso la rimodulazione delle scelte progettuali.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/02/2013.</p> <p>Con nota prot. n. 1493 del 11/03/2013 il Provveditorato trasmette il Progetto Generale Definitivo per un importo pari ad € 3.700.000,00 ed il Progetto Esecutivo 1°Stralcio per un importo di € 2.000.000,00.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi del 10/05/2013, si resta in attesa dei pareri non ancora pervenuti.</p>	SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	-----	--




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME115_1	Sant'Angelo di Brolo							Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 interventi.	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	151 - 27/7/2011	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di Impegno	24 - 15/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.675.342,21		
				Decreto di Impegno AVCP	95 - 07/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
				Decreto di Impegno GURI	178 - 04/08/2011	Importo dell'Impegno	€ 2.170,62		
				Decreto di Impegno PUBLIKOMPASS	229 - 20/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 3.528,00		
				Decreto di Impegno MANZONI	247 - 28/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 2.520,00		
				Decreto di Impegno GURI	299 - 27/10/2011	Importo dell'Impegno	€ 895,23		
				Decreto di Impegno MANZONI	362 - 05/12/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.452,00		
				Decreto di Impegno Commissione gara	372 - 13/12/2011	Importo dell'Impegno	€ 4.375,37		
				Decreto di Impegno PUBBLICAZIONI	86 - 29/02/2012	Importo dell'Impegno	€ 7.175,50		
		TOTALE Finanziamenti	€ 3.000.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 2.698.058,93		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 170 del 17/04/2012	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:			
Progettista	DRPC	Ing. A. Sorge, Arch. F. Benedetti	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot. n. 10523 del 19/10/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. A. Sorge, Arch. F. Benedetti (DRPC)	Incarico conferito tramite: nota in entrata prot. n. 10523 del 19/10/2011		
Geologo	Geol. Giuseppe Basile (Serv. RIA)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot. n. 10523 del 19/10/2011				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DI			Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:							
Collaudatore Statico	Ing. Mariagrazia Mafodda	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.291 del 31.01.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Mariagrazia Mafodda	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.291 del 31.01.2012		
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. Srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	A.T.I. MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo) - AN.CA.MA. S.R.L. (Mandante)	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 295 del 26/10/2011	data contratto	15/11/2011
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	29/11/2011	data presunta di termine lavori	24/08/2012

STATO DELL'ARTE	<p>L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.</p> <p>In data 19.10.2011 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.</p> <p>A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 295 del 26/10/2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 15/11/2011.</p> <p>I lavori sono stati avviati il 29/11/2011.</p> <p>Con nota prot.n. 281/65 del 08.08.2012 il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della Perizia di Variante e Suppletiva, per l'autorizzazione di competenza.</p> <p><b>In data 08.08.2012 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.</b></p> <p>Il Commissario, data l'urgenza delle attività previste nell'ambito della PVS ai lavori, ha convocato il 11.09.2012 un tavolo tecnico, in base agli esiti della quale, con nota prot. n. 3456 del 12/09/2012 sono state richieste integrazioni alla PVS presentata, successivamente acquisite al prot.n. 4017 del 12/10/2012.</p> <p>In data 19/11/2012, con D.C. n. 624, è disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili siti nel Comune.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 24 del 15/01/2013 è stato rimodulato l'impegno, prendendo atto della PVS approvata dal RUP.</p> <p>In data 01/03/2013, con nota prot.n. 1308, il RUP trasmette copia del Verbale di Ripresa Lavori</p>	SAL	 <p>AVVIATI LAVORI</p>
-----------------	--	-----	---





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME115_2	Sant'Angelo di Brolo							Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli	Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note:	Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 interventi. Il Comitato del 18/05/2012 prende atto dei finanziamenti rimodulati a seguito della riunione del 03/04/2012	Importo Rimodulato	€ 2.930.000,00	
Decreto di Finanziamento	n. 301 del 28/06/2012	Importo Finanziato	€ 2.930.000,00	Decreto di Impegno	n. 15 del 11/01/2013	Importo dell'impegno	€ 2.412.808,79			
				Decreto di Impegno GURI	N. 368 del 17.07.2012	Importo dell'impegno	€ 1.964,56			
				Decreto di Impegno GURI (esito gara)	N. 554 del 24.10.2012	Importo dell'impegno	€ 895,23			
				Decreto di Impegno e Pagamento Publikompass	n. 500 del 27/09/2012	Importo dell'impegno	€ 5.000,33			
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	577 - 06/11/2012	Importo dell'impegno	€ 600,00			
		TOTALE Finanziamenti	€ 2.930.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 2.421.268,91	Economie da finanziamento		
								Eventuali Economie da ribasso		

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Vittorio Ricciardi (Comune)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 171 del 17/04/2012	Supporto al RUP	Arch. Francesco Giuseppe Fricano	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 278 del 15/04/2013	
Progettista	DRPC Ing. A. Sorge, Ing. C. La Rocca, Ing. V. Nicolosi, Ing. E. Raciti	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 6051 del 06.07.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. C. La Rocca [DRPC]	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 6051 del 06.07.2011	
Geologo	Geol. Filippo Cappotto, Dott. Geol. Davide Siragusano (Figure Esterne)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.324 del 16.03.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Sandro Orlando	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 638 del 21/11/2012	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Sandro Orlando	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 638 del 21/11/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Carlevaro Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 177 del 11/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Carlevaro Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 177 del 11/03/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ATI AVENI SRL - GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI	Decreto Affidamento Lavori	532 - 15/10/2012	data contratto
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.</p> <p>La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 955 del 21/03/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto esecutivo I Stralcio. A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2</p> <p>A seguito delle Conferenza dei Servizi del 16/04/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli Enti e a seguito di validazione del RUP il progetto è stato finanziato con Decreto n. 301 del 28.06.2012.</p> <p>Con Decreto n. 532 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il Contratto è stato stipulato in data 25/10/2012</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 è stato disposto l'impegno della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera.</p> <p>In data 29/01/2013, con nota prot.n. 561, il DL invita l'aggiudicatario dei lavori alla formale consegna parziale dei lavori che avrà luogo giorno 01/02/2013.</p> <p>In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1584, l'Ufficio del Commissario autorizza il DL a redigere Perizia di Variante Strutturale.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 31/10/2013, si è in attesa dell'approvazione della PVS da parte del RUP.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	---	-----	----------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME119	Sinagra	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 764 del 24/09/2013	Importo Finanziato	€ 2.972.159,55	Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
Decreto di definanziamento	n. 764 del 24/09/2013	Importo defanziato di cui al D.C. n. 437 del 03/09/2013	€ 15.997,61	Decreto di Impegno GURI avviso di gara	840 - 09/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.023,97		
Decreto di Finanziamento Indagini	437 - 03/09/2012	Importo Finanziato	€ 43.838,06	Decreto di Impegno e Pagamento somme per plottaggio	914 - 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 287,50		
				Decreto di Impegno Plottaggio	914 - 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 287,50		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 2.311,47</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

Figure Tecniche

RUP	Ing. Cappotto (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.27 del 23.02.2011	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicollicchia	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.27 del 23.02.2011
Progettista	INVITALIA	Ing. Marco Calogero, Ing. Fabio Ferla, Ing. Giuseppe Morganti, Ing. Alberto Pelgra	Incarico conferito tramite:	nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a.	GEO PLANTS Sr	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
Contratto	26/09/2012	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011 In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con note acquisite ai prott. n. 753 del 07/03/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati. Con nota acquisita al prot. n. 1900 del 29/05/2012, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, vistato dal RUP in data 10/07/2012.</p> <p>Con D.C. n. 437 del 03/09/2012 sono state finanziate e approvate le specifiche tecniche afferenti il piano di indagini preliminari.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 486 del 24/09/2012 il Commissario ha disposto l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluse.</p> <p>In data 04/03/2013, con nota prot.n. 1326, la CGIAM trasmette relazione geologica provvisoria ed i relativi elaborati.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/09/2013 risultano acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 764 del 24/09/2013 è stato finanziato l'intervento.</p>	SAL	 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA
-----------------	---	-----	---

REPUBBLICA  
ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE  
SICILIANA


ME115_3	Sant'Angelo di Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano						Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note:	Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 interventi. Il Comitato del 18/05/2012 prende atto dei finanziamenti rimodulati a seguito della riunione del 03/04/2012	Importo Rimodulato	€ 2.070.000,00
Decreto di Finanziamento	456 - 18/06/2013	Importo Finanziato	€ 2.069.505,23	Decreto di Impegno	843 - 10/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.580.612,53		
Decreto di Finanziamento Plottaggio Tavole Grafiche	433 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 494,77	Decreto di Impegno Plottaggio Tavole Grafiche	433 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 494,77		
				Decreto di Impegno e pagamento commissione di gara	Decreto n. 647 del 05/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.721,94		
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 693 del 05/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 980,49		
				Decreto di Impegno e Pagamento spese di pubblicazione	788 - 27/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 617,10		
		TOTALE Finanziamenti	€ 2.070.000,00			TOTALE IMPEGNI	€ 1.584.426,83	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Tindaro Pino Scaffidi (Comune)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 172 del 17/04/2012	Supporto al RUP	Dott. Geol. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 362 del 17/05/2013
Progettista	INVITALIA Arch. Pulizzi, Ing. Imbroglia, Ing. Grassi, Ing. Calogero	Incarico conferito tramite:	Nota In uscita prot.n.425 del 10.02.2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Gianluca Coroneo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 714 del 10/09/2013	Direttore Operativo	Ing. Rossella Zumbè	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 714 del 10/09/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Giuseppe Morganti	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 714 del 10/09/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Fortunato Lo Presti	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6039 del 08.10.2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Fortunato Lo Presti	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6039 del 08.10.2013

INDAGINI preliminari affidate a:	METE.ERO	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	DIVA srl	Decreto Affidamento Lavori	679 - 28/08/2013	data contratto	24-set
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.</p> <p>Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.</p> <p>In data 21.03.2012 il DRPC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche effettuate propedeutiche alla progettazione.</p> <p>In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con note acquisite ai prott. n. 753 del 07/03/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.</p> <p>A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2</p> <p>Con nota prot. 2394 del 28/06/2012 il Commissario, a seguito di richiesta di CGIAM, ha chiesto al DRPC di voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ad oggi non pervenute.</p> <p>A seguito di riscontro negativo alle integrazioni richieste, il Commissario, con nota prot.3332 del 06/09/2012, ha invitato il Dott. Geol. Filippo Cappotto a fornire supporto al gruppo di progettazione per la stesura del progetto esecutivo.</p> <p>Il Dott. Geol. Filippo Cappotto, con nota prot.n. 4808 del 20/11/2012 ha trasmesso all'Ufficio del Commissario le integrazioni geologiche richieste.</p> <p>In data 02/05/2013, con nota prot.n. 2514, Invitalia trasmette copia del Progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, sono stati acquisiti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con Decreto n. 456 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con D. C. n. 505 del 02/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito alla procedura negoziata.</p> <p>Con D.C. n. 679 del 28/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Diva srl.</p> <p>In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.</p>	<p>SAL</p>	<p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p> 
----------------------------	---	------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME120	Sinagra	Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini						Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 364,03	Decreto di Impegno Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 364,03		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 364,03</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 364,03</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI CGIAM

Figure Tecniche

RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale 28 del 23-02-2011	Supporto al RUP	Geom. Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale 28 del 23-02-2011
Progettista	Comune	Incarico conferito tramite:	nota prot. N. 156 del 26/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>In data 26.02.2011 la progettazione è stata affidata al Comune.          Con nota prot. 975 del 28/06/2011 è stato sollecitato il Comune alla trasmissione del progetto esecutivo.          In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.</p>			SAL	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO
-----------------	--	--	--	-----	----------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>ME121</b>	<b>Sinagra</b>	<b>Drenaggi e gabbioni - C.da Mulinazzo</b>						Importo ApQ	<b>€ 2.500.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	<b>A</b>	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## CONVENZIONI

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 26 del 23.2.2011	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicolichia	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.26 del 23.02.2011
Progettista	Comune	Incarico conferito tramite:	nota prot. N.156 del 26/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	SGM srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>In data 26.02.2011 l'incarico di progettazione è stato affidato al Comune.          Il comune, con nota prot. 1216 del 25/07/2011, ha richiesto autorizzazione per conferimento incarico di revisione dello studio geologico.          L'Ufficio del Commissario ha richiesto al Comune con nota prot.n. 594 del 22.02.2012, apposita relazione attestante gli adempimenti posti in essere al fine di realizzare i lavori          il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2946 del 31/07/2012, ha trasmesso al RUP copia delle specifiche tecniche relative alle indagini geognostiche per la convalida di competenza.          Le indagini sono state affidate dallo stesso Comune in data 04/10/2012.          In data 14/06/2013, con nota prot.n. 3574, il Comune trasmette n. 5 copie del Progetto Esecutivo.          A seguito della cdS tenutasi in data 08/07/2013 sono concessi 7 gg ai progettisti per adeguare il progetto a quanto richiesto dall'ARTA (Serv. 3) e dalla Soprintendenza BB.CC.AA.</p>	SAL	ADEGUAMENTO DEL PROGETTO IN CORSO
-----------------	--	-----	-----------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME124	Terme Vigliatore	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana						Importo ApQ	€ 3.823.875,00
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'INTERVENTO TRANSITA DALLA LETTERA A ALLA B	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno			
Decreto di Finanziamento attività specialistiche	Decreto n. 690 del 11/12/2012	Importo Finanziato	€ 116.233,51					Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno Campionamento ed Analisi	Decreto n. 731 del 20/12/2012	Importo Finanziato	€ 23.760,00	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno Rilievi	Decreto n. 233 del 27/03/2013	Importo Finanziato	€ 12.584,00	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno Studio Geologico	Decreto n. 304 del 19/04/2013	Importo Finanziato	€ 26.693,51	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno DHI Italia	Decreto n. 746 del 17/09/2013	Importo Finanziato	€ 13.189,00	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Messina	Decreto n. 779 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 9.075,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Catania	Decreto n. 777 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 22.800,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 116.233,51</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 108.101,51</b>		
								Eventuali Economie da ribasso	


CONVENZIONI Provv.to Int.Le OO.PP.

#### Figure Tecniche

RUP	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 489 del 03/11/2010	REG (CARONTE)	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	
Progettista	Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 489 del 03/11/2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Pacos Srl	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	16/11/2012	data presunta di termine lavori	14/07/2013



<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2011. Con nota acquisita al prot.n.3021 del 30/12/2011 il Provv Interregionale OO.PP. ha trasmesso il progetto primo stralcio esecutivo e successivamente, in data 08.03.2012, ha trasmesso il progetto primo stralcio esecutivo rielaborato secondo quanto richiesto dall'ARTA Serv.1 in sede di Conferenza Servizi del 09.02.2012.</p> <p>Il Commissario con nota prot. 962 del 22/03/2012, ha trasmesso il progetto all'ARTA serv. 3 al fine dell'emissione del Decreto di finanziamento.</p> <p>In data 11-09-2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 390 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 di finanziamento del progetto esecutivo.</p> <p>Con nota prot. n. 3459 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmesso i D.D.G. di finanziamento al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria invitandolo ad attivare, in tempi brevi l'iter di affidamento dei lavori.</p> <p>In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4275, il RUP comunica l'aggiudicazione dei lavori a favore della Pacos srl (ribasso del 10,21%).</p> <p>I lavori sono stati consegnati il giorno 16/11/2012 ed avranno una durata di circa di 240 giorni.</p> <p>Con Decreto n. 852 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta Pacos srl.</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
------------------------	--	------------	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




ME125	Tortorici	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche – Zona Lembo-Pellizza						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 592 del 08/11/2012	Importo Finanziato	€ 1.452.238,14	Decreto di Impegno	784 - 27/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.019.259,96		
Decreto finanziamento progettazione DL e sicurezza	121 del 07/07/2011	Importo Finanziato	€ 124.161,88	Decreto di Impegno PROGETTAZIONE - DL	182 - 09/08/2011	Importo dell'Impegno			
Decreto finanziamento indagini preliminari	220 del 09/09/2011	Importo Finanziato	€ 47.761,86	Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 30,00		
Decreto di revoca decreto n. 121 del 07/07/2012 finanziamento progettazione DL e sicurezza	n. 592 del 08/11/2012	Importo Revocato	€ 124.161,88	Decreto di Impegno e pagamento INDAGINI	110 - 16/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 31.730,78		
				Decreto di impegno e pagamento commissione gara progettazione	338 - 11/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 136,35		
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazione GURI	296 - 18/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.021,04		
				Decreto di impegno e pagamento Commissione gara	393 - 03/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.118,87		
				Decreto di impegno e pagamento Progettazione	473 - 20/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 43.959,61		
				Decreto di impegno e pagamento Avviso pubblicazione esito di gara	494 - 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.089,00		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.624.161,88</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.098.945,61</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Giampiero Di Magro (limitatamente all'assegnazione dell'incarico Progettazione)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 120 del 7 luglio 2011	RUP (Lavori) Supporto al RUP	Geom. Calanni R. Carmelo (UTC) Ing. Giampiero Di Magro	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 143 del 02.04.2012	nota del serv.3° Tecnico Lavori Pubblici prot.n. 10552 del 28.07.2010
Progettista	Ing. Mario Salita (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Mario Salita (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 143 del 02.04.2012	Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011
Geologo	Geol. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 2271 del 26.10.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Mario Salita (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Resp. Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Diego Mammo Zagarella	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 290 del 18.04.2013					
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 909 del 30.10.2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 909 del 30.10.2013	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID s.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 250 del 3 ottobre 2011	AFFIDATARIA	Decreto Affidamento Lavori	n. 271 del 11/04/2013	data contratto	
----------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------------------------	-----------------------	----------------	--

Contratto	04/10/2011	data conclusione lavori	15/11/2011	Esecuzioni lavori	ITAL PROGET S.R.L.	Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori
STATO DELL'ARTE	<p>A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata, con Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011 ad un professionista esterno.</p> <p>Con Decreto n. 250 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.</p> <p>Con nota prot.n. 515 del 16.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.943 del 21/03/2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo.</p> <p>In sede di Conferenza di Servizi del 29/05/2012 sono stati acquisiti i pareri degli Enti con prescrizioni ed il progetto rielaborato in ottemperanza alle stesse è stato acquisito al prot. n. 2351 in data 27/06/2012.</p> <p>A seguito di validazione del progetto da parte del RUP, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 592 del 08/11/2012.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Società ITAL PROGET S.R.L. (ribasso pari al 30,1982%).</p> <p>In data 31/05/2013 si provvederà alla formale consegna dei lavori.</p> <p>Con Decreto n. 784 del 27/09/2013 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>							
	<p>SAL</p> <p>AVVIATI LAVORI</p> 							




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME126	Tortorici	Muri su pali e raccolta acque – Zona S. Antonio-Sciortino						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	573 - 06/11/2012	Importo Finanziato	€ 473.375,06	Decreto di Impegno	769 - 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 363.140,93		
Decreto finanziamento progettazione DL e sicurezza	decreto n. 119 del 07/07/2011	Importo Finanziato	€ 73.473,07	Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 30,00		
Decreto finanziamento indagini preliminari	decreto n. 307 del 04/11/2011	Importo Finanziato	€ 26.624,94	Decreto di Impegno e pagamento INDAGINI	273 - 11/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 14.738,78		
				Decreto di Impegno e pagamento commissione gara progettazione	337 - 11/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 90,90		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	518 del 08/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 861,74		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 573.473,07</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 379.087,35</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP (Progettazione)	Ing. Giampiero Di Magro (limitatamente all'assegnazione dell'incarico Progettazione)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 118 del 7 luglio 2011	RUP (Lavori) Supporto al RUP	Geom. Calanni R. Carmelo (UTC) Ing. Giampiero Di Magro	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 144 del 02.04.2012	nota del serv.3* Tecnico Lavori Pubblici prot.n. 10546 del 28.07.2010 Decreto Commissariale n. 144 del 02.04.2012
Progettista	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011	
Geologo	Dott. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 2741 del 02.12.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL	Decreto di affidamento INDAGINI	decreto n. 334 del 24 novembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Matina Geom. Giovanni	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 242 del 02/04/2013	data contratto
Contratto	30/11/2011	data conclusione lavori	26/12/2011			Verbale inizio attività	06-giu	data presunta di termine lavori

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidata in data 25.08.2011 a professionista esterno.</p> <p>Con Decreto n. 334 del 24.11.2011, è stata affidata la realizzazione del piano di indagini preliminari ad oggi completato.</p> <p>Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 1303 del 18.04.2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo.</p> <p>In sede di Conferenza di Servizi del 11.07.2012 il RUP si è impegnato a portare a termine il procedimento finalizzato alle procedure espropriative.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2672 del 12/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha richiesto documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza.</p> <p>In data 19/09/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto n. 573 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 242 del 02/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Matina Geom. Giovanni</p> <p>In data 06/06/2013 è avvenuta la formale consegna dei lavori.</p> <p>Con Decreto n. 769 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
------------------------	---	------------	---



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME127	Tortorici	Muri e paratie monte valle e opere idrauliche – Zona S.Paolo					Importo ApQ	€ 2.300.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Calanni Carmelo (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 489 del 27/06/2013	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	-	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Geol. Filippo Cappotto	Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari/ affidate a:	GEO PLANTS S.r.l	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 563 del 15/07/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2564 del 09/07/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario di averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2565 del 09/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2761 del 17.07.2012 il Comune ha trasmesso alla Struttura Commissariale tutta la documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti.</p> <p>Con nota prot.n. 3197 del 23.08.2012 il RUP ha chiesto al Commissario la disponibilità di figure professionali a cui affidare la redazione dello studio geologico e quant'altro di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva. Il Commissario, con nota prot. n.3293 del 03/09/2012, ha comunicato al RUP il nulla osta all'immediato avvio delle procedure per il conferimento del nuovo incarico.</p> <p>In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5106, il RUP ha trasmesso al Commissario richiesta di integrazioni al piano di indagini originario ricevuta dalla RTI Dinamica srl - Studio Colonna srl.</p> <p>In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1577, il RUP trasmette alla Struttura Commissariale il preventivo del programma delle indagini geognostiche integrative.</p> <p>Con Decreto n. 491 del 27/06/2013 sono state approvate le specifiche tecniche del piano di indagini preliminari</p> <p>Con Decreto n. 563 del 15/07/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini integrative a favore della GEO PLANTS S.r.l che ha offerto un ribasso percentuale pari al 47,2125%.</p> <p>In data 06/08/2013 viene sottoscritto il Verbale di Consegna delle Aree alla Geo Plants srl, ed in data 04/09/2013 sono state ultimate le attività della stessa.</p>	SAL	PROGETTAZIONE IN CORSO
-----------------	---	-----	------------------------




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME128	Tortorici	Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	574 - 06/11/2012	Importo Finanziato	€ 476.038,45	Decreto di Impegno	n. 547 del 12/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 344.390,16		
Decreto finanziamento progettazione DL e sicurezza	decreto n. 122 del 07/07/2011	Importo Finanziato	€ 72.795,49	Decreto di Impegno PROGETTAZIONE - DL	181 - 09/08/2011	Importo dell'Impegno			
Decreto finanziamento indagini preliminari	decreto n. 219 del 09/09/2011	Importo Finanziato	€ 23.961,55	Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 30,00		
				Decreto di Impegno e pagamento INDAGINI	111 del 16/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 16.766,30		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	318 del 06/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 90,90		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	467 del 20/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 333,06		
		TOTALE Finanziamenti	€ 572.795,49			TOTALE IMPEGNI	€ 361.835,42		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

## Figure Tecniche

RUP	Ing. Giampiero Di Magro (limitatamente all'assegnazione dell'incarico Progettazione)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 117 del 7 luglio 2011	RUP (Lavori) Supporto al RUP	Geom. Buttafarro Carmelo (UTC) Ing. Giampiero Di Magro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2012	nota del serv.3° Tecnico Lavori Pubblici prot.n. 10547 del 28.07.2010 Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2012
Progettista	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	
Geologo	Dott. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.2271 del 26.10.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011					
Collaudatore Statico	Ing. Ignazio Cusmano (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1810 del 25/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID s.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 251 del 3 ottobre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	AVENI SRL	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	10/01/2013
Contratto	04/10/2011	data conclusione lavori	08/11/2011			Verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>A seguito di procedure di gara la progettazione è stata affidata con Decreto Commissariale n. 181 del 09.08.2011 a professionista esterno.</p> <p>Con Decreto n. 251 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.</p> <p>In data 10.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2048 del 07/06/2012 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della Conferenza di Servizi del 25/06/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2758 del 17/07/2012 ha trasmesso il verbale di verbale di verifica e validazione e l'attestazione del Direttore dei lavori in merito alla immediata eseguibilità degli stessi.</p> <p>Con Decreto n. 574 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con Decreto n. 645 del 27/11/2012 è stato approvato lo schema lettera d'invito alla Procedura di gara.</p> <p>Con nota prot. n. 5465 del 20/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Aveni srl.</p> <p>In data 10/01/2013 è avvenuta la stipula del contratto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 547 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 344.390,16.</p> <p>Con Decreto n. 926 del 31/10/2013 è decretata la presa atto l'Perizia di Variante, rimodulazione quadro economico ed impegno somme.</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
----------------------------	--	------------	--






UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME130	Castel di Tusa	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	B#	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	transitato dalla Lettera A alla Lettera B nel corso del Comitato di Coordinamento e Controllo del 24 febbraio	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 11 del 27 gennaio 2011	Importo Finanziato	€ 280.137,46	Decreto di Impegno	Decreto n. 11 del 27 gennaio 2011	Importo dell'Impegno	€ 280.137,46	LAVORI DI SOMMA URGENZA	
Decreto di Finanziamento attività specialistiche	Decreto n. 689 del 11/12/2012	Importo Finanziato	€ 104.160,82	Decreto di Impegno Campionamento ed Analsi	Decreto n. 235 del 28/03/2013	Importo Finanziato	€ 17.820,00		
				Decreto di Impegno e pagamento DHI Italia	Decreto n. 749 del 17/09/2013	Importo Finanziato	€ 27.830,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Messina	Decreto n. 776 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 9.075,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Catania	Decreto n. 778 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 21.600,00		
Decreto di Finanziamento Integrativo ed Impegno per la Relazione Geologica	Decreto n. 424 del 07/06/2013	Importo Finanziato	€ 3.117,38	Decreto di Finanziamento Integrativo ed Impegno per la Relazione Geologica	Decreto n. 424 del 07/06/2013	Importo Finanziato	€ 20.953,20	Economie da finanziamento	
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 387.415,66</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 377.415,66</b>	Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI									
Provv.to Int.le OO.PP.									
Figure Tecniche									
RUP	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 491 del 03/11/2010	REO (CARONTE)	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:			
Progettista	Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 491 del 03/11/2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:			
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:			
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:			
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI			AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Costruzioni Bruno Teodoro spa	Decreto Affidamento Lavori	data contratto		
Contratto	data conclusione lavori					Verbale inizio attività	16-nov	data presunta di termine lavori	14/07/2013

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>La progettazione è stata affidata al Prov. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2010. In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria ha trasmesso il progetto I Stralcio esecutivo.</p> <p>In sede di Conferenza del 29/02/2012 sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni ed il Prov. Interr. OO.PP., con nota acquisita al prot.n. 1000 del 23.03.2012, ha trasmesso il progetto rielaborato inoltrato dal Commissario all'ARTA, con nota prot.n. 1023 del 27.03.2012, ai fini dell'emissione del Decreto di Finanziamento.</p> <p>In data 11/09/2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 290 del 24/05/2012 di finanziamento del progetto esecutivo.</p> <p>Con nota prot. n. 3460 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmesso i D.D.G. al Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria invitandolo ad attivare, in tempi brev,i l'iter di affidamento dei lavori .</p> <p>In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4276, il RUP ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori.</p> <p>I lavori sono stati consegnati in data 16/11/2012 ed avranno una durata di circa 240 giorni.</p> <p>Con DDG n. 577 viene finanziata la Perizia di Variante dell'intervento.</p> <p>Con Decreto n. 847 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta Costruzioni Bruno Teodoro spa.</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
------------------------	--	------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>ME131</b>	<b>Ucria</b>	<b>Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile - Belvedere</b>					Importo ApQ	€ 1.261.000,00
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria APQ	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno	Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	

## CONVENZIONI

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Gianfranco Vincullo	Decreto di incarico		Supporto al RUP		Decreto di incarico
Progettista	Ing. Cosentini Matteo	Nota di incarico	Delibera di G.M. n. 329 del 15/10/1985	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di incarico
Geologo		Incarico conferito tramite:				
Direttore Lavori		Nota di incarico		Assistente al DL		Nota di incarico
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di incarico				
Collaudatore Statico		Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di incarico
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

## STATO DELL'ARTE

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2847 del 23/06/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato al Commissario di averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto. Con nota prot. n. 2904 del 27/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota prot. n. 3039 del 03/08/2012 il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto esecutivo, datato 05/07/2010, e di tutti atti amministrativi richiesti. In data 23/04/2013, con nota prot.n. 2370, l'Ufficio del Commissario trasmette all'ARTA copia del progetto, affinché lo stesso possa procedere all'emissione del parere di propria competenza.

Con nota prot.n. 4879 del 08/08/2013 l'ARTA comunica che il progetto ricevuto non ha i requisiti di G.P.1.

SAL

PROGETTAZIONE IN CORSO




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME132	Ucria	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – Zona via Annunziata						Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	458 - 18/06/2013	Importo Finanziato	€ 959.845,87	Decreto di Impegno			Importo dell'Impegno		
				Decreto di Impegno e pagamento componente commis. Gara	Decreto n. 640 del 05/08/2013		Importo dell'Impegno	€ 1.276,56	
				Decreto di Impegno e pagamento Indagini	Decreto n. 651 del 06/08/2013		Importo dell'Impegno	€ 31.809,03	
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 694 del 05/09/2013		Importo dell'Impegno	€ 1.001,45	
				Decreto di Impegno e pagamento Commissione di Gara	Decreto n. 811 del 08/10/2013		Importo dell'Impegno	€ 2.320,59	
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione esito di Gara	Decreto n. 933 del 05/11/2013		Importo dell'Impegno	€ 617,10	
		TOTALE Finanziamenti	€ 959.845,87				TOTALE IMPEGNI	€ 37.024,73	
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	INVITALIA	CGIAM						
<b>Figure Tecniche</b>								
RUP	Ing. Sidoti Pinto Benedetto	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 563 del 26/10/2012	Supporto al RUP	Geom. Domenico Rigoli	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 563 del 26/10/2012	
Progettista	Ing. Giuseppe Morganti, Ing. Marco Calogero, Ing. Gianluca Coroneo	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 652 del 09.05.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Antonino Scutteri	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 683 del 28/08/2013	Direttore Operativo	Geom. Roberto Coppola	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 683 del 28/08/2013	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:		Ispettore di Cantiere e RSE	Geom. Michele Quarto	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 683 del 28/08/2013	
Collaudatore Statico	Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 915 del 30/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 915 del 30/10/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M.srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 129 del 26/03/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Geo Drilling Srl	Decreto Affidamento Lavori n. 676 del 27/08/2013	data contratto	
Contratto	04/04/2012	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	30-ott	data presunta di termine lavori
								28-apr

STATO DELL'ARTE	<p>In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari ed il contratto è stato firmato in data 04/04/2012.</p> <p>In data 23/10/2012, con nota acquisita al prot.n. 4240, la CGIAM ha trasmesso la Relazione Geologica dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 773 del 05/02/2013 il GDL IAP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS del 08/03/2013, e del parere espresso dal GC di Me, con nota prot.n. 1790 del 25/03/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.</p> <p>In data 06/06/2013 i Progettisti, con nota prot.n. 3457, trasmettono il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo rimodulato.</p> <p>Con Decreto n. 458 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.</p> <p>Con Decreto n. 676 del 27/08/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Geo Drillina Srl (ribasso del 32,9999%).</p>	SAL	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
-----------------	--	-----	---


REPUBBLICA  
ITALIANAUFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1REGIONE  
SICILIANA

ME177	Brolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	502 - 02/07/2013	Importo Finanziato	€ 599.808,08	Decreto di Impegno	766 - 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 432.876,41		
Decreto di Finanziamento Plottaggio Tavole Grafiche	434 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 191,12	Decreto di Impegno Plottaggio Tavole Grafiche	434 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 191,12		
				Decreto di Impegno e pagam. Inagin. Prelimin.	D.C. n. 537 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 13.096,79		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 599.999,20</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 446.164,32</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

## Figure Tecniche

RUP	Arch. Mario Messina (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 357 del 17.07.2012	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 357 del 17.07.2012		
Progettista	INVITALIA Ing. Morganti Ing. Imbroglia Ing. Coroneo	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 1336/UC del 19/04/2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:			
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:			
Direttore Lavori	Ing. Basilio Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 685 del 30/08/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:							
Collaudatore Statico	Ing. Basilio Ceraolo	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n. 5123 del 30/08/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:	Geo Plants srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	AEMME Srl	Decreto Affidamento Lavori	620 - 30/07/2013	data contratto	10/09/2013
Contratto	04/05/2013	data conclusione lavori				Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo.</p> <p>In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota assunta al prot. n. 498 del 16/02/2012, ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.</p> <p>Con nota prot. n. 1336 del 19/04/2012 il Commissario ha affidato la progettazione a INVITALIA. In data 31/01/2013, con nota prot. n. 659, CGIAM trasmette le specifiche tecniche ed i relativi elaborati riguardanti il programma operativo per l'esecuzione delle indagini.</p> <p>Con D. C. n. 140 del 27/02/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano d'indagini, che hanno avuto luogo da giorno 12/03/2013, e sono state portate a termine il 29/03/2013.</p> <p>In data 23/05/2013, con nota prot. n. 3066, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo. A seguito della Cds tenutasi giorno 06/06/2013 e dei pareri acquisiti, con nota prot. n. 3586 del 17/06/2013 il RUP trasmette Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.</p> <p>Con Decreto n. 502 del 02/07/2013 è stato finanziato l'intervento, e con D.C. n. 522 del 09/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito.</p> <p>Con Decreto n. 620 del 30/07/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla AEMME S.r.l., risultata aggiudicataria a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 31,7373%. In data 10/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.</p> <p>Con Decreto n. 766 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	SAL	 <p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p>
-----------------	---	-----	---




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ME178	Caprileone	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)						Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 79 del 06/02/2013	Importo Finanziato	€ 1.000.000,00	Decreto di Rimodulazione Impegno	723 - 11/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 672.617,55		
				Decreto di Impegno Progettazione	204 - 20/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 116.735,60		
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	321 - 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.104,91		
				Decreto di Impegno Pubblicazione Avviso di Gara	403 - 05/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.539,12		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 792.372,18</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche									
RUP	Arch. Gianpiro Di Magro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 376 del 19.07.2012	Supporto al RUP	Geom. Piero Nicolichia	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 376 del 19.07.2012		
Progettista	pH3 Engineering s.r.l	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.	pH3 Engineering s.r.l	Incarico conferito tramite:			
Geologo	Geol. Salvatore Armeli	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n° 13 del 02/02/2012	Assistenza Geologica alla DL	Dott. Geol. Salvatore Armeli	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6210 del 16/10/2013		
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Zaccaro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 373 del 21/05/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Salvatore Zaccaro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 373 del 21/05/2013						
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI affidate a:	Biosurvey	Decreto di affidamento INDAGINI	487 - 27/06/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	C.T.F. srl	Decreto Affidamento Lavori	D. C. n. 272 del 11/04/2013	data contratto	
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	28/06/2013	data presunta di termine lavori	25/11/2013



<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>Il progetto è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune. Il Comune con nota prot. n. 1273 del 13/04/2012 ha trasmesso la documentazione relativa al conferimento degli incarichi per lo studio geologico e per la progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 il progettista incaricato ha trasmesso progetto esecutivo dell'intervento.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi giorno 30/10/2012 e dei pareri conseguentemente acquisiti, si è in attesa dell'adeguamento del progetto a quanto richiesto dall'ARTA Serv. 3 in data 14/12/2012, con nota prot.n. 5356.</p> <p>A seguito del Tavolo Tecnico tenutosi in data 09/01/2012 e del parere espresso dall'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 321 del 17/01/2013, si intendono acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 79 del 06/02/2013 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>Con nota prot.n. 1912 del 29/03/2013, il Commissario invia ai vari Enti richiesta di autorizzazione all'occupazione temporanea del tratto di costa oggetto dell'intervento.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D. C. n. 272 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori a favore della Società' C.T.F. S.R.L. (ribasso percentuale del 29,8728%).</p> <p>Il RUP e l'aggiudicatario dei lavori giorno 06/05/2013 sottoscrivono l'art. 106 c. 3 Regolamento DPR 207/2010.</p> <p>In data 28/06/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.</p> <p>Con Decreto n. 617 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.</p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
------------------------	--	------------	--

REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REPUBBLICA ITALIANA



## ELENCO INTERVENTI B

DOG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimpiazzato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO/LAVORI	
								Impresa	Data inizio lavori
176	AG	002	Caltabellotta	Interventi di consolidamento del centro abitato "Consolidamento a Monte e a Valle della Via Colaninno Vita-2 strada funzionale esecutiva"	€ 600.000,00	Ennesimo nuovo Decreto di Finanziamento nell'agosto del 2011, il Primo Decreto è stato annullato e seguito da un rinvio della Corte dei Conti relativo ai certificati emessi per l'approvazione tecnica. I lavori sono stati aggiudicati in data 02.04.2012 all'impresa Anzalone Luigi & Co. - San Cataldo che ha offerto un ribasso del 24,7985%. In data 02/05/2012 è avvenuta la consegna dei lavori	Avviati Lavori	Anzalone Luigi & Co.	
AP VERB. 15/2/2011	AG	003	Cammarata	Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia	€ 1.050.000,00	La Progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento. Il 20/1/2011 affidate indagini geognostiche. Nel corso del comitato del 24 febbraio l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B. I lavori sono stati aggiudicati all'impresa Panepinto Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 26,5087%.	Affidamento Lavori	Panepinto Costruzioni s.r.l.	
965	AG	004	Cattolica Eraclea	Opere di consolidamento - Zona Eraclea Minoa	€ 1.480.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	AG	005	Cianciana	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante ovest del centro abitato	€ 855.618,05	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 194 del 1/4/2011 per un importo di euro 855.618,05. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 06/09/2011 con un ribasso del 23,7603% alla Torsten Costruzioni Contratto sottoscritto il 30/03/2012. Lavori avviati in data 31/05/2012 in data 29/10/2012 sono stati ultimati i lavori	LAVORI ULTIMATI	Torsten Costruzioni	31/05/2012
176	AG	008	Montallegro	Consolidamento della parete Est del Monte Lupo sovrastante il centro abitato	€ 1.435.536,03	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 236 del 13/4/2011 per un importo di euro 1.435.536,03. A seguito di procedura di gara i lavori sono stati affidati alla BCS COSTRUZIONI S.R.L. C/da Ciccè Misiretta. Il Contratto è stato stipulato in data 06/06/2012 e i lavori avviati in data 19/08/2012.	Avviati Lavori	BCS COSTRUZIONI S.R.L.	19/08/2012
176	AG	009	Ravanusa	Consolidamento zona Est Centro abitato 1° stralcio	€ 996.908,73	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 28 del 2/2/2011 per un importo di euro 996.908,73. Lavori aggiudicati con un Ribasso pari a al 22,597%. Sono in corso le attività necessarie per la stipula del contratto	Affidamento Lavori	Leenker Srl	
965	AG	012	Sambuca di Sicilia	Opere di consolidamento delle cavità sotterranee con sostegni metallici e in c.a. - chiodature - Quartiere "Saraceno"	€ 1.025.000,00	Nel corso del comitato del 20 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B. L'intervento è stato finanziato e sono completate le procedure di affidamento. Lavori aggiudicati dalla ATI DAMIGA srl. con un ribasso pari a al 25,6066%. In data 14/01/2013 è avvenuta la consegna dei lavori	Avviati Lavori	ATI DAMIGA s.r.l.	
176	AG	013	San Giovanni Gemini	Opere di consolidamento del centro abitato Viale Alessi	€ 2.474.826,76	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 55 del 10/2/2012 per un importo di euro 2.474.826,76. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara l'idea Costruzioni è risultata aggiudicataria dei lavori in data 27/02/2012 con un ribasso del 53,1311%. In data 30/08/2012 hanno avuto inizio i lavori, ultimati in data 13/06/2013.	LAVORI ULTIMATI	Idea Costruzioni Srl	
965	AG	014	Santo Stefano di Quisquina	Opere di consolidamento e rifacimento regimazione lastrica zona a valle villa comunale	€ 2.360.195,11	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REPUBBLICA ITALIANA



## ELENCO INTERVENTI B

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO (rimodulato)	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO/LAVORI	
								impresso	data inizio lavori
AP VERB. 24/3/2011	AG	174	Cattolica Eraclea	Coll. costone racchiso Eraclea Minoa	€ 1.170.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
454	AG	174_int	Naro	Area Via Vonnelle	€ 1.067.000,00	L'intervento è stato finanziato con DDG n. 211 del 11/05/2012	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
454	AG	175_int	Palma di Montechiaro	Lavori di finaturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano.	€ 1.800.000,00	L'intervento è stato finanziato con DDG n. 160 del 09/03/2012	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	CL	016	Acquaviva Platani	Consolidamento della parete rocciosa a monte della Via Marina Misretta	€ 986.525,06	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 185 del 29/3/2011 per un importo di euro 986.525,06. I lavori sono stati aggiudicati alla CGP srl con un ribasso del 24,0495 ed in data 26/07/2012 sono stati avviati i lavori	Avviati Lavori		
176	CL	017	Butera	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
965	CL	018	Butera	Opere di consolidamento pendici del centro storico	€ 800.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
AP VERB. 15/7/2011	CL	019	Caltanissetta	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della Collina S. Anna. Centro storico e quartiere Succaro, con opere di ingegneria	€ 4.160.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
AP VERB. 15/9/2011	CT	021	Acitena	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Vampolleri	€ 4.500.000,00	Istruttoria progetto	Progetto ancora non pervenuto		
176	CT	028	Licodia Eubea	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	€ 880.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	CT	029	Maniace	Consolidamento Sponda sinistra T.te Martello	€ 1.500.000,00	Progetto ancora non pervenuto. In attesa procedure ambientali.	Progetto ancora non pervenuto		
965	CT	030	Maniace	Opere di regimazione idraulica e consolidamento delle scarpate - C/da Galatse-	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 38 del 31/01/2013	Intervento finanziato		
176	CT	032	Motta Sant'Anastasia	Opere di consolidamento del centro abitato: Area Nord Est	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 440 del 09/08/2012	Intervento finanziato		
965	CT	035	Raddusa	Trincea drenante a monte del centro abitato e paratie di pali	€ 2.500.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 158 del 9/3/2012 per un importo di euro 2.389.815,78. I lavori sono stati aggiudicati dalla Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali che ha offerto un ribasso del 22,5524.	Affidamento Lavori		
176	CT	038	Santa Venerina	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago	€ 1.000.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	CT	039	Sant'Agata Li Battiati	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucata - Via Elnocidi	€ 1.000.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		

REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REPUBBLICA ITALIANA



## ELENCO INTERVENTI B

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimaldato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								imprese	data inizio lavori
176	CT	040	Trecastagni	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 446.849,79	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/04/2011 per un importo di euro 446.849,79. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 12/12/2011 con un ribasso del 24,0415%. Il contratto è stato sottoscritto in data 24/04/2012 e i lavori sono stati avviati il 03/05/2012	ATI Conicello Luigi-Rinaudo Costruzioni	03/05/2012	
454	CT	176_int	Sant'alfio	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	€ 1.900.000,00	Progetto non pervenuto	AUP integrativo		
176	EN	041	Berrafrenca	Mitigazione del rischio zona Bivio Catania	€ 1.608.973,06	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.608.973,06.	Intervento finanziato		
176	EN	043	Gagliano Castelferrato	Consolidamento centro abitato	€ 1.557.285,46	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 235 del 13/04/2011 per un importo di euro 1.557.285,46. La gara è stata indetta in data 19/09/2011, a seguito dell'espletamento delle procedure. I lavori sono stati affidati al CONSORZIO ESSEGI con il quale è stato stipulato il contratto in data 16/04/2012	Contratto stipulato		
965	EN	45_1	Leonforte	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante scuola Verga	€ 400.000,00	Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralzo relativo alla scuola Verga.	Progetto ancora non pervenuto		
	EN	45_2	Leonforte	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante la via Trieste	€	Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralzo relativo alla scuola Verga.	Progetto ancora non pervenuto		
176	EN	046	Piazza Armerina	Interventi nel quartiere Itria	€ 1.130.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 27 del 2/2/2011 per un importo di euro 1.130.000. I lavori sono stati affidati alla Consorzio Galle S.c.a.r.l. - Esec. Kimissa costr. S.r.l. I lavori hanno avuto inizio il 5 settembre 2011 e sono stati conclusi il 27/10/2012	LAVORI ULTIMATI	Consorzio Galle S.c.a.r.l. - Esec. Kimissa costr. S.r.l. Piazza Armerina	05/09/2011
176	ME	048	Alcara Li Fusi	Consolidamento costone roccioso soprastante Centro Abitato	€ 1.880.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 19/7/2010 per un importo di euro 1.880.000,00. I lavori sono stati aggiudicati in data 31/11/2011 all'impresa Siboti Costruzioni Srl che ha offerto un ribasso del 53,731%. I lavori sono stati consegnati in data 07/03/2012	Aviati Lavori	Siboti Costruzioni Srl	07/03/2012
176	ME	050	Ali	Opere di salvaguardia centro abitato 1° stralzo	€ 900.000,00	Intervento finanziato con D.D.G. 161 del 12/03/2012	Intervento finanziato		
176	ME	054	Capizzi	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.192.623,56	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 142 del 16/3/2010 per un importo di euro 1.192.623,56. I lavori sono stati aggiudicati in data 07/03/2012 all'impresa Torsten Costruzioni che ha offerto un ribasso del 23,4255%. Il contratto è stato firmato in data 26/03/2012. I lavori sono iniziati in data 09/05/2012.	Aviati Lavori	Torsten Costruzioni	09/05/2012



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
EX OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



ELENCO INTERVENTI B

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimosibilita	Stato dell'opera	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								Impresa	data inizio lavori
176	ME	055	Capo d'Orlando	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
	ME	060	Castel di Lucio	Completamento degli interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico in località Colvario per la s.p. 176 e per il Centro Abitato - Via S. Consalimento e sistemazione idraulica a salvaguardia del Centro Abitato in zona Castello Colonna-Rocca a Sud dell'Abitato	€ 989.676,87	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 646 del 22/09/2010 per un importo di euro 999.676,87. In data 19/05/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "P.I.S.A.N.I srl - Mussomeli" con un ribasso del 21,8864%. I lavori hanno avuto inizio il 5 luglio 2011 e sono stati completati in data 12/07/2012 con certificato di ultimazione del 16/07/2012.	LAVORI ULTIMATI	P.I.S.A.N.I srl - Mussomeli	05/07/2011
	ME	064	Cesarò		€ 965.547,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 2 del 12/1/2011 per un importo di euro 965.547,00. I lavori sono stati assegnati alla B.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME). I lavori hanno avuto inizio il 7 settembre 2011	Avviati Lavori	B.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME)	07/09/2011
AP VERB. 15/12/2011	ME	065	Ficarra	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada greene	€ 1.028.981,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010. Il progetto è stato finanziato con Decreto Commissoriale n.1 del 23.11.10. I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11. A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita alla lettera B (copertura finanziaria regionale). I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011.	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	EDILTECNICA COSTRUZIONI s.r.l.	20/01/2011
	ME	067	Fondachelli Farfina	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 298 del 30/05/2012 per un importo pari a € 927.337,42. A seguito delle procedure di gara, con un ribasso del 30,3548%, l'aggiudicatario dei lavori risulta essere la Pullara Calogera.	Affidamento Lavori		
AP VERB. 15/09/2011	ME	068	Forza D'Agro	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 414.165,28	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
965	ME	069	Frazzanò	Lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via S. Filippo di Fragalà - Zona	€ 1.165.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 54 del 06/02/2012. Risultato aggiudicatario dei lavori la ATI Malifiano srl - Renzo Costruzioni	Affidamento Lavori		
	ME	070	Frazzanò	Opere di consolidamento ad est del centro abitato	€ 2.500.000,00	La ATI ALAK srl - Costruba risulta l'aggiudicatario dei lavori, dopo aver offerto un ribasso del 22,7777% ed è in corso di stipula il contratto	Affidamento Lavori		
965	ME	074	Giardini Naxos	Consolidamento versante - Località Oro Grande	€ 2.200.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 9 del 18/01/2012. Aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Consalimenti Speciale srl, ribasso del 26,6305%. In data 27/02/2013 hanno avuto inizio i lavori	Avviati Lavori		
	ME	075	Gualtieri Sicaminò	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	€ 1.651.041,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 273 del 22/4/2011 per un importo di euro 1.651.041,00. La gara è stata indetta in data 14/11/2011. In corso di aggiudicazione	Affidamento Lavori		
965	ME	076	Itala	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Frazione Borgo	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 10 del 18/01/2012	Intervento finanziato		
	ME	077	Leni	Opere di difesa costiera a difesa del centro abitato	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 792 del 26/10/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla Chiofalo Costruzioni srl in data 28/09/2012 e avvenuta la consegna dei lavori	Avviati Lavori		
176	ME	082	Limina	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.666.000,00	L'aggiudicatario dei lavori, a seguito di gara, risulta essere la D.L.M. Costruzioni srl (ribasso del 28,4166%). I lavori hanno avuto inizio il 19/07/2013.	Avviati Lavori		

REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
EX OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1



**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimosulato	Stato dell'opera	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI		
								Impresa	data inizio lavori	
176	ME	083	Longi	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.474.985,06	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 153 del 18/03/2011 per un importo di euro 1.474.985,06. Lavori aggiudicati in data 15/11/2011 alla DEMETRA LAVORI SRL con un ribasso del 24,16354%. In data 08/02/2012 hanno avuto inizio i lavori.	Avviati Lavori	Demetra Lavori Srl		
176	ME	084	Mafia	Messa in sicurezza e consolidamento del costone in località Torricella della Frazione Capo	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 846 del 22/11/2011.	Intervento finanziato			
176	ME	085	Melvagna	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 288 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MICHELANGELO MAMMANA con un ribasso d'asta pari al 23,44. I lavori sono stati consegnati in data 30/12/2011.	Avviati Lavori	MICHELANGELO MAMMANA - Castel di Lucio (ME)	30/12/2011	
176	ME	086	Mandacini	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.149.942,49	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATFIN.PAR 2000 S.p.a. ROMA con un ribasso d'asta pari al 22,832 ed affidati alla stessa in data 20/10/2011	Avviati Lavori	ATFIN.PAR 2000 S.p.a. ROMA	20/11/2011	
176	ME	090	Milkelo Rosmarino	Consolidamento all'interno del centro abitato in c/da Ramisi	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG.n. 584 del 29/10/2012	Intervento finanziato			
176	ME	093	Monte San Giorgio	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.200.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 360 del 6/6/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. In data 22/11/2012 è stato stipulato il contratto con il Consorzio Cooperativo Costruzioni che ha offerto un ribasso del 11,754%.	Affidamento Lavori			
176	ME	094	Motta Camastra	Completamento consolidamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Mancusa	€ 993.521,35	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 425 del 17/6/2011 per un importo di euro 993.521,35. I lavori sono stati affidati alla Vertical Project srl ed in data 12/03/2012 è avvenuta la consegna dei lavori.	Avviati Lavori	VERTICAL PROJECT s.r.l. - Ceasro (ME)	12/03/2012	
176	ME	095	Novara di Sicilia	Consolidamento del centro abitato	€ 399.110,40	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 1/4/2011 per un importo di euro 399.110,40. I lavori sono stati affidati alla Chiofalo Group con un ribasso d'asta pari a 23,9471%, ed in data 25/11/2011 sono stati avviati.	Avviati Lavori	CHIOFALO GROUP srl - San Filippo del Mela	25/11/2011	
176	ME	097	Pagliara	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 163 del 12/03/2012. Con un ribasso del 33,0927 risulta essere l'aggiudicatario dei lavori la MED Appalti srl	Affidamento Lavori			
176	ME	098	Patti	Consolidamento frazione Sorrentino	€ 1.085.544,63	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 154 del 18/3/2011 per un importo di euro 1.085.544,63. I lavori sono stati aggiudicati dalla ATI Co.I.V. di Roscheli S. - G.F. Costruzioni srl - Patti Sorrentini srl con un ribasso del 24,05%. In data 24/07/2012 sono stati avviati i lavori	Avviati Lavori			
176	ME	101	Reltano	Opere di consolidamento centro abitato	€ 980.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 849 del 22/11/2011	Intervento finanziato			

REGIONE SICILIANA



*[Signature]*

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 EX OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REPUBBLICA ITALIANA



ELENCO INTERVENTI B

DDG	PROV.	COD.	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimborsato	Stato dell'ente	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
176	ME	102	Roccalumera	Consolidamento del centro abitato	€ 850.000,00	I lavori sono stati consegnati in data 12/10/2012 alla Consorzio Artek - Roma (Giada Costruzioni) che ha offerto in gara un ribasso del 26,6166%.	Avviati Lavori		
176	ME	103	Roccalvaldina	Consolidamento centro abitato	€ 1.885.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 726 del 14/10/2010 per un importo di euro 1.885.000,00. I lavori sono stati affidati alla Sidati Costruzione con un ribasso d'asta pari a 47,731%. Il contratto è stato stipulato in data 26/03/2012 e i lavori sono stati avviati il 14/06/2012	Avviati Lavori	SIDATI COSTRUZIONI srl - Montagnara IZ (ME)	14/06/2012
176	ME	104	Roccella Valdemone	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 875.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 361 del 6/6/2011 per un importo di euro 875.000,00. Aggiudicazione avvenuta il 21/11/2011, a favore della Di Maria Costruzioni. In data 01/12/2011 hanno avuto inizio i lavori, terminati in data 12/11/2012	LAVORI ULTIMATI		
965	ME	105	Rometta	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	€ 1.000.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
965	ME	106	S. Alessio Siculo	Barriera soffiata e radente o protezione del centro abitato	€ 5.000.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	ME	108	San Pier Niceto	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.550.000,00	Intervento finanziato con DDG. 619 del 06/11/2012	Intervento finanziato		
AP VERB. 15/12/2011	ME	110	San Piero Patti	Opere di consolidamento e regimazione idraulica del centro abitato	€ 1.850.000,00	Il Comune con nota del 10 feb 2011 chiede di trasferire l'intervento, R4P4 GP1, dalla lettera A alla lettera B, cioè di inserirlo nel PO FESR 2007/2013; Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accolto l'istanza del Comune nel corso della seduta del 24 febbraio 2011. Il progetto è stato finanziato con DDG n. 127 del 11/03/2013	Intervento finanziato		
176	ME	111	Santa Lucia del Mela	Consolidamento centro abitato	€ 1.300.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 572 del 31/8/2010 per un importo di euro 1.300.000,00. In data 20/4/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "UNICOS S.r.l. - AcI Castello" con un ribasso del 21,3809%. I lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2011	Avviati Lavori	UNICOS srl AcI Castello	18/08/2011
176	ME	112	Santa Lucia del Mela	Consolidamento ed eliminazione rischio idrogeologico perimetro urbano in Contrada Grazie in prossimità del Viale dei Pini	€ 1.200.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 88 del 1/3/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla CIOPALO COSTR. S.R.L.-S. Filippo del Mela (ME) con un ribasso d'asta pari al 23,2012%. I lavori hanno avuto inizio il 21/11/2011	Avviati Lavori	CIOPALO COSTR. S.R.L.- S. Filippo del Mela (ME)	21/11/2011
176	ME	114	Sant'Agata di Militello	Intervento di difesa idraulica del centro abitato	€ 1.710.000,00	Intervento finanziato con DDG. 881 del 25/11/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla Amato Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 30,00%	Affidamento Lavori		
176	ME	116	Svoca	Consolidamento centro abitato	€ 1.195.875,88	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 73 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.195.875,88. I lavori sono stati affidati alla Cadore Asfalti s.p.a. Belluno con un ribasso d'asta pari al 23,1. Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2012	Contratto stipulato	Cadore Asfalti s.p.a. Belluno	



REGIONE SICILIANA



*[Signature]*

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

REPUBBLICA ITALIANA



**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rivalutata	Stato dell'ente	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								Impresa	Data inizio lavori
176	ME	117_1	Scaletta Zanclea	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Scaletta Zanclea	€ 2.700.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 36 del 31/01/2013	Intervento finanziato		
	ME	117_2	Scaletta Zanclea	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Scaletta Zanclea	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 37 del 31/01/2013	Intervento finanziato		
	ME	118	Scaletta Zanclea	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torrente Divieto Cadice PAI 102	€ 1.400.000,00	Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di rinviare il finanziamento dell'intervento ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi è il	Progetto ancora non pervenuto		
176	ME	122	Spadafora	Consolidamento centro abitato	€ 1.327.891,32	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 571 del 31/08/2010 per un importo di euro 1.327.891,32. I lavori sono stati affidati alla ATI Imp. Rubino s.r.l. Costelli/Umbe Imp. Trovato Torregrotta con un ribasso d'asta pari al 22,2222. La consegna dei lavori è avvenuta il 29/11/2011	Avvisi Lavori	ATI Imp. Rubino s.r.l. Costelli/Umbe Imp. Trovato.	29/11/2011
985	ME	123	Spadafora	Consolidamento dell'area - Fraz. S. Martino	€ 1.500.000,00	lavori sono stati affidati alla PMP costruzioni srl con un ribasso d'asta pari a 26,178%.	Affidamento Lavori	PMP costruzioni srl	
AP VERB. 15/2/2011	ME	124	Terme Vigliatore	Ripascimento scogliere - Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00		Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
	ME	127	Tortorici	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona S. Paolo	€ 2.300.000,00		Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
985	ME	129	Tortorici	Opere di consolidamento, regimazione idraulica e drenaggi - Zona via Zappulla Proseccione della barriera soffolta a mare. Interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 4.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 393 del 09/07/2012.	Intervento finanziato		
AP VERB. 15/2/2011	ME	130	Tusa	Consolidamento del centro urbano in località Vasile-Belvedere	€ 1.500.000,00		Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
	ME	131	Ucila	Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	€ 1.261.000,00		Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	ME	133	Valdina	Consolidamento del centro abitato	€ 2.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 211 del 6/4/2011 per un importo di euro 2.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla ATIN ASC srl con un ribasso d'asta pari al 24,3987.	Contratto stipulato	ATIN ASC srl	
176	ME	134	Venetico	Consolidamento del centro abitato	€ 1.554.100,81	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 492 del 7/7/2011 per un importo di euro 1.554.100,81. L'Impresa Renzo Costruzioni srl è risultata aggiudicataria dei lavori, che hanno avuto inizio in data 07/06/2013	Avvisi Lavori		
AP VERB. 24/3/2011	ME	176	Giardini Naxos	Erosione costiera	€ 1.400.000,00		Istruttoria in corso		



REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30/03/2010"  
 EX OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

REPUBBLICA ITALIANA



**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV.	COD.	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimosibile	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
176	PA	135	Altofonte	Consolidamento centro abitato	€ 789.270,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 143 del 10/3/2011 per un importo di euro 789.270,00. I lavori sono stati affidati alla Ditta Geom. Carmelo Cangemi con un ribasso d'asta pari al 23,8727. Il Contratto è stato stipulato in data 29/02/2012 e la consegna lavori è avvenuta l'11/04/2012	Aviati Lavori	Geom. Carmelo Cangemi	11/04/2012
	PA	138	Calavuturo	Consolidamento centro abitato	€ 793.690,51	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 252 del 18/4/2011 per un importo di euro 793.690,51. I lavori sono stati affidati alla Torsten Costruzioni con un ribasso d'asta pari al 23,2553. Il Contratto è stato stipulato in data 22/03/2012 e la consegna lavori è avvenuta l'02/02/2012	Aviati Lavori	Torsten Costruzioni S.r.l.	02/02/2012
965	PA	139	Campofelice di Roccella	Opere di consolidamento - C/da Belvedere	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 39 del 31/01/2013	Intervento finanziato		
	PA	140	Camporeale	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	L'intervento transito, in attesa della determinazione del Comitato del 15 settembre 2011 dalla lettera A alla lettera B. Progetto ancora non pervenuto	Progetto ancora non pervenuto		
176	PA	144	Gastronovo di Sicilia	Opere di consolidamento del centro abitativo verso Est a difesa della Scuola Elementare di Via Mazzini, ecc.	€ 1.600.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 186 del 29/3/2011 per un importo di euro 1.600.000,00. I lavori sono stati affidati a SCF Costruzioni s.r.l. con un ribasso d'asta pari al 23,0625%. Il Contratto è stato stipulato in data 17/05/2012 e la consegna lavori è avvenuta il 22/06/2012	Aviati Lavori	CF Costruzioni s.r.l.	22/06/2012
	PA	145	Gastronovo di Sicilia	Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.344.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 359 del 22/06/2012	Predisposizione atti di gara		
176	PA	146	Gera di Sicilia	Progetto di consolidamento della zona nord orientale	€ 1.057.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 909 del 2/12/2010 per un importo di euro 1.057.000,00. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Costruzioni San Giuseppe di Lanza Vincenzo s.a.s." con un ribasso del 22,4650%. In data 24/06/2011 riapertura gara a seguito ricorso della seconda classificata. nuova aggiudicazione alla Impresa Di Maria Costruzioni srl con un ribasso del 22,4622%. Lavori avviati il 13/04/2012	Aviati Lavori	Di Maria Costruzioni srl	13/04/2012
	PA	147	Marineo	Consolidamento centro abitato	€ 2.257.528,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 290 del 3/5/2011 per un importo di euro 2.257.528,00. I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 23,9653. I lavori sono stati avviati il 29/12/2011	Aviati Lavori	AT Costr. San Giuseppe di Lanza Vincenzo e C s.a.s Catalano Francesco	29/12/2011
965	PA	148	Mezzojuso	Opere di consolidamento - Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
	PA	150	Palermo	Opere di regimazione idraulica C.da Belmonte Chivelli	€ 4.300.000,00	In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Palermo. I lavori sono stati aggiudicati dalla ICM che ha offerto un ribasso del 25,3627	Affidamento Lavori	I.C.M. Impresa Costruzioni Moderne	
176	PA	151	Partinico	Consolidamento costone roccioso Colle Cesaro-terzo stralcio	€ 950.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		

REGIONE SICILIANA



*[Handwritten signature]*

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 EX OPCVM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

REPUBBLICA ITALIANA



**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimoscolato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								Impresa	Data inizio lavori
	PA	152	Petraia Sottana	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scovarello	€ 1.200.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario	QUADRIFOGLIO s.r.l. - Polizzi Generosa	10/06/2011
176	PA	153	Polizzi Generosa	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 908.469,01	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 753 del 25/10/2010 per un importo di euro 908.469,01. I lavori sono stati aggiudicati alla QUADRIFOGLIO s.r.l. - Polizzi Generosa con un ribasso offerto pari a 21,7273%. I lavori hanno avuto inizio il 10 giugno 2011.	Avanti Lavori	Bellino Costruzioni srl	
176	PA	155	Termini Imerese	Intervento di monitoraggio del centro abitato	€ 198.196,38	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 754 del 25/10/2010 per un importo di euro 198.196,38. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Bellino Costruzioni S.r.l. - Cammarata" con un ribasso del 21,8288% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).	Affidamento Lavori	Bellino Costruzioni srl	
454	PA	182	Corleone	Messa in sicurezza costone roccioso Contrada S. Giovanni	€ 1.578.183,23	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 358 del 22/06/2012	Intervento finanziato		
454	PA	183	Pollina	consolidamento della rupe S. Pietro	€ 800.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 624 del 12/09/2012	Intervento finanziato		
176	RG	158_1	Modica	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	€ 2.000.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	RG	158_2	Modica	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	€ 1.000.000,00	L'intervento previsto in APQ è stato suddiviso in 2 stralci e lo stralcio da 1000.000,00 è stato finanziato con decreto n.804 del 20/11/2011	Intervento finanziato		
176	RG	160	Ragusa	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.674.051,32	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 106 del 7/3/2011 per un importo di euro 1.674.051,32. I lavori sono stati affidati alla "PRESAL COSTR. S.R.L. - S. Agata di Militello (ME)" con un ribasso del 23,2118% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).	Affidamento Lavori	PRESAL COSTR. S.R.L. - S. Agata di Militello (ME)	
176	SR	164	Portopalo di Capo Passero	Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato	€ 719.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 642 del 18/09/2013	Intervento finanziato		
176	SR	165	Rosolini	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	TP	170	Poggioreale	Consolidamento versante orientale dell'abitato	€ 1.500.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 493 del 7/7/2011 per un importo di euro 1.500.000,00. I lavori sono stati affidati alla Spallina Costruzioni con un ribasso del 24,1644%	Affidamento Lavori	Spallina Costruzioni	

REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

REPUBBLICA ITALIANA



## ELENCO INTERVENTI B

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	ALFABETICO ALVO	
								impresa	data inizio lavori
AP VERB. 15/2/2011	TP	171	Salemi	Sistemazione del costone roccioso Monte Rose a monte della via Marsala - Zona C.da Monte Rose	€ 1.650.000,00	In Ottemperanza alle determinazioni del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 il finanziamento relativo all'intervento viene aumentato, attraverso l'utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla mancata realizzazione dell'intervento ME794, Libretti pari a € 150.000€, passando da 1.500.000,00 a 1.650.000,00 euro. Nello stesso seduta del Comitato si stabilisce di far transitare l'intervento dalla lettera A alla Lettera B. I lavori sono stati aggiudicati dalla LeC srl che ha offerto un ribasso del 26,9699%. In data 21/03/2013 hanno avuto inizio i lavori	Avviati Lavori		
AP VERB. 15/2/2011	TP	173	Trapani	Opere di regimazione litraulica - Zona Sallinagrande	€ 4.000.000,00	L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 24 feb 2011 dalla lettera A alla lettera B. Pertanto con nota prot. 510 del 15 apr 2011 si comunica all'ARTIA l'ovenuto variazione e si trasmette tutta la documentazione. In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Trapani.L'intervento è stato finanziato con DDG n. 959 del 23/12/2011.	Intervento finanziato		
454	TP	190	San Vito Lo Capo	Erosione costiera	€ 1.350.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
					€ 160.226.986,15				







REPUBBLICA ITALIANA

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE  
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE  
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

*[Handwritten signature]*

PROG.	CONTO	COMPT.	STIP.	AMMONT. SUP.	AMMONT. CORR.	SPAZIO RESERVE	SAL.	CONTRIBUZIONI	AFIDAMENTO FINANZIARIO	AFIDAMENTO IN MOBILITÀ	AFIDAMENTO IN IMMOBILITÀ	ALTRA	INDICAZIONE DI FONDO	INDICAZIONE DI FONDO	INDICAZIONE DI FONDO	INDICAZIONE DI FONDO	INDICAZIONE DI FONDO	INDICAZIONE DI FONDO	INDICAZIONE DI FONDO	
AG. 174, IN	Nato	B	Regione	1.807.000,00 €	1.807.000,00 €															
AG. 175, IN	Valore di Matrimonio	B	Regione	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €															
CL. 016	Assegnazione Regionale	B	Regione	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €															
CL. 017	Stato	B	Regione	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €															
CL. 018	Barra	A	Regione	800.000,00 €	800.000,00 €															
CL. 019	Chioschietti	A	Regione	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €															
CL. 020	Serrafello	B	A	7.100.000,00 €	7.100.000,00 €															

REPUBBLICA ITALIANA

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE  
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE  
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

*[Handwritten signature]*



REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO

ALLEGATO AL COMPLESSIVO STATO FINANZIARIO DELLO STATO  
Per l'attuazione dell'articolo 48 del regolamento del Parlamento approvato  
dalla Camera dei Deputati il 20/12/2012 e dal Senato della Repubblica il 20/12/2012  
in data 24/01/2013

PROV.	CDG	COMUNE	PROV. DIVISIONE	PROV. ATTIVITÀ	COMUNITA'	TITOLO	IMPORTO 2012	IMPORTO 2013	IMPORTO 2014	CONTRATTO	ANNO DI INIZIO	ANNO DI FINE	FRAMMENTO PROGETTO	FRAMMENTO INDICAZIONE	FRAMMENTO LAVORI	DESCRIZIONE ALTERNATIVE	IMPORTO	DESCRIZIONE ALTERNATIVE	IMPORTO	DESCRIZIONE ALTERNATIVE	IMPORTO	DESCRIZIONE ALTERNATIVE	DESCRIZIONE ALTERNATIVE	DESCRIZIONE ALTERNATIVE	
CT	024	Giuris	A	A	MILANO	Realizzazione di un nuovo edificio per la sede della Direzione Provinciale Antiquaria di Milano - via S. Stefano, 20 - 20121 Milano	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €				CONTR			17/10/2012	1.000.000,00 €	17/10/2012	1.000.000,00 €	17/10/2012	1.000.000,00 €	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	
CT	027	Grembio	A	A	MILANO	Oltre al completamento della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva per la costruzione di un nuovo edificio per la sede della Direzione Provinciale Antiquaria di Milano - via S. Stefano, 20 - 20121 Milano	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €				CONTR			17/10/2012	700.000,00 €	17/10/2012	700.000,00 €	17/10/2012	700.000,00 €	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012
CT	028	Milano	A	B	Regione	Consolidamento del debito della Regione	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	CONTRATTO 2012						17/10/2012	1.000.000,00 €	17/10/2012	1.000.000,00 €	17/10/2012	1.000.000,00 €	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	
CT	029	Milano	A	B	Regione	Consolidamento del debito della Regione	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	CONTRATTO 2012						17/10/2012	1.000.000,00 €	17/10/2012	1.000.000,00 €	17/10/2012	1.000.000,00 €	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	
CT	031	Milano	A	A	Milano	Oltre al completamento della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva per la costruzione di un nuovo edificio per la sede della Direzione Provinciale Antiquaria di Milano - via S. Stefano, 20 - 20121 Milano	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				CONTR			17/10/2012	500.000,00 €	17/10/2012	500.000,00 €	17/10/2012	500.000,00 €	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	
CT	032	Milano	A	B	Regione	Oltre al completamento della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva per la costruzione di un nuovo edificio per la sede della Direzione Provinciale Antiquaria di Milano - via S. Stefano, 20 - 20121 Milano	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				CONTR			17/10/2012	500.000,00 €	17/10/2012	500.000,00 €	17/10/2012	500.000,00 €	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO

ALLEGATO AL COMPLESSIVO STATO FINANZIARIO DELLO STATO  
Per l'attuazione dell'articolo 48 del regolamento del Parlamento approvato  
dalla Camera dei Deputati il 20/12/2012 e dal Senato della Repubblica il 20/12/2012  
in data 24/01/2013

ALLEGATO



REGIONALIZZIAMO

LEGGI DI FINANZA DEL 2014  
L. 170/2014  
L. 170/2014  
L. 170/2014

MEMORIA ITALIANA

PROV.	COD.	COMUNE	FONDO STRUTTURALE	FONDO REGIONALE	FONDO	CATEGORIA	TITOLO	IMPORTO CAP	IMPORTO FINANZIABILE	ZAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO REGIONALE	AFFIDAMENTO REGIONALE (MIGLIAIA)	BILANCIATO	ECONOMIA	RISORSE DI IMPEGNO		RUP	REVISIONE RUP	DI
																in €	in €			
CT	D5	Raidana	A	A	Ministero	COMITATO 21 OTT 2014	- Opere di consolidamento del territorio	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	ACQUEDOTTI PASSEI PROGETTAZIONE	CONTRA	CONTRASTO	1.000.000,00	1.000.000,00	€	€	Genio Rurale Progetti	02/08/2014	Ng. Antonio Di Biase	
CT	D5	Raidana	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2014	- Opere di consolidamento del territorio	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	Albergo Ison	INIZIATIVA	CONTRASTO	1.175.000,00	2.375.000,00	€	€	Genio Rurale Progetti	02/08/2014	Ng. Antonio Di Biase	
CT	D5	Raidana	A	A	Ministero		- Opere di consolidamento del territorio	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE	INIZIATIVA	CONTRASTO	1.175.000,00	2.375.000,00	€	€	Genio Rurale Progetti	02/08/2014	Ng. Antonio Di Biase	
CT	D7	Raidana	B	A	Ministero	COMITATO 24 11 2011	- Opere di consolidamento del territorio	960.000,00 €	960.000,00 €	LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE	INIZIATIVA	CONTRASTO	1.175.000,00	2.375.000,00	€	€	Genio Rurale Progetti	02/08/2014	Ng. Antonio Di Biase	
CT	D5	Santa Maria di Castellana	B	B	Regione		- Opere di consolidamento del territorio	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE	INIZIATIVA	CONTRASTO	1.175.000,00	2.375.000,00	€	€	Genio Rurale Progetti	02/08/2014	Ng. Antonio Di Biase	
CT	D5	Santa Maria di Castellana	B	B	Regione		- Opere di consolidamento del territorio	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE	INIZIATIVA	CONTRASTO	1.175.000,00	2.375.000,00	€	€	Genio Rurale Progetti	02/08/2014	Ng. Antonio Di Biase	
CT	D0	Trivulzio	B	B	Regione	COMITATO 15 SUT 2011	- Interventi di consolidamento del territorio	448.848,70 €	448.848,70 €	LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE	INIZIATIVA	CONTRASTO	1.175.000,00	2.375.000,00	€	€	Genio Rurale Progetti	02/08/2014	Ng. Antonio Di Biase	
CT	D7	Sant'Alfio	B	B	Regione	COMITATO 15 SUT 2011	- Interventi di consolidamento del territorio	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE	INIZIATIVA	CONTRASTO	1.175.000,00	2.375.000,00	€	€	Genio Rurale Progetti	02/08/2014	Ng. Antonio Di Biase	



Handwritten signature and stamp.

LEGGI INTERREGIONALI
Art. 1. L'Assemblea regionale siciliana, in attuazione dell'articolo 11 della Costituzione, ha approvato il presente disegno di legge...

REGIONE SICILIANA
Logo of the Sicilian Region.

Table with columns: PROV, COD, COMUNA, FONDI, FONDI, COMITATI, TITOLO, SPORTEGGI, IMPORTO PREVISTO, SAL, CONTRAZIONE, AFFIDAMENTO PROGETTI, AFFIDAMENTO INDIZIALE, AFFIDAMENTO LAVORI, IMPORTO, RENDIMENTO INDIZIALE, RUP, TERMINO RUP, SUPERFICIE RUP, etc. Rows include projects like 'Miglioramento della linea ferroviaria Palermo-Mazara del Vallo' and 'Oggetti di manutenzione e manutenzione ordinaria'.



MEDIOCRISTIANO

ME

UFFICIO DEL COLLABORATORE STRAORDINARIO DELEGATO  
"per" med. Agricolt. Sc. Agr. "per" Agr. di Progr. Agric. di 19.12.2017  
D. L. 19.12.2017 n. 168 art. 1

RIC. N. 1927 DEL 17.12.17

REPUBBLICA ITALIANA

PROV.	CDU	COMUNE	RIONE	CATEGORIA	COMPTO	TITOLO	IMPORTO SP.	IMPORTO FINANZIARIO	C.A.	CONTRIBUTO	AFFIDAMENTO PROGETTO	AFFIDAMENTO LAVORI	ELENCO DEI PREZZI		ELENCO DEI PREZZI	RECANO DI BANDO	RUP	MATERIA SP. TECNICA	SP. DI RIF.	D.L.				
													in Euro	in Euro							in Euro	in Euro		
ME	050	Casale di Stabia	B	A	COMPTO 15 5177 2011	Contribuzione in conto di gestione per il servizio di pulizia in loco di 500 mq. di terreno in via S. Aquilone	1.000.000,00 €	996.679,97 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	€ 996.679,97	11.3.2017	11.3.2017								
ME	063	Casale di Stabia	A	A	Miscelato	Contribuzione in conto di gestione per il servizio di pulizia in loco di 500 mq. di terreno in via S. Aquilone	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	€ 1.000.000,00	11.3.2017	11.3.2017								
ME	052	Casale di Stabia	A	A	Miscelato	Opere di manutenzione in viale della sede municipale - Contrada di S. Maria	300.000,00 €	300.000,00 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	€ 300.000,00	11.3.2017	11.3.2017								
ME	053	Casale di Stabia	B	A	COMPTO 15 5177 2011	Contribuzione in conto di gestione per il servizio di pulizia in loco di 500 mq. di terreno in via S. Aquilone	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	€ 1.000.000,00	11.3.2017	11.3.2017								
ME	054	Casale di Stabia	B	A	COMPTO 15 5177 2011	Contribuzione in conto di gestione per il servizio di pulizia in loco di 500 mq. di terreno in via S. Aquilone	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	€ 1.000.000,00	11.3.2017	11.3.2017								
ME	055	Casale di Stabia	B	A	COMPTO 15 5177 2011	Contribuzione in conto di gestione per il servizio di pulizia in loco di 500 mq. di terreno in via S. Aquilone	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	€ 1.000.000,00	11.3.2017	11.3.2017								

COMUNE	COMPTO	TITOLO	IMPORTO SP.	IMPORTO FINANZIARIO	C.A.	CONTRIBUTO	AFFIDAMENTO PROGETTO	AFFIDAMENTO LAVORI	ELENCO DEI PREZZI	RECANO DI BANDO	RUP	MATERIA SP. TECNICA	SP. DI RIF.	D.L.
CASALE DI STABIA	COMPTO 15 5177 2011	Contribuzione in conto di gestione per il servizio di pulizia in loco di 500 mq. di terreno in via S. Aquilone	1.000.000,00 €	996.679,97 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	11.3.2017	11.3.2017			
CASALE DI STABIA	COMPTO 15 5177 2011	Contribuzione in conto di gestione per il servizio di pulizia in loco di 500 mq. di terreno in via S. Aquilone	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	11.3.2017	11.3.2017			
CASALE DI STABIA	COMPTO 15 5177 2011	Opere di manutenzione in viale della sede municipale - Contrada di S. Maria	300.000,00 €	300.000,00 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	11.3.2017	11.3.2017			
CASALE DI STABIA	COMPTO 15 5177 2011	Contribuzione in conto di gestione per il servizio di pulizia in loco di 500 mq. di terreno in via S. Aquilone	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	11.3.2017	11.3.2017			
CASALE DI STABIA	COMPTO 15 5177 2011	Contribuzione in conto di gestione per il servizio di pulizia in loco di 500 mq. di terreno in via S. Aquilone	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	11.3.2017	11.3.2017			
CASALE DI STABIA	COMPTO 15 5177 2011	Contribuzione in conto di gestione per il servizio di pulizia in loco di 500 mq. di terreno in via S. Aquilone	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1476 m. di terreno	11.3.2017	11.3.2017	11.3.2017	3177/2011 N. 6/16 DEL 23/01/2011	11.3.2017	11.3.2017			





REGIONE CALABRIA

*Handwritten signature*

UNIONE DI SINISTRA  
"Per il futuro della Calabria"  
nella Regione Calabria prevista nell' "Avviso di Programmazione Regionale n. 2/04/2014"  
C.U.P. 839 Regione Calabria 2014-2020-5-NA04-01

ELenco opere art. 47

REGIONE CALABRIA

PROV.	CDI	COMUNE	COND. CIVICALE	GEN. ATTIVITA'	PROV.	IMPORTO A/P	IMPORTO P/INDICATO	STATO ESISTENTE	DEL.	CONVENZIONI	APPROVAZIONE PROGETTO	PERMANENZE INDICAZIONE	APPROVAZIONE LAVORI	ESISTENZA	QUANTIFICAZIONE IMPORTO	IMPORTO	NOBILITAZIONE	Supponibile a/P	DL	
ME	085	Ugento	A	A	Municipio	€ 510.000,00	€ 510.000,00	Opera di consolidamento e manutenzione - Zona Nuova Marina	OPERA DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE DELLA ZONA NUOVA MARINA	COMUNE UGENTO	15/06/2014	15/06/2014	15/06/2014	€ 510.000,00	€ 510.000,00	707/2014	Com. 15/06/2014	15/06/2014	15/06/2014	
ME	082	Lamezia	B	B	Regione	€ 1.660.000,00	€ 1.660.000,00	Opere di consolidamento del centro abitato	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO	Regione Calabria	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013							
ME	083	Lecce	B	B	Regione	€ 1.263.300,00	€ 1.263.300,00	Interventi di consolidamento del centro abitato	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO	Regione Calabria	14/05/2012	14/05/2012	14/05/2012	€ 1.474.980,00	€ 1.474.980,00	N. 333 DEL 20/04/2014				
ME	084	Polia	B	B	Regione	€ 1.202.000,00	€ 1.202.000,00	Mezza in sicurezza e consolidamento del centro abitato	MEZZA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO	Regione Calabria	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	€ 1.474.980,00	€ 1.474.980,00	N. 333 DEL 20/04/2014				
ME	085	Mandona	B	B	Regione	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Opere di consolidamento del centro abitato	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO	Regione Calabria	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	N. 333 DEL 20/04/2014				
ME	086	Mandaci	B	B	Regione	€ 1.370.000,00	€ 1.370.000,00	Opere di salvaguardia centro abitato	OPERE DI SALVAGUARDIA CENTRO ABITATO	Regione Calabria	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	€ 1.474.980,00	€ 1.474.980,00	N. 333 DEL 20/04/2014				
ME	087	Messina	B	B	Municipio	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	Opere di consolidamento del centro abitato	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO	Municipio Messina	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	N. 333 DEL 20/04/2014				
ME	088	Messina	B	B	Municipio	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	Opere di salvaguardia centro abitato	OPERE DI SALVAGUARDIA CENTRO ABITATO	Municipio Messina	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	N. 333 DEL 20/04/2014				
ME	089	Messina	B	B	Municipio	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Opere di consolidamento centro abitato	OPERE DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO	Municipio Messina	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	€ 900.000,00	€ 900.000,00	N. 333 DEL 20/04/2014				



REGIONE EMILIA

*[Handwritten signature]*

UFFICIO DEL COMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AGILITÀ  
in materia di procedure amministrative  
e di servizi pubblici  
di cui al Regolamento di cui al D.L. n. 201 del 18.10.2012  
e al D.L. n. 118 del 18.10.2012

REPUBBLICA ITALIANA

PROV.	COD. COMUNE	CATEGORIA	TITOLO	IMPORTO D.P.F.	IMPORTO IMMOBILIARE	STIPULAZIONE	SILV.	CONVEZIONI	FRANCHESCA	FRANCHESCA	FRANCHESCA	BILANCIO DI		SOCIETÀ IN REG. CO. S.p.A.	BIP	IMPORTO D.P.F.	SOSPENSIONE BIP	D.L.
												IMMOBILIARE	IMMOBILIARE					
ME	BO_2	Messina	Opera di manutenzione strada As. Strada 1000	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	PROGETTO ASSTUR ATTUAZIONE					€	€			D. C. 381 del 12.07.2012	Reg. di legge Regionale (P.R.G. AL. 11/07/2012)	
ME	BO_3	Messina	Opera di manutenzione strada As. Strada 1000	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	PROGETTO ASSTUR ATTUAZIONE					€	€			D. C. 381 del 12.07.2012	Reg. di legge Regionale (P.R.G. AL. 11/07/2012)	
ME	BO_3	Messina	Opera di manutenzione strada As. Strada 1000	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	PROGETTO ASSTUR ATTUAZIONE					€	€			D. C. 381 del 12.07.2012	Reg. di legge Regionale (P.R.G. AL. 11/07/2012)	
ME	BO_3	Messina	Opera di manutenzione strada As. Strada 1000	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	PROGETTO ASSTUR ATTUAZIONE					€	€			D. C. 381 del 12.07.2012	Reg. di legge Regionale (P.R.G. AL. 11/07/2012)	
ME	BO_3	Messina	Opera di manutenzione strada As. Strada 1000	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	PROGETTO ASSTUR ATTUAZIONE					€	€			D. C. 381 del 12.07.2012	Reg. di legge Regionale (P.R.G. AL. 11/07/2012)	



REPUBBLICA ITALIANA

REGOLAMENTO

UFFICIO DEL COORDINAMENTO TRASPARTEMENTALE DEL C.D.
del 19 giugno 2010, n. 100, art. 1, comma 1, del Regolamento di Procedura approvato dal C.D. il 12/12/09

Table with columns: REGIONE, COD. COMUNALE, COD. PROV., COD. DIST., COD. MUN., TITOLO, IMPORTO C.D.P., IMPORTO REGIONALE, IMPORTO STATO, IMPORTO UNIONE EUROPEA, DATA, CONVENZIONI, AFFIDAMENTO REGIONALE, AFFIDAMENTO STATO, AFFIDAMENTO UNIONE EUROPEA, ESAMINATI, CATEGORIA DI AFFIDAMENTO, RISP, RENDICONTI, SUPPLEMENTO REGIONALE, D.

REPUBBLICA ITALIANA

REGOLAMENTO

UFFICIO DEL COORDINAMENTO TRASPARTEMENTALE DEL C.D.
del 19 giugno 2010, n. 100, art. 1, comma 1, del Regolamento di Procedura approvato dal C.D. il 12/12/09

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXVII N. 19 VOL. I

MEZZOGIOCHI

ME

LEGGI DI FINANZA PER IL BIENNIO 2012-2013  
Art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 201 del 28/11/2011  
e l. 22 del 18/02/2012, n. 45

ME

PROV.	COMUNICAZIONE	REGIONE	FOONDO	COMUNICAZIONE	TITOLO	IMPORTO DEF.	IMPORTO FINANZIATO	DESCRIZIONE	AVVIAZIONE	PROGETTO	INIZIATIVA	ATTIVITA' LAVORO	DETERMINAZIONE	STIMATO	DETERMINAZIONE	DETERMINAZIONE	DETERMINAZIONE	DETERMINAZIONE	
ME	100	San Pier d'Istria	A	Mezzogiorno	Realizzazione del nucleo abitativo connesso alla strada statale n. 47, in prossimita' della frazione di San Pier d'Istria, comune di San Pier d'Istria (VI).	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	2012	AVVIAZIONE	IN ITALIA	AVVIAZIONE	AVVIAZIONE	21/12/2011	52.105,83 €	47.062,57 €	394.200,00 €	426.938,24 €	Comunicazione di spesa n. 21/12/2011
ME	110	San Pier d'Istria	B	Mezzogiorno	Opere di consolidamento e ripristino dell'assetto del centro storico.	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	2012	AVVIAZIONE	IN ITALIA	AVVIAZIONE	AVVIAZIONE	11/06/2011	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	Comunicazione di spesa n. 11/06/2011
ME	111	San Pier d'Istria	B	Mezzogiorno	Consolidamento e restauro del centro storico.	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	2012	AVVIAZIONE	IN ITALIA	AVVIAZIONE	AVVIAZIONE	11/06/2011	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	Comunicazione di spesa n. 11/06/2011
ME	112	San Pier d'Istria	B	Mezzogiorno	Consolidamento del centro storico.	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	2012	AVVIAZIONE	IN ITALIA	AVVIAZIONE	AVVIAZIONE	11/06/2011	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	Comunicazione di spesa n. 11/06/2011
ME	113	San Pier d'Istria	A	Mezzogiorno	Opere di consolidamento, ripristino e manutenzione del centro storico.	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2012	AVVIAZIONE	IN ITALIA	AVVIAZIONE	AVVIAZIONE	11/06/2011	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	Comunicazione di spesa n. 11/06/2011
ME	114	San Pier d'Istria	B	Mezzogiorno	Manutenzione e consolidamento del centro storico.	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	2012	AVVIAZIONE	IN ITALIA	AVVIAZIONE	AVVIAZIONE	11/06/2011	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	Comunicazione di spesa n. 11/06/2011
ME	115	San Pier d'Istria	A	Mezzogiorno	Opere di consolidamento, ripristino e manutenzione del centro storico.	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2012	AVVIAZIONE	IN ITALIA	AVVIAZIONE	AVVIAZIONE	11/06/2011	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	Comunicazione di spesa n. 11/06/2011





LENGHI DALLA CAMMINATA STRALUMINA NOSTRILLO  
Per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana (art. 204, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 156 del 14.06.2001

REGIONE SICILIANA

PROV.	COD. CIVILIT.	COMUNE	ANNO ORIGINARIO	PROV. ATTUALE	ANNO	COMUNICAZIONE	TIPOLOGIA	MONTANTE SUP.	MONTANTE CANCELLATO	MONTANTE AMMONTARE	MONTANTE TOTALE	SAL.	COMPLESSIVO	AFFIDAMENTO LAVORI		RISULTATO REALIZZATIVO		AFFIDAMENTO LAVORI	MONTANTE IMPORTO	ESECUTIVO IMPEGNO		MONTANTE SUP.	SUPPORTO F.F.P.P.	SAL.		
														IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO			IMPORTO	IMPORTO				IMPORTO	IMPORTO
ME	124	Terme Vigliatore	A	P	Agosto	COMUNICAZIONE	Idoneità tecnica - zona turistica	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €			100% (100%)	100% (100%)	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	100% (100%)	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	100% (100%)	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €			
ME	125	Termini	A	A	Marzo	Messa a disposizione - zona turistica	Messa a disposizione - zona turistica	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €			100% (100%)	100% (100%)	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	100% (100%)	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	100% (100%)	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €			
ME	126	Termini	A	A	Marzo	Messa a disposizione - zona turistica	Messa a disposizione - zona turistica	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €			100% (100%)	100% (100%)	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	100% (100%)	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €	100% (100%)	1.514.800,00 €	1.514.800,00 €			
ME	127	Termini	A	P	Agosto	COMUNICAZIONE	Messa a disposizione - zona turistica	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €			100% (100%)	100% (100%)	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	100% (100%)	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	100% (100%)	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €			



*Manwritten signature/initials*

LEGGE DI FINANZIAMENTO PER LA REGIONE DELLO STATO  
Della Commissione di Finanze del Parlamento  
del Regno del 1910, n. 281, art. 10, par. 1°  
ELENCO DEI TITOLI DI CREDITO

Table with columns: REGIONE, CATEGORIA, TIPOLOGIA, AMMONTARE, etc. Rows include regions like Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-South Tyrol, and Valle d'Aosta.

REGIONE LIGURIA

REGIONE SARDEGNA















REGIONE SICILIANA

*[Handwritten signature]*

LA FINE DEL COLLABORATO TRAGUONUM/TELECOM  
Per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del traliccio ad alto voltaggio, Sicilia, Legge n. 201, n. 248 del 14/11/2014

REPUBBLICA ITALIANA

PROV.	COD.	CONSIGL.	RUBRICA	FONDI	COMPTI	TITOLO	IMPORTO SUP.	IMPORTO PRESUNTO	P.N.	CONVERSIONI	AFFIDAMENTO PUBBLICITÀ	AFFIDAMENTO LAVORI	BENEFICIARI		DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO SUP. CORRISP.	D.	
													n. e data	importo				
SR	177	Carfagna	A	MiStero	COMPTO 24 COMPTO 15 SET 2011	Regolazione e riduzione rischio sismico a difesa del centro storico di Siracusa	2.249.000,00 €	2.249.000,00 €	AMM. ILLUSTRAZIONE	OGNUN	OGNUN	OGNUN	DECRETO N. 247 DEL 28/05/2011	€ 2.249.000,00	Decreto n. 201 del 14/11/2014	Dirigente Area 4 del Dipartimento di Architettura	Ing. Diego Uzzia	
SR	184	Avola	A	MiStero	ASP Integrativo	Opera di difesa e antipaghi della zona di Avola	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	ANAGRAFE PRELIMINARE IN CUDICI	OGNUN	OGNUN	OGNUN	OGNUN	OGNUN	€	OGNUN	OGNUN	OGNUN
SR	185	Barcellona	A	MiStero	ASP Integrativo	Consolidamento sezione urbanistica di Barone	246.000,00 €	246.000,00 €	LAUREA IN INFORMATICA	OGNUN	OGNUN	OGNUN	OGNUN	OGNUN	€	OGNUN	OGNUN	OGNUN
SR	186	Pertusillo di Capo Passero	A	MiStero	ASP Integrativo	Regolazione e riduzione rischio sismico a difesa del centro storico di Siracusa	500.000,00 €	500.000,00 €	COMMISSIONE LAVORI	OGNUN	OGNUN	OGNUN	OGNUN	OGNUN	€	OGNUN	OGNUN	OGNUN





REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

LEGGI DI FINANZA 2012 - 2

LEGGI DI FINANZA 2012 - 2

PROG.	COD.	COMUNE	ZONA PREFERENZIALE	ZONA A/B	REGIONE	COMUNITA'	TIPOLOGIA	INQUADRO. AEP	PROG. DI REALIZZAZIONE	VAL.	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO (MATERIA)	AFFIDAMENTO (MATERIA)	AFFIDAMENTO (MATERIA)	ECONOMIA	ECCED. DI FINANZIAMENTO		RUP	INIZIATIVE (MATERIA)	SCELTE		
																in ESCL.	in ESCL.					
TP	171	Silvi	A	B	Regione	COMUNITA' 14 FEB 2011	Intervento di riqualificazione del centro storico	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
TP	172	San Vito lo Capo	A	A	Molise		Collaborazione nella pianificazione "Zona Marina"	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
TP	173	Tripodi	A	B	Regione	COMUNITA' 14 FEB 2011	Opere di ingegneria idraulica - Zona Subacquea	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
TP	179	Mazzeo del Vallo	A	A	Molise	ASP Integrativo	Lavori di ripristino dei fontali del bacino per la zona di Mazzeo del Vallo	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
TP	180	Mazzeo del Vallo	B	B	Regione	ASP Integrativo	Consolidamento dei franti di scosce	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

LEGGI DI FINANZA 2012 - 2

LEGGI DI FINANZA 2012 - 2





*Il Commissario straordinario delegato*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

Firenze, li 27 marzo 2014

Prot. **1342/2014**

Via PEC

**Onorevole Sig. Ministro**

dell'Ambiente e della tutela del territorio  
e del mare

*per tramite del Capo di Gabinetto*

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

[segreteria.capogab@minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@minambiente.it)

e p.c. Egr. Direttore generale della tutela del  
territorio e delle risorse idriche,  
Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare  
[DGTri@pec.minambiente.it](mailto:DGTri@pec.minambiente.it)  
[TRI-UDG@minambiente.it](mailto:TRI-UDG@minambiente.it)

Egr. Ispettore generale,  
Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare  
[ispettorato.generale@pec.minambiente.it](mailto:ispettorato.generale@pec.minambiente.it)  
[luciani.mauro@minambiente.it](mailto:luciani.mauro@minambiente.it)

Oggetto: Piano straordinario ex art. 2, comma 240, L. 191/2009. Accordo di programma MATTM-  
Regione Toscana, 3 novembre 2010.

*Relazione per il Parlamento sull'attività del Commissario nell'anno 2013*

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 10.12.2010 di nomina trasmetto in formato digitale  
l'allegata relazione annuale per il Parlamento sull'attività svolta nel 2013.

Distinti saluti,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
Prof. Ing. Pier Gino Megale


*Prof. Ing. Pier Gino Megale*

cel.: +39 335 455685 \* e.mail: [pgmegale@lni.unipi.it](mailto:pgmegale@lni.unipi.it) \* pec: [piergino.megale@ingpec.eu](mailto:piergino.megale@ingpec.eu)

presso Autorità di bacino del fiume Arno \* Via dei Servi, 15 - 50122 FIRENZE \* tel. +39 055 267431

sede aggr.: Dip. di Agronomia e gestione dell'agroecosistema - Università di Pisa \* tel. +39 050 2210580 - fax +39 050 6179616

PAGINA BIANCA



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione annuale anno 2013

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10.12.2010

27/03/2013  
Prot. n. 1341  
Commissario Straordinario Delegato  
Prof. Ing. Pier Gino Megale  
**REGIONE TOSCANA**


*L'incarico di commissario, scaduto col 9 dicembre 2013, è proseguito fino alla fine dell'anno in regime di "prorogatio" ai sensi del d.l. 293 del 1994.*

*La presente relazione è stata redatta dopo la proroga dell'incarico commissariale disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014 e la sua registrazione alla Corte dei Conti.*

PAGINA BIANCA

## 1. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

### Pier Gino MEGALE



e. mail: [pgmegale@lni.unipi.it](mailto:pgmegale@lni.unipi.it)  
[www.adbarno.it/commissario/](http://www.adbarno.it/commissario/)  
tel.: 335 455685

Nato a Pisa, 1946.

Ingegnere civile, sez. idraulica.

Professore associato di Idraulica agraria nell'Università di Pisa.

Membro esperto nel Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Arno.

Già membro della Segreteria tecnica della Direzione generale per la qualità della vita e successivamente della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## 2. LA MISSIONE

Nell'ambito dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 240, della Legge 191 del 2009 (Finanziaria 2010), il commissario straordinario delegato attua gli interventi di difesa del suolo individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della regione, sentiti le autorità di bacino di rilievo nazionale e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. **Non compete quindi al commissario né l'individuazione degli interventi, né la destinazione delle risorse.**

Non compete al commissario straordinario delegato la gestione degli stati di emergenza, affidati a commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile.

A compimento dell'**Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico**, sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, il commissario straordinario delegato attua gli interventi, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi.

Per l'espletamento dei propri compiti il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi il commissario è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

I provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

### 3. LA CONTABILITÀ SPECIALE

Quale strumento gestionale per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse di più amministrazioni, enti ed organismi pubblici può essere adottata una contabilità speciale, intestata al funzionario responsabile, costituita dalle somme versate in tesoreria dalle amministrazioni firmatarie dell'accordo per formare fondi necessari per sua attuazione. Nella fattispecie la contabilità speciale è stata aperta a nome del commissario straordinario delegato.

Malgrado il diverso punto di vista della Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale del MiSE, è convincimento dello scrivente che la gestione della contabilità speciale debba avvenire in regime di cassa, anche alla luce del parere della Ragioneria generale dello Stato, secondo il quale per la stipula di contratti i commissari "hanno a disposizione le risorse effettivamente trasferite nella contabilità speciale, che rappresentano, quindi, la copertura finanziaria al momento disponibile dell'opera delegata". Ciò impedisce al commissario di assumere "impegni" di spesa senza avere in cassa la somma corrispondente, ovvero aver ricevuto dai sottoscrittori dell'accordo di programma le risorse necessarie per la sua attuazione.

### 4. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

<b>Regione</b>	<b>TOSCANA</b>
<b>Decreto nomina del Commissario</b>	<b>DPCM 10 dicembre 2010</b>
<b>Data sottoscrizione Accordo</b>	<b>3 novembre 2010</b>
<b>Importo complessivo dell'Accordo</b>	<b>€ 126.573.395,00</b>
<b>Data sottoscrizione 1° Accordo integrativo</b>	<b>3 agosto 2011</b>
<b>Importo complessivo rimodulato a seguito del 1° Accordo integrativo</b>	<b>€ 119.873.395,00</b>
<b>Data sottoscrizione 2° Accordo integrativo</b>	<b>9 novembre 2012</b>
<b>Importo complessivo a seguito del 2° Accordo integrativo</b>	<b>€ 118.682.711,00</b>
<b>di cui: MATTM</b>	<b>€ 60.300.000,00</b>
<b>Regione Toscana</b>	<b>€ 58.382.711,00</b>
<b>Importo programmato per il periodo<sup>(1)</sup>:</b>	
- 2011	€ 55.414.495,00
- 2012	€ 46.619.200,00
- 2013	€ 17.840.000,00
<b>Risorse trasferite alla contabilità speciale:</b>	
- 2011 <sup>(2)</sup>	€ 25.200.000,00
- 2012 <sup>(3)</sup>	€ 12.538.461,54
- 2013 <sup>(4)</sup>	€ 14.958.346,07
<b>Risorse impegnate<sup>(5)</sup>:</b>	
- 2011	€ 24.470.265,77
- 2012	€ 698.039,77
- 2013	€ 13.066.850,06
<b>Importo accantonato con obbligazioni giuridicamente vincolanti<sup>(6)</sup>:</b>	
- 2011	€ 512.013,29
- 2012	€ 16.670.054,66
- 2013	€ 22.630.157,47
<b>Importo pagato nel periodo:</b>	
- 2011	€ 478.617,75
- 2012	€ 7.953.263,81
- 2013	€ 4.672.275,47

(1) Da cronoprogramma, art. 3, DPCM 10.12.2010 (nomina), relativo all'importo previsto dall'Accordo di programma.

(2) 18.000.000,00 € in maggio, 7.200.000,00 € in novembre.

(3) 1.038.461,54 € in settembre, 11.500.000,00 € in dicembre.

(4) 2.000.000,00 € in maggio, 5.582.711,00 € in luglio, 1.661.538,46 € in settembre, 5.714.096,61 € in novembre.

(5) Riservate in contabilità speciale a seguito di atti del commissario.

(6) Contratti e analoghi

## 5. CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Le tabelle che seguono forniscono un quadro sintetico della situazione toscana.

<b>Regione Toscana</b>		
<b>Superficie</b>	<b>km<sup>2</sup></b>	<b>22 994</b>
<b>Comuni</b>	<b>n</b>	<b>287</b>
<b>Abitanti</b>	<b>n</b>	<b>3 745 786</b>

<b>Ripartizione geografica del territorio</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Toscana</b>	<b>Italia</b>
<b>Territorio montano</b>	<b>25,1%</b>	<b>35,2%</b>
<b>Territorio collinare</b>	<b>66,5%</b>	<b>41,6%</b>
<b>Territorio di pianura</b>	<b>8,4%</b>	<b>23,2%</b>

<b>Rischio idraulico</b>			
<b>Comuni soggetti</b>	<b>n</b>	<b>263</b>	<b>92%</b>
<b>Superficie totale soggetta</b>	<b>km<sup>2</sup></b>	<b>2 530</b>	<b>11%</b>
<b>Superficie totale soggetta a rischio idraulico molto elevato</b>	<b>km<sup>2</sup></b>	<b>973</b>	<b>4,2%</b>

Legambiente, Protezione civile, Regione Toscana, ARPAT

Per quanto non abbia un significato diretto, si deve rilevare che la superficie soggetta ad allagamenti supera l'intera superficie di pianura.

<b>Rischio da frana</b>			
<b>Numero dei fenomeni franosi (ISPRA 2009)</b>	<b>n</b>	<b>39 517</b>	
<b>Comuni soggetti</b>	<b>n</b>	<b>249</b>	<b>87%</b>
<b>Superficie totale soggetta</b>	<b>km<sup>2</sup></b>	<b>1 464</b>	<b>6,4%</b>

Legambiente, Protezione civile, Regione Toscana, ISPRA

<b>Danni provocati dalle frane</b>		
<b>Eventi con danni segnalati</b>	<b>n</b>	<b>3 919</b>
<b>Infrastrutture e trasporti</b>		<b>48,9%</b>
<b>Nuclei abitati e case sparse</b>		<b>18,7%</b>
<b>Corsi d'acqua</b>		<b>21,0%</b>

Elaborazione CRESME su dati ISPRA (censimento frane 2007)

A fronte di un territorio pari al 7,6% di quello nazionale, in Toscana le aree in frana rappresentano l'8% del dato complessivo, anche se con un indice di franosità (6,4%) leggermente inferiore a quello medio nazionale pari a 6,9%. Circa la metà delle infrastrutture è minacciata da fenomeni

franosì. Un quinto delle frane incombe su corsi d'acqua, minacciando così di innescare anche fenomeni di straripamento.

Completivamente un cittadino su otto vive in un'area soggetta a elevata criticità idrogeologica. Considerato che il costo aggiornato dei danni prodotti in Italia dal dissesto idrogeologico nel periodo 1944-2012 è stato valutato in 900 milioni di euro all'anno, l'ordine di grandezza per la quota toscana può essere indicato in quasi 70 milioni di euro all'anno.

<b>Elevata criticità idrogeologica - 2011</b>			
<b>Comuni soggetti</b>	<i>n</i>	<b>97,6%</b>	<b>280</b>
<b>Superficie totale soggetta</b>	<i>km<sup>2</sup></i>	<b>11,1%</b>	<b>2 542</b>
<b>Popolazione residente</b>	<i>n</i>	<b>12,8%</b>	<b>479 162</b>
<b>Famiglie residenti</b>	<i>n</i>	<b>12,8%</b>	<b>206 394</b>
<b>Patrimonio edilizio sottoposto</b>	<i>n</i>	<b>Abitazioni</b>	<b>229 701</b>
	<i>n</i>	<b>Edifici res.</b>	<b>92 347</b>
	<i>n</i>	<b>Non res.</b>	<b>12 974</b>

Elaborazioni CRESME su dati ISTAT e MATTM

<b>Erosine costiera</b>					
<b>Sviluppo costiero</b>	<i>km</i>	<b>Italia</b>	<b>7 911</b>	<b>Toscana</b>	<b>582</b>
<b>Costa rocciosa</b>	<i>km</i>	<b>4 138</b>	<b>52%</b>	<b>366</b>	<b>63%</b>
<b>Costa armata</b>	<i>km</i>	<b>592</b>	<b>8%</b>	<b>16</b>	<b>3%</b>
<b>Spiagge</b>	<i>km</i>	<b>3 181</b>	<b>40%</b>	<b>200</b>	<b>34%</b>
<b>In erosione</b>	<i>km</i>			<b>72</b>	<b>36%</b>
<b>In ripascimento</b>	<i>km</i>			<b>128</b>	<b>64%</b>

ENEA

Non deve trarre in inganno il rapporto apparentemente favorevole tra spiagge in erosione e spiagge in ripascimento, poiché il fenomeno erosivo è molto più incisivo di quello di crescita, che spesso registra tassi di pochi centimetri all'anno. Una ricerca bibliografica, effettuata per conoscere la variazione complessiva della superficie costiera della Toscana, ha riproposto da varie fonti la cifra di 214 000 m<sup>2</sup> come superficie perduta. Il dato fornisce la somma di fenomeni che si sono sviluppati in tempi e per lassi diversi, pertanto, pur confermando la prevalenza dei fenomeni erosivi, non consente di dare al bilancio un riferimento cronologico unico.

## 6. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

### 6.1. Ufficio del commissario e struttura operativa

L'ufficio del commissario ha sede presso l'Autorità di bacino del fiume Arno<sup>1</sup>, in Firenze, di cui si avvale con apposita convenzione per il supporto tecnico, giuridico, amministrativo-contabile, e logistico. Buona parte della propria attività, comunque, è svolta dal commissario nel proprio ufficio dell'Università di Pisa, messi a disposizione dal dipartimento di afferenza, dove sono conservati il protocollo e gli atti.

<sup>1</sup> Organismo misto stato-regione, il cui Comitato istituzionale è presieduto dal ministro dell'ambiente.



Del personale in servizio presso l'Autorità di bacino del fiume Arno, quello che affianca all'attività di istituto quella per il commissario, ha ricorso, se necessario, al lavoro straordinario nei limiti fissati dal DPCM 20.07.2011 e ha beneficiato di una quota del 10% degli incentivi previsti dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. n.163 del 2006, la cui ripartizione è stabilita dalla suddetta convenzione.

In particolare fanno parte dell'ufficio del commissario:

- il dirigente amministrativo dell'Autorità di bacino del fiume Arno, che coordina le attività dell'ufficio e provvede agli adempimenti amministrativi e alla gestione della contabilità speciale;
- il *coordinatore dell'ufficio legislativo*, che fornisce consulenza giuridica e attività di segreteria;
- un funzionario tecnico ingegnere, che segue gli interventi a prevalente rilevanza idraulica;
- un funzionario tecnico geologo, che segue gli interventi sulle frane;
- un tecnico informatico, che provvede degli adempimenti informatici e alla gestione del sito web.

Per gli aspetti legati agli appalti e ai contratti l'ufficio si avvale della consulenza del responsabile del Servizio gestione gare di appalto della Provincia di Massa Carrara.

L'Autorità di bacino ospita nel proprio spazio informatico il sito web del commissario, che dà notizie sull'Accordo di programma e sull'andamento della gestione commissariale. Il sito fornisce inoltre informazioni, strumenti e recapiti utili ai responsabili del procedimento per rendere più agevole il loro compito. [www.adbarno.it/commissario/](http://www.adbarno.it/commissario/)

È fatto ampio ricorso a strumenti informatici e ad archivi condivisi, raccolti in un unico spazio accessibile per via telematica (VPN) a tutti gli operatori, indipendentemente dall'ubicazione del posto di lavoro.

## 6.2. Attuazione degli interventi

Per l'attuazione degli interventi il commissario ricorre all'istituto dell'avvalimento, utilizzando di preferenza i soggetti competenti in via ordinaria, pur conservando la titolarità e l'esercizio della propria funzione; approva tutti gli atti che producono spesa e provvede direttamente ai pagamenti, con la snellezza e semplicità amministrativa tipica della contabilità speciale di cui è titolare. Questa procedura inoltre affranca la gestione dei finanziamenti dai vincoli del patto di stabilità interno.

Il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 9 dell'Accordo di programma (ReNDiS) è effettuato direttamente dall'ufficio del commissario ed è aggiornato costantemente.

Nel 2013 al monitoraggio ReNDiS si è affiancato, per gli interventi finanziati con fondi CIPE, quello SGP, attuato in collaborazione con la Regione Toscana. Purtroppo l'aggiornamento non è garantito a causa del cattivo funzionamento del sistema.

## 6.3. Costi di gestione

Il DPCM 20.07.2011 dà facoltà ai commissari di gravare sul quadro economico di ciascun intervento una somma non superiore all'1,5% dell'importo dell'intervento, per sostenere le spese legate all'espletamento del proprio incarico, senza incidere sulla quota a copertura dei compensi.

In relazione all'entità dell'Accordo di programma il costo della gestione commissariale, inclusi i compensi del commissario, è stato stimato a suo tempo nello 0,8% dell'importo complessivo degli interventi. Prudenzialmente sul quadro economico di ciascuno di essi viene fatta gravare una quota dell'1%.

Dopo tre anni di attività, l'incidenza dei costi della gestione commissariale, compresi i compensi del commissario, può essere stimata in circa lo 0,5 % dell'importo degli interventi. **I soli costi dell'ufficio, missioni del commissario comprese, ammontano a oggi a circa 1.000,00 euro al mese.**

Tale quota non tiene conto del rimborso del trattamento economico corrisposto al commissario dall'Università di Pisa, ai sensi dell'art. 17 del DL 195 del 2009. In attesa di sapere se il rimborso debba gravare, come gli altri costi di gestione, sulle risorse destinate all'attuazione dell'accordo di programma, una cifra pari al rimborso per gli anni 2010-2012 è stata accantonata dal commissario nella contabilità speciale.


## 7. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

<b>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente</b>				
<b>Data</b>	<b>Importo corrente</b> <i>(per l'anno 2013)</i>	<b>Importo cumulato</b> <i>(anno 2013 + precedente periodo)</i>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
sett. 2013	1.661.538,46	37.914.096,61	6.259.333,68	31.654.762,93
nov. 2013	5.714.096,61			
	7.375.635,07			

<b>Risorse economiche provenienti dalla Regione Toscana</b>				
<b>Data</b>	<b>Importo corrente</b> <i>(per l'anno 2013)</i>	<b>Importo cumulato</b> <i>(anno 2013 + precedente periodo)</i>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
mag. 2013	2.000.000,00	14.782.711,00	6.844.823,36	7.937.887,64
lug. 2013	5.582.711,00			
	7.582.711,00			

## 8. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RELATIVO STATO DELLA SPESA

<b>Descrizione attività</b>	<b>Importo speso corrente</b> <i>(per l'anno 2013)</i>	<b>Importo speso cumulato</b> <i>(anno 2013 + precedente periodo)</i>
struttura commissariale compensi compresi	136.795,77	231.518,94
attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	4.535.479,70	13.174.191,18

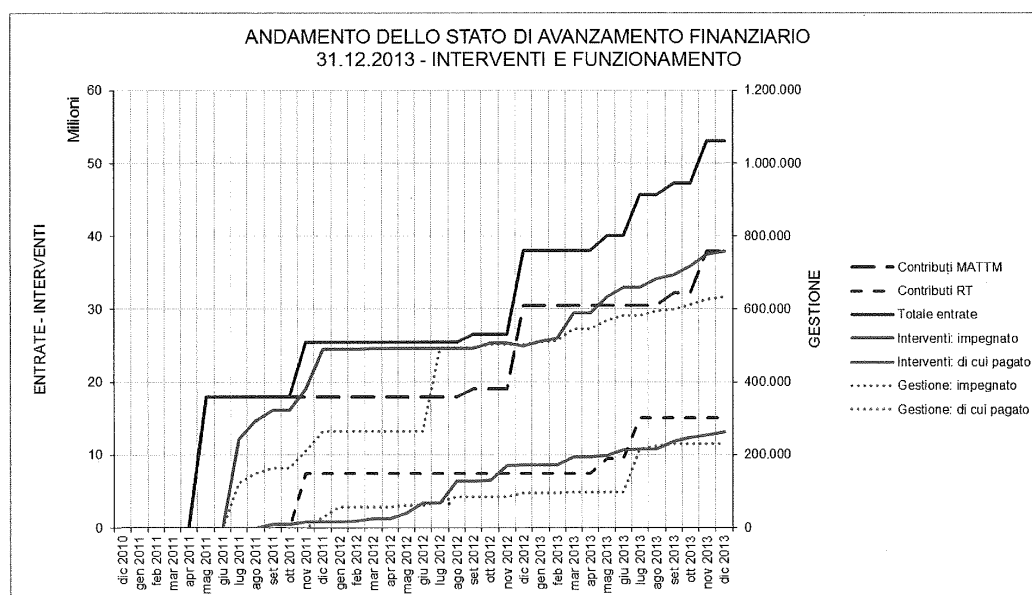

## 9. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE



*Il Commissario straordinario delegato*

COMMISSARIO DELEGATO: Prof. Ing. Pier Gino Megale D.P.C.M. del 10 dicembre 2010

Attuazione dell'accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico

RENDICONTO N. 1

Esercizio finanziario 2013

## CS RISCHIO IDROGEOL TOSCANA

Contabilità speciale n. 5588 aperta il 28 aprile 2011

FONDI RICEVUTI ENTRATE		IMPORTI EROGATI USCITE	
Giacenza di cassa al 01/01/13	€ 29.306.579,98	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€ 0,00	1) redditi da lavoro dipendente	69.687,83
2) Fondi Statali	€ 7.373.635,07	2) Consumi intermedi	11.104,84
3) Fondi Regionali	€ 7.582.711,00	3) Interessi passivi	
4) Fondi di Enti Locali	€ 0,00	4) Trasferimenti a Regioni	11.445,81
5) Tariffe e proventi per servizi	€ 0,00	5) Trasferimenti a Enti Locali	52.779,65
6) Accensione prestiti	€ 0,00	6) Investimenti diretti	4.399.140,77
7) Altro	€ 0,00	7) Trasferimento in c/capitale	
		8) Rimborso prestiti	
		9) Versamenti erariali	96.849,55
		10) Versamenti previdenziali	31.267,03
		11) Altro	
		Totale uscite	4.672.275,48
		12) Titoli investiti e accantonamenti di tesoreria	0,00
Totale al 31/12/12	€ 44.264.926,05	Disponibilità di cassa	39.592.650,57
		Totale a pareggio	44.264.926,05

Firenze, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
DI \_\_\_\_\_

IL COMMISSARIO DELEGATO  
(Prof. Ing. Pier Gino Megale)

## 10. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

### 10.1. 2° Atto integrativo all'accordo di programma

Con l'applicazione del secondo atto integrativo all'Accordo di programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012 e registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2013, fin dal 2012 gli interventi previsti dall'accordo risultano ripartiti in due categorie.

Una è composta da 41 interventi, dell'importo complessivo di 20.100.000,00 euro, finanziati con le risorse PAR-FAS destinate dalla regione al finanziamento dell'accordo. I suddetti interventi sono gestiti amministrativamente dalla Regione Toscana tramite ARTEA, secondo le procedure previste per i finanziamenti PAR-FAS, che prevedono che le risorse relative siano assegnate direttamente ai beneficiari nel ruolo di ente attuatore. Per tali interventi il commissario svolge attività di monitoraggio, vigilanza e impulso ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, e s.m.i.

L'altra è composta dai rimanenti 50 interventi, dell'importo complessivo di 98.582.711,00 euro, alla cui attuazione provvede il commissario straordinario delegato, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30.12.2009, n. 195, e s.m.i. tramite contabilità speciale.

### 10.2. Modalità di attuazione degli interventi e descrizione delle attività

Pare utile ricordare che l'attuazione di un intervento passa attraverso tre fasi:

- la progettazione, che culmina con l'approvazione del progetto, normalmente l'esecutivo, dopo aver raccolto tutti i pareri, prescrizioni e approvazioni richieste;
- l'*affidamento*, che si conclude col contratto d'appalto;
- l'*esecuzione* dei lavori e il loro collaudo.

Per redigere un progetto è sempre necessario disporre di adeguate risorse, perché, per quanto un'amministrazione possa essere dotata di una struttura operativa robusta, alcune attività come rilievi, sondaggi, indagini e prove e alcune prestazioni specialistiche debbono essere necessariamente affidate all'esterno. Laddove, poi, l'amministrazione non possieda le competenze necessarie, il contributo esterno diventa predominante. Quindi anche la sola progettazione non può essere avviata senza un adeguato finanziamento. Per questa ragione è assai raro che un'amministrazione si impegni nella progettazione esecutiva senza la certezza del finanziamento e possa disporre di progetti "*cantierabili*" in attesa di essere finanziati.

Il tempo per disporre di un progetto "*cantierabile*" dipende dall'entità delle attività preoperative, dalla complessità del progetto e dai tempi di approvazione, che per progetti di complessità ordinaria sono i più lunghi. A questi si aggiungono i tempi per l'affidamento delle prestazioni esterne. In pratica si oscilla complessivamente tra i 4 e gli 8 mesi.

I tempi minimi di appalto sono fissati dalla legge, ma nella pratica possono variare in funzione del numero dei concorrenti e dal criterio di aggiudicazione prescelto. Ottimisticamente possono essere valutati in non meno di 4, 5 mesi; nei casi più semplici ovvero di appalti inferiori al milione di euro, raramente si riesce a contenere i tempi entro 3 mesi. Quindi la firma del contratto di appalto, anche per lavori di modesta entità, non può avvenire prima di 7-8 mesi dall'inizio della progettazione, ma nei casi più articolati si può superare abbondantemente l'anno, sempre che siano disponibili le risorse necessarie.

Il tempo di esecuzione dei lavori dipende, ovviamente, dalla loro entità, salvo imprevisti.

Come accennato al punto 6.2 il commissario attua gli interventi avvalendosi di preferenza e ove possibile dei soggetti competenti in via ordinaria. Questa scelta, condivisa fin dagli inizi con la Regione Toscana, avrebbe permesso di avviare più opere contemporaneamente, ripartendo gli interventi tra più soggetti diversi. Purtroppo il flusso finanziario insufficiente a garantire copertura a tutti gli interventi previsti dal cronoprogramma non lo ha permesso. Di tale circostanza, ai sensi dell'art. 3 del DPCM di nomina, è stata data formale comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota 3 marzo 2012, prot. n. 280/2012.

L'avvalimento, disposto con ordinanza e perfezionato con apposita convenzione con l'ente avvalso, è disciplinato dal Regolamento di avvalimento approvato con decreto commissariale 21 novembre 2011, n. 5, e modificato e integrato con decreti 30 marzo 2012, n. 23, 5 luglio 2012, n. 50 e 29 ottobre 2012, n. 78. Il regolamento definisce il ruolo e gli impegni dell'ente avvalso, il processo di realizzazione degli interventi, i limiti di spesa per la progettazione e le attività tecniche, le procedure dei pagamenti e il supporto tecnico e amministrativo fornito dal commissario. Il quadro riassuntivo del processo di attuazione degli interventi è riportato in allegato.

Di norma l'avvalimento riguarda la progettazione e la realizzazione dell'intervento, compreso l'appalto. Tutti gli atti che producono spesa sono approvati dal commissario che, assumendone così la titolarità, provvede direttamente ai pagamenti.

Nella prima fase operativa della gestione commissariale, cioè a partire dall'accreditamento in contabilità speciale della prima tranche dei finanziamenti (maggio 2011), con l'ordinanza di avvalimento venivano accantonate per intero le risorse previste per ciascun intervento, avviando con residui di cassa, insufficienti a garantire anche la copertura dei lavori, i progetti di altri interventi in attesa di ulteriori trasferimenti.

Purtroppo l'incertezza sui tempi di trasferimento delle risorse, e non solo, ha rallentato l'attività di progettazione, per cui il proposito di disporre di progetti esecutivi all'atto dei successivi trasferimenti non è stato sempre rispettato. Ha contribuito anche il fatto che gli accrediti sono avvenuti senza alcun preavviso, cosa che ha impedito un minimo di programmazione.

A partire dall'inizio di quest'anno si è consolidata la seguente prassi.

- L'ordinanza di avvalimento, individua l'ente avvalso, nomina il responsabile del procedimento (RUP), approva il progetto presentato dall'ente, generalmente il preliminare, e, sulla base del quadro economico, accantona e mette a disposizione la somma necessaria per redigere il progetto esecutivo. Successivamente il commissario approva i disciplinari e i contratti delle attività affidate all'esterno dell'ente, verificandone la congruenza con le previsioni di spesa e paga le conseguenti fatture su proposta del RUP.
- Una volta verificato, validato e approvato in linea tecnica dall'ente in avvalimento, il commissario approva a sua volta il progetto esecutivo, controllando che sia coerente con l'intervento previsto dall'Accordo di programma e che rispetti i limiti di spesa a esso assegnati.
- Soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, in funzione delle disponibilità di cassa, il commissario *autorizza l'avvio della gara di appalto* e accantona le somme necessarie previste dal quadro economico.

Questa procedura rende più elastica la gestione dei finanziamenti e mette in competizione gli enti avvalsi, in quanto le risorse per la realizzazione delle opere sono destinate agli interventi che per primi possono andare in gara. Questa sollecitazione è avvertita soprattutto dalle amministrazioni comunali, più sensibili ai disagi del territorio.

Conclusasi positivamente la procedura di gara, il commissario approva il contratto di appalto e il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, *paga gli stati d'avanzamento* certificati dal RUP, approva eventuali *varianti in corso d'opera*, nomina se necessario il collaudatore e approva il collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

Rispetto al trasferimento delle risorse agli enti appaltatori, la gestione di una contabilità speciale ha il vantaggio già accennato in precedenza di non dover sottostare ai vincoli del patto di stabilità. In più il pagamento diretto delle spese da parte del commissario è molto rapido, non più di 15 giorni dalla liquidazione, cosa che spinge le imprese a una maggiore produttività e riduce il contenzioso; ne sia prova il fatto che **ad oggi nessuna delle imprese appaltatrici ha posto riserve in contabilità.**

Si deve rilevare che non vi è alcun rapporto tra la natura o la dimensione dell'ente avvalso e l'efficienza operativa. Anzi molto spesso le amministrazioni più piccole sono più disponibili ad accettare l'avvalimento e si dimostrano più efficienti e dinamiche di quelle di maggiori dimensioni, appesantite da meccanismi burocratici articolati in compartimenti stagni.

Nella tabella che segue sono riportati, con riferimento alla data di stesura della presente relazione e limitatamente a quelli attuati dal commissario, il numero degli interventi affidati in avvalimento e il loro importo complessivo distinti per tipologia di ente avvalso.

<i>Enti in avvalimento</i>	<i>n. interventi</i>	<i>importo complessivo</i>
<b>Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti</b>	<b>15</b>	<b>10.921.194,00</b>
<b>Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti</b>	<b>9</b>	<b>10.120.000,00</b>
<b>Unioni di comuni</b>	<b>3</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Consorzi di bonifica</b>	<b>2</b>	<b>703.517,00</b>
<b>Province</b>	<b>17</b>	<b>41.550.000,00</b>
<b>Uffici del genio civile (Regione Toscana)</b>	<b>2</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>65.364.711,00</b>


Salta all'occhio lo scarso coinvolgimento degli Uffici regionali del genio civile, di cui ci si sarebbe aspettata una maggiore disponibilità proprio in relazione alla straordinarietà del Piano. C'è da dire, però, che le emergenze prodotte dalle alluvioni in Lunigiana, all'Isola d'Elba e nel grossetano hanno costretto gli apparati regionali a mobilitare tutte le risorse tecniche disponibili, con un impegno, continuato nel 2013 e ancora in corso. Le ripetute emergenze della Lunigiana giustificano, anche se solo in parte, i forti ritardi nella stesura dei progetti degli interventi affidati alla Provincia di Massa Carrara.

Per far fronte almeno in parte a detti ritardi, in giugno è stato revocato l'avvalimento della Provincia di Massa Carrara per quattro interventi, assegnati ai comuni di Carrara e di Zeri e all'Unione dei Comuni della Lunigiana. In luglio è stato revocato l'avvalimento del Consorzio del Padule di Fucecchio per l'intervento che gli era stato affidato, che è stato trasferito al Comune di Altopascio. La revoca è stata disposta su richiesta del consorzio, parte civile in una vicenda giudiziaria che ha riguardato anche detto intervento.


### 10.3. Livello di attuazione globale degli interventi

A seguito della suddivisione in lotti di alcuni interventi e dei nuovi accordi sanciti dal Secondo atto integrativo, il numero complessivo degli interventi al 31.12.2013 è 91, di cui 41, finanziati con fondi PAR-FAS, sono gestiti attraverso ARTEA. Come detto in precedenza, per essi il commissario esercita la funzione di impulso e controllo, ma non quella di soggetto attuatore che è affidata direttamente dalla regione agli enti appaltatori. Gli interventi attuati dal commissario tramite contabilità speciale sono quindi 50.

<i>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</i>	<i>n. interventi al dicembre 2013</i>	<i>n. interventi al dicembre 2012</i>	<i>n. interventi al dicembre 2011</i>
<b>Attuati tramite ARTEA</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>17</b>
<b>Attesa di avvio</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>42</b>
<b>In corso di progettazione, indagini comprese.</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>19</b>
<b>Progettazione ultimata</b>	<b>1</b>		
<b>In corso di appalto</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>In esecuzione</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Lavori ultimati (collaudati e no)</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>Totale interventi</b>	<b>91</b>	<b>86</b>	<b>87</b>

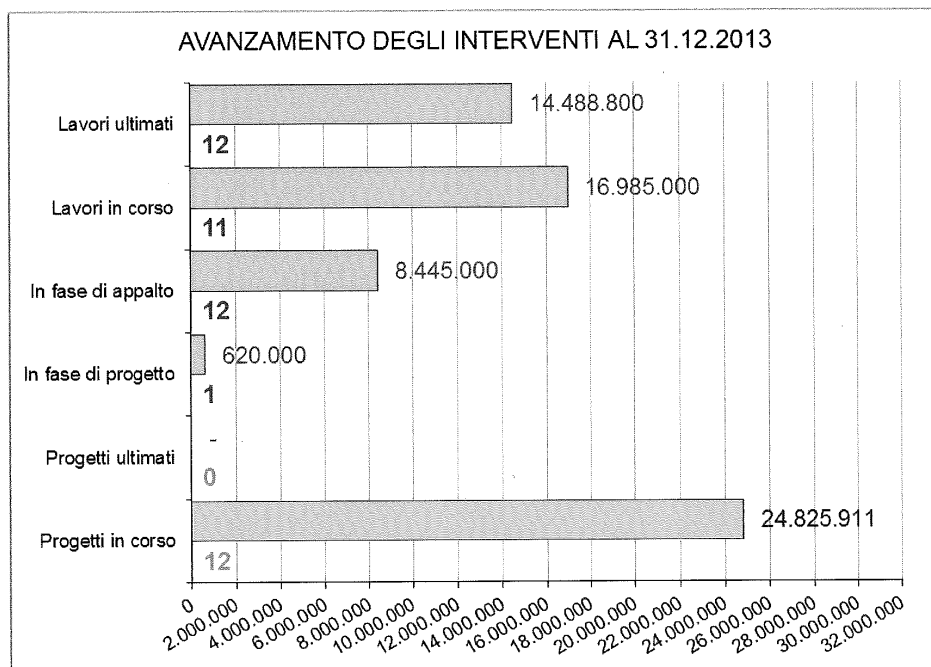

Gli importi indicati nel grafico precedente e in quello che segue fanno riferimento alle somme previste per ciascun intervento dall'Accordo di programma.

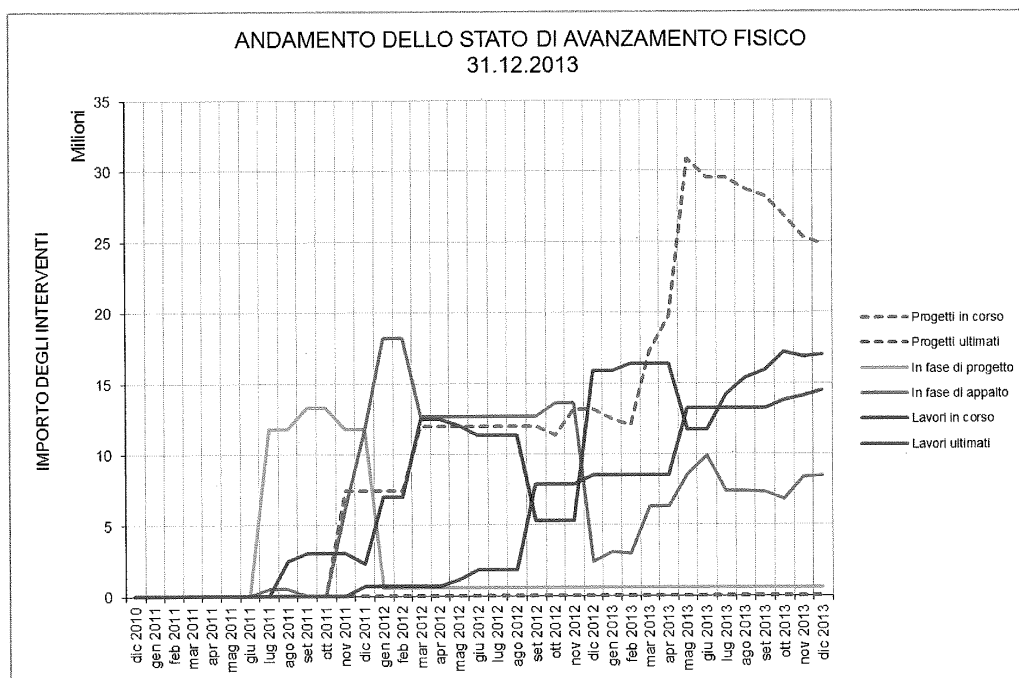

Il trasferimento degli interventi ad ARTEA è avvenuto a seguito di provvedimenti assunti alla fine del 2011 per i primi 17 e del 2012 per i restanti 25 (poi divenuti 24 per l'accorpamento di due lotti). L'attività degli interventi ARTEA 2011 in realtà ha avuto inizio soltanto nel 2012 e quella degli interventi ARTEA 2012 soltanto nel 2013. Mentre gli interventi attuati dal commissario sono modulati in base alla disponibilità di cassa, quelli gestiti tramite ARTEA sono totalmente finanziati.

Nella tabella che segue è riportata la fase di attuazione alla fine del 2013 degli interventi ARTEA e la fase di attuazione dell'Accordo di programma nel suo complesso.

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi tramite ARTEA</b>	<b>n. interventi TOTALE</b>
<i>Attesa di avvio o in fase di progetto preliminare</i>	<b>9</b>	<b>11</b>
<i>In corso di progettazione indagini comprese.</i>	<b>10</b>	<b>23</b>
<i>In corso di appalto</i>	<b>0</b>	<b>12</b>
<i>In esecuzione</i>	<b>10</b>	<b>21</b>
<i>Lavori ultimati (collaudati e non)</i>	<b>12</b>	<b>24</b>
<b>Totale interventi finanziati</b>	<b>41</b>	<b>91</b>

Praticamente la metà degli interventi sono ultimati o sono in corso. Di qui a breve ne inizieranno altri 12. Salvo pochi casi particolarmente complessi anche le progettazioni in corso sono in fase di ultimazione.

#### **10.4. Ulteriori riflessioni sull'attuazione degli interventi tramite ARTEA**

Con la gestione tramite ARTEA, che ricorre alla contabilità ordinaria ovvero in regime di competenza, una parte degli interventi inseriti nell'Accordo di programma perde i maggiori benefici della gestione commissariale (attuazione diretta, deroghe, ecc.) ed in particolare quelli economici. Col meccanismo dell'avvalimento il finanziamento delle opere non incide sul bilancio dell'ente appaltatore (patto di stabilità), bensì sulla contabilità speciale del commissario, che operando in regime di cassa non solo garantisce la copertura finanziaria, ma anche la tempestività dei pagamenti, che si riverbera positivamente anche sull'economia delle imprese.

Col meccanismo ARTEA, per esempio, l'accesso alla prima tranche del finanziamento è condizionato alla consegna dei lavori, per cui tutte le spese di progettazione dovrebbero essere anticipate dall'ente attuatore. Nella pratica i creditori sono costretti ad aspettare l'erogazione del primo anticipo del finanziamento. Il trasferimento delle risorse da ARTEA all'ente attuatore, oltre ad avvenire in tempi lunghi, spesso è insufficiente a coprire la spesa da giustificare per ottenere l'acconto successivo, per cui la stazione appaltante deve ricorrere ad anticipazioni di cassa o addirittura al credito.

È evidente che queste difficoltà sono più sentite dalle piccole amministrazioni, che magari non sono tenute al rispetto del patto di stabilità, ma per le quali l'entità del costo dell'intervento è rilevante rispetto al bilancio. Per questa ragione il commissario, preso atto della volontà dei sottoscrittori dell'accordo di procedere per questa strada, aveva suggerito, senza successo, di orientare il finanziamento PAR-FAS sugli interventi di maggiore entità di competenza provinciale.

#### **10.5. Attività amministrativa**

Alla data della presente relazione l'attività amministrativa del commissario è documentata da: 1307 atti protocollati, 287 decreti, 40 ordinanze, 21 convenzioni.



**11. PREVISIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITÀ 2014****11.1. Confronto tra lo stato di avanzamento di previsione (Relazione 2012) e quello effettivo**

Con la relazione annuale per il 2012 si formulava una previsione dello stato di attuazione degli interventi, in relazione al profilo atteso dei trasferimenti alla contabilità speciale, che alla resa dei conti è risultata eccessivamente ottimistica.

Nella tabella che segue sono messi a confronto, per il fabbisogno economico di previsione, gli afflussi alla contabilità speciale previsti ed effettivi. L'importo complessivo dell'Accordo di programma e l'importo degli interventi attuati tramite ARTEA sono stati aggiornati alla luce del Secondo atto integrativo dopo la sua registrazione alla Corte dei Conti.

NATURA O PROVENIENZA DEL FINANZIAMENTO	Importo					
	MATTM		Regione Toscana		Totale	
	previsione	consuntivo	previsione	consuntivo	previsione	consuntivo
Accordo di programma	60.300.000,00	60.300.000,00	59.573.395,00	58.382.711,00	119.873.395,00	118.682.711,00
Interventi in attesa di avvio					-11.218.000,00	-11.218.000,00
Interventi in corso di progett.					-22.000.000,00	-22.000.000,00
Progetti ultimati					-13.118.200,00	-13.118.200,00
Fabbisogno 2013					73.537.195,00	72.346.511,00
Trasferiti alla contabilità spec.	30.538.461,54	29.500.000,00	15.084.264,09	15.084.264,09	45.622.725,63	44.584.264,09
Interventi ARTEA			20.086.395,00	20.100.000,00	20.086.395,00	20.100.000,00
CIPE delibera 6/2012	13.500.000,00	8.414.096,61			13.500.000,00	8.414.096,61
<b>Totale disponibile</b>	<b>44.038.461,54</b>	<b>37.914.096,61</b>	<b>35.170.659,09</b>	<b>35.184.264,09</b>	<b>79.209.120,63</b>	<b>73.098.360,70</b>
<b>Saldo disponibile</b>					<b>5.671.925,63</b>	<b>- 751.849,70</b>

Il trasferimento regionale alla contabilità speciale tiene conto di 301.553,09 euro anticipati dalla Regione Toscana per il progetto dell'intervento di Follonica (91a), che vengono acquisiti come contributo al finanziamento dell'Accordo di programma.

Dalla tabella si evince che se lo stato di avanzamento fisico degli interventi avesse rispettato le previsioni si sarebbe verificato un deficit di cassa di poco superiore a 750 mila euro. Sicuramente l'andamento dell'attuazione degli interventi si sarebbe discostato maggiormente da quello previsto a causa del fatto che il trasferimento dei fondi CIPE è avvenuto soltanto a partire da settembre.

Nell'analoga tabella che segue, la previsione è invece posta a confronto col fabbisogno economico legato all'effettivo stato di avanzamento fisico degli interventi. Il ritardo nella realizzazione degli interventi ha prodotto un saldo teorico attivo delle disponibilità di oltre 12 milioni di euro.

NATURA O PROVENIENZA DEL FINANZIAMENTO	Importo					
	MATTM		Regione Toscana		Totale	
	previsione	consuntivo	previsione	consuntivo	previsione	consuntivo
Accordo di programma	60.300.000,00	60.300.000,00	59.573.395,00	58.382.711,00	119.873.395,00	118.682.711,00
Interventi in attesa di avvio					-11.218.000,00	-33.218.000,00
Interventi in corso di progett.					-22.000.000,00	-24.401.811,00
Progetti ultimati					-13.118.200,00	-620.000,00
Fabbisogno al 2013					73.537.195,00	60.442.900,00
Trasferiti alla contabilità spec.	30.538.461,54	29.500.000,00	15.084.264,09	15.084.264,09	45.622.725,63	44.584.264,09
Interventi ARTEA			20.086.395,00	20.100.000,00	20.086.395,00	20.100.000,00
CIPE delibera 6/2012	13.500.000,00	8.414.096,61			13.500.000,00	8.414.096,61
<b>Totale disponibile</b>	<b>44.038.461,54</b>	<b>37.914.096,61</b>	<b>35.170.659,09</b>	<b>35.184.264,09</b>	<b>79.209.120,63</b>	<b>73.098.360,70</b>
<b>Saldo disponibile</b>					<b>5.671.925,63</b>	<b>12.655.460,70</b>

In realtà il saldo disponibile effettivo, come risulta dalla tabella del capitolo 4, è di circa 2 milioni più elevato, in quanto per l'intervento n. 91a di Follonica, l'impegno è stato assunto sul quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, scontando il ribasso d'asta. Inoltre l'approccio adottato non può tener conto di impegni presi al di fuori dei quadri economici o di quelli dovuti a varianti in corso d'opera, non coperte dalle economie dell'intervento.

In conclusione il mancato rispetto della previsione fatta alla fine del 2012 non può essere in alcun modo imputato a insufficienti afflussi finanziari alla contabilità speciale.

Come mette in evidenza la tabella che segue, il mancato rispetto delle previsioni è imputabile sostanzialmente ai ritardi nell'attuazione degli interventi.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	numero degli interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013 numero EFFETTIVO degli interventi al 31 dicembre 2013					
	Contabilità speciale		ARTEA		Totale	
	previsione	consuntivo	previsione	consuntivo	previsione	consuntivo
Attesa di avvio	1	2		9	1	11
Esecuzione studi ed indagini						
In corso di progettazione	1	12		10	1	22
Progettazione ultimata	3	1			3	1
Lavori in corso di appalto	4	12	1		5	12
In esecuzione	20	11	21	10	41	21
Lavori ultimati (collaudati e no)	21	12	19	12	40	24
<b>Totale interventi finanziati</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

Con riferimento agli interventi attuati tramite contabilità speciale, si osserva che, malgrado una sensibile dilatazione dei tempi di progettazione e di gara, che ne ha modificato la distribuzione, il numero degli interventi in appalto, esecuzione o ultimati, è di 35, a fronte dei 45 previsti. L'arretramento dei tempi di attuazione trova la sua giustificazione nella sottostima dei tempi operativi. I ritardi maggiori si registrano per gli interventi ancora in fase di progettazione esecutiva, per i quali, in genere, l'arretramento è dovuto o a un ritardo nell'avvio delle attività in alcuni casi legato alla complessità del progetto.

Gli interventi per i quali non è ancora stata avviata alcuna attività sono due.

Il primo (intervento n.1) è quello indicato come "Interventi per la sicurezza idraulica dei territori di fondovalle del fiume Arno". In pratica si tratta di un contributo all'Accordo di programma per la sicurezza dell'Arno del 18 febbraio 2005 tra MATTM e Regione Toscana (Accordo 200 milioni). Gli interventi da gestire tramite il commissario, devono essere individuati dal Comitato di controllo di tale accordo nell'ambito del relativo programma. L'articolazione degli interventi già programmati e la necessità di aggiornare la programmazione con nuovi interventi non ancora ben identificati, non ha ancora reso possibile definire la destinazione dei fondi.

Il secondo (intervento n.89) è quello di difesa dall'erosione marina dell'abitato di Marina di Massa. Per quanto si tratti di un lotto di completamento in fase di progettazione, la sua realizzazione è pregiudicata dal trovarsi in parte in un'area SIN ed è legata alla bonifica del sito. Il previsto passaggio del sito alla competenza regionale potrebbe sbloccare la situazione.

Per quanto attiene agli interventi in corso di progettazione si ritiene utile una sintetica analisi dei motivi che hanno prodotto i ritardi. Per ciascun intervento è riportato il relativo importo e la data di approvazione del progetto preliminare, che coincide in genere con quella dell'atto di avvalimento. Va premesso che per la maggior parte di questi si è potuto procedere con le iniziative necessarie soltanto quando le risorse disponibili in contabilità speciale lo hanno consentito.

32a Santa Fiora (GR)	2.487.194	20.04.13	L'accordo di programma prevedeva solamente questo intervento per un importo di 3 milioni di euro. Un'improvvisa frana incombente su un complesso rurale ha indotto l'amministrazione comunale a chiedere una parziale modifica di ubicazione. Gli approfondimenti che ne sono seguiti hanno messo in evidenza la possibilità di effettuare tanto il previsto intervento che il nuovo con le risorse assegnate. La nuova articolazione è stata sancita con il Secondo atto integrativo del 9.11.2012. L'avvalimento è stato disposto con approvazione del progetto definitivo già in mano al comune, con ordinanza 23.03.2013, per il lotto 31b, e con ordinanza 20.04.2013 per il lotto 32a. Il lotto 32b è stato aggiudicato. Del presente lotto è in via di ultimazione il progetto esecutivo, rallentato da alcune operazioni propedeutiche indispensabili.
47 Zeri (MS)	600.000	06.06.13	L'intervento fa parte di un complesso di interventi affidati in avvalimento alla Provincia di Massa Carrara con ordinanza 07.11.2011, n. 9. Preso atto dell'inerzia dell'amministrazione provinciale, per questo intervento come per altri, si è revocato l'avvalimento alla Provincia di Massa Carrara affidandolo al Comune di Zeri, propositosi per tale ruolo. Per quanto i contatti per il nuovo avvalimento siano iniziati nel febbraio del 2013, la sua formalizzazione è potuta avvenire soltanto nel giugno con la contemporanea approvazione del progetto preliminare. Le procedure amministrative adottate dall'ente avvalso, hanno mostrato non pochi punti di debolezza e gli atti relativi sono stati respinti per essere riproposti. Il progetto esecutivo, presentato in ottobre non è stato approvato dal commissario, che, anche in relazione agli aggravamenti prodotti dagli eccezionali fenomeni meteorici del mese di dicembre, ha disposto una sostanziale revisione del progetto e suggerito l'affidamento da parte dell'ente avvalso di un incarico di supporto al RUP.
68a Vecchiano (PI)	720.000	26.03.13	Quelli individuati col numero 68 sono i lotti di un intervento complessivo da 5,5 milioni di euro previsto per la sistemazione idraulica di un'importante tratto del fiume Serchio. Aderendo alla richiesta del 18.10.2011 della Provincia di Pisa, ente competente in via ordinaria, il 5.11.2011 il commissario invitava la Provincia stessa ad approntare i progetti preliminari per procedere all'avvalimento. Malgrado le ripetute sollecitazioni, i progetti preliminari sono stati presentati soltanto nel marzo del 2013 e nello stesso mese, con ordinanza 26.03.2013, n. 23, è stato formalizzato il rapporto di avvalimento. Con decreto 13.11.2013 è stato approvato il progetto esecutivo del lotto 68d e sono state accantonate le risorse per avviare le procedure di affidamento dei lavori. La lentezza con cui procede la progettazione induce a valutare il ricorso all'avvalimento di soggetti diversi. La situazione è destinata ad aggravarsi a seguito della soppressione degli incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice dei contratti, per gli interventi inseriti negli accordi di programma attuativi dei Piani straordinari.
68b San Giuliano T. (PI)	850.000	26.03.13	
68c Vecchiano (PI)	2.280.000	26.03.13	
68e Vecchiano (PI)	1.090.000	26.03.13	
76 Abbadia S.S.(SI)	1.500.000	13.05.13	I primi contatti col Comune di Abbadia San Salvatore, individuato poi come ente avvalso, sono avvenuti nell'aprile del 2013, dopo i trasferimenti alla contabilità speciale di quote ragguardevoli di finanziamento statale e regionale. Con ordinanza 13.05.2013, n. 25, è stato formalizzato l'avvalimento del Comune di Abbadia San Salvatore e approvato il progetto preliminare. Si tratta di un progetto complesso da attuare in zona urbana in presenza di numerose e delicate interferenze con servizi a rete.

Al momento della redazione della presente relazione si è chiusa positivamente la conferenza di servizi e il progetto è stato approvato, per quanto di sua competenza, dall'ente avvalso. Di qui a breve il progetto esecutivo sarà approvato dal commissario e saranno avviate le procedure per l'affidamento dell'appalto.

78 Livorno (LI)	400.517	07.08.13	L'individuazione del Consorzio di bonifica Colline livornesi come ente in avvalimento, è avvenuta dopo aver dovuto scartare altre ipotesi. I primi contatti hanno avuto luogo nell'aprile del 2013 e il 9 agosto 2013, con ordinanza n. 36, è stato approvato il progetto preliminare e formalizzato l'avvalimento. Al momento si è chiusa la conferenza di servizi e il progetto esecutivo è in procinto di essere approvato dall'ente avvalso. Anche in questo caso si prevede l'avvio delle procedure di affidamento dell'appalto entro il mese di aprile.
80 Rosignano M.mo (LI)	3.000.000	26.03.12	Sicuramente si tratta dell'intervento più complesso. La sua realizzazione, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, impiega anche un finanziamento privato di 2 milioni di euro destinato a opere di mitigazione del rischio idraulico del fiume Fine, imposto come contributo compensativo alla società Roselectra dal decreto VIA per la realizzazione di una centrale turbogas. Fa parte degli obblighi della società Roselectra anche fornire il progetto esecutivo dell'intervento, che prevede oltre ad argini remoti l'integrazione della luce del ponte ferroviario della linea tirrenica e di quella del ponte stradale ex Aurelia. L'intervento, che si sviluppa su proprietà Solvay, produce consistenti interferenze con strutture industriali della medesima società, che devono essere adeguate con costi consistenti. Mentre è in corso la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo e la verifica di assoggettabilità VIA, si sta affinando la bozza di convenzione con RFI in vista dell'avvalimento per gli interventi sulla sede ferroviaria, da effettuare come primo lotto di lavori. L'intervento si sviluppa in sito di interesse archeologico e in presenza di un'area da bonificare. Purtroppo la stima complessiva dell'intervento supera il finanziamento disponibile.
87 Carrara (MS)	1.100.000	06.12.13	Anche questo è uno degli interventi affidati in un primo momento alla Provincia di Massa Carrara e poi trasferiti ad altro ente; nella fattispecie al Comune di Carrara. A seguito dei contatti avviati nel febbraio 2013, analizzate varie ipotesi di intervento sull'asta del torrente Carrione, con ordinanza 29.06.2013, n. 33, è stato formalizzato l'avvalimento del Comune di Carrara, con contestuale approvazione del progetto preliminare di 3 lotti di sistemazione dell'alveo nel tratto urbano del torrente. Il 18 di luglio, nel corso di un incontro col dirigente regionale del Settore difesa del suolo, potendo la Regione Toscana ricomprendere in un finanziamento già stanziato gli interventi suddetti, fu deciso di trasferire le risorse dell'accordo di programma a un intervento diverso individuato nel tratto d'alveo a cavallo dello storico Ponte della bugia, per il quale il progetto generale di messa in sicurezza del Carrione aveva previsto la demolizione e il rifacimento, incontrando l'opposizione della Soprintendenza ai monumenti. Trattandosi di una modifica della localizzazione, verificata la possibilità di effettuare un intervento di adeguamento dell'alveo senza intervenire sul Ponte della bugia, la nuova ubicazione è stata portata all'approvazione del Comitato di indirizzo del 3 ottobre 2013. Con ordinanza 06.12.2013, n. 40, è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento, che prevede, tra le altre cose, l'esproprio e la demolizione di un fabbricato che invade l'alveo, riducendone la sezione idraulica. Il 10 di

febbraio si è conclusa positivamente la conferenza di servizi preliminare e con la stesura del progetto esecutivo sono in corso anche gli atti di variante al regolamento urbanistico per disporre sul fabbricato il vincolo preordinato all'esproprio. È un fatto rilevante che la Soprintendenza ai monumenti abbia valutato positivamente, anche se con qualche prescrizione, la soluzione proposta.

91b,c Follonica (GR) 10.798.200 18.05.13 L'importo complessivo dell'intervento di difesa costiera ha indotto a rallentare il processo attuativo, per mancanza di risorse. Ciononostante si è ritenuto di avviare l'attività confermando anche per i due lotti in tema l'avvalimento della Provincia di Grosseto, già realizzatrice del primo lotto. L'avvalimento è stato formalizzato con ordinanza 18.05.2013, n. 27, con cui è stato approvato anche il progetto preliminare, unico per entrambi i lotti. Il progetto definitivo che ne è seguito è risultato non assoggettabile al giudizio di assoggettabilità alla VIA ed è stato inviato a tutti i soggetti interessati, in preparazione della conferenza di servizi che si terrà entro la fine di marzo di questo anno. Si prevede l'attuazione per lotti in funzione del trasferimento di risorse da parte dei firmatari dell'accordo di programma.

### 11.2. Previsione per il 2014

La previsione è sintetizzata nella tabella che segue. In blu gli interventi ultimati alla data di redazione della presente relazione.

N.	Codice ReNDiS	Comune	Ente in avvalimento	Da avviare	Avviati	In corso	Ultimati
				2	4	6	38
				<b>33.218.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>19.885.394</b>	<b>40.539.317</b>
1	FI001A/10	Vari	Da definire	11.218.000			
6	FI006A/10	Bagno a Ripoli	C.B. Toscana Centrale				303.000
14	LU014A/10	Altopascio	Comune di Altopascio				1.500.000
15	PI015A/10	Palaia	Comune di Palaia				500.000
16	PO016A/10	Cantagallo	Comune di Cantagallo				200.000
17a	PO017A/10-1	Prato	U.G.C. di Pistoia				465.000
17b	PO017A/10-2	Prato	U.G.C. di Pistoia				1.035.000
26	SI026A/10	San Gimignano	Comune di San Gimignano				620.000
32a	GR032A/10-1	Santa Fiora	Comune di Santa Fiora			2.487.194	
32b	GR032A/10-2	Santa Fiora	Comune di Santa Fiora				500.000
33	MS033A/10	Aulla Liciana N.	Provincia di Massa Carrara				400.000
34	MS034A/10	Bagnone	Provincia di Massa Carrara				100.000
36	MS036A/10	Filattiera	Provincia di Massa Carrara				400.000
37	MS037A/10	Fivizzano	U.C. Montana Lunigiana				300.000
39	MS039A/10	Fosdinovo	U.C. Montana Lunigiana				200.000
42	MS042A/10	Podenzana	Comune di Podenzana				700.000
43	MS043A/10	Podenzana	Provincia di Massa Carrara				200.000
44	MS044A/10	Pontremoli	Comune di Pontremoli				400.000
45	MS045A/10	Pontremoli	Comune di Pontremoli				300.000
46	MS046A/10	Tresana	Provincia di Massa Carrara				250.000
47	MS047A/10	Zeri	Comune di Zeri				600.000
51b	GR051A/10-2	Grosseto	Provincia di Grosseto			2.500.000	
52	SI052A/10-1	Gaiole in Chianti	Comune di Gaiole in C.				600.000
53	SI053A/10	Gaiole in Chianti	Comune di Gaiole in C.				1.200.000
58	LU058A/10	Camporgiano	Comune di Camporgiano				506.000
59	LU059A/10	Careggine	Comune di Careggine				600.000
61	LU061A/10	Fabbriache di V.	Comune di Fabbriache di V.				558.000
63	LU063A/10	Giuncugnano	Comune di Giuncugnano				500.000
64	LU064A/10	Lucca	Provincia di Lucca				5.500.000
67	LU067A/10	Fabbriache di V.	Comune di Vergemoli				820.000
68a	PI068A/10-1	Vecchiano	Provincia di Pisa		720.000		
68b	PI068A/10-2	San Giuliano T.	Provincia di Pisa		850.000		

N.	Codice ReNDiS	Comune	Ente in avvalimento	Da avviare	Avviati	In corso	Ultimati
				2	4	6	38
				33.218.000	4.940.000	19.885.394	40.539.317
68c	PI068A/10-3	Vecchiano	Provincia di Pisa		2.280.000		
68d	PI068A/10-4	Vecchiano	Provincia di Pisa				560.000
68e	PI068A/10-5	Vecchiano	Provincia di Pisa		1.090.000		
72	PT072A/10	Piteglio	Comune di Piteglio				450.000
75	AR075A/10	Pieve S. Stefano	U.C. Montana Valtiberina				70.000
76	SI076A/10	Abbadia S. S.	Comune di Abbadia S. S.				1.500.000
78	LI078A/10	Livorno	C. B. Colline livornesi				400.517
80	LI080A/10	Rosignano M.	Comune di Rosignano M.			3.000.000	
81	PI081A/10	Monteverdi M.	Comune di Monteverdi M.				700.000
84	LU084A/10	Seravezza	Comune di Seravezza				700.000
87	MS087A/10	Carrara	Comune di Carrara			1.100.000	
88	MS088A/10	Massa	Comune di Massa				1.000.000
89	MS089A/10	Massa		22.000.000			
90a	LI090A/10-1	Cecina	Provincia di Livorno				5.200.000
90b	LI090A/10-2	Cecina	Provincia di Livorno				6.000.000
91a	GR091A/10-1	Follonica	Provincia di Grosseto				4.701.800
91b	GR091A/10-2	Follonica	Provincia di Grosseto			4.298.200	
91c	GR091A/10-3	Follonica	Provincia di Grosseto			6.500.000	

“*In corso*” sono previsti gli interventi di maggiore complessità, sottoposti a ritardi nella fase progettuale, e quelli che non possono essere eseguiti con continuità e devono essere interrotti nel periodo estivo (difesa costiera) perché incompatibili con la stagione balneare, o nel periodo invernale perché incompatibili con i deflussi di piena.

Un punto interrogativo riguarda gli interventi affidati alla provincia di Pisa, che si è rivelata poco solerte specialmente nella fase di avvio delle progettazioni.

Ovviamente il rispetto della previsione non è indipendente dalle disponibilità di cassa e quindi dall'andamento degli afflussi alla contabilità speciale.

## 12. CRITICITÀ

Al momento non si registrano problemi finanziari, posto che la disponibilità di cassa è in grado di coprire gli interventi da realizzare a breve e medio termine.

### 12.1. Ripercussioni dell'attività legislativa.

Le disposizioni dell'art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, hanno di fatto vincolato i fondi CIPE di cui alle delibere 6 e 8 del 2012, all'attuazione degli accordi di programma, anche se è prevista una rimodulazione delle risorse al loro interno, qualora per gli interventi a cui sono attualmente destinate, non si sia proceduto entro la fine del 2014 alla pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei lavori. La norma appare ragionevole e il consolidamento del finanziamento legato a una fase del processo di attuazione, piuttosto che a un indistinto perfezionamento giuridico di impegni di spesa, è certamente più adeguato. Si deve però tener conto del fatto che anche gli interventi che hanno un iter più lento sono comunque necessari, spesso più necessari, e si deve evitare che un termine indipendente dalla complessità dell'intervento possa vanificare gli sforzi di un processo laborioso già in atto. Si devono poi semplificare le procedure evitando di creare duplicazioni specialmente nel campo dei monitoraggi, limitando l'informazione a elementi essenziali e garantendo l'efficienza e la funzionalità delle piattaforme informatiche.

L'art. 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, apportava modifiche e integrazioni all'art. 17 del DL 195 del 2009, che a suo tempo aveva istituito i commissari straordinari delegati. Con tali integrazioni si prevedeva, tra l'altro, che per l'attuazione degli interventi previsti dagli accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e ciascuna regione i commissari potessero avva-

lersi soltanto degli uffici tecnici e amministrativi delle regioni, dei comuni, dei provveditorati alle opere pubbliche e dell'ANAS.

L'avvalimento, secondo le nuove disposizioni, avrebbe dovuto riguardare quindi "gli uffici" degli enti, escludendo così gli enti nel loro insieme. Questa limitazione avrebbe impedito che la verifica tecnica e amministrativa dei vari atti prima dell'approvazione del commissario potesse essere decentrata, con l'avvalimento, presso gli enti avvalsi.

Si prevedeva inoltre che al personale degli enti in avvalimento non fossero dovuti compensi, salvo il rimborso spese (?).

La nuova disciplina, che per altro andava a incidere su procedimenti in corso d'attuazione avviati in base a disposizioni diverse, avrebbe creato all'attività dei commissari le insormontabili difficoltà manifestate al Ministro dell'ambiente con nota 16 dicembre 2013.

Grazie alla sensibilità del relatore del disegno di legge di conversione e della Commissione ambiente della Camera dei deputati, molte delle difficoltà sopra illustrate sono state superate, salvo quella che riguarda i compensi al personale impegnato per le attività e per gli interventi del commissario e in particolare il riconoscimento degli incentivi alla progettazione. Si tratta di una norma assolutamente illogica e controproducente che ostacola il lavoro dei commissari e che ostacolerà anche quella dei soggetti destinati a continuarne l'attività dopo la loro decadenza. Tale disposizione deve essere al più presto abrogata.

È invece apprezzabile il fatto che con legge 6 febbraio 2014, n. 6, di conversione del prefato decreto-legge, all'art. 6 siano state individuate le procedure per il trasferimento alle regioni delle attività commissariali al momento della loro cessazione.

#### **12.2. Proroga dell'incarico commissariale**

Col 9 dicembre 2013 è andato a naturale scadenza l'incarico triennale. Alla vigilia della scadenza il ministero ha disposto di procedere nelle attività ordinarie in applicazione della proroga prevista dal decreto-legge 6 maggio 1994, n. 293. La proroga è scaduta il 23 gennaio 2014 senza ulteriori comunicazioni e di conseguenza l'attività si è bloccata. Il 4 febbraio 2014 il gabinetto del ministro ha dato notizia della firma da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del decreto di proroga dell'incarico commissariale, invitando il commissario stesso ad assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale ordinaria, nelle more del perfezionamento dell'iter della registrazione.

Nell'incertezza che l'atto di proroga fosse avvenuto nel termine previsto dall'art. 5 del citato decreto-legge 6 maggio 1994, n. 293, sono stati prudenzialmente sospesi tutti i pagamenti in attesa della sua efficacia.

#### **12.3. Rapporti con il ministero**

Sarebbe auspicabile che venisse incoraggiato il dialogo tra i commissari e gli uffici di riferimento del ministero, sia perché questi possano trarre vantaggio dall'esperienza dei commissari, sia per sostenerne l'attività con iniziative proficue.

#### **12.4. Attuazione tramite avvalimento di strutture ordinarie**

Come già ricordato al punto 10.2, il numero degli interventi da eseguire, il tempo destinato alla loro realizzazione, l'economia dell'iniziativa e la realtà toscana, hanno indotto il commissario a distribuire gli interventi tra più soggetti e di preferenza tra quelli competenti in via ordinaria, essendo avvantaggiati dalla conoscenza del territorio e delle realtà burocratiche locali e risultando in teoria i più interessati alla realizzazione delle opere.

Questo meccanismo nella maggior parte dei casi ha dato buoni risultati. La presenza del commissario snellisce le procedure contabili e amministrative con sensibili vantaggi per i tempi di attuazione, che sicuramente si riducono rispetto alla norma, anche e soprattutto per la costante pressione esercitata dal commissario sugli enti in avvalimento. D'altro canto questi trovano nel commissario un interlocutore presente e sollecito, garante della correttezza delle procedure, che interviene

tempestivamente, assumendosi la responsabilità degli atti necessari per superare i problemi che possono presentarsi lungo l'iter attuativo. La presenza del commissario è più efficace quando maggiore è l'efficienza dell'ente avvalso.

Quando l'ente competente in via ordinaria ha difficoltà ad adattarsi al ruolo di ente avvalso o la struttura non è in grado di operare con la necessaria sollecitudine, l'efficacia del commissario si riduce e la sua azione diventa più faticosa. Il trasferimento dell'avvalimento ad altro ente, per quanto necessario, non rende l'attuazione degli interventi più dinamica, poiché il nuovo soggetto si sente caricato di un'incombenza che sente estranea alle proprie competenze.

I casi più complicati possono essere risolti rinunciando all'avvalimento e ricorrendo all'attuazione diretta da parte del commissario tramite una modesta struttura operativa temporanea alle dirette dipendenze del commissario.

### 13. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Tre anni di attività inducono a dare un giudizio cautamente positivo dell'esperienza commissariale, la cui funzione è sostanzialmente quella di snellire e rendere più dinamici processi che sono rallentati e complicati dalle procedure ordinarie, che spesso inducono a una minor premura gli organismi operativi.


Un unico soggetto responsabile, dedicato in forma esclusiva a promuovere e stimolare l'attuazione degli interventi assicura:

- rapidità decisionale;
- maggior coordinamento delle attività, semplificazione amministrativa per gli enti in avvalimento, controllo delle procedure;
- interlocuzione dinamica e presenza a supporto dei responsabili del procedimento, agilità nella soluzione dei problemi;
- flessibilità ed economia nella gestione delle risorse e rapidità dei pagamenti tramite contabilità speciale;
- superamento dei vincoli prodotti dal patto di stabilità interno a valle del trasferimento dei finanziamenti alla contabilità speciale.

purché, ovviamente, gli siano garantite condizioni e strumenti operativi non inferiori a quelli utilizzabili con prassi ordinaria.

Firenze 27 marzo 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
Prof. Ing. Pier Gino Megale





## REGIONE TOSCANA - INTERVENTI ATTUATI TRAMITE ARTEA - 2° ATTO INTEGRATIVO 09.11.2012 - Avanzamento al 31 dicembre 2013

Allegato

Atto	N° Com.	Codice Rendis	Ente attuatore	Importo	Da avviare		Progetto Preliminare		Progetto esecutivo		Gara		Lavori			
					In corso	Ultimato	In corso	Ultimato	In corso	Ultimato	In corso	Ultimati				
DGR 19.12.2011, n.1172	5b	AR005A/10-2	Provincia di Arezzo	155.000,00										09.11.2012		
	5c	AR005A/10-3	Provincia di Arezzo	135.000,00										x		
	5d	AR005A/10-4	Provincia di Arezzo	390.000,00										x		
	5e	AR005A/10-5	Provincia di Arezzo	130.000,00										x		
	9	FI009A/10-1	Comune di Certaldo	345.000,00										x		
	10	FI010A/10-1	Comune di Montespertoli	370.000,00										x		
	31	GR031A/10-1	Comune di Pitigliano	400.000,00												
	35	MS035A/10-1	Comune di Comano	215.000,00												
	41	MS041A/10-1	Comune di Mulazzo	200.000,00												
	55	PT055A/10-1	Consorzio della Bonifica Burana	150.000,00												
	56	PT056A/10-1	Consorzio della Bonifica Burana	200.000,00												
	57	PT057A/10-1	Consorzio della Bonifica Burana	49.000,00												
	73	PT073A/10-1	Unione dei Comuni media valle del Serchio	90.000,00												
	74	PT074A/10-1	Unione dei Comuni media valle del Serchio	100.000,00												
	82	LU082A/10-1	Provincia di Lucca	2.600.000,00												
	85	LU085A/10-1	Comune di Stazzema	450.000,00												
	86	LU086A/10-1	Comune di Stazzema	300.000,00												
	DD 04.12.2012 n. 5809 (Ing. Massini)	2	AR002A/10-1	Consorzio di Bonifica Valdichiana Aretina	138.100,00											
		3	AR003A/10-1	Comunità Montana del Casertino	300.000,00											
		4	AR004A/10-1	Unione dei Comuni del Pratomagno	97.889,00											
		7	FI007A/10-1	Consorzio di Bonifica Area Fiorentina	1.000.000,00											
		8	FI008A/10-1	Comune di Cerreto Guidi	200.000,00											
		11	FI011A/10-1	Comune di Pelago	465.000,00											
		12	FI012A/10-1	Comune di Pontassieve	230.000,00											
		13	FI013A/10-1	Comune di Rufina	326.902,00											
		24	SI024A/10-1	Comune di Montepulciano	436.517,00											
		25	SI025A/10-1	Comune di Poggibonsi	600.000,00											
		27	AR027A/10-1	Comune di Montemignao	697.220,00											
		28	AR028A/10-1	Comune di Poppi	799.372,00											
		29	PI029A/10-1	Comune di San Miniato	600.000,00											
		30	GR030A/10-1	Comune di Castell'Azzara	270.000,00											
		38	MS038A/10-1	Comune di Fossinovo	80.000,00											
		40	MS040A/10-1	Comune di Licciana Nardi	564.000,00											
		48	GR048A/10-1	Consorzio di Bonifica Grossetana	500.000,00											
		49	GR049A/10-1	Comune di Cinigiano	300.000,00											
		51a	GR051A/10-1	Provincia di Grosseto	2.500.000,00											
		54	SI054A/10-1	Comune di Montalcino	420.000,00											
		60	LU060A/10-1	Comune di Castiglione Garfagnana	200.000,00											
		62	LU062A/10-1	Comune di Fosciandora	196.000,00											
		65	LU065A/10-1	Comune di Piazza al Serchio	300.000,00											
		83	LU083A/10-1	Provincia di Lucca	2.600.000,00											
						41	3	6	7	3	10	12				
						20.100.000	610.000	2.044.791	5.697.517	1.634.692	7.639.000	2.474.000				



*Il Commissario straordinario delegato*  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FASI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

n.	Fasi del processo di attuazione		Atto	Rif.	Attività	Verifiche	C	M
	descrizione							
1	Individuazione dell'ente avvalso.		Ordinan.	2.2	Nomina del RUP Approvazione dei cronoprogrammi di progettazione e dei lavori Approvazione del progetto, se disponibile Accantonamento delle somme necessarie alla progettazione	Cronoprogrammi Progetto (come 3)	2 2 2 4	a
2	Convenzione di avvalimento		Conven.	2.4	Sono definiti i rapporti tra Commissario, ente avvalso ed altri soggetti pubblici o privati, coinvolti nell'attuazione dell'intervento		4	
3	Approvazione del progetto preliminare		Decreto	2.5	Approvazione da parte del Commissario	Localizzazione Compatibilità economica Quadro economico	2 2, 4 2, 4	
4	Avvio del progetto definitivo			2.8	Comunicazione da parte del RUP al Commissario dell'inizio dell'attività progettuale e di eventuali affidamenti a soggetti esterni		2 2, 4	a
5	Poteri di deroga		Decreto	2.6	Sono delegati dal Commissario al RUP in forma circostanziata		1, 2	
6	Approvazione del progetto definitivo			2.8	Approvazione in linea tecnica da parte dell'ente avvalso Comunicazione del RUP al Commissario		2	b
7	Approvazione del progetto esecutivo (definitivo in caso di appalto integrato *)		Decreto	2.9	Approvazione da parte del Commissario	Cronoprogramma Quadro economico Schema di contratto Validazione Facsimile bando o avvisi Lavorazioni ai fini del collaudo in corso d'opera	2 2, 4 3 2 3 2 *	

Fasi del processo di attuazione		Atto	Rif.	Attività	Verifiche	C	M
n.	descrizione						
8	Avvio delle procedure di affidamento	(Decreto)	2.10	Comunicazione al Commissario della nomina del direttore dei lavori	Disponibilità finanziaria Stato giuridico del DLL ai fini del collaudo in corso d'opera	4 2 *	
9	Approvazione e del quadro economico a seguito di aggiudicazione Approvazione del contratto	Decreto	2.11 2.12 2.16	Rimodulazione delle somme a disposizione per imprevisti	Quadro economico Cronoprogramma Economia di gara Entità del ribasso ai fini del collaudo in corso d'opera	2 2 2, 4 2, 4 *	c c
10	Inizio dei lavori		2.13	Comunicazione del RUP	Rispetto cronoprogramma	2	d
11	Nomina del collaudatore in corso d'opera		2.16	Nomina da parte del Commissario entro 30 gg. dalla consegna dei lavori			
12	Controlli e verifiche		2.17	Verifiche bimestrali			e
13	Sospensione e proroghe		2.14	Trasmissione da parte del RUP del verbale di sospensione o della concessione di proroga e segnalazione della ripresa dei lavori.	Aggiornamento del cronoprogramma	2	f
14	Varianti in corso d'opera al disotto del 5% dell'importo contrattuale		2.15	Trasmissione da parte del RUP della variate su supporto digitale		2	e, h
15	Varianti in corso d'opera al disopra del 5% dell'importo contrattuale	Decreto	2.15	Individuazione delle risorse Approvazione preventiva da parte del Commissario Trasmissione da parte del RUP della variate su supporto digitale		4 3 2	e, h
16	Ultimazione dei lavori		2.13	Trasmissione da parte del RUP del certificato	Rispetto cronoprogramma	2	
17	Nomina del collaudatore		2.16	Nomina da parte del Commissario entro 30 gg. dall'ultimazione			
18	Conto finale e collaudo	Decreto	2.16	Approvazione da parte del Commissario	Quadro economico finale Economie residue	2 4	g g

**M:** adempimenti legati al monitoraggio di cui al paragrafo 7 del Regolamento.

**C:** numero identificativo del contatto competente, di cui al punto 6.2 del Regolamento, a cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti e a cui inviare, oltre che al Commissario, le segnalazioni, notizie ed atti trasmessi per via telematica.

m\_ante.TRI.REGISTRO UFFICIALE (I) .0000800.13-01-2014



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

Data: 13/01/2014 Protocollo n°: 11514/6313 Class. C. 100.06 Allegati n° 1

**AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M.**  
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle  
Risorse Idriche.  
Comitato d'Indirizzo e Controllo per il Veneto  
Posta certificata: [DGTRI@PEC.minambiente.it](mailto:DGTRI@PEC.minambiente.it)

Via Cristoforo Colombo 44  
00147 ROMA

**AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M.**  
Ispettorato Generale per l'Emergenza Idrogeologica  
Posta certificata: [ispettorato.generale@pec.minambiente.it](mailto:ispettorato.generale@pec.minambiente.it)

Via Cristoforo Colombo 44  
00147 ROMA

e, p.c.

**AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO**  
**Dott. Luca Zaia**  
Invio tramite inserimento protocollo generale

Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901  
30123 Venezia

**ALL'ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE**  
**Arch. Maurizio Conte**  
Invio tramite inserimento protocollo generale

Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901  
30123 Venezia

**OGGETTO:** Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Veneto - **Relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'art.2 c.3 del DPCM 21/01/2011**

Si invia in allegato Relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'art. 2 c.3 del DPCM 21/01/2011.

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario Delegato  
Dott. Vincenzo Alonzi



Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera  
e-mail: [commissario.idrogeologico@regione.veneto.it](mailto:commissario.idrogeologico@regione.veneto.it)  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)  
Tel. 041-279 5685-4502  
Fax. 041- 279 4503



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione annuale anno 2013

Relazione sulla attività commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 21 gennaio 2011



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

***Dott. Vincenzo Alonzi***

*Sede:* via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera  
e-mail: [commissario.idrogeologico@regione.veneto.it](mailto:commissario.idrogeologico@regione.veneto.it)  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)  
Tel. 041-279 5685-4502  
Fax. 041- 279 4503

PAGINA BIANCA

**1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

<b>Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2013)</b>	<b>16.287.203,96</b>
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Commissario straordinario delegato</b>	DOTT.VINCENZO ALONZI
<b>Decreto nomina</b>	<b>DPCM 21 GENNAIO 2011</b>
<b>Data sottoscrizione Accordo</b>	<b>23 DICEMBRE 2010</b>
<b>Data sottoscrizione Accordo Integrativo</b>	<b>10 NOVEMBRE 2011</b>
<b>Importo complessivo assentito in Accordo</b>	<b>44.877.000,00</b>
<b>Importo programmato per il periodo (anno 2013)</b>	<b>21.438.000,00</b>
<b>Importo speso per il periodo (anno 2013)</b>	<b>243.586,48</b>

**2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE**

Il dissesto idrogeologico in atto nel Veneto rappresenta un problema di notevole rilevanza sotto vari profili (ambientale, economico, sociale), visti gli ingenti danni arrecati al territorio, ai beni e alle persone, i cui effetti si manifestano ormai con frequenza annuale.

Anche quest'anno, le precipitazioni registrate, in particolare in primavera, hanno evidenziato la fragilità del territorio e il bisogno di attuare l'intero piano di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma del 23.12.2010.

In un territorio estremamente delicato, in cui semplici temporali provocano continui allagamenti e gravi disagi per la popolazione, le soluzioni vanno ricercate sia nella realizzazione di nuove opere di difesa locale e di area (quali ad esempio bacini di laminazione) ma, anche e prima di tutto, nella manutenzione delle opere di difesa già esistenti.

Con riferimento alla storia dell'idraulica veneta, infatti, solo in alcuni casi, pur in presenza di eventi eccezionali, i collassi delle difese arginali sono stati determinati dal sormonto delle acque, mentre in più occasioni, l'improvviso sifonamento di un manufatto, il rilassamento di un tratto d'argine hanno danneggiato e distrutto in brevissimo tempo le difese esistenti. Nel corso del corrente anno, ad esempio, a seguito di un significativo evento meteo nei giorni 16 maggio e seguenti, si è verificato un'importante rotta arginale del fiume Alpone nel territorio del Comune di San Bonifacio in provincia di Verona; l'esondazione ha causato la perdita di una vita umana e notevoli danni ad abitazioni civili e all'economia agro-alimentare.

Questo a evidenziare ancora una volta l'importanza di assicurare lo stato di manutenzione delle opere di difesa esistenti al fine di prevenire fattori di degenerazione delle stesse.

Nella giornata di giovedì 16 maggio il Veneto fu interessato da un intenso flusso meridionale con precipitazioni di tipo autunnale sulle zone montane e pedemontane. Sulla pianura centro settentrionale si determinò una zona di convergenza tra i venti di scirocco penetrati nelle zone interne e i venti provenienti da Nord Est, originando rovesci intensi.

Numerose stazioni segnarono valori cumulati di precipitazione superiori ai 100 mm/24 h con massimi registrati sulle zone prealpine occidentali del vicentino e del bellunese (235.8 mm/24h a Valpore Seren del Grappa-BL; Recoaro 1000 con 231.6 mm/24h) e sui Lessini orientali (218.2 mm/24h a San Giovanni Ilarione).

Sebbene per il bacino del fiume Adige la piena fluviale non sia risultata particolarmente significativa fu comunque la maggiore degli ultimi 10 anni. Per le stazioni di Verona e Boara Pisani si registrarono livelli superiori alla soglia di criticità “moderata” definiti rispettivamente in 1,10 m e 1.50 m.

Il bacino del fiume Alpone registrò un’importante onda di piena che provocò importanti rotte arginali. L’onda di piena alla sezione di S. Bonifacio raggiunse il massimo livello misurabile prima del colmo alle sezioni a monte di Monteforte e S. Vito Veronese sul fiume Chiampo.

### **3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMISSARIALI**

La struttura commissariale ha i propri uffici in Venezia-Marghera, via Paolucci 34. Gli uffici, le strumentazioni telematiche ed ogni altra necessità logistica viene assicurata dalla Regione del Veneto con cui questo Commissario, all’avvio della gestione commissariale, stipulò apposita convenzione. L’Ente regionale, però, per motivi legati a carenze significative di organico non ha potuto assicurare il necessario supporto di personale idoneo alle attività connesse.

Per far fronte, quindi, agli accresciuti impegni connessi alla realizzazioni dei 16 interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012 si è reso necessario incrementare la struttura con due unità di elevato profilo tecnico. E’ stata attuata una procedura pubblica di valutazione e selezione per l’assunzione delle due unità di personale occorrenti e per il rinnovo dei contratti in scadenza dell’assistente e del co.co.co. come “esperto nel coordinamento di struttura complessa”. Si è proceduto così all’assunzione a tempo determinato di una unità di cat. D1 di profilo ingegneristico, una unità di cat. D1 di profilo giuridico ed una unità di cat. C1 con mansioni di assistente amministrativo. E’ stato altresì stipulato un contratto di co.co.co con persona di elevata esperienza di coordinamento di struttura organizzativa complessa per affiancare il Commissario nella gestione delle attività di indirizzo e coordinamento.

La struttura, allo stato, è composta da una collaboratrice per le attività organizzative e contabili, un ingegnere idraulico per le incombenze tecniche, un avvocato per lo studio e la valutazione degli aspetti giuridici, ed una persona che assicura funzioni di segreteria.

Tutti i contratti stipulati avranno vigore sino alla data di scadenza del mandato del Commissario.

### **4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA’ SPECIALE**

Prospetto riepilogativo contabile entrate uscite al 31 dicembre 2013 in all. 1.

Con decreti 4623 e 4624 del 5/11/2013 la Direzione TTRI del Ministero ATTM, trasferiva in contabilità speciale risorse di cassa utili a coprire le prime due quote e parte della terza quota dei finanziamenti destinati ai 16 interventi di cui alle delibere CIPE n. 6 e 8/2012



Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente (anno 2013)	Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)	Importo Speso	Importo Residuo
9.451.745,95	14.910.041,55	447.436,53	14.462.605,02

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare)			
Importo corrente (per l'anno 2012)	Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)	Importo Speso	Importo Residuo
0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Descrizione attività	Importo speso corrente (anno 2013)	Importo speso cumulato (anno 2013 + precedente periodo)
struttura commissariale	155.787,60	359.637,65
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	87.798,88	87.798,88

#### 6. DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' CONDOTTE NEL 2013

Le risorse di cassa disponibili in contabilità speciale nella prima metà dell'anno, avevano consentito il finanziamento completo delle sole seguenti tre opere:

- COD. PD48A/10 "Scolmatore di piena Limenella – Fossetta per la difesa idraulica della zona nord di Padova" importo € 3.500.000,00;
- COD. BL001A/10 "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsìe (BL)" importo € 300.000,00;
- COD PD012A/10 "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della SP 10 in Campo S. Martino (PD)" importo € 1.000.000,00.

Con le Delibere n. 6 ed 8 del 2012 il CIPE aveva preso atto dell'elenco degli interventi più urgenti segnalati dalla Regione del Veneto e confermato il finanziamento con fondi FSC degli stessi per € 17,3 milioni.

Il CIPE stabilì, inoltre, che tali risorse fossero erogate in 4 quote, di cui la prima del 20% come anticipazione solo dopo l'inserimento dei dati degli interventi nella BDU del QSN e che, se

entro il 31/12/2013, non fossero state stipulate obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) i finanziamenti sarebbero stati revocati.

In riferimento a dubbi ed obiezioni di incompatibilità del sistema di erogazione dei fondi, sollevate anche da questo Commissario, con le regole di gestione di contabilità speciale, che obbligano ad operare per cassa e non per competenza, il MiSE, con nota 1859 dell'11 febbraio 2013, confermò la piena compatibilità del sistema in quanto: *"la disciplina della fonte di finanziamento, contenuta nei commi 863 e seguenti dell'art. 1 della legge 296/2006 e nelle Delibere CIPE costituisce la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad operare"*.

Il parere del MISE, determinante al fine di poter adottare provvedimenti amministrativi legittimi e ben motivati sotto il profilo logico-giuridico e per autorizzare la stipula dei contratti di appalto delle opere, apparve non del tutto convincente e sufficiente per poter affrontare con adeguato grado di tranquillità l'affidamento di opere per le quali, in sostanza, non si disponeva ancora delle risorse di cassa necessarie.

Infatti il Commissario per la Sardegna, a seguito della nota del MiSE suddetta, avanzò specifico quesito al Ragioniere Generale dello Stato, organo deputato alle verifiche di merito sulla gestione delle contabilità speciali, cui i Commissari rendono conto economico.

Il 19 marzo, nel corso di apposita riunione, l'Assessore all'Ambiente della Regione del Veneto fu informato dettagliatamente dallo scrivente Commissario della situazione relativa alla realizzazione delle opere finanziate con le Delibere 6 e 8 del 2012, delle problematiche emergenti dal sistema di erogazione delle risorse nonché dei rischi potenziali esistenti per il futuro qualora gli impegni contrattuali assunti non potessero essere onorati per ritardi nell'erogazione delle successive quote di finanziamento. Allo stesso Assessore veniva nuovamente rivolta richiesta di conoscere se, come e quando la Regione intendesse erogare la quota di competenza del finanziamento del piano, pari a Euro 8,9 milioni, come da impegno assunto con l'Accordo di Programma. L'Assessore, pur senza fornire precise indicazioni, assicurò che la problematica sarebbe stata portata in Giunta.

Il giorno 22 marzo 2013, in apposita riunione, questo Commissario informò tutti i rappresentanti degli Enti pubblici di cui si avvale per la realizzazione degli interventi della situazione venutasi a determinare in conseguenza delle procedure di erogazione dei finanziamenti previste con le Delibere CIPE 6 ed 8 del 2012. Gli Enti furono comunque sollecitati ad accelerare – ove necessario – le progettazioni esecutive per poter avviare tempestivamente le fasi di affidamento delle opere nel momento in cui sarebbe stata erogata l'anticipazione del 20%. Ciò per giungere, entro il termine fissato del 31 dicembre 2013, alla stipula dei contratti di appalto (tale momento si riteneva infatti stipula di OGV).

Con nota n. 237 del 06/05/2013, il Ragioniere Generale dello Stato, in risposta al quesito avanzato dal Commissario Straordinario per la Sardegna, chiarì di non intravedere alcun disallineamento tra le proprie note e quella n. 1859 datata 11/02/2013 del MiSE, e quindi di intendere compatibile con le gestioni commissariali il sistema di erogazione delle risorse imposto dalla delibera CIPE 8/2012.

In conseguenza di ciò questo Commissario destinò per competenza, con specifici provvedimenti, le risorse (17,3 mil €) di cui alle delibere CIPE 6 e 8/2012 alla realizzazione dei 16 interventi previsti.

Gli Enti realizzatori, dunque, furono autorizzati a proseguire le progettazioni e avviare la fase di affidamento delle opere in modo da poter giungere, entro il termine del 31 dicembre 2013, alla stipula di OGV.

Si rese necessario, inoltre, revocare gli impegni di spesa precedentemente assunti per due interventi, in conseguenza della comunicazione del MATTM (nota n. 0008762 del 01/02/2013)

con cui venne precisato che l'ultimo trasferimento di cassa ricevuto costituiva anticipazione della prima quota di cui alla delibera CIPE 8/2012.

Gli Enti incaricati poterono proseguire le progettazioni utilizzando un fondo di rotazione sui capitoli di bilancio della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto.

Nel mese di agosto, pervenne comunicazione del MATTM che rappresentò come nonostante la validazione dei dati inseriti nella BDU del QSN, le risorse richieste non fossero ancora pervenute sui competenti capitoli del Ministero. I nuovi dubbi circa la reale disponibilità ed entità delle risorse, costrinse questo Commissario a fermare le procedure di gara che stavano per essere avviate e proseguire solo con le progettazioni per le quali esisteva copertura di cassa da parte della Regione del Veneto.

Alla luce dell'incertezza regnante circa la reale disponibilità delle risorse ed avendo a cuore l'obiettivo primario di realizzazione degli interventi, questo Commissario prese specifici accordi con la Regione del Veneto, formalizzati successivamente con la DGRV NR 848 del 04/06/2013. In attuazione di detta Delibera, in data 18/09/2013 fu firmata una convenzione con la Direzione di Difesa del Suolo, con cui 15,4 milioni erano posti a disposizione (per competenza) di questo Commissario nel caso in cui i trasferimenti di cassa dei fondi FSC non fossero pervenuti con la puntualità necessaria a garantire i pagamenti.

Nel mese di settembre giunsero trasferimenti di cassa da parte del MATTM che, in totale, coprivano quasi completamente la prima quota di anticipazione delle risorse FSC. Si decise, pertanto di autorizzare nuovamente gli Enti realizzatori a riprendere le procedure di progettazione e di affidamento.

Appariva chiaro, però come il ritardo accumulato a causa dell'incertezza sull'erogazione dei finanziamenti non avrebbe consentito di stipulare obbligazioni giuridicamente vincolanti per tutti i 16 interventi entro il termine del 31/12/2013 e pertanto, con note n. 368289 del 04/09/2013 e n. 400923 del 24/09/2013, ne fu richiesta la proroga nella considerazione che, dovendosi comunque far fronte a spese di progettazione, tali impegni economici sarebbero stati vani se il finanziamento delle opere fosse stato revocato.

Si nutrivano, inoltre perplessità circa l'interpretazione da dare all'espressione: "obbligazione giuridicamente vincolante". Si procedette, quindi, con nota n. 484507/63 del 18/10/2013 ad ulteriore richiesta di proroga di tale termine e, contestualmente, ad avanzare alcuni quesiti circa l'interpretazione di "obbligazione giuridicamente vincolate" anche alla luce di sentenza del Corte dei Conti che chiaramente intravedeva obbligo giuridico dell'Amministrazione già al momento della aggiudicazione dei lavori.

Risposta ai quesiti inoltrati pervenne dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - con atto n. 5292 del 27/12/2013. Fu chiarito, dunque, che la legge di stabilità del 2014, art. 1 c. 111, dettando una nuova tempistica per l'attuazione degli interventi finanziati con le delibere 6 e 8/2012, prevedeva il termine del 31/12/2014 per l'assunzione delle relative OGV. Detta norma prevede inoltre, ai fini dell'insorgere della OGV, la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori.

Alla luce delle nuove disposizioni della legge di stabilità 2014, si ritiene, quindi, di aver già raggiunto obbligazioni giuridicamente vincolanti per 12 dei 16 interventi finanziati con le citate delibere CIPE ed è ragionevole prevedere che tale obiettivo sarà agevolmente conseguito nel prossimo quadrimestre per tutte le opere con esclusione dell'intervento *BL004A/10 - Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore - € 2.500.000* per cui si prevede di giungere al bando di gara per l'estate 2014.

Con atto n. 438389/63.13 del 14/10/2013, si è dato riscontro alla richiesta, da parte della Direzione TTRI del MATTM n. 476507 del 11/10/2013, di ricognizione dei progetti compresi nell'accordo di programma non attuabili a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

Sono stati segnalati tutti gli interventi, in fase attuativa dell'Accordo di programma, che avrebbero dovuto essere finanziati con risorse messe a disposizione della Regione e che rimangono d'impossibile attuazione per il mancato trasferimento in contabilità speciale delle relative erogazioni di cassa dovuto alle restrizioni in questione (8,9 mil € circa).

In conseguenza dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% si è reso necessario procedere all'aggiornamento dei quadri economici di tutti gli interventi finanziati.

Nell'anno di riferimento sono stati adottati, per la realizzazione degli interventi i provvedimenti amministrativi elencati in all. 2.

## 7. LIVELLO DI ATTUAZIONE GLOBALE DEGLI INTERVENTI

Dettaglio dello stato di attuazione in all. 3.

La seguente tabella si riferisce agli interventi che hanno trovato possibilità di finanziamento:

- N. 1 finanziato con risorse ex l. 191/2009;
- N. 16 finanziati con le delibere CIPE 6 e 8/2012.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi al dicembre 2013	n. interventi al dicembre 2012
Attesa di avvio	n. 0	n. 14
Esecuzione studi ed indagini	n. 0	n. 0
In corso di progettazione	n. 6	n. 1
Progettazione ultimata	n. 8 *	n. 2
Lavori aggiudicati	n. 1	n. 0
In esecuzione	n. 2	n. 0
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 0	n. 0
<b>Totale interventi finanziati</b>	17	

\* Stato di attuazione: Offerte acquisite

## 8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014

Dettaglio dello stato di attuazione in all. 4.

Non è possibile fare alcuna previsione per l'anno venturo circa lo stato di realizzazione degli interventi compresi nella fase attuativa dell'atto integrativo all'A di P che non hanno trovato, allo stato, possibilità di finanziamento (n. 28 interventi). Nessuna certezza, infatti, sussiste circa l'entità ed i reali tempi di disponibilità delle risorse necessarie alla loro realizzazione.

La seguente tabella, dunque, si riferisce alle previsioni di stato di avanzamento delle opere (n. 17) per le quali si ha certezza di finanziamento.

<b>FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI</b>	<b>n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014</b>
Attesa di avvio	n. 0
Esecuzione studi ed indagini	n. 0
In corso di progettazione	n. 0
Progettazione ultimata	n. 0
Lavori aggiudicati	n. 0
In esecuzione	n. 9
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 8
<b>Totale interventi finanziati</b>	<b>17</b>

## 9. CRITICITA'

### **SISTEMA DI MONITORAGGIO ReNDIS-WEB di ISPRA.**

L'alimentazione del sistema in questione, per evidenti ragioni di praticità e semplificazione del flusso documentale previsto per tale compito, è stata delegata ai RUP di cui si avvale il Commissario per la realizzazione degli interventi. E' stato, quindi, sollecitato l'aggiornamento dei dati relativi a tutti i 17 interventi finanziati (1 con risorse ex L. 191/2009 e 16 con delibera CIPE 6/2012) entro i tempi di monitoraggio semestrale. L'aggiornamento viene costantemente verificato.

Con nota n. 219039 del 23/05/2013, fu segnalato al MATTM e ad ISPRA che il quadro degli interventi inseriti nel sistema di monitoraggio presentava alcuni errori e non recepiva le variazioni introdotte con l'Atto Integrativo all'Accordo di programma tra MATTM e Regione del Veneto, fornendo, inoltre, un elenco dettagliato di quanto rilevato allo scopo di evidenziare le incongruenze rilevate e facilitare la loro correzione.

Allo stato, risulta che non tutte le anomalie siano ancora state completamente eliminate.

I nuovi quadri di carattere economico-finanziario, recentemente introdotti, sono stati aggiornati direttamente da questa struttura commissariale, trattandosi di dati di partite gestite dal Commissario.

Si nutrono dubbi circa il senso di alcuni campi inseriti nei quadri in questione (già sinteticamente espressi in data 12.11.2013, con e-mail, indirizzata a [TRI-X@minambiente.it](mailto:TRI-X@minambiente.it), [matteigentili.maddalena@minambiente.it](mailto:matteigentili.maddalena@minambiente.it), [Pernice.Maurizio@minambiente.it](mailto:Pernice.Maurizio@minambiente.it), di richiesta chiarimenti relativamente alla nota del MATTM prot. 0054453/TRI del 07.11.2013) e si ritiene necessario convocare una riunione da parte del MATTM per chiarirli.

Non è neppure chiara l'utilità di questa ulteriore incombenza di monitoraggio di carattere esclusivamente finanziario, visto che gli stessi dati vengono regolarmente inseriti nel sistema informatico della BDU del QSN.

**PROBLEMATICA CONNESSA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 9 LETTERA A) COMMA 2 DEL D.L. 78/2009.**

Detto articolo di legge prevede che nelle *“pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottato entro il 31 dicembre 2009”* - elenco nel quale i Commissario ovviamente non son inclusi - *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*.

Considerato che, adottando in sistema di elargizione delle risorse per quote successive previsto dalla CIPE 6/2012, si andranno a stipulare obbligazioni vincolanti prive della corrispondente copertura di cassa, si ritiene che gli obblighi di verifica previsti siano di competenza del responsabile del centro di spesa che trasferirà le risorse stanziare con la CIPE 6/2012 ai Commissari, che operano solo come delegati.

**RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. 31.5.2010, N. 78 CONVERTITO DALLA L. 30.7.2010, N. 122:**

Il citato comma 28 prevede che a decorrere dall'anno 2011 *“le P.A. possono avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”*

Il comma è stato modificato con l'art. 4 c. 102 della Legge n. 183/2011 che ha previsto che tale disposizione costituisca *“principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica”* al quale sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali.

Lo stesso comma è stato integrato con l'art. 4ter, comma 12, del D.L. n. 16/2012 il quale prevede che *“a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale....”*

Con nota n. 17624 del 2.5.2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha altresì precisato che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa pubblica può ritenersi riferito alle tipologie di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato) complessivamente intese, considerando il numero dei contratti o l'ammontare della spesa, per cui una Amministrazione può autonomamente organizzarsi ai fini del rispetto del vincolo di spesa, compensando la mancata diminuzione della stessa con quella del costo di altre forme contrattuali, seguendo principi di buona gestione, efficienza ed economicità.

Con riferimento a tale adempimento, si precisa che il Commissario Straordinario Delegato è stato nominato in data 21.01.2011 per tre anni (salvo proroga) e pertanto la struttura nel 2009 non esisteva.

Va anche ricordato che, per specificità e soprattutto per temporaneità di questa Amministrazione, è stato indispensabile ricorrere all'utilizzo di personale con contratti di lavoro flessibile (tempo determinato e co.co.co.), essendo impossibile ricorrere a personale a tempo indeterminato.

Si ricorda che l'art. 110 c. 1 e 3 del D.Leg.vo 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità di conferire, nel limite del 10% del personale a tempo indeterminato, incarichi dirigenziali con

contratto a tempo determinato per la durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il Dipartimento per la Funzione Pubblica con nota n. 28195 dell'11.7.2012, ha precisato che tali contratti non sono da prendere in considerazione ai fini del calcolo di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 in quanto il limite è già fissato dal D.L.eg.vo 267. I principi indicati sono due: il tempo determinato del mandato elettivo ed il limite del numero dei contratti o della spesa.

In via interpretativa, nella stessa situazione può ritenersi il Commissario Straordinario Delegato in quanto nominato "pro tempore" e per il quale il DPCM del 20.7.2011 all'art. 1 comma 5, ha previsto specificatamente un limite di spesa non superiore all'1,5% del finanziamento assegnato per l'acquisizione di risorse necessarie all'espletamento del proprio incarico per il triennio 2011-2013. Tale limite non è stato superato.

Si ritiene quindi che il principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile possa essere declinato dal Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nell'ambito della propria autonomia e coerentemente con le proprie esigenze funzionali. In quest'ottica il Commissario Straordinario Delegato ha proceduto al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa ed all'assunzione di tre unità di personale a tempo determinato, previo espletamento di selezioni pubbliche, in numero inferiore a quanto previsto dal decreto commissariale n. 2 del 7.2.2012 che determina il fabbisogno di personale.

Ai fini del contenimento della spesa, questo Commissario ha inteso infatti limitare a tale numero essenziale e indispensabile il personale, avvalendosi, per l'espletamento di alcune attività amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, di personale dipendente della Regione del Veneto attraverso il pagamento di ore straordinarie, sempre nel rispetto del limite di spesa di cui al DPCM del 20.7.2011.

#### **SCOLMATORE DI PIENA LIMENELLA-FOSSETTA-BRENTA (CODICE INTERVENTO PD048A/10)**

Per quanto attiene l'intervento di "Realizzazione dei lavori di costruzione dello scolmatore di piena dei Collettori Limella-Fossetta per la difesa idraulica della zona nord del Comune di Padova - 1<sup>a</sup> stralcio funzionale - opere civili" Codice PD048A/10, si segnala che in data 18.06.2013 il Consorzio Stabile Medoacus S.C. a R.L. ha notificato al Consorzio di Bonifica Bacchiglione (Ente individuato dal Commissario quale Ente realizzatore dell'opera di cui trattasi), alla C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e alla Mestrinaro S.p.a., ricorso con il quale viene chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale l'annullamento, tra l'altro, di tutti gli atti di gara e, segnatamente, dei verbali di gara relativi all'appalto dell'opera *de qua* nella parte in cui hanno ammesso e non escluso il costituendo raggruppamento tra le due compagini sociali resistenti, nonché dell'atto di definizione della graduatoria provvisoria e di avvio del procedimento di verifica di congruità e dell'eventuale aggiudicazione provvisoria.

Motivo del gravame risiedeva nel fatto che la domanda di partecipazione presentata dalle contro interessate (Cooperativa Muratori e Mestrinaro), e in particolare la manifestazione di volontà espressa relativamente alla tipologia di raggruppamento prescelta, pare contraddistinta, a detta della ricorrente, da ambiguità, incertezze e contraddizioni, tale da determinare l'esclusione delle contro interessate dalla gara di appalto.

Si sottolinea, tuttavia, che la ricorrente non ha presentava alcuna istanza di sospensione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria.

A seguito delle verifiche sull'RTI è emersa la necessità di escluderlo RTI in favore del secondo classificato. Nel verbale di gara, redatto con atto notarile rep. n. 5376 del 19/12/2013, veniva dichiarato decaduto il suddetto RTI e conseguentemente ridefinita la graduatoria provvisoria, con subentro della seconda impresa in graduatoria.

Sono attualmente in corso le verifiche di congruità dell'offerta e dei requisiti per la partecipazione alla gara e per la permanenza degli stessi ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto.

**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSARIO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO INTRODOTTE DAL DL 136/2013.**

L'attuale formulazione dell'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195/2009 (introdotta con il D.L. n. 136/2013) la quale prevede che **“al personale degli enti di cui i commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese”** provocherà serie problematiche in quanto è in netto contrasto con l'art. 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice degli Appalti) che prevede incentivi per la progettazione ed il collaudo, peraltro già contabilizzati nel quadro economico di tutti gli interventi che si stanno effettuando, di cui molti verranno a breve cantierizzati.

Impedire ai commissari, come par di capire, di pagare gli incentivi avrà conseguenze negative per gli interventi i cui quadri economici sono stati già approvati e le progettazioni interne terminate. Tali oneri, infatti, potrebbero rimanere a carico degli enti che realizzano in quanto sono loro a nominare i gruppi di progettazione e lavoro, con la conseguenza di far sorgere legittimi contenziosi.

Sarà difficile se non impossibile, visto che il Commissario non ha poteri di precettazione, trovare funzionari disposti a progettare, avere funzioni di RUP, di direzione lavori, emettere certificati di regolare esecuzione dei lavori o collaudare interventi di competenza del commissario, in quanto sarà l'unico soggetto pubblico a non poter corrispondere gli incentivi per legge previsti.

Quanto sopra indicato potrebbe rendere necessario il ricorso al libero mercato con conseguente notevole ampliamento dei costi e possibile insufficienza delle risorse assegnate a ciascun intervento per sottostima dei costi valutati in assenza delle norme D.L. in questione.

Impedire al Commissario, improvvisamente e dopo 3 anni di attività già organizzata, di pagare compensi per lavoro straordinario al personale degli enti che con lui collaborano crea ulteriori complicazioni e necessità di riorganizzazione della gestione commissariale e potrebbe rendere necessario ridimensionare l'organico della struttura commissariale misurata in maniera ridotta proprio perché alcune incombenze erano delegate a personale delle Amministrazioni in avvalimento.

Non ultimo si segnala la paradossale situazione che verrebbe a crearsi, nella quale il funzionario che progetta e collauda per la sua Amministrazione di appartenenza percepisce gli incentivi di cui all'art. 92 del Codice degli appalti, mentre svolgendo la medesima funzione per conto del commissario non percepirebbe alcunché se non un generico rimborso spese (non si comprende riferito a cosa e documentato in quale modo e con quale procedura).

**Si auspica che tale evidente anomalia, già segnala vie brevi al MATTM, possa essere eliminata per ripristinare le cose come erano ben definite nel DPCM integrativo del luglio 2011, che ha efficacemente e senza sprechi economici regolato le attività commissariali sin a questo momento.**

**8. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE****SISTEMA BDU DEL QSN**

L'alimentazione del monitoraggio della BDU del QSN, grazie alla collaborazione della Direzione di Programmazione della Regione del Veneto che esercita funzioni di MS (master strumento), avviene regolarmente con cadenza bimestrale sin dalla fine di giugno 2013.

Tutti gli aggiornamenti sin ad ora eseguiti hanno avuto esito positivo senza scarti ed i dati sono stati regolarmente validati.

**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELLA P.A.**  
(art. 42 del D.L. n. 33/2013).



Non sono stati adottati sino ad ora atti e/o provvedimento di carattere straordinario in deroga alle procedure ordinarie di legge. Le prescrizioni di cui all'art. 42 del D.L. 33/2013, sebbene appaiano più misurate per le Amministrazioni che intendono procedere in “somma urgenza” e per gestioni commissariali di emergenza, verranno comunque puntualmente rispettate qualora si rendesse necessario intervenire con gli speciali poteri conferiti dal DPCM di nomina e successivo DPCM del luglio 2011.

Di prassi, comunque, viene eseguita la pubblicazione di tutti i provvedimenti commissariali sullo spazio dedicato sul sito web istituzionale della Regione del Veneto, facilmente reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/commissario-delegato-per-il-rischio-idrogeologico-nel-veneto>, oppure facendo una ricerca Google: “commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel veneto”; tutti i documenti sono scaricabili in formato \*.pdf.

Non è stato conferito alcun incarico di consulenza; appare chiaro altresì che le incombenze di cui al secondo capoverso del comma 14, art 53 del D.L. 165/2001 e s.m., tra cui “l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazione, anche potenziali, di conflitto di interessi” riguardano esclusivamente gli incarichi di “Consulenza” ed “a Progetto” e non altre tipologie contrattuali.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 15 DEL D.LGS n. 33/2013.**

E’ stato affidato un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a tempo parziale a persona, selezionata con procedura pubblica di valutazione, che non ha alcun rapporto in essere con amministrazioni dello Stato. Tale contratto ha avuto il visto di legittimità della Corte dei Conti di Roma il 26.6.2012. Il decreto di conferimento dell’incarico è pubblicato sullo spazio web istituzionale unitamente al curriculum vitae e al contratto riportante la ragione dell’incarico ed il compenso.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI AL C. 14 CAPOVERSO DELL’ART. 53 D.LGS. n. 165/2001.**

Del suddetto detto incarico di Co. Co. Co. sono stati comunicati i dati all’Anagrafe delle Prestazioni pubbliche del Dipartimento per la Funzione Pubblica mediante l’applicativo web del sito [perlpa.gov.it](http://perlpa.gov.it) relativamente al secondo semestre 2012 e del primo e secondo semestre 2013, così come prescritto.


#### **ISCRIZIONI ED ACCREDITAMENTI DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE A BANCHE DATI PREVISTE PER LEGGE E LORO ALIMENTAZIONE:**

- **IPA Indice Pubblica Amministrazione** : accreditato come UO Regione Veneto – Commissario Straordinario;
- **PIATTAFORMA certificazione crediti**: accreditato come UO Regione Veneto – Commissario Straordinario;
- **PERLA PA Anagrafe delle prestazioni (incarichi cococo e dipendenti)**: per dati 2012 totalmente adempiente sia per consulenti che per dipendenti; per dati primo semestre 2013 totalmente adempiente sia per consulenti che per dipendenti;
- **MAGELLANO lavoro flessibile** : dati 2012: inserita tipologia di contratti e dati co.co.co. 2012;
- **EQUITALIA (Servizio verifica inadempimenti)**: effettuata registrazione al servizio di verifica adempimenti necessaria ai pagamenti verso terzi privati;
- **CONSIP (Pagamenti della P.A.)**: effettuata registrazione;
- **VENETOLAVORO (Coveneto – ufficio collocamento)**: per 2013: inseriti dati relativi alle tipologie dei contratti a tempo determinato e cococo;
- **SICO (Sistema informativo costo della Pubblica Amministrazione - D.Leg.vo 165)** :

è in corso di definizione con la Regione la competenza per gli adempimenti sul costo della PA;

**ADEMPIMENTI ART. 48 COMMA 1 DEL D.LEG.VO 11.4.2006, N. 198** (pari opportunità):  
Il Commissario Straordinario Delegato, fa riferimento alla DGR della Regione del Veneto n. 1298/2013 “D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48. Piano triennale di azioni positive 2013-2015”. Il Commissario si adegua al piano triennale di azioni positive ed alle indicazioni della Commissione sulle pari opportunità della Regione del Veneto.

Il Commissario Straordinario Delegato  
Dott. Vincenzo Alonzi



## SCHEMA RIPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI

Pagina 1

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO Dott. Vincenzo ALONZI codice fiscale 90151360279											31/12/2013					
CONTABILITA' SPECIALE N. 5596 aperta il 9.5.2011											Esercizio finanziario 2011-2012					
DATA DI ACCREDITO	TOTALE ACCREDITI	PROVENIENZA	IMPEGNI	ORD.ZE/DECRETI	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTI	BENEFICIARIO	OPERAZIONI 2011	N° ord.	DATA	ORD.ZE/DECRETI	CAUSALE	DISPONIBILITA' RESIDUA	N. ELENCO	SPESA	
23/06/2011	457.772,76	MIN.AMBIENTE	174.434,88	1 del 26/10/2011	Accanto e spese 2011 emolumenti	109.444,59	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario		1	20/12/2011	Disposiz. 10.12.2011	Accanto compenso 2011		1	109.444,59	
16/12/2011	457.772,76	impegnato '11	174.434,88		totale pagamenti	109.444,59	TOTALI ANNO 2011					residuo cassa			109.444,59	
16/12/2011	3.869.793,63	MIN.AMBIENTE		1 del 16/11/2012	CONS. 155singolare Progetto Scimmatore											
accrediti 2011	4.127.526,39		3.500.000,00	7 del 17/5/2012	Impegno straordinari	40.188,05	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario		1	maggio 2012	Disposiz. 15.5.2012	saldo compenso 2011 Comm.	348.228,17		40.188,05	
			38.000,00	9 del 10/5/2012	Impegno cocco	40.188,05							3.977.895,75		40.188,05	
			24.802,24	11 del 17/5/2012	Economiche 2011 su emolumenti e spese											
			68.500,00	10 del 17/5/2012	Impegno emolumenti e spese 2012											
						26.217,59	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario		2	agosto 2012	Disposiz. 6.8.2012	primo acconto compenso 2012	3.951.676,16		26.217,59	
						26.217,59										
18/09/2012	1.330.769,21	MIN.AMBIENTE	1.330.769,21	32 del 16/9/2013	Provincia Belluno Consolidamento Ansis											
			500.000,00	13 del 28/9/2012	Genio Civile PD Lavori											
			1.000.000,00	14 del 28/9/2012	Roggia Condamna											
			500.000,00	29 dell'11.6.2013	Disimpegno finanziamento											
			1.000.000,00	30 dell'11.6.2013	Disimpegno finanziamento											
						15.918,01	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario e cocco		3	ottobre 2012	Disposiz. 15.10.2012 per primo acconto cassa 2012					
						12.081,81										
						27.999,82										
			20.000,00	20 del 20/12/2012	Impegno contratto a tempo determinato											
accrediti 2012	1.330.769,21	impegnato '12	4.956.466,97		pagamenti 2012	94.005,46	TOTALI ANNO 2012					residuo cassa	5.254.445,55	spesa 2012		94.005,46
totale accrediti	5.458.295,60	totale impegnato	5.130.901,85		totale pagamenti	203.850,05	TOTALI AL 31.12. 2012					residuo cassa	5.254.445,55	tot. 1.1.2013		203.850,05



SCHEMA RIEPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI

IMPEGNI E PAGAMENTI SU FONDI CIPE											
Fondi previsti	DATA DI ACCREDITO	totale accrediti (cassa)	DESTINAZIONE VINCOLATA (competenza)	DECRETI	IMPEGNI (cassa)	CAUSALE	BENEFICIARIO	%	IMPORTO PAGAMENTI compreso 1%	DISPONIBILITA' RESIDUA (cassa)	SPESA
17.300.000,00							<b>TOTALI A NOVEMBRE 2013</b>				
	18/09/2012	1.330.769,21		32 del 16/9/2013	1.330.769,21	Quota su anticipazione 20%		7,690			
	06/09/2013	225.174,00		36 del 30/9/2013	1.820.064,77	Seconda quota su anticipazione 20%		10,520			
	19/09/2013	1.594.890,77				Saldo prime due quote pari al 46%		26,795	26,78708671		
	20/11/2013	4.634.166,00		44 del 26/11/2013	4.634.166,00	Anticipo su terza quota		45,00			
	20/11/2013	2.997.515,18			2.997.515,18	Servizio Forestale BL Progetto 55/A	Servizio Forestale Belluno	17,327		300.000,00	
			300.000,00	16 del 28/5/2013		Servizio Forestale TV e VE Progetto 58/A	Servizio Forestale Treviso e Venezia		0,00		
			150.000,00	16 del 28/5/2013		Genio Civile RO Progetto 18/A	Genio Civile Rovigo		0,00	150.000,00	
			1.980.000,00	17 del 3/6/2013		Genio Civile TV Progetto TV21/A	Genio Civile Treviso		0,00	1.980.000,00	
			1.000.000,00	18 del 3/6/2013		Genio Civile TV Progetto TV23/A	Genio Civile Treviso		0,00	1.000.000,00	
			1.200.000,00	19 del 3/6/2013		Genio Civile VE Progetto VE26/A	Genio Civile Venezia		0,00	1.200.000,00	
			600.000,00	20 del 3/6/2013		Genio Civile VI Progetto V38/A	Genio Civile Vicenza		0,00	600.000,00	
			1.038.000,00	21 del 3/6/2013		Genio Civile VI Progetto V39/A	Genio Civile Vicenza		0,00	1.038.000,00	
			960.000,00	22 del 3/6/2013		Consorzio Piave Montebelluna (TV) Progetto TV57/A	Consorzio di Bonifica Piave Montebelluna (TV)		0,00	960.000,00	
			300.000,00	23 del 3/6/2013		Genio Civile TV Progetto TV63/A	Genio Civile Treviso		0,00	300.000,00	
			200.000,00	24 del 3/6/2013		Genio Civile BL Progetto BL04/A	Genio Civile Belluno		0,00	200.000,00	
			2.500.000,00	25 del 4/6/2013		Genio Civile PD Progetto PD11/A	Genio Civile Padova		0,00	2.500.000,00	
			1.200.000,00	26 del 4/6/2013		Genio Civile VR Progetto VR37/A	Genio Civile Verona		0,00	1.200.000,00	
			2.570.000,00	27 del 4/6/2013		Genio Civile VR Progetto VE24/A	Genio Civile Venezia		0,00	2.570.000,00	
			2.000.000,00	28 del 4/6/2013		Provincia Belluno (Arsizé) Revoca decr. n. 13/2012 e riassegnaz. fondi	Provincia Belluno		0,00	2.000.000,00	
			300.000,00	29 dell'11/6/2013		Provincia Belluno (Roggia Centerina) Revoca decr. n. 14/2012 e riassegnazione fondi	Genio Civile PD	30,27	90.799,88	209.201,12	90.799,88
17.300.000,00	accreditati	10.792.515,16	17.288.000,00	30 dell'11/6/2013	10.792.515,16		<b>TOTALI ANNO 2013</b>		90.799,88	17.197.201,12	90.799,88
	resto da assegnare	12.000,00			12.000,00				pagamenti 2013	6.414.695,96	resto cassa
									credito		



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

## REGISTRO DECRETI - ANNO 2013

N°	DATA	OGGETTO
1	30.1.2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240. Provincia di BELLUNO. Approvazione progetto: "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" - Codice BL001A/10. Importo € 300.000,00=, <b>Preso d'atto.</b>
2	30.1.2013	Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data 21.1.2011. Compenso anno 2013. Impegno di spesa.
3	21.2.2013	<i>Contratto di assunzione a tempo determinato per le necessità della struttura commissariale costituita ai sensi del D.P.C.M. del 21.1.2011. Sig. CAMPAGNARO Elena.</i>
4	12.3.2013	<i>Adp del 23.12.2010. Provincia di Belluno. Progetto "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè". Erogazione acconto 1° stato avanzamento lavori. € 2.493,88</i>
5	25.3.2013	Proroga contratto Elena Campagnaro.
6	09.4.2013	Nomina commissione di valutazione nella procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa – profilo professionale: "Esperto nel coordinamento di Struttura complessa" presso la Struttura del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.
7	09.4.2013	Nomina commissione di valutazione nelle selezioni pubbliche per titoli e colloquio per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per i seguenti profili professionali: - Assistente amministrativo – Cat. C - Specialista tecnico ingegneristico – Cat. D1.
8	30.4.2013	Nomina commissione di valutazione selezione pubblica per titoli e colloquio per costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per il seguente profilo professionale: -Specialista amministrativo giuridico – Cat. D1.
9	06/05/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). PD012A/10 "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10. Primo lotto funzionale". Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.000.000,00 CUP H59H12000440001. Approvazione progetto definitivo.
10	15/05/2013	Approvazione degli esiti della procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale "Esperto nel coordinamento di Struttura complessa" presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011.
11	15/05/2013	Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale "Esperto nel coordinamento di Struttura complessa" presso l'ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011.
12	15/05/2013	Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato - profilo professionale "Assistente Amministrativo - Cat. C1" presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011.
13	15/05/2013	Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato - profilo professionale "Specialista amministrativo giuridico- Cat. D1" presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011.
14	15/05/2013	Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato - profilo professionale "Specialista tecnico ingegneristico Cat. D1" presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011.
15	28/05/2013	Decreti n. 7 in data 7.3.2012 e n. 10 in data 17.5.2012 del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 21.1.2011 di impegno spesa per l'anno 2012 per prestazione ore straordinarie e compensi. Accertamento minore spesa.
16	28/05/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. Unità di Progetto Foreste e Parchi:-Servizi Forestali di Belluno: Progetto "Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale di Livinallongo del Col di Lana (BL)." - Codice BL055A/10 - Importo progetto:€ 300.000,00;-Servizi Forestali di Treviso e Venezia: Progetto "Intervento di sistemazione frane e dissesti idrogeologici in località Perdonanze e località Formeniga in Comune di Vittorio Veneto (TV)" – CodiceTV058A/10 – Importo progetto € 150.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e approvazione schema di convenzione.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

17	03/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO:</b> Progetto "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo" (Rosolina) – Codice <b>RO018A/10</b> – Importo progetto: € 1.980.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
18	03/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO:</b> - Progetto "Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari" (TV) – Codice <b>TV021A/10</b> - Importo progetto:€ 1.000.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
19	03/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO:</b> Progetto "Intervento di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionale" – Codice <b>TV023A/101</b> – Importo progetto: € 1.200.000,00. - Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
20	03/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA:</b> Progetto: "Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene" in Comuni vari – Codice <b>VE026A/10</b> - Importo progetto:€ 600.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
21	03/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA:</b> Progetto "Lavori di sovrizzo e ringrossa realizzazione dell'intervento.
22	03/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA:</b> Progetto "Lavori di espurgo e ringrosso con adeguamento delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza" – Codice <b>VI039A/10</b> – Importo progetto: € 950.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
23	03/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE:</b> Progetto: "Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua Le Fosse" in Comune di San Vendemiano (TV). – Codice <b>TV 057A/10</b> - Importo progetto:€ 300.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
24	03/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO:</b> Progetto" Ripristino officiosità del fiume Sile" in Comune di Quinto di Treviso (TV) – Codice <b>TV063A/10</b> - Importo progetto:€ 200.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
25	04/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO:</b> Progetto "Realizzazione di una briglia selettiva sul T. Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti" (BL) – Codice <b>BL004A/10</b> – Importo progetto: € 2.500.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
26	04/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA:</b> Progetto "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD). Primo lotto funzionale" – Codice <b>PD011A/101</b> – Importo progetto: € 1.200.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
27	04/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA:</b> Progetto "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in comune di Arcole (VR)" – Codice <b>VR037A/10</b> – Importo progetto: € 2.570.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
28	04/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. <b>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA:</b> Progetto "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'ordinanza 3276/2002" Comune di Vigonovo (VE) – Codice <b>VE024A/10</b> – Importo progetto: € 2.000.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.
29	11/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240. Provincia di BELLUNO. "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" - Codice <b>BL001A/10</b> . Importo progetto: € 300.000,00=. Revoca decreto n. 13 del 28 settembre 2012 e



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO**  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

		riassegnazione fondi.
30	11/06/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240. Genio Civile di PADOVA. "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10" - Codice PD012A/10. Importo progetto: € 1.000.000,00=. Revoca decreto n. 14/2012 e riassegnazione fondi.
31	13/06/2013	A.d.P.del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA: Progetto "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10. Primo lotto funzionale". Codice PD012A/101 - CUP H59H12000440001.Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.000.000,00. <b>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</b>
32	16/09/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera CIPE n. 6/2012. Impegno fondi per primo acconto a valere sulla quota del 20%.
33	30/09/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto "Interventi di consolidamento arginale del fiume Monticano e affluenti in comuni vari". Codice TV021A/10 - CUP H39H11000800001. Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.000.000,00. <b>Approvazione progetto definitivo.</b>
34	30/09/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto "Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari". Codice TV023A/101 - CUP H39H11000680001. Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.200.000,00. <b>Approvazione progetto esecutivo.</b>
35	30/09/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: Progetto "Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari". Codice VE026A/10 - CUP H38G12000000001. Importo finanziato Sezione Attuativa €. 600.000,00. <b>Presa d'atto progetto definitivo.</b>
36	30/09/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera CIPE n. 6/2012. Impegno fondi per secondo e terzo acconto a valere sulla quota del 20%.
37	24/10/2013	Decreto n. 6 in data 27.2.2012 del Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. 21.1.2011 di impegno spesa per compenso contratto di collaborazione coordinata continuativa per l'anno 2012/2013 Dott.ssa Odetta Dalla Mora. Accertamento e impegno maggiore spesa.
38	31/10/2013	Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data 21.1.2011. Mese di gennaio 2014. Impegno di spesa.
39	05/11/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto "Ripristino officiosità del fiume Sile" in Comune di Quinto di Treviso. Codice TV063A/10 - CUP H99H12000170001. Importo finanziato Sezione Attuativa €. 200.000,00. <b>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</b>
40	06/11/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA: Progetto "Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza". Codice VI039A/10 - CUP H59H13000130001. Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 950.000,00. <b>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b>
41	08/11/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO: Progetto di "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo". Codice RO018A/10 - CUP H95D12000290001. Importo finanziato Sezione Attuativa Euro €. 1.980.000,00. <b>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.</b>
42	12/11/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Provincia di BELLUNO. Progetto: "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di 'Arsiè'" - Codice BL001A/10. CUP: F13B12000100002. Erogazione acconto su stato avanzamento lavori





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

43	12/11/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA: Progetto "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole. <b>Codice VR037A/10 - CUP H63B12000200001.</b> Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 2.570.000,00. <b>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b>
44	26/11/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera CIPE n. 6/2012. Impegno fondi per <b>saldo prime due quote e anticipo su terza quota</b> a valere sulle somme assegnate.
45	28/11/2013	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: Progetto "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'ordinanza 3276/2002". <b>Codice VE024A/10- CUP H89H12000200002.</b> Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 2.000.000,00. <b>CONFERMA FINANZIAMENTO</b>



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

## REGISTRO ATTI REPERTORIATI 2013

N°	DATA	OGGETTO
4	14.01.2013	DISCIPLINARE delle procedure per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico . Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240. <b>Genio Civile di PADOVA</b> . "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10" - <b>Codice PD012A/10</b> . Importo progetto: € 1.000.000,00=.
5	19.02.2013	DISCIPLINARE delle procedure per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico . Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240.. "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsìè" - Codice BL001A/10. <b>Ente</b> incaricato della realizzazione: Provincia di BELLUNO Importo progetto:€ 300.000,00=.
6	26/02/2013	Contratto a tempo determinato Dott.ssa Elena Campagnaro.
7	25/03/2013	Proroga contratto Dott.ssa Elena Campagnaro
8	15/05/2013	Contratto a tempo determinato Ing. Stefano Schiavon
9	06/06/2013	Contratto a tempo determinato Sig.ra Monica Evarchi
10	01.07.2013	Contratto co.co.co. Dott.ssa Odetta Dalla Mora
11	10.07.2013	Contratto a tempo determinato Dott.ssa Elena Campagnaro.
12	18/09/2013	Accordo di Programma con Direzione Difesa Suolo
13	25/09/2013	Disciplinare GCTV interventi TV021A/10 – TV023/101 e TV063A/10
14	25/09/2013	Convenzione Servizi Forestali Regionali interventi TV058A/10 e BL055/10
15	30/09/2013	Disciplinare GCVE interventi VE024A/10 e VE026A/10
16	03/10/2013	Disciplinare GCRO intervento RO018A/10
17	22/10/2013	Disciplinare GCVI interventi VI038A/10 e VI039A/10
18	24/10/2013	Disciplinare GCVR intervento VR037A/10
19	31/10/2013	Disciplinare GCBL intervento BL004A/10
20	18/11/2013	Disciplinare Consorzio Bonifica Piave intervento TV057A/10
21	25/11/2013	Disciplinare GCPD intervento PD011A/10

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Allegato 3 - Relazione Annuale 2013

Interventi inseriti nell'Atto Integrativo all' Accordo di Programma finanziabili con Del. Cipe 6 e 8 2012	Stato di attuazione previsto nel cronoprogramma allegato alla Rel. Trimestrale del 30.09.2013	Stato di attuazione al 31.12.2013	Note
BL001A/10 - Opere di consolidamento a monte dell'abitato - € 300.000	Esecuzione	Esecuzione	Consegna lavori in data 03/07/2013
BL004A/10 - Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore - € 2.500.000	Progettazione	Progettazione	La criticità, che è possibile quantificare in Euro 500.000,00, è dovuta alla necessità di aggiornare gli importi del quadro economico di progetto datato 12.02.2007. In corso l'aggiornamento del progetto definitivo
PD011A/101 - Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD). Primo lotto funzionale - € 1.200.000	Progettazione	Progettazione	La direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto è in attesa dei pareri necessari per l'approvazione del progetto definitivo dell'importo complessivo di € 4.300.000,00; l'intervento inserito nell'accordo tra MATM e Regione Veneto in fase attuativa di € 1.200.000,00 (1° lotto), dopo l'approvazione tecnica dell'intero intervento verrà stralciato e attuato.
PD012A/101 - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 - € 1.000.000	Lavori aggiudicati	Esecuzione	Consegna lavori in data 21/10/2013
RO018A/10 - Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo - € 1.980.000	Progettazione	Offerte acquisite	
TV021A/10 - Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari - € 1.000.000	Progettazione	Offerte acquisite	
TV023A/101 - Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionale - € 1.200.000	Progettazione	Offerte acquisite	
VE024A/10 - Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002 - € 2.000.000	Progettazione	Offerte acquisite	
VE026A/10 - Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari - € 600.000	Progettazione	Offerte acquisite	
VR037A/10 - Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico - € 2.570.000	Progettazione	Offerte acquisite	
VI038A/10 - Lavori di sovrizzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento - € 1.038.000	Progettazione	Progettazione	In attesa della consegna formale del progetto definitivo e conseguente approvazione
VI039A/10 - Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza - € 950.000	Progettazione	Lavori aggiudicati	
BL055A/10 - Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale - € 300.000	Progettazione	Progettazione	Obbligazione giuridicamente vincolante (convenzione) tra l'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto e il Commissario firmata in data 25.09.2013. Le opere saranno realizzate in economia dal Servizio Forestale e ad oggi sono in corso di progettazione. Data l'ubicazione montana, durante l'inverno i lavori non possono essere realizzati
TV057A/10 - Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse" - € 300.000	Progettazione	Progettazione	In attesa della conclusione del giusto procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
TV058A/10 - Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e località Formeniga - Lavori di sistemazione frane - € 150.000	Progettazione	Progettazione	Obbligazione giuridicamente vincolante (convenzione) tra l'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto e il Commissario firmata in data 25.09.2013. Le opere saranno realizzate in economia dal Servizio Forestale e ad oggi sono in corso di progettazione. Data l'ubicazione montana, durante l'inverno i lavori non possono essere realizzati
TV063A/10 - Ripristino officiosità del fiume Sile - € 200.000	Progettazione	Offerte acquisite	
PD048A/10 - Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord - € 3.500.000	contratto	contratto	Ricorso al TAR del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) primo escluso in gara che ha impugnato la regolare composizione del RTI vincitore. In data 19.12.2013 (rep.5376-Verbale di gara con procedura aperta-III seduta) la Commissione dichiara decaduto dall'aggiudicazione provvisoria il RTI vincitore, e ridefinisce la graduatoria. Conseguente inizio delle procedure di verifica sulla nuova ditta vincitrice.

PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO

CONTRATTO

ESECUZIONE



PAGINA BIANCA

€ 39,80



\*170270004960\*
