

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

Doc. CIX-ter
n. 2

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI
GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI
FUORI DEL LAZIO**

(al 30 Settembre 1999)

(Articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270)

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma capitale e Giubileo del 2000**

(MICHELI)

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1999

Doc. CIX-ter
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI
GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI
FUORI DEL LAZIO

(al 30 Settembre 1999)


(Articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270)

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma capitale e Giubileo del 2000**

(MICHELI)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI



PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE
RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI
E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA'
AL DI FUORI DEL LAZIO

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione
degli interventi

(art. 3, comma 14 legge 7 agosto 1997, n. 270)

Il Ministro dei Lavori Pubblici delegato per
Roma Capitale e Giubileo 2000

Presidente della Commissione

(art. 2, comma 1, legge 7 agosto 1997, n. 270)

Situazione al 30 settembre 1999



INDICE

PREMESSA	Pag.	7
1. <i>Parte prima - La gestione amministrativa</i>	»	11
1.1. <i>La relazione precedente</i>	»	11
1.2. <i>La riprogrammazione del piano nei primi tre trimestri del 1999</i>	»	12
1.3. <i>Gli interventi defianziati</i>	»	12
1.4. <i>I lavori della Commissione</i>	»	15
1.4.1. <i>Seduta del 27 gennaio 1999</i>	»	15
1.4.2. <i>Seduta del 21 aprile 1999 e del 4 maggio 1999</i>	»	15
1.4.3. <i>Seduta del 19 maggio 1999</i>	»	15
1.4.4. <i>Seduta del 28 luglio 1999</i>	»	18
2. <i>Parte seconda - La gestione finanziaria</i>	»	19
2.1. <i>Situazione finanziaria del piano aggiornata al 30 settembre 1999</i>	»	19
3. <i>Parte terza - Il piano per regioni - Stato di attuazione degli interventi al 30 settembre 1999</i>	»	95
3.1. <i>Il quadro riepilogativo</i>	»	95
3.1.1. <i>Tabelle relative al 1° trimestre 1999</i>	»	96
3.1.2. <i>Tabelle relative al 2° trimestre 1999</i>	»	99
3.1.3. <i>Tabelle relative al 3° trimestre 1999</i>	»	102
3.2. <i>Il piano per regioni - stato di attuazione al 30 settembre 1999</i>	»	105
3.2.1. <i>Regione Abruzzo</i>	»	105
3.2.2. <i>Regione Basilicata</i>	»	106
3.2.3. <i>Regione Calabria</i>	»	108
3.2.4. <i>Regione Campania</i>	»	109
3.2.5. <i>Regione Emilia Romagna</i>	»	111
3.2.6. <i>Regione Friuli</i>	»	112
3.2.7. <i>Regione Liguria</i>	»	114
3.2.8. <i>Regione Lombardia</i>	»	115
3.2.9. <i>Regione Marche</i>	»	117
3.2.10. <i>Regione Molise</i>	»	118
3.2.11. <i>Regione Piemonte</i>	»	120
3.2.12. <i>Regione Puglia</i>	»	121

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.2.13. Regione Sardegna	Pag. 123
3.2.14. Regione Sicilia	» 124
3.2.15. Regione Toscana	» 126
3.2.16. Regione Trentino Alto Adige	» 127
3.2.17. Regione Umbria	» 129
3.2.18. Regione Valle d'Aosta	» 130
3.2.19. Regione Veneto	» 132
3.3. Totale regioni d'Italia al 1° trimestre 1999	» 133
3.4. Totale regioni d'Italia al 2° trimestre 1999	» 136
3.5. Totale regioni d'Italia al 30 settembre 1999	» 138
3.6. Lo stato di attuazione per singolo intervento (Istogrammi)	» 141
4. Parte quarta - La vigilanza	» 235
4.1. Il monitoraggio	» 235
4.2. Le relazioni del soggetto monitorato	» 237
4.2.1. Sintesi del primo rapporto trimestrale	» 237
4.2.2. Sintesi del secondo rapporto trimestrale	» 249
5. Parte quinta - Il piano Enit e la Task Force per la comunicazione presso la Presidenza del Consiglio	» 261
5.1. Il piano Enit e la Task Force per la comunicazione presso la Presidenza del Consiglio	» 261
5.2. Aggiornamento lavori svolti dalla Task Force per il coordinamento delle iniziative per la comunicazione e la promozione del Giubileo 2000	» 263
5.3. Incontro di coordinamento tra soggetti beneficiari settore "Gestione dei flussi di visitatori" del 14 aprile 1999	» 265
6. Appendice	» 267
I Decreti	» 267
Rep. N. 187/RC del 9 febbraio 1999	» 267
Rep. N. 202/RC del 30 luglio 1999	» 299
Rep. N. 209/RC dell'11 ottobre 1999	» 344
Rep. N. 210/RC del 22 ottobre 1999	» 360
Le Delibere	» 387
Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 1999	» 387
Deliberazione n. 10 del 21 aprile e del 4 maggio 1999	» 390
Deliberazione n. 11 del 19 gennaio 1999	» 396
Deliberazione n. 12 del 28 luglio 1999	» 400

Premessa

Il presente documento costituisce la seconda delle relazioni trimestrali che il Ministro delegato per le Aree Urbane, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997 n. 270, presenta allo scopo di informare il Parlamento Italiano sullo stato di attuazione degli interventi del *"Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio"*

Il lasso di tempo intercorso a far data dall'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, avvenuta con D.M. in data 21 aprile 1998, ha consentito alla Commissione di modificare ed integrare il Piano stesso al fine di renderlo sempre più congruente con le finalità e con le esigenze emergenti in relazione alla celebrazione del Giubileo del 2000.

Si è ritenuto di strutturare il presente documento in cinque sezioni ed un'Appendice nella quale sono raccolti i principali provvedimenti assunti in attuazione della legge stessa.

La prima parte - dopo una breve sintesi della Relazione precedente - è dedicata ai lavori della Commissione ed alle diverse sedute attraverso le quali sono state deliberate le successive riprogrammazioni del Piano.

Un capitolo a sé stante è stato dedicato alla gestione finanziaria del Piano, fotografando la situazione alla scadenza dei primi tre trimestri del 1999. La terza parte è dedicata allo stato di attuazione degli interventi al 30 settembre 1999, attraverso una serie di grafici e tabelle suddivisi per Regioni e per singoli interventi. La quarta parte riguarda gli strumenti di controllo del Piano ed i soggetti ad esso deputati; l'ultima sezione è dedicata all'aggiornamento dei lavori della "task force" per la comunicazione presso la Presidenza del Consiglio.

Al termine di una complessa procedura di affidamento, il Servizio di monitoraggio è stato affidato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi (URCGE) - alla Associazione Temporanea di Imprese costituita tra Sovis S.p.A. e T.E.C.N.I.C. S.p.A. (ATI) con contratto del 24 febbraio 1999, approvato e reso esecutivo con Decreto del 15 marzo 1999.

A partire da tale data il Monitore ha prodotto Rapporti di monitoraggio per il periodo marzo/maggio 1999 e giugno/agosto 1999.

La necessità di riferire al Parlamento sulla base di dati certificati dallo specifico servizio di monitoraggio ha suggerito di riunire le prime tre Relazioni Trimestrali per il 1999 nel presente Rapporto al fine di una più completa visione dello stato di avanzamento del Piano.

La Relazione fornisce un quadro complessivo della gestione di forte impegno per amministrazioni, enti ed organismi coinvolti nella realizzazione dei programmi inseriti nel Piano.

Gli elementi di sintesi vengono riportati nella tav. 1 mentre nei successivi paragrafi sono esposti gli elementi analitici e di dettaglio.

Per quanto riguarda l'impiego delle risorse pubbliche rese disponibili dalla legge 270/97 pari a 2.000 miliardi, al 3° trimestre risultano attivati programmi per 1.446,1 miliardi di lire pari al 72,3%, mentre le risorse trasferite rappresentano, con 937,8 miliardi di lire, il 46,9% del fondo disponibile.

In termini di opere fisiche e servizi al 30 settembre 1999 risulta in fase di realizzazione o completato complessivamente l'82,3% degli interventi (96 ultimati e 843 in fase di realizzazione su 1.128). In termini di finanziamento pubblico l'ammontare reso operativo è pari al 94,3%, mentre sull'investimento totale la quota attivata è dell'85,3%.

In poco più di un anno, pertanto, ben 939 interventi su 1.128 si avviano alla conclusione.

Si riportano di seguito alcune abbreviazioni utilizzate nel testo :

- *Commissione – Commissione ex art. 2 legge 7 agosto 1997 n. 270;*
- *Piano – Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio;*
- *U.R.C.G.E. – Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 1 - Sintesi sullo stato di attuazione del Piano per il Giubileo fuori dal Lazio (Legge 7 agosto 1997 n. 270)

A) UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

	Risorse attivate		Risorse trasferite	
	miliardi di lire	% sulle disponibilità	miliardi di lire	% sulle disponibilità
Al 31 marzo 1999	857,4	42,9	542,2	27,1
Al 30 giugno 1999	1.282,0	64,1	785,0	39,2
Al 30 settembre 1999	1.446,1	72,3	937,8	46,9
Variazione % 1°-3° trimestre 1999	+68,7	-	+73,0	-

B) STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO (AL 30 SETTEMBRE 1999)

Programmi:	Interventi		Finanziamenti pubblici	Investimenti complessivi
	N°	%	%	%
Completati	96	8,5	3,7	5,5
In fase di realizzazione	843	74,7	90,6	79,8
In fase pre-realizzativa	189	16,8	5,7	14,7
Totale	1.128	100,0	100,0	100,0

C) INTERVENTI PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO

	Completati		In fase di realizzazione	In fase pre-realizzativa	Totale
	N°	%	%	%	%
Accoglienza	311	6,1	69,1	24,8	100,0
Ricettività	496	8,0	72,6	19,4	100,0
Beni culturali	320	11,6	83,4	5,0	100,0

1. PARTE PRIMA - LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**1.1. La relazione precedente**

Con la Prima Relazione al Parlamento, si è dato conto, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997 n. 270, delle attività svolte al 31.12.1998 dalle istituzioni di governo, dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, dagli enti regionali e locali. Tali organismi hanno partecipato, nei termini e nei modi indicati dalla Legge 270, ad una efficace realizzazione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

In particolare nella prima parte della Relazione sono stati riportati i contenuti e gli aspetti giuridici della Legge 7 agosto 1997 n° 270, le modalità attraverso cui sono stati individuati i criteri di selezione degli interventi da inserire nel Piano (Decreto Ministeriale n. 115 del 17 settembre 1997), nonché la strumentazione approntata da parte dell'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi per quanto attiene la modulistica, il sistema informativo, il sistema di proiezione territoriale degli interventi, gli strumenti di comunicazione ed il sistema di monitoraggio.

Nella seconda parte della Relazione sono state invece poste in evidenza procedure e metodologie adottate per l'elaborazione del Piano, di cui vengono presentate dettagliatamente le caratteristiche.

Infine nell'ultimo paragrafo della Relazione è stato riportato lo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel Piano e la situazione dei flussi finanziari al 31.12.1998.

La prima Relazione al Parlamento ha dato conto in maniera completa e diffusa, delle diverse attività svolte sia per la attuazione della Legge n. 270 che per l'avvio operativo degli interventi.

Il Piano fu, infatti, adottato dalla Commissione il 28 marzo 1998 e definitivamente approvato con D.M. 21 aprile 1998. In soli sette mesi (dall'agosto 1997 al marzo 1998) sono state approntate le procedure per la selezione delle richieste di finanziamento, diffuse le strumentazioni necessarie alla presentazione delle domande, effettuata l'istruttoria sulle circa 7.000 richieste pervenute e definito il Piano.

La precedente Relazione fornisce al Parlamento lo stato di avanzamento degli interventi compresi a quella data: 1.115 interventi per un investimento complessivo di 3.673 miliardi di lire di cui 1.955 miliardi di lire finanziati dallo Stato.

Il ritardo nell'avvio delle impegnative operazioni di monitoraggio non ha privato, tuttavia, la Prima Relazione al Parlamento di un quadro complessivo e per singolo intervento dello stato di attuazione, effettuato direttamente dall'Ufficio che ha surrogato funzioni previste per il soggetto monitore, il cui incarico è stato definitivamente approvato successivamente al periodo di riferimento.

1.2. La riprogrammazione del Piano nei primi tre trimestri del 1999

Nel corso del 1999 la Commissione ex art. 2 legge 270/1997 ha proceduto ad una sempre più incisiva azione di modifica ed integrazione del Piano, in modo da renderlo più aderente alle necessità emergenti dall'aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all'accertamento della concreta fattibilità di talune opere, anche per sopravvenute esigenze, non previste in precedenza. L'attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l'integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, è stata possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture che, con frequenza crescente, passavano dalla fase degli adempimenti amministrativi, a quella realizzativa.

1.3. Gli interventi definanziati

Nel corso dell'attività di modifica ed integrazione al Piano attuata dalla Commissione a tutto il giugno 1999, sono stati definanziati, totalmente, o parzialmente, 26 interventi per complessivi 37,3 miliardi di lire.

Tab. 1 - Interventi definanziati (giugno 1999)

	N. interventi	Importi in milioni di lire
- definanziamento totale	16	28.676
- definanziamento parziale	10	8.645
Totale	26	37.321

Vengono di seguito riportati gli interventi definanziati identificati dal titolo, localizzazione e soggetto beneficiario.

In linea di massima i definanziamenti di taluni interventi sono stati deliberati dalla Commissione vuoi per l'imprevisto manifestarsi di cause ostative alla realizzazione totale o parziale degli stessi, vuoi per l'impossibilità di completare le opere di interventi, ancorché fattibili, entro i tempi programmati.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. URCE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Estremi del provvedimento	Importo del definanziamento
198	Napoli	"Costruzione nuovo parcheggio bus turistici"	Min. Trasporti e della Navigazione	D.M. del 05.08.1999	5.600.000.000 (definanziamento totale)
510	Napoli	"Scambiatore intermodale Catacombe di San Gennaro"	Arcidiocesi di Napoli	D.M. del 22.10.1999	4.500.000.000 (definanziamento totale)
897	Vicenza	"Restauro e riorganizzazione funzionale del Chiostro monumentale del convento da adibire a ricettività in comunità religiosa e relativi servizi"	Comunità ordine francescani minori conventuali	D.M. del 09.02.1999	1.620.000.000 (definanziamento parziale)
928	Venosa (Potenza)	"Ristrutturazione ed adeguamento Chiesa Convento di S. Maria in Montalto"	Curia Vescovile	D.M. del 22.10.1999	2.550.000.000 (definanziamento parziale)
1313	Montoro Superiore (Avellino)	"Opere di restauro ed adeguamento funzionale del Convento S. Maria degli Angeli"	Comunità Montana Serinese Solofrana	D.M. del 05.08.1999	200.000.000 (definanziamento totale)
1676	Udine	"Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi"	Comune di Udine	D.M. del 05.08.1999	1.400.000.000 (definanziamento totale)
1678	Udine	"Ostello per la gioventù"	Comune di Udine	D.M. del 22.10.1999	840.000.000 (definanziamento totale)
1681	Udine	"Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi"	Istituto Mons. F. Tomadini I.P.A.B.	D.M. del 09.02.1999	960.000.000 (definanziamento totale)
2803	Venezia	"Realizzazione servizi igienici"	A.M.A.V. Azienda multiservizi ambientali veneziana	D.M. del 01.06.1999	176.000.000 (definanziamento totale)
3018	Verbania (Verbano)	"Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali"	Opera Diocesana della preservazione della fede	D.M. del 05.08.1999	965.000.000 (definanziamento parziale)
3133	Ventimiglia (Imperia)	"Progetto di restauro delle coperture, rifacimento impermeabilizzazioni e impianti nel complesso della Cattedrale di Ventimiglia"	Parrocchia Nostra Signora Assunta Cattedrale	D.M. del 01.06.1999	1.010.000.000 (definanziamento parziale)
3173	Loreto (Ancona)	"Centro Casa del Carmelo"	Delegazione Pontificia per il Santuario della S. Casa	D.M. del 09.02.1999	2.100.000.000 (definanziamento totale)
3224	Pitigliano (Grosseto)	"Ristrutturazione e completamento funzionale dell'ex asilo di Pitigliano ad uso residenze ricettive a basso costo per bisogni e scopi sociali"	Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello	D.M. del 22.10.1999	196.410.000 (definanziamento parziale)
3362	Venezia	"Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico"	Congregazione Armena Mechitarista	D.M. del 05.08.1999	2.663.000.000 (definanziamento totale)
3638	Napoli	"Infopoint passepartout 2000 - Sistema di nodi informativi dedicati ai disabili"	Comune di Napoli	D.M. del 01.06.1999	177.680.000 (definanziamento parziale)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3958	Brescia	"Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostri monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività"	Ordine Frati Minori Conventuali di S. Francesco	D.M. del 05.08.1999	3.804.000.00 (definanziame totale)
3997	Padova	"Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda"	Pia Fondazione V.S. Breda	D.M. del 05.08.1999	1.000.000.00 (definanziame parziale)
4530	Padova	"Recupero della cripta medievale per l'accoglienza dei pellegrini"	Monastero S. Giustina	D.M. del 09.02.1999	561.000.000 (definanziame parziale)
4732	Catania	"Restauro ed adeguamento funzionale della Cattedrale di Catania"	Basilica Cattedrale S. Agata	D.M. del 22.10.1999	2.342.000.00 (definanziame totale)
4741	Massa (Massa Carrara)	"Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo Comunale"	Comune di Massa	D.M. del 05.08.1999	1.120.000.00 (definanziame totale)
5406	San Giovanni Rotondo (Foggia)	"Centro di accoglienza presso il Santuario di S. Maria delle Grazie"	Ente Monastico Provincia dei Frati minori Cappuccini	D.M. del 22.10.1999	600.000.000 (definanziame: totale)
5556	Serralunga di Crea (Alessandria)	"Riqualficazione del complesso edilizio e monastico Santuario di Crea"	Santuario Diocesano Madonna di Crea	D.M. del 01.06.1999	340.000.000 (definanziame: totale)
5645	Vicenza	"Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto di servoscala"	Provincia veneta dell'Ordine dei Servi di Maria	D.M. del 09.02.1999	131.000.000 (definanziame: totale)
6405	Ancona	"Copertura in tensostrutture per aree di sosta veicoli leggeri in attesa di imbarco"	Autorità portuale di Ancona	D.M. del 22.10.1999	245.111.441 (definanziame: parziale)
6523	Fabriano (Ancona)	"Trasformazione distributiva dell'immobile - struttura ricettiva a basso costo"	Seminario Vescovile	D.M. del 05.08.1999	1.900.000.00 (definanziame: totale)
6681	Loreto (Ancona)	"Ammodernamento della casa di S. Francesco"	Prov. Picena S. Giacomo della Marca - Frati Minori	D.M. del 01.06.1999	320.000.000 (definanziame: parziale)

1.4. I lavori della Commissione

A far data dalla precedente Relazione trimestrale al Parlamento, e cioè a partire dal gennaio 1999, si sono tenute 4 sedute della Commissione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, rispettivamente in data 27 gennaio, 21 aprile, 4 maggio e 19 maggio 1999. Tali riunioni hanno dato luogo a 3 delibere (nn. 9, 10 e 11), il cui contenuto è stato recepito in due D.P.C.M. del 4 e del 19 maggio 1999.

1.4.1. Seduta del 27 gennaio 1999

La Commissione ex Lege 270/1997 si è riunita in data 27 gennaio 1999 per discutere principalmente due ordini di problemi: il primo inerente alle richieste di riesame di istanze di inserimento nel Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 al di fuori del Lazio ubicate nella Regione Toscana; il secondo inerente ad eventuali modifiche ed integrazioni al Piano in parola. Nel corso della riunione si è preso atto delle economie derivanti da ribassi d'asta per un importo complessivo di £ 31.069.730.000 e si è dato luogo al definanziamento totale o parziale di alcuni interventi su richiesta dei rispettivi soggetti titolari. Si è inoltre proceduto alla rettifica di taluni errori materiali ed all'approvazione di proroghe ai termini lettera c) e d) dell'art. 1, comma 4 della legge 270/97 nonché a cambi titolo e di soggetto beneficiario. Sono state inoltre assentite aggregazioni e disaggregazioni di interventi ed alcune richieste di integrazione di finanziamento. Sono stati infine inclusi nel Piano - in coerenza con le finalità della legge e sulla base di esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano - una serie di interventi, per un importo complessivo di £ 41.732.000.000, ubicati nella Regione Toscana. Questi ultimi erano stati stralciati dal D.M. del 27 gennaio 1999 di approvazione della deliberazione della Commissione del 16 dicembre 1998, a seguito delle richieste alternative formulate dal Presidente di quella Regione e fatte proprie dalla Conferenza Stato Regioni. Su proposta del presidente Micheli, la Commissione ha accolto l'istanza della Regione in parola, essendo questa improntata a criteri di trasparenza ed avendo i requisiti richiesti.

Le suindicate decisioni della Commissione sono contenute nella delibera n. 9/99 del 27 gennaio 1999 recepita nel decreto ministeriale n. 187/RC del 9 febbraio 1999, riportato in allegato alla presente Relazione.

1.4.2. Seduta del 21 aprile 1999 e del 4 maggio 1999

In data 21 aprile 1999, la Commissione ex Lege n. 270/97 è tornata a riunirsi per discutere alcune varianti ed integrazioni al Piano, nonché in merito all'approvazione di indirizzi omogenei per l'attuazione finanziaria del Piano extra Lazio.

Il Segretario della Commissione ha informato preliminarmente i presenti in merito ad una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei LL.PP. da Vannino Chiti, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome, relativa alla questione della gestione dei servizi pubblici di base durante il Giubileo che comporterà rilevanti costi aggiuntivi per le Amministrazioni centrali e locali

maggiormente interessate dal flusso straordinario di visitatori. La Conferenza in parola ha esaminato tale problematica nella riunione del 4 marzo 1999 ed ha ravvisato l'opportunità di chiedere al Governo di adottare un provvedimento urgente per il finanziamento delle spese di gestione dei servizi pubblici di base e dei servizi speciali organizzati per l'accoglienza dei flussi giubilari. Tra le ipotesi di finanziamento del provvedimento di che trattasi è stata considerata quella di impiegare somme non utilizzate ai sensi della legge n. 270/1997 per interventi revocati o per riduzioni degli investimenti.

Nel corso della riunione è stato illustrato e discusso il succitato stralcio di delibera contenente indirizzi e criteri atti a regolare diverse questioni, in particolare quella legata all'aumento complessivo del costo degli interventi, all'incremento superiore al 10% degli oneri derivanti da spese di progettazione, appalto, Direzione Lavori e collaudo. L'approvazione dello stralcio di delibera in parola è avvenuta nella successiva riunione del 4 maggio 1999. A quest'ultima seduta è stato anche rinviato l'esame delle richieste di modificazioni ed integrazioni al Piano già all'ordine del giorno nella riunione del 21 aprile, attesa la necessità sottolineata dal Ministro Micheli, di disaggregare le stesse in richieste ammissibili, dubbie e senz'altro assentibili, per una più agevole consultazione delle stesse da parte della Commissione.

Nella riunione del 4 maggio, il segretario della Commissione ha anche riferito in merito all'interrogazione a risposta scritta n. 4-13849 del Senatore Antonio di Pietro, presentata in data 28 gennaio 1999 e contenente una serie di censure per presunti vizi di illegittimità inerenti a interventi di titolarità del Comune di S. Giovanni Rotondo. Al riguardo, la dott.ssa Barbato ha riferito che, a seguito di un supplemento istruttorio compiuto dall'Ufficio e dell'acquisizione di ulteriore documentazione richiesta al Comune in parola, l'U.R.C.G.E., con il supporto dell'esperto Franco Bianchi, ha escluso - nel formulare elementi di risposta all'interrogazione di che trattasi - la fondatezza delle censure mosse. Il segretario stesso della Commissione ha fornito al riguardo una esposizione puntuale delle controdeduzioni alle censure di che trattasi. Il Presidente Micheli ha puntualizzato, al riguardo, che la Commissione non può surrogarsi all'Autorità Giudiziaria e, pertanto, le controdeduzioni di cui sopra non debbono essere intese come una memoria difensiva a favore del Comune di S. Giovanni Rotondo.

Nel corso della medesima riunione, preso atto delle risorse nella disponibilità della Commissione derivanti dai ribassi d'asta comunicati dai singoli soggetti beneficiari, alle quali vanno aggiunte risorse residue pari a £ 530.172.360 per un totale di £ 23.298.172.360, sono state approvate una serie di richieste di integrazione finanziaria giudicate "necessarie" a seguito di istruttoria dell'Ufficio e di approfondito esame da parte della Commissione. E' stato dato inoltre mandato all'Ufficio per attivare la procedura di messa in mora anche ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, nei confronti di soggetti titolari di interventi che presentino problematiche tali da pregiudicarne il regolare compimento. La Commissione ha infine deliberato due definanziamenti totali (uno per la persistente indisponibilità dell'area ed uno per completamento dei lavori precedente all'inserimento nel Piano) e cinque definanziamenti parziali (per riduzione dei costi stimati o aumento della quota di cofinanziamento) nonché la cancellazione di un intervento dal Piano a seguito di rinuncia del soggetto privato titolare dello stesso.

Le deliberazioni della commissione di cui alla delibera n. 10/99 sono state quindi raccolte in un unico allegato "B" che comprende tutte le modificazioni al Piano assentite, nonché le integrazioni finanziarie per un ammontare complessivo di £ 26.219.874.193. Il contenuto della succitata delibera n. 10/99 è stato recepito nel decreto ministeriale n. 202/RC del 30 luglio 1999, riportato in allegato alla presente Relazione.

1.4.3. Seduta del 19 maggio 1999

Nella riunione del 19 maggio 1999 la Commissione ex L. n. 270/1997 ha deliberato – sulla scorta dell'esito della procedura di contestazione ex art. 7 della legge n. 241/90, avviata nei confronti dei titolari degli interventi individuati nella precedente riunione del 4 maggio 1999 – il definanziamento totale di cinque interventi. Mentre, in relazione a quegli interventi i cui titolari non hanno dato riscontro alla messa in mora dell'ufficio, la Commissione – su proposta del Presidente Micheli – ha deciso di concedere, stante il possibile intempestivo recapito della comunicazione, un ulteriore termine di 10 giorni a carattere ultimativo, decorso il quale, la Commissione procederà al definanziamento degli stessi.

Nella stessa seduta la Commissione ha deliberato il definanziamento parziale di tre interventi, ha assentito alcune richieste di proroga dei termini lettera c) e la rettifica di un importo di finanziamento. Il Segretario della Commissione dott.ssa Barbato ha comunicato in questa sede i risultati del supplemento di istruttoria richiesto dalla Commissione nella precedente seduta del 4 maggio 1999 nei confronti di tre interventi localizzati nei Comuni di San Marco in Lamis e Fontanellato ed Assisi. In relazione al primo degli interventi citati, la Commissione ha deliberato di riconoscere un'integrazione finanziaria nell'ambito della variante per opere impreviste e imprevedibili, escludendo la restante porzione ascrivibile a migliorie non necessitate. Per quanto riguarda il secondo intervento, la dott.ssa Barbato ha comunicato che i lavori sono stati già appaltati e che proseguono nel rispetto del cronoprogramma dichiarato. In merito al terzo degli interventi sopra citati, il Segretario della Commissione ha riferito che la relazione tecnica pervenuta, pur non contenendo la richiesta dichiarazione del progettista in ordine alla impossibilità di prevedere i lavori in questione in sede di progettazione originaria, ha fornito un quadro tecnico dettagliato per suffragare la richiesta del finanziamento del consolidamento statico della zona interessata.

La Commissione quindi, preso atto delle risorse nella propria disponibilità per un ammontare complessivo di £ 30.029.058.167, ha proceduto ad esaminare alcune ipotesi di inserimento nel Piano di nuovi interventi tenendo conto della situazione di alcune Regioni che, anche a causa della minore connotazione giubilare, hanno beneficiato sino ad ora di minori quote di finanziamento, quali la Basilicata, la Calabria, la Lombardia, il Molise, la Sicilia e la Sardegna. Dopo aver esaminato un complesso di interventi presentati prevalentemente nell'ambito delle regioni di che trattasi, la Commissione ha approvato all'unanimità un elenco di nuovi interventi da inserire nel Piano, per un importo totale pari a £ 24.827.000.000.

Al termine della riunione il Segretario della Commissione ha reso noto che si è concluso l'iter parlamentare relativo all'approvazione del "Collegato ordinamentale" alla finanziaria 1999 che, fornendo l'interpretazione autentica della legge 270/1997 ed integrando le precedenti disposizioni, ha ripristinato – tra l'altro – lo stanziamento del programma degli interventi INAIL per un ammontare pari a £ 651 miliardi. Ha comunicato inoltre che l'INAIL ha presentato il proprio programma definitivo rimodulato a seguito delle valutazioni di congruità formulate dalla Commissione tecnica dell'Ente di che trattasi, proponendo altresì la sostituzione di alcuni interventi ormai impossibili da realizzare nel rispetto dei termini giubilari con altri indicati dall'Ente medesimo. La Commissione ha approvato all'unanimità la sostituzione in parola escludendo dal Piano gli interventi indicati dall'INAIL.

Le suindicate decisioni della Commissione sono contenute nella delibera n. 11/99 del 19 maggio 1999 recepita nel decreto ministeriale n. 209/RC del 5 agosto 1999 riportato in

allegato alla presente Relazione.

1.4.4. Seduta del 28 luglio 1999

In data 28 luglio 1999, la Commissione ex L. n. 270/1997, ha discusso preliminarmente in merito ad un'indagine giudiziaria che riguarda incidentalmente un intervento INAIL incluso nel Piano con la precedente delibera della Commissione. Su proposta del Ministro, la Commissione ha approvato all'unanimità - in via di autotutela - una sospensiva dell'efficacia della precedente delibera nella parte in cui inserisce nel Piano i tre nuovi interventi INAIL proposti dall'Ente medesimo.

Nel corso della riunione è stato anche affrontato un altro aspetto di ordine generale attinente ai ritardi nelle erogazioni finanziarie. Il Presidente Micheli ha reso noto di aver inoltrato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro lamentando le citate difficoltà nonché di aver preso contatti con il Ragioniere Generale dello Stato il quale ha attribuito il problema di che trattasi all'insufficienza del personale della Ragioneria della Presidenza del Consiglio. Su sollecitazione del Ministro Micheli, il Ragioniere Generale ha garantito che avrebbe provveduto ad integrare il personale esistente. La Commissione prende ufficialmente posizione a sostegno di tale sollecitazione fatta dal Ministro Micheli alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione all'intervento riguardante i "Lavori di riqualificazione funzionale delle aree di sosta e della accessibilità al centro storico ed al Complesso monumentale della Cattedrale di San Cerbone a Massa Marittima" (prot. U.R.C.G.E. n. 4739), la Commissione ha ritenuto opportuno sospendere la decisione sull'intervento di che trattasi, in attesa che il Comune interessato produca la documentazione indicata nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Un'altra questione di ordine generale discussa dalla Commissione riguarda l'intervento dell'Arca di Padova in relazione al quale è stata chiesta un'autorizzazione a procedere all'affidamento a trattativa privata di uno stralcio dell'importo di 7 miliardi e 150 milioni di lire in presenza di una somma urgenza causata dal pericolo di crollo e cedimento delle torri campanarie, dei minareti e della parte della biblioteca antoniana. La Commissione ha ritenuto che, in presenza di un reale pericolo, il titolare potesse intervenire dandone comunicazione a consuntivo, senza necessità di un'autorizzazione preventiva.

Il Segretario della Commissione ha altresì informato i presenti sui problemi inerenti il monitoraggio degli interventi. Il soggetto monitore (l'Associazione Temporanea di Imprese SOVIS S.p.a. e T.E.C.N.I.C. S.p.a.) doveva consegnare il primo Rapporto al 30 giugno 1999. La società di che trattasi ha presentato una prima documentazione che alla luce delle verifiche fatte dall'Ufficio risultava in parte contraddittoria. Pertanto l'U.R.C.G.E. ha messo in mora l'ATI accordandole 15 giorni di tempo. In questo periodo il Monitore ha elaborato un esauriente dossier dal quale è risultato che, a quella data, il 75% circa degli interventi risultava partito ed in fase avanzata e non emergevano particolari segnali di sofferenza.

Di seguito, una volta riepilogate le somme disponibili derivanti da rinunce, riduzioni di stanziamento, definanziamenti, pari a complessive lire 24.108.769.608, la Commissione ha proceduto ad esaminare gli interventi contenuti nell'allegato "B", deliberando una serie di modifiche e integrazioni al Piano repute necessarie.

Le suindicate decisioni della Commissione sono contenute nella delibera n. 12/99 del 28 luglio 1999 recepita nel decreto n. 210/RC del 22 ottobre 1999, riportato in allegato.

2. PARTE SECONDA - LA GESTIONE FINANZIARIA

2.1. Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 30 settembre 1999

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97, valutate in complessive £. 2.000 miliardi, sono state direttamente stanziati in Bilancio sul capitolo 7902 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo trasferimento ai singoli soggetti beneficiari.

Gli stanziamenti statali hanno consentito, attraverso la priorità accordata agli interventi che esprimevano una quota di cofinanziamento, la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £. 1.702 miliardi, permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo complessivo pari a £. 3.566 miliardi.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi sono stati stanziati nell'esercizio finanziario 1998, 600 miliardi nell'esercizio finanziario 1999 e 200 miliardi sul bilancio annuale di competenza relativo all'anno 2000.

Come già ricordato, il Piano è stato soggetto ad alcune rimodulazioni a seguito delle quali sono state ridotte le assegnazioni finanziarie degli interventi attivati per un importo corrispondente al ribasso d'asta registrato all'atto dell'aggiudicazione. Con le somme rese così disponibili sono stati finanziati altri interventi originariamente non inclusi nel Piano. Sono stati inoltre inseriti nel Piano, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n. 270/1997, gli interventi relativi alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, con le corrispondenti assegnazioni finanziarie.

La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con modalità già definite per l'attuazione del Piano per il Giubileo ex lege n. 651/96 dalla competente Commissione.

Tra i suddetti indirizzi assume particolare rilievo la norma che prevede l'anticipazione del 10% per le progettazioni, gli studi e le indagini, e quella che consente, in presenza del verbale di aggiudicazione delle gare di appalto e del verbale di consegna dei lavori o il contratto, nel caso di appalto di forniture, l'assunzione dell'impegno di spesa, al netto delle quote cofinanziate nonché l'erogazione del 50% dell'ammontare dell'impegno suindicato. Tali indirizzi finanziari sono stati meglio specificati con il successivo D.M. n. 2 Pres. /278 del 30.07.1999.

Seguendo le procedure indicate nei cennati indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, nonostante le note carenze di organico, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha istruito tutte le pratiche pervenute entro il 31.08.1999, attivando finanziamenti relativi a n. 711 interventi, attraverso l'emanazione a favore dei relativi soggetti beneficiari di n. 798 decreti di impegno per £. 1242,8 miliardi e di n. 882 titoli di pagamento per complessive £. 734,5 miliardi.

Sono state inoltre trasferite, con variazioni compensative di bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 270, risorse finanziarie ammontanti a £. 204,2 miliardi nello Stato di previsione dei seguenti Ministeri:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero per le Attività Culturali: 189 miliardi di lire

Ministero degli Interni: 11,6 miliardi di lire

Ministero delle Finanze: 1,1 miliardi di lire

Ministero dei Trasporti: 0,8 miliardi di lire

Ministero di Grazia e Giustizia: 1,5 miliardi di lire

TOTALE: 204,2 miliardi di lire

Vengono di seguito riportate le tabelle relative alla situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31.03.1999, al 30.06.1999 ed al 30.09.1999.

TAV. I (situazione finanziaria al 31 marzo 1999)**(importi in lire)**

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	677.439.078.398
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	857.399.078.398
Pagamenti	362.190.046.665
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	542.150.049.665

TAV. II (situazione finanziaria al 30 giugno 1999)**(importi in lire)**

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.079.380.955.691
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.281.977.955.691
Pagamenti	582.397.763.915
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	784.994.763.915

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. III (situazione finanziaria al 30 settembre 1999)	(importi in lire)
Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.446.125.278.632
Pagamenti	734.533.939.986
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	937.770.939.986

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11028	1100	1098	1059	10484	1023	1018	0003/A	0003/A	1	Protocollo
Padova	Cavalino	Lecco	Compians	Torino	Benevento	Benevento	Ambio Nazionale	Ambio Nazionale	Ambio Nazionale	Comune localizzazione
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGIOLO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRASETTI E TORRI CAMPANINE	RESTAURO E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL TEX CONGREGIO DEI PADRI DOMENICANI IN CAVALLINO PER USO RICETTIVO	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALFARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTROSOFFITTO LIGNOLI ACQUARI DELLE SALE A PIAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DEL TEX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI	RICOSTRUZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEL DUOMO E DEL PALAZZO REALE DI TORINO	COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALTESTIMONIO SULLA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OFFERTA	RESTAURO DEL CONVENTO DI S. PASQUALE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA E AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA E AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	INFORMAZIONE PER INTERMEDIARI ITALIANI ALL'ESTERO	Titolo intervento
VERERANDA ARCA DI S. ANTONIO	COMUNE DI CAVALLINO	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	COMUNE DI COMPIANS	SOPRINTENDENZA REGIONALE DEL PIEMONTE	COMUNE DI BENEVENTO	COMUNE DI BENEVENTO	ENIT	ENIT	ENIT	Soggetto beneficiario
37.844.000.000	2.715.300.000	3.411.530.000	5.000.000.000	90.048.000.000	3.499.000.000	7.715.000.000	13.450.000.000	13.450.000.000	1.500.000.000	Costo Stimato
37.844.000.000	2.566.300.000	1.083.530.000	5.000.000.000	90.048.000.000	3.499.000.000	7.715.000.000	12.700.000.000	12.700.000.000	1.300.000.000	Finanziamento attribuito
0	149.000.000	2.328.000.000	0	0	0	0	750.000.000	750.000.000	200.000.000	Altre fonti
3.784.400.000	154.000.000	0	500.000.000	0	349.900.000	771.500.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
3.784.400.000	154.000.000	0	500.000.000	0	349.900.000	771.500.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
19.230.700.000	2.412.304.994	1.083.529.084	3.433.049.747	0	2.519.623.802	4.863.956.814	1.828.864.325	10.700.000.000	940.000.000	Impegni di spesa
9.615.350.000	1.206.152.500	541.764.540	1.716.524.870	0	1.259.811.900	2.431.978.410	914.432.160	5.350.000.000	470.000.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	90.048.000.000	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Stimazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1209	1208	1201	1199	1198	1195	1187	11622	1162	1149	Protocollo
Ferrara	Corigorio	Pompei	Pompei	Pompei	Pompei	Brescia	Vercelli	Capestrano	Foggia	Comune localizzazione
BASILICA DI SANTA MARIA IN VADO COMPLETAMENTO RESTAURO	ACCESSIBILITA' SERVIZI RESTAURI ALL'ABBAZIA DI POMPOSA	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI ANNESSI FABBRICATI DELL'EX STAZIONE	TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN OSTELLO	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E ARREDO DELLA SALA CONVEGNI NEL COMPLESSO RELIGIOSO DON BOSCO	PALAZZO ARCESCONI E DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBIENTI DESTINATI ALL'ARCHIVIO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	COMPLETAMENTO DELL'ANTICA BASILICA	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERI E SERVIZI OPERAI DONORAZIONE BASILICA	Titolo intervento
SOPRINTENDENZA Z.A.B.A. DI RAVENNA	SOPRINTENDENZA Z.A.B.A. DI RAVENNA	SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE	COMUNE DI POMPEI	COMUNE DI POMPEI	SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE	ISTITUTO DON BOSCO	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	ENTE PROV. NAPOLETANA CONSERVAZIONE	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOLLINARE PIETRO E PAOLO OP.	Soggetto beneficiario
1.750.000.000	795.000.000	8.996.000.000	1.540.000.000	1.082.000.000	21.319.000.000	1.454.064.000	6.927.000.000	2.904.930.000	1.025.000.000	Costo Stimato
1.000.000.000	500.000.000	8.996.000.000	1.540.000.000	1.082.000.000	21.319.000.000	1.454.064.000	3.707.000.000	2.540.930.000	1.025.000.000	Finanziamento attribuito
750.000.000	295.000.000	0	0	0	0	0	3.220.000.000	364.000.000	0	Altre fonti
0	0	899.600.000	0	0	2.131.900.000	165.700.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	899.600.000	0	0	2.131.900.000	165.700.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	0	6.048.909.731	1.275.400.000	1.071.673.060	0	1.284.364.251	3.706.471.645	2.540.768.392	997.375.900	Impegni di spesa
0	0	3.024.454.870	637.700.000	535.836.530	0	642.182.120	1.853.235.820	1.270.384.200	498.687.950	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
1.000.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1257	1256	1247	1224	1221	1218	1217	1214	1213	1212	Protocollo
Enna	Montepulciano	San'Angelo Del Lirio	Trapani	Aquila	Messina	Messina	Napoli	Napoli	Napoli	Comune localizzazione
RESTAURO DI EDIFICIO ESISTENTE PER LA CREAZIONE POSTI TAPPA ESCLUSIVISTICI DOCTORIA	RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO AL BORGHI DI MONTIJOVE	RICETTIVITA' DIOCESANA IN ALTA IRRPIA	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA DINEZIONE DI FILME. DI PIAZZA VITTORIO VENETO 1	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AGENZIA DI AQUILEA	RESTAURO E RECUPERO CHIESA E CONVENTO DEI CAPUCCINI DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	RESTAURO E RECUPERO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA	RESTAURO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO ARMINO	RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DEL CHIOSO MAJALICATO DI S. CHIARA	RESTAURO DEI MAGGIORI BENI ARTISTICI DELLA BASILICA DI SAN DOMENICO MAJALICATO	Titolo intervento
COMUNE DI ETROBI ES	PARROCCHIA MANTIVA DI MARIA VERGINE	CURIA AGRICOLA EDIZIONE DEL	POSTE ITALIANE E P.E. SEDE FRIULI V. Q.	POSTE ITALIANE E P.E. SEDE FRIULI V. Q.	COMUNE DI MESSINA	COMUNE DI MESSINA	FONDO EDIFICI DI CULTO	FONDO EDIFICI DI CULTO	FONDO EDIFICI DI CULTO	Soggetto beneficiario
413.883.000	600.000.000	2.094.690.000	132.000.000	30.000.000	3.209.000.000	1.099.000.000	2.800.000.000	3.222.000.000	750.000.000	Costo Stimato
190.683.000	500.000.000	1.965.740.000	132.000.000	30.000.000	2.850.000.000	849.000.000	2.800.000.000	3.222.000.000	750.000.000	Finanziamento attribuito
223.000.000	100.000.000	128.950.000	0	0	359.000.000	250.000.000	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	13.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	13.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
150.682.745	482.950.000	1.862.985.234	112.167.889	0	1.736.120.000	608.051.000	0	0	0	Impegni di spesa
75.341.370	241.475.000	931.492.617	56.083.945	0	868.060.000	304.025.500	0	0	0	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	694.448.000	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	2.800.000.000	2.822.000.000	750.000.000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1353	1352	1348	1344	1337	1325B	1292	1274	1268	1264	Protocollo
Livorno	Livorno	Livorno	Correzzola	Misa	Alessandria	Marzabotto	Napoli	Asa	Portogruaro	Comune localizzazione
SOGGIORNO MARIANO ISTITUTO LA MADONNA	SOGGIORNO MARIANO MONTEROSO	REALIZZAZIONE DI AREA COPERTA DI ACCOGLIENZA PER LA SOSTA, IL RISTORNO DEI Pellegrini e RELATIVI SERVIZI	RECUPERO CELLERMA BENEDETTINA DI CORREZZOLA	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCOLASTICI ELETTRICI DISMESSE DI DANIE DA DESTINARE AD OSTELLO	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI SANNA DI CASTELLO	REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PIACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOCA E TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO	TRINTE EDIFICI FRANCESCANI ROVAVENTURANO ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE IN CATTEDRALE E DELLE SPIRITUALI DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S. LORENZO MAGGIORE	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO	ACCOGLIENZA CULTURALE RELIGIOSA NEL COLLEGGIO MARCONI	Titolo intervento
CONGR. VALLOMBROSA NA ORD. S. BENEDETTO	CONGR. VALLOMBROSA NA ORD. S. BENEDETTO	CONGR. VALLOMBROSA NA ORD. S. BENEDETTO	COMUNE DI CORREZZOLA	COMUNE DI MISA	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	PROV. DI NAPOLI DEI FRATI MINORI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DI ASI	FOUNDAZIONE COLLEGGIO MARCONI	Soggetto beneficiario
678.000.000	262.000.000	7.814.510.000	2.363.000.000	917.000.000	4.570.000.000	1.861.713.000	2.313.000.000	5.329.328.000	3.850.100.189	Costo Stimato
558.000.000	200.000.000	5.965.510.000	1.643.000.000	917.000.000	2.770.000.000	1.861.713.000	2.313.000.000	5.293.328.000	2.830.100.189	Finanziamento attribuito
120.000.000	62.000.000	1.849.000.000	720.000.000	0	1.800.000.000	0	0	36.000.000	1.020.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
482.200.000	175.600.000	5.853.515.000	1.399.112.908	837.902.091	2.408.791.823	1.566.713.000	1.615.624.650	4.893.327.391	2.241.224.811	Impegni di spesa
241.100.000	87.800.000	2.928.757.500	699.556.450	418.951.045	1.204.395.910	783.356.500	807.812.325	2.446.663.890	1.120.612.410	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1514	1513	1512	1499	1496	1485	1463	1432	1421	1408	Protocollo
Cogorno	Chiavari	Chiavari	Ferrara	Paola	Bobbio	Alzano	Padova	Paradiso Val Tidone	Pescara	Comune localizzazione
RESTAURO CONSERVATIVO BASSETTO E RECUPERO DI STABILI DISMESSI NEL COMPLESSO STORICO MONUMENTALE DI SAN SALVATORE CREAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA AD ESSO COLLEGATO	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CHIESA DEL SANTUARIO DI N. SIGNORE DELL'ORTO	AMPLIAMENTO DEL MUSEO DIOCESANO	SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATEDRALE E NELLE CHIESA DI S. ROMANO	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTÀ.	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI MILIO CHIARAVALLE DELLA COLONIA RUSSO DELL'EX DORMITORIO DEI MONACI DELL'ABBAZIA CISTERCENSE A SPAZIO MUSEALE LEGATO ALLA RICETTIVA.	COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO PER LA STAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO COMPLETAMENTO INTEGRALE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE NELLA IMMACOLATA IN LOCALITÀ SAN SILVESTRO DI PESCARA	Titolo intervento
DIOCESI DI CHIAVARI	DIOCESI DI CHIAVARI	DIOCESI DI CHIAVARI	COMUNE DI FERRARA	COMUNE DI PAOLA	COMUNE DI BOBBIO	MINISTERO DELLE FINANZE DIP. TERRITORIO	COMUNE DI PADOVA	COMUNE DI PIAZZO VAL TIDONE	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	Soggetto beneficiario
6.001.000.000	617.000.000	195.000.000	2.936.000.000	2.958.624.000	1.778.966.000	1.100.000.000	2.857.000.000	1.420.492.192	4.475.160.000	Costo Stimato
6.001.000.000	617.000.000	195.000.000	2.936.000.000	2.958.624.000	1.383.966.000	1.100.000.000	2.857.000.000	1.205.492.192	3.685.682.000	Finanziamento attribuito
0	0	0	0	0	395.000.000	0	0	215.000.000	789.478.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
5.345.458.877	617.000.000	194.953.285	2.375.314.447	2.808.623.366	1.250.659.156	0	1.692.144.750	957.058.935	2.353.610.140	Impegni di spesa
2.672.729.440	308.500.000	97.476.640	1.187.657.220	1.404.311.680	630.329.580	0	846.072.375	478.529.470	1.176.805.070	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	1.100.000.000	0	0	0	Amministrazione dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
1685	Urbino	RESTAURIO DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO MARTIRE	CONFRATERNITA' DEL FRULLAIO	253.000.000	215.000.000	38.000.000	0	0	209.500.000	104.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1684	Urbino	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ATTINUA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	CONGREGAZIONE S. GIUSEPPE COLLEGGIO DIMESSE	579.680.000	379.680.000	200.000.000	0	0	371.000.000	185.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1683	Urbino	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO A DELLA SEDE DELL' I.P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA	I.P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA	1.721.210.000	1.341.210.000	380.000.000	0	0	1.341.214.400	670.607.200	536.485.760	0	0	0	0	0	0	0
1670	Giovanna in Puglia	RICUPERO TECNICO FUNZIONALE E DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEI TORISTI	COMUNE DI GIOVANNA	3.057.111.842	3.000.111.842	57.000.000	0	0	2.363.888.158	1.181.944.080	0	0	0	0	0	0	0	0
1663	Chiusa Di Paso	RISTRUTTURAZIONE RESTAURIO DELL'ANTICA ABBAZIA E DEL CRISTOFRO ANNESSO	ISTITUTO MISS DI MARIA SS CONSOLATA	393.000.000	343.000.000	50.000.000	0	0	343.000.000	171.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1589	Torino	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA	CITTA' DI TORINO	4.320.000.000	4.320.000.000	0	0	0	2.612.447.120	1.306.223.560	0	0	0	0	0	0	0	0
1576	Modena	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIÀ ATTIVA	CONGREGAZIONE S. FEMMI SERVE DEI POVERI	3.614.000.000	3.514.000.000	100.000.000	263.000.000	263.000.000	3.217.703.329	1.606.851.665	0	0	0	0	0	0	0	0
1537	Fucecchio	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	3.326.670.000	2.926.670.000	400.000.000	0	0	1.909.670.662	954.635.330	0	0	0	0	0	0	0	0
1535	Piacenza	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI POSITILUNGO LA VIA FRANCOGENA IN LOCALITA' CHIARAVALLE OTTAVA COLONIA NUOVO DELL'ANTICO PALAZZO DELLA COMMENDA	AZIENDA USI DI PIACENZA	4.808.948.000	4.561.948.000	247.000.000	278.300.000	278.300.000	3.967.878.176	1.983.839.090	1.587.151.270	0	0	0	0	0	0	0
1534	Treviso	RESTAURIO DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO MARTIRE	CONFRATERNITA' DEL FRULLAIO	850.000.000	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1779	1742	1738	1736	1732	1729	1728	1720	1716	1709	Protocollo
Padova	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	Palmanova	Cervignone Del Friuli	Taranto	Comune localizzazione
RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DELLA FORESTERIA PER ACCOGLIENZA NOTTURNA DEI PELLEGRINI	RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANI AMBROGIO E BELLINO	ARREDAMENTO DEL NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'	REALIZZAZIONE AREA DI ACCOGLIENZA NELLE ADIACENZE DEL PARCO STORICO DI VILLA GIUCCOLI	SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DELLE SCALLETTE DI MONTE BERICO	RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ALLA TAVOLA GARANTIRE LA SICUREZZA	REALIZZAZIONE DI POSTILETTO A BASSO COSTO CON ANNESSI SERVIZI GENERALI INOSTRO E SOSTA	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER FERIE FORESTERIA	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE E DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE	TITOLO intervento
CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIUSTINA V. M.	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	PARROCCHIA SS. REDENTORE	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	PARROCCHIA DI S. ERODIO	Soggetto beneficiario
354.000.000	913.000.000	368.000.000	620.000.000	616.000.000	321.000.000	2.589.000.000	1.365.612.000	550.000.000	3.385.000.000	Costo Stimato
350.000.000	613.000.000	369.000.000	620.000.000	616.000.000	321.000.000	2.562.000.000	1.115.612.000	412.000.000	3.025.000.000	Finanziamento attribuito
4.000.000	300.000.000	0	0	0	0	27.000.000	250.000.000	138.000.000	360.000.000	Altre fonti
31.000.000	0	0	70.000.000	68.700.000	32.100.000	274.500.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
31.000.000	0	0	70.000.000	68.700.000	32.100.000	274.500.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
302.947.444	580.968.000	365.310.000	549.119.200	542.716.021	279.746.055	0	1.010.612.355	293.048.015	2.774.298.000	Impegni di spesa
151.473.720	290.484.000	0	274.559.600	271.358.010	139.873.025	0	505.306.180	146.524.005	1.387.149.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	365.310.000	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1949	1912	1898	1875	1873	186	1857	1852	1820	1798	Protocollo
Mazza Del Vado	San Marco in Leno	Carro Guai	Pont-Saint-Martin	Siracusa	Napoli	Chioggia	Porto Torres	Milano	Empoli	Comune localizzazione
RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO DELLA FORESTIERA ANNESSA AL MONASTERO	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELEGRINI	RESTAURO DELL'ANTICO OPATORIO DI SANTA LIBERATA	SISTEMAZIONE DELL'ANTICA VIA ROMA	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATTEDRALE DI S. GIOVANNI E ALLA CHIESA DI S. MARZANO	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CENTRO ACCOGLIENZA SALESIANA 2001 TURISMO GIOVANE	RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUBRESSIS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO	CHARRAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO	RESTAURO E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA IN VIA SALAIOLA E DELL'ANTISTANTE PIAZZALE	Titolo intervento
MONASTERO BENEDETTINO S. MICHELE ARC.	PROV. S. MARCO - ABBADIA DEL FRATELLO	PARRROCCHIA DI SAN LEONARDO	COMUNE DI PONT SAINT MARTIN	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	MIN. TRASP. - NAVIGAZIONE D. G. A. C.	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	COMUNE DI PORTO TORRES	MONASTERO CISTERCENSE CHARRAVALLE	COMUNE DI EMPOLI	Soggetto beneficiario
1.205.930.000	5.085.000.000	471.000.000	572.000.000	475.000.000	1.075.000.000	538.000.000	5.340.000.000	2.491.240.000	642.000.000	Costo Stimato
1.155.930.000	4.155.000.000	251.000.000	572.000.000	475.000.000	860.000.000	488.000.000	5.340.000.000	2.491.240.000	492.000.000	Finanziamento attribuito
50.000.000	930.000.000	220.000.000	0	0	215.000.000	50.000.000	0	0	150.000.000	Altre fonti
74.000.000	415.500.000	0	57.200.000	0	0	0	534.000.000	253.700.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
74.000.000	415.500.000	0	57.200.000	0	0	0	534.000.000	253.700.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
961.930.900	2.879.437.020	239.725.000	437.078.492	474.905.750	0	482.582.500	0	1.937.540.000	491.478.000	Impegni di spesa
480.965.450	1.439.718.510	119.862.500	218.539.245	237.452.875	0	241.291.250	0	968.770.000	245.739.000	Lavori acconto 50%
0	0	95.890.000	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	860.000.000	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2011	2006	2005	200	1984	1971	1968	1965	1960	1951	Protocollo
Stracusa	Monza San'Angelo	Monza San'Angelo	Ortano	Ivrea	Milano	Torona	Aberobello	Mazara Del Vallo	Levano	Comune localizzazione
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NELLA STRUTTURAZIONE PROGETTIVA	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITÀ POVERA	IL PERCORSO DEL PELLEGRINO RESTAURO SCALINATA ANGIONINA E SISTEMAZIONE ACCESSI	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FUNZIONALE AL PERCORSO GIUBILARE IN OTTAVANTO	RISTRUTTURAZIONE DI DUE EDIFICI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO E DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA	L'ACCOGLIENZA FRANCESCAINA NEGLI TRINCLANTINI E MODERNI PER LE GRANDI ORBITE DEL 2000 - OPERA SAN FRANCESCO	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI S.MASSIMILIANO DI RIVALTA SCIVIA	RICETTIVITÀ DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ALBEROBELLO	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI SVEVERANDA	CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA RECUPERO EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	Titolo intervento
ARCHIDIOCESI DI SIRACUSA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE A.S.C.	BASILICA SANTUARIO SANMICHELE A.S.C.	COMUNE DI OTTAVANTO	ISTITUTO MISS SALESIANI O CARDINALI CAGLIERO	PROV. LOMBARDA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	PARROCCHIA S. M. ASSUNTA ABBAZIA CISTERCENSE	SEMINARIO VESCOVILE DI CONVERSANO	DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO	COMUNE DI LEVANTO	Soggetto beneficiario
390.000.000	3.000.000.000	3.578.950.000	600.950.000	5.590.000.000	3.072.000.000	3.410.000.000	1.403.000.000	1.781.000.000	4.035.000.000	Costo Stimato
345.000.000	3.000.000.000	2.928.950.000	600.950.000	5.530.000.000	1.575.000.000	2.760.000.000	1.373.000.000	1.731.000.000	3.255.000.000	Finanziamento attribuito
45.000.000	0	650.000.000	0	60.000.000	1.497.000.000	650.000.000	30.000.000	50.000.000	780.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
344.928.212	2.690.000.000	2.728.549.000	600.348.194	4.329.379.200	1.575.000.000	2.407.136.215	1.372.488.250	1.550.260.400	2.814.970.000	Impegni di spesa
172.464.105	1.345.000.000	1.364.274.500	300.474.560	2.164.689.600	787.500.000	1.203.568.110	686.244.120	775.130.200	1.407.485.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	630.000.000	962.654.485	548.995.300	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2181	2183	2146	2125	2111	2107/B	2107/A	2055	2013	2012	Protocollo
Noio	Castiglione	Venezia	Sennars	Confine	Milano	Milano	Cinise	Saint-Marcel	Asola	Comune localizzazione
RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'EX ORFANOTRIFO DON ORIONE DELLA PNEITA E DEGLI SPAZI ANNESSI AL FINE DI REALIZZARE UN OSTELLO ED UN CAMPING STAGIONALE	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA S. BARTOLOMEO	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA TELEMATICA INFORMATICA E SISTEMA PER UN TURISMO AFFIDABILE	RICOSTRUZIONE CASA DEL PELLEGRINO SISTEMAZIONE PIAZZALE DELLA BASILICA	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	CERTOSA COMPLESSO MONUMENTALE IN VIA GRIECCANO	OPALTRIO PARROCCHIALE DI VIA PARETO	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCAICHTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	CASA DI ACCOGLIENZA	CASA ACCOGLIENZA BARRIERA	Titolo intervento
DIOCESI DI NOIO	SEMINARIO VESCOVILE	COMUNE DI VENEZIA	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE	COMUNE DI CONFINE	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	ISTITUTO DI OC. SOSTENIAMEN TO CLERO	ENTE MOR. ASILO PRINC. AMEDEO ECCL. E MATEMELLE	Soggetto beneficiario
2.100.000.000	890.292.000	14.760.000.000	500.000.000	616.000.000	9.163.000.000	1.974.000.000	5.600.000.000	1.430.000.000	2.495.000.000	Costo Stimato
2.075.000.000	790.292.000	14.760.000.000	500.000.000	500.000.000	9.063.000.000	1.974.000.000	3.900.000.000	982.000.000	900.000.000	Finanziamento attribuito
25.000.000	100.000.000	0	0	116.000.000	100.000.000	0	1.700.000.000	448.000.000	1.595.000.000	Altre fonti
182.500.000	0	1.476.000.000	50.000.000	0	0	1.211.100.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
182.500.000	0	1.476.000.000	50.000.000	0	0	1.211.100.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.594.225.354	670.291.900	13.284.000.000	448.080.000	385.156.713	8.076.423.383	1.748.561.232	0	802.958.750	648.400.000	Impegni di spesa
797.112.675	335.145.950	6.642.000.000	224.040.000	192.578.356	4.038.211.690	874.280.620	0	401.479.375	324.200.000	Lavori acconto 50%
0	268.116.760	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	3.400.000.000	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
2337	San Sebastiano	RECUPERO FABBRICATO DEI PELLEGRINI CON SISTEMAZIONE DELLE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA DEL SANTUARIO	DIOC. DI SAN MARCO ARBENTINANO	2.500.000.000	2.500.000.000	0	250.000.000	250.000.000	1.918.238.710	959.119.350	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Padova	RESTAURO DELLA CATEDRALE DI PADOVA	DIOCESI DI PADOVA	5.626.000.000	4.344.000.000	1.282.000.000	0	0	4.343.130.473	2.171.565.240	0	0	0	0	0	0	0	0
2329	Frosinone	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLE COPERTURE E DELLA FACCIATA PROSPICIENTI LA PIAZZA DI SAN DOMENICO	COMUNE DI PIGNONICO S. DOMENICO	1.753.000.000	570.000.000	1.183.000.000	0	0	400.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2315/A	Fiesse Pro X	CONSERVATIVO DELLA BARCHESSA ZOBBI PER IL RICAMO DI RICETTIVA. A BASSO COSTO E REQUIRO DI BENE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER LA REALIZZAZIONE DI AREE LAVORI DI LA REALIZZAZIONE BARCHESSA ZOBBI	COMUNE DI FIESSE PRO X	3.210.000.000	1.910.000.000	1.300.000.000	0	0	1.764.882.952	882.441.475	0	0	0	0	0	0	0	0
2309	Isola Di Gian Sasso d'Isola	RESTAURO E REALIZZAZIONE DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE E RELAZIONE STORICO	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ISOLA	586.715.000	586.715.000	0	0	0	586.715.000	293.357.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2296	Isola Di Gian Sasso d'Isola	RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA E RICETTIVA. NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE E	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ISOLA	9.862.000.000	9.862.000.000	0	1.157.600.000	1.157.600.000	8.435.339.271	4.217.669.640	0	0	0	0	0	0	0	0
2284	Venezia	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO RICETTIVO	ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO	3.922.785.000	2.692.785.000	1.230.000.000	0	0	2.242.784.700	1.121.392.350	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Venezia	ADEGUAMENTO LOCALI PARROCCHIA S. DONATO A MURANO	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA E DONATO	1.864.000.000	1.100.000.000	564.000.000	0	0	1.074.370.000	537.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2216	Lanusei	RISAVVAMENTO SANTUARIO MADONNA D'OBELASTRA	DIOCESI DI LANUSEI	1.011.313.000	1.011.313.000	0	0	0	1.011.313.123	505.656.650	0	0	0	0	0	0	0	0
2197	Venezia	CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE CATEDRALI DI VENEZIA	SOPRINTENDENZA B.A.A. DELLA BASILICATA	4.110.000.000	2.000.000.000	2.110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
2436	Palermo	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURAZIONE GIÀ ATTIVATA PER ACCOGLIENZA TURISTICA	CONGREGAZIONE DEL SIGNORE DOMENICANE SAN SISTO VECCHIO	1.476.000.000	1.466.000.000	10.000.000	136.600.000	136.600.000	1.237.854.280	618.927.140	0	0	0	0	0	0	0	0
2416/B	Ancona	CONSOLIDAMENTO STATICO ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA - EDIFICI A B ed F - I LOTTO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMIO	633.129.564	383.000.000	250.129.564	0	0	300.303.374	150.151.690	0	0	0	0	0	0	0	0
2416/A	Ancona	CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA - EDIFICI A B ed F - I LOTTO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMIO	4.990.317.141	2.027.000.000	2.963.317.141	0	0	1.752.364.845	876.182.420	0	0	0	0	0	0	0	0
2407	Ruvo	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE E DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIULIARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA	308.000.000	308.000.000	0	30.800.000	30.800.000	246.976.000	123.488.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2406	Ruvo	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE E DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIULIARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELLA CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA	396.000.000	396.000.000	0	0	0	365.548.000	182.774.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2405	Ruvo	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE E DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIULIARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	508.000.000	508.000.000	0	0	0	453.452.500	226.726.250	0	0	0	0	0	0	0	0
2397	Romagnolo	RECUPERO E RIPRISTINO ANTICA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI ROMAGNESE	1.639.000.000	1.639.000.000	0	163.900.000	163.900.000	1.444.584.000	722.292.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2393	Bari	RECUPERO DEL MONASTERO DI S. SCOLASTICA	MONASTERO, S. SCOLASTICA	2.725.574.000	2.575.574.000	150.000.000	115.200.000	115.200.000	2.370.088.800	1.185.044.400	948.035.520	0	0	0	0	0	0	0
237	Genova	RECUPERO DI UNA CHIESA SEICENTESCA QUALI CENTRO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI	CONGREGAZIONE EBRAICA EVANGELICIZZATA FRANZOSIANI	4.476.000.000	2.996.000.000	1.480.000.000	0	0	2.966.600.000	1.483.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2357	Palza Anversa	FRUITTO DI UN'ALMA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADBRIGHE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA	OPERA PIA CARMELO TRISCONA DI GENOVA	953.000.000	933.000.000	20.000.000	73.300.000	73.300.000	734.700.000	367.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2543	2533	2520	2516	2502	2468	2460	245	2440	2437	Protocollo
Caprese Machinungolo	San Giovanni Rotondo	Venezia	Venezia	Galbiana	Tanghera	Fasano	Padova	Canalbatana	Catania	Comune localizzazione
CONFERIMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO ERMO DELLA CASELLA DEDICATA SAN FRANCESCO	RECUPERO TRAMITE RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA ABRESCHI	ILUOCHI DELLO SPIRITO E DELLA NATURA PARCO ECOLOGICO ATTREZZATO	RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHINKA	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSEGNA DEL SANTUARIO MARISS DELLORIENTE E SUO MUSEO ORIENTALE	OASI S. GIOVANNI BATTISTA RESTAURO MASSEMINA OTTAVA	MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA	RECUPERO GIUVILIA SPONZESCA	RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DELLA DOMUS PACIS	Titolo intervento
PARROCCHIA DI S. MARIA E S. MICHELE	FONDI CASA SCALLENTO SOFERENZA	CHIAIA VESCONIA MELETTA VENOSA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	COMUNE DI GALBIANA	PROV. ABRUZZI FRATELLI MINORI S. DEFRANCO	PARROCCHIA MARISS GIOVANNI BATTISTA	DIOCESI DI PADOVA	COMUNE DI CASTELVAZZARI	ARCIDIOCESI DI CATANIA	Soggetto beneficiario
208.400.000	2.811.921.000	1.660.000.000	4.200.000.000	450.000.000	2.405.940.000	1.006.726.000	5.643.000.000	5.935.510.000	867.364.000	Costo Stimato
158.400.000	2.811.921.000	1.660.000.000	2.000.000.000	435.000.000	2.405.940.000	889.726.000	4.455.000.000	5.435.510.000	834.364.000	Finanziamento attribuito
50.000.000	0	0	2.200.000.000	15.000.000	0	120.000.000	1.188.000.000	500.000.000	53.000.000	Altre fonti
0	0	166.000.000	0	28.500.000	275.000.000	0	0	50.000.000	43.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	166.000.000	0	28.500.000	275.000.000	0	0	50.000.000	43.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
158.400.000	2.463.921.040	0	1.768.040.186	393.467.112	2.008.534.000	779.726.400	4.454.964.791	4.765.510.000	791.363.040	Impegni di spesa
79.200.000	1.231.960.520	0	884.020.093	196.733.556	1.004.267.000	389.863.200	2.227.482.390	2.382.755.000	395.681.520	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	1.906.204.000	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2611	2609	260	2581	2578	2570	2569	2558	2552/B	2552/A	Protocollo
Parma	San Giovanni Rotondo	Magnago	Cinossa	Aquila	Napoli	San Giovanni Valdarno	Olivetta	Bologna	Bologna	Comune localizzazione
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SEMINARIO VESCOVILE	CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI ANZIANI DI PADRE PIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE	RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSERA PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAMPI DELLA SETTETRONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETHANNA	RESTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA MAIA AD USO OSTELLO E SERVIZI	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASERMA S. PIETRO DA ORLANDO DEI MONACI BENEDETTINI DI S. PIETRO	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNZIATIONE (IL MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO	RESTAURO DEL TRATTO URBANO DI PORTICO, ARCHI DA 1 a 69 e da 214 a 239	Titolo intervento
SEMINARIO VESCOVILE	PROV. FOGGIA TRATTI MONACI CAPPUCCINI	SANTUARIO MADONNA SIGNORELLA DELLA VITTORIA	PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA	ARCIDIOCESI DI GORIZIA	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	PARROCCHIA DI SANTA TERESA D'AVILA	COMUNE DI OLIVETTA	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	Soggetto beneficiario
1.500.000.000	13.541.000.000	2.500.000.000	4.450.000.000	3.053.659.000	2.884.000.000	941.000.000	1.726.000.000	798.100.000	2.068.000.000	Costo Stimato
800.000.000	11.041.000.000	1.500.000.000	3.950.000.000	3.053.659.000	2.884.000.000	645.000.000	1.526.000.000	648.100.000	1.716.000.000	Finanziamento attribuito
700.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	0	0	296.000.000	200.000.000	150.000.000	350.000.000	Altre fonti
0	1.357.300.000	0	0	332.400.000	288.400.000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	1.357.300.000	0	0	332.400.000	288.400.000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
550.000.000	9.583.208.885	1.482.660.000	3.590.295.000	2.721.258.474	2.018.655.195	552.600.000	1.509.111.091	648.100.000	1.500.762.896	Impegni di spesa
275.000.000	4.781.604.430	741.330.000	1.795.147.500	1.360.629.240	1.009.327.597	276.300.000	754.555.540	324.050.000	750.381.450	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	221.040.000	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazione dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2751	2739	272	2719	2695	2693	2688	2687	2624	2617	Protocollo
Angimi	Sarzana	Matera	Piano	Castellone G. Monti	Chieti	Rubiera	Correjo	Palermo	Messina	Comune localizzazione
RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL'OPATORIO PER ESSERE ADIBITA CASA PER FERIE	OPATORIO DI SAN GEROLAMO	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA S. ANNA	RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONI EDIFICIO DEL CORSO NAZIONALE DELLA TENENZA	RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EREMO DI BISMANTOVA PER RICETTIVA A BASSO COSTO	CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE	RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO LA CORTE OSPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RICETTIVA A BASSO COSTO	RECUPERO FABBRICATO LA ROCCHETTA DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA OSTELLO	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL COLLEGGIO PER LE MISSIONI CAPPUCCINI FINALIZZATA ALLA RICETTIVA A BASSO COSTO	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	Titolo intervento
DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	PARRROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA	ARCIDIOCESI DI MATERA RISINA	PARRROCCHIA DI SANTA MARIA DELLE CARCERI	PARRROCCHIA DI S. APOLLINARE VESCOVO	CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A.R.L.P.A.	COMUNE DI RUBIERA	COMUNE DI CORREGGIO	COLLEGGIO MISSIONI ESTERE FRATI MINORI	ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI	Soggetto beneficiario
900.000.000	721.000.000	5.359.970.000	2.100.000.000	700.000.000	1.806.000.000	3.807.126.000	950.000.000	4.470.505.000	3.509.348.000	Costo Stimato
550.000.000	577.000.000	4.859.970.000	965.000.000	350.000.000	1.806.000.000	3.307.126.000	550.000.000	4.470.505.000	3.364.348.000	Finanziamento attribuito
350.000.000	144.000.000	500.000.000	1.135.000.000	350.000.000	0	500.000.000	400.000.000	0	145.000.000	Altre fonti
0	0	450.000.000	0	0	180.600.000	0	0	463.000.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	450.000.000	0	0	180.600.000	0	0	463.000.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
395.968.000	380.093.500	3.411.560.000	965.000.000	350.000.000	0	3.287.838.995	536.599.700	4.007.511.681	2.860.447.885	Impegni di spesa
197.984.000	190.046.750	1.705.780.000	482.500.000	175.000.000	0	1.643.919.495	268.299.850	2.003.755.840	1.430.223.940	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2847/C	2847/B	2847/A	2839	2811	2781	2777	2770	2763	2754	Protocollo
Capriati	Capriati	Capriati	Capriati	Farema	Brugiate	La Spezia	Napoli	Sansepolcro	Brescia	Comune localizzazione
RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATEDRALE IN VICO DIOMO	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATEDRALE IN VIA FOSCARIO	RESTAURO CATEDRALI E LOCALI ADIACENTI	AMBITRATTO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CONSERVATIVO EX CONVENTO DEI GESUITI	RECUPERO STRUTTURE EDIFICIO GIA' SEDE VESCOVILE IN BRUGIATO DA DESTINARE A SPAZIO CULTURALE RELIGIOSO POLIFUNZIONALE	MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' ARENELLA	RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CONVENTO DEI SERVI DI MARIA PER ESSERE UTILIZZATO A CASA DI ACCOGLIENZA	CITTADELLA MARINA CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI RICETTIVITA'	Titolo intervento
SEMINARIO ARCIVESCOVILE E DI CALIARI	ENTE PARROCCHIA DI S. CEDLIA	ENTE DIOCESI CATEDRALE DI CALIARI	COMUNE DI CALIARI	SEMINARIO VESCOVILE DI COMACINO	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOM	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA	PROV. DI NAPOLI CARBONE CAMPETANO	Soggetto beneficiario
955.000.000	2.539.000.000	4.493.000.000	5.650.000.000	4.067.000.000	1.304.000.000	4.578.000.000	6.340.000.000	1.250.000.000	2.238.498.000	Costo Stimato
955.000.000	2.539.000.000	4.493.000.000	2.150.000.000	3.597.000.000	1.304.000.000	4.578.000.000	1.330.000.000	875.000.000	1.988.498.000	Finanziamento attribuito
0	0	0	3.500.000.000	470.000.000	0	0	5.010.000.000	375.000.000	250.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	135.000.000	457.800.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	135.000.000	457.800.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
888.251.200	2.362.003.200	4.184.505.600	1.827.787.000	3.540.288.336	1.168.364.000	0	1.229.500.000	691.130.000	1.688.497.857	Impegni di spesa
444.125.600	1.181.001.600	2.092.252.600	913.893.500	1.770.134.170	584.182.000	0	614.750.000	345.565.000	844.248.930	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.399.140	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2915	2913	2909	2897	2893	2875	2864	286	2853	2848	Protocollo
Frosinone	Frosinone	Belluno	Isaia	Ferrara	Venezia	San Marco in Lania	Napoli	Lecciano	Cagliari	Comune localizzazione
RESTAURO DELLA FACCIATA LATERALE DELLA CATTEDRALE DI S. ROMOLO	RESTRUTTURAZIONE DI CASA CARROZZA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI	RECUPERO E RIPUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVE E DI BERTINHO A FINI DI RESIDENZE QUADRILIARI	RECUPERO A FINE RICETTIVE E CREAZIONE INFRASTRUTTURE PER ACCOGLIENZA NELL'AREA DEL SANTUARIO DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO	RESTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA MURATA PER COMPLETAMENTO EX CONVENTO DI S. SPIRITO	RICETTIVITA' E SERVIZI PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA PER ANZIANI CASA DI RIPOSO AI SS. GIOVANNI E PAOLO A VENEZIA	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL CONVENTO DELLA CHIESA E DEL BOSCO DI MARIA SS. DI STIGNANO CON CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA E VIABILITA' DI ACCESSO CHIESA S. ELIA	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MIRACOLO EUCARISTICO ACCESSIBILITA' TOTALE IN UN PERCORSO PLURISCALE	RESTAURO DELL'AUDITORIUM PIAZZA DETTORI	Titolo intervento
CAPITOLIO DELLA CATTEDRALE DI FIESOLE	COMUNE DI FIESOLE	DIOCESI FORL' BERTINHO	DIOCESI DI ISERNA VERAFRO	COMUNE DI FERRARA	I.N.E. ISTITUZIONI DI RIPOSO E DI EDUCAZIONE	PROV. DI S. MARCELLO ARCANDELO FRATELLI MINORI	PROVINCIA DI CAGLIARI	PROV. PARIZZO DEI CONVENTUALI	COMUNE DI CAGLIARI	Soggetto beneficiario
529.683.000	1.894.340.000	5.483.044.000	11.009.800.000	2.071.287.000	3.260.000.000	5.890.000.000	300.000.000	5.037.588.000	1.740.000.000	Costo Stimato
383.762.000	1.464.340.000	3.833.044.000	9.726.800.000	2.071.287.000	3.260.000.000	5.290.000.000	300.000.000	5.037.588.000	1.740.000.000	Finanziamento attribuito
145.921.000	430.000.000	1.850.000.000	1.283.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	0	0	326.000.000	529.000.000	30.000.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	326.000.000	529.600.000	30.000.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
249.442.900	1.329.329.750	2.454.544.000	9.726.160.500	1.901.415.370	2.539.277.900	3.385.299.975	0	5.037.588.098	1.704.557.820	Impegni di spesa
124.721.450	669.669.870	1.227.272.000	4.863.080.250	950.707.690	1.269.638.950	1.692.649.990	0	2.518.794.050	852.278.910	Lavori acconto 50%
0	0	981.817.600	3.890.464.200	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3030	3008	2996	2989	2982	2981	2972	2949	2949	2918	Protocollo
Verona	Pedova	Moggiaro Veneto	Firenze	Catania	Capua	Siena	Moggiaro Veneto	Moggiaro Veneto	Maloro	Comune localizzazione
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO PASTORALE MONS. CAMBANO	RESTAURO DELLA CHIESA CONQUEVENTESCA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE AL FINE DI ACCOGLIERE A BASSO COSTO E ASSISTENZA	CONTROLLI IN TEMPO REALE DEI TRASMITTORI BBS TURISMI	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ED ACCOGLIENZA ISTITUTO S. EUFEMIA	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO MONUMENTALE S. CATERINA	REALIZZAZIONE DI AREA ATTEZZATA PER LA SOSTA ED IL RISTORO SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI RECIPERO A FINI DI OSPITALITÀ COMBELLAIVI SERVIZI DEL CONVENIO	COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E RELIGIOSO CONNESSE CON IL COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI IN CONCA	Titolo intervento
CENTRO MONS. CAMBANO FONDI DI RELIGIONE	MONASTERIO SANTA GIUSTINA	CASA REL. COLLEGGIO SALESIANO ASTORI	COMUNE DI FIRENZE	CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI	CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI	SEMINARIO ARCIVESCOVALE DI SIENA	COMUNE DI MOGLIARO VENETO	COMUNE DI MOGLIARO VENETO	SOPRINTENDENZA A. DELLA LOMBARDIA	Soggetto beneficiario
2.916.810.000	806.000.000	534.000.000	846.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	2.366.810.000	2.325.000.000	2.325.000.000	700.000.000	Costo Stimato
2.616.810.000	800.000.000	444.000.000	719.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.856.810.000	2.325.000.000	2.325.000.000	700.000.000	Finanziamento attribuito
300.000.000	6.000.000	90.000.000	127.000.000	0	0	510.000.000	0	0	0	Altre fonti
0	74.000.000	0	0	100.000.000	150.000.000	190.300.000	0	232.500.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	74.000.000	0	0	100.000.000	150.000.000	190.300.000	0	232.500.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.161.810.000	653.562.227	441.511.105	706.820.972	851.634.459	1.249.389.680	1.416.510.000	480.000.000	1.452.665.369	0	Impegni di spesa
1.080.905.000	326.781.113	220.755.550	353.410.490	430.817.230	624.694.840	708.255.000	0	726.332.684	0	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	344.653.780	499.755.870	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Stimazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3151	3135	3130	3080	3066	3065	3063	3060	3048/B	3034	Protocollo
Milano	Casaleiro	Capua	Saazena	Sienna	Sienna	Sienna	Sienna	Verona	Firenze	Comune localizzazione
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. EUSTORGIO	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITÀ PRESSO IL SANTUARIO DI LAMPEDUSA	CENTRO DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA CAMONICA DELLA BASILICA BENEDETTINA DI S. ANGELO IN FORMIS	TERMINCA GLI ITINERARI DELLA FEDE	RISALITA BALDASSARRE PERUZZI CENTRO STORICO	POSTEGGIO BALDASSARRE PERUZZI	POSTEGGIO PIAZZALE NOSELLI	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI LITURGICI PER LA FRUIZIONE DEI PELLEGRINI CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA SAGRESTIA VECCHIA SANTA CATERINA DELLA NOTTE CAPPELLA DEL MANTO	AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ NELLA FORESTERIA CIVILE FRANCESCANTI - FORESTIERE ALA EST - CORPO PRINCIPALE ALA OVEST - SERRE SCALINATA BAROCCA	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICA FIRENZE SUD	Titolo intervento
PARROCCHIA DI S. EUSTORGIO	PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI	COMUNE DI CAPUA	COMUNE DI SAZZENA	COMUNE DI SIENNA	COMUNE DI SIENNA	COMUNE DI SIENNA	COMUNE DI SIENNA	DIOCESI DI VERONA	COMUNE DI FIRENZE	Soggetto beneficiario
2.093.036.000	602.000.000	2.600.000.000	354.000.000	4.500.026.000	6.019.933.000	18.172.000.000	6.080.606.000	3.247.000.000	3.411.000.000	Costo Stimato
1.251.036.000	500.000.000	1.300.000.000	248.000.000	4.500.026.000	6.019.933.000	14.322.000.000	4.680.606.000	3.247.000.000	2.855.000.000	Finanziamento attribuito
842.000.000	102.000.000	1.300.000.000	106.000.000	0	0	3.850.000.000	1.400.000.000	0	556.000.000	Altre fonti
0	0	130.000.000	0	400.000.000	700.000.000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	130.000.000	0	400.000.000	700.000.000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.251.036.000	429.962.500	0	210.287.375	3.341.025.900	5.319.833.000	12.540.240.000	1.393.666.270	2.942.044.036	1.247.214.800	Impegni di spesa
625.518.000	214.981.250	0	105.143.685	1.670.512.950	2.659.966.500	6.270.120.000	696.833.120	1.471.022.020	623.607.400	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

327	3253	320	3194	3185	3175	3174	3172	3163	3152	Protocollo
Cagliari	Venezia	Genova	Firenze	Calabria	Lazio	Lazio	Lazio	Liguria	Matera	Comune localizzazione
OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO DEL PELLEGRINO	OPERE RELATIVE AL RESTAURO DELL'ANTICO OSPEDALE DEI PELLEGRINI E DELLE COPERTURE DELL'INTERNO COMPLESSO ARCHITETTONICO	SISTEMA REGIONALE E LIGURE DI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TURISTICHE S.I.R.L.P.T.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO OTTOLETTA E PARRASO	RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO S. PASQUALE	CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANNI PAOLI PER GIOVANI PELLEGRINI D'ITALIA E D'EUROPA	CENTRO PER GIOVANI CASA BEVEDERE	PARCHEGGIO SCALA SANTA	CONSERVAMENTO E RESTAURO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA DI COLETTA	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CORTILE INTERNO ED EDIFICI LIMITROFI	Titolo intervento
SEMINARIO ARCIDIACONO DI ROSSANO CAGLIARI	CONGREGAZIONE ARSENIA MECHITARISTA	REGIONE LIGURIA	COMUNE DI FIRENZE	CONSIGLIO SUPERIORE SERVE DEI POVERI	SOPRINTENDENZA REGIONALE PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA REGIONALE PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA REGIONALE PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA REGIONALE PER L'ABRUZZO	SANTUARIO SANTA MARIA DI PROCIANO	Soggetto beneficiario
2.345.530.000	6.480.600.000	1.130.000.000	2.000.000.000	316.000.000	10.748.000.000	4.832.000.000	640.000.000	5.000.000.000	4.224.000.000	Costo Stimato
2.345.530.000	5.580.600.000	780.000.000	1.769.000.000	292.000.000	10.748.000.000	4.752.000.000	640.000.000	5.000.000.000	4.194.000.000	Finanziamento attribuito
0	900.000.000	350.000.000	231.000.000	24.000.000	0	80.000.000	0	0	30.000.000	Altre fonti
244.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	440.700.000	O.N.T. Impegni di spesa
244.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	440.700.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.003.026.877	5.580.600.000	780.000.000	1.768.918.317	225.586.907	0	0	0	0	3.463.300.000	Impegni di spesa
1.001.513.440	2.790.300.000	390.000.000	884.459.660	112.793.453	0	0	0	0	1.731.650.000	Lavori acconto 50%
801.210.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.320.000	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	10.748.000.000	4.752.000.000	640.000.000	5.000.000.000	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3289	3286	3285	3279	3278/C	3278/B	3278/A	3277/B	3277/A	3276	Protocollo
Ravenna	Ravenna	Ravenna	Ravenna	Ravenna	Ravenna	Ravenna	Ravenna	Ravenna	Ravenna	Comune localizzazione
Titolo intervento										
Soggetto beneficiario										
Costo Stimato										
Finanziamento attribuito										
Altre fonti										
O.N.T. Impegni di spesa										
O.N.T. Anticipazioni 10%										
Impegni di spesa										
Lavori acconto 50%										
Lavori acconto 90%										
Lavori saldo										
Fornitura acconto 50%										
Fornitura ulteriore acconto										
Fornitura saldo										
Acquisizione aree e immobili										
O.N.T. Uffici tecnici										
Amministrazioni dello Stato										

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3360	334	3339	3338	3318	3315	3314	330	3291	329	Protocollo
Palermo	Pasqua	Venezia	Monterotondo	Catigiano	Firenze	Firenze	Isola Del Gran Sasso d'Italia	Parma	Caprace	Comune localizzazione
RIQUALIFICAZIONE DI COMPLESSO EDILIZIO AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL'AGIBILITA' DELLE AREE ESTERNE	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CANONICA DELLA CHIESA DI S. MARONIA PER FORMAZIONE DI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI LAPIDEI DELLA CHIESA E DEL CAMPANELLO E CONSOLIDAMENTO PALATINA E RESTAURO DEGLI AFFRESCHI NELL'AREA PRESBITERIALE	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CONVENTO DI S. LEUCO DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI	CONSERVATIVO DELLA BASILICA DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DI LUDICA MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORME DEGLI EDIFICI MANSI STELLA E PENSIONE SANTUARIO	AMPLIAMENTO E PROTEZIONE DALL'EROSIONE DEL SANTUARIO DI S. MARONIA	SERVIZI DI VISITA GUIDATA AI MUSEI DI FIRENZE CON I BAMBINI	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA EST DEL CONVENTO DI SAN GABRIELE DELL'ABDOL OPERA	RISTRUTTURAZIONE NELL'EX ORFANOTRUCO ISTITUTO GALETTI ABBOSI FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA CON SERVIZI INTERNI PER UN TOTALE DI 70 POSTI LETTI	RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANITO	Titolo intervento
OPERA DI QUALIFICAZIONE DELLA FIDEI	DOCGESI DI PERSONA	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	COMUNE DI MONTEOTRO INTERIORE	ENTE SANTI S. MARIA DI LUDICA E PARROCCHIA	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	PROVINCIA DI MARIASSA DELLA PIETA' DEI PADRI PASS	ARCHIDIOCESI DI PARVENNA CERIVA	SANTUARIO MADONNA DEL GRANITO	Soggetto beneficiario
1.500.000.000	670.000.000	2.217.429.000	2.442.300.000	4.050.035.000	1.641.000.000	1.080.000.000	3.351.000.000	5.164.700.000	3.037.000.000	Costo Stimato
1.450.000.000	268.000.000	1.817.429.000	2.142.300.000	3.510.035.000	1.171.000.000	961.000.000	3.351.000.000	4.164.700.000	3.037.000.000	Finanziamento attribuito
50.000.000	402.000.000	400.000.000	300.000.000	540.000.000	470.000.000	119.000.000	0	2.000.000.000	0	Altre fonti
95.000.000	0	0	0	0	0	0	335.100.000	0	239.700.000	O.N.T. Impegni di spesa
95.000.000	0	0	0	0	0	0	335.100.000	0	239.700.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.146.828.000	231.000.000	1.817.428.561	1.842.300.000	3.510.034.540	1.165.566.380	630.760.000	0	4.164.703.000	1.729.791.016	Impegni di spesa
573.414.000	115.500.000	908.714.280	921.150.000	1.755.017.270	584.783.180	315.380.000	0	2.082.351.500	864.895.505	Lavori acconto 50%
0	0	726.971.425	0	1.404.013.815	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3451	3432	342	342	3417	3412	3400	3398	3371	3370	Protocollo
Montechiaro D'Alfi	Carrara	Codrignanos	Codrignanos	Varese	Firenze	Monopoli	Dona D'Alfi	Novi Ponente	Novi Ponente	Comune localizzazione
CONSOGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RESTAURO CHIESA ROMANICA SS. MAZARIO E GERSONO MONTICHIAMO D'ALFI		SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARIGIA	SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARIGIA	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NOBILITAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI	RESTAURO DELLA CHIESA E DELL'ANNESSE CONFINESSE PATRIMONIALE DI SANTA MARIA AMALFITANA	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA E DEL CONVENTO DELLA PIETÀ A.S. TERAMO IN COLLE COME CENTRO ACCOGLIENZA POVERA	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELEGRINI	RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELEGRINI	Titolo intervento
PARROCCHIA DEL SS. BARTOLOMEO E CATERINA REG. P.G.	COMUNITA' MONTANA ALTA VAL POLCIVERBA	COMUNE DI CODRIGNANOS	COMUNE DI CODRIGNANOS	CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO	COMUNE DI FIRENZE	PARROCCHIA SANTA MARIA AMALFITANA	COMUNITA' MONT. MURGIA SUD ORIENTALE	CONVENTO DI PIETRALBA	CONVENTO DI PIETRALBA	Soggetto beneficiario
800.000.000	951.000.000	5.205.000.000	5.205.000.000	2.000.000.000	996.000.000	1.500.000.000	2.940.978.000	5.033.000.000	7.509.000.000	Costo Stimato
800.000.000	851.000.000	3.805.000.000	3.805.000.000	1.500.000.000	886.000.000	1.500.000.000	2.540.978.000	3.355.000.000	5.006.000.000	Finanziamento attribuito
0	100.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	500.000.000	110.000.000	0	0	1.678.000.000	2.503.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	150.000.000	339.900.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	150.000.000	339.900.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
799.356.500	851.781.600	452.078.160	2.420.430.000	1.393.888.500	865.591.200	1.350.000.000	2.601.077.275	2.457.524.200	3.981.382.186	Impegni di spesa
399.678.250	425.890.800	0	1.210.215.000	696.944.250	432.795.600	675.000.000	1.300.538.640	1.228.762.100	1.990.691.095	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	1.040.430.910	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	452.078.160	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3564	3524	352	351	3506	3505	3494	3474	3472	347	Protocollo
Firenze	San Marco in Lamo	Torralba	Morss	Arezzo	Macerata	Napoli	Macerata	Genova	Benevento	Comune localizzazione
PARCHEGGIO SCAMBIA TORE E SVINCOLO DI RACCORDO IN LOCALITA' SAN LORENZO A GREVE	AREE URBANE ED EXTRAURBANE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO NAVETTE	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO SANT'ANTONIO ABATE DOTAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI E REALIZZAZIONE DIVISORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	CONCRETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI, RESTAURO DELLA CASA DEL PELLEGRINO, RESTAURO DI ALTRO EDIFICIO ESISTENTE E CREAZIONE DI UN SERVIZIO DI RISTORO CON ANNESSA ABEA ATTREZZATA	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CONVENTO DI SAN PIER PICCOLO	POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI BENI CULTURALI RIFUNDAZIONE DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO DI IMMOBILITA' DESTINATA AD ATTIVITA' TURISTICA A BASSO COSTO DEL PROGETTO RISIDA NELL'AMBITO DEL PROGETTO RISIDA IUDORO PIAZZA	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP SENSORIALE E MOTORIO PRESSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE ED AL CROSTO DI SAN LORENZO	CENTRO GIUBILARE LA FACE COMPLETAMENTO STRUTTURE ESISTENTI	TITOLO intervento
COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	COMUNE DI TORRALBA	COMUNE DI MORSS	DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	SOPRINTENDEN ZA B.A.A.S. DI SALERNO	MIN. GRAZIA GIUSTIZIA CENTRO DI STUDI MANDUCI	DIOCESI DI MONTEVERGINE	ARCIDIOCESI DI GENOVA	ARCIDIOCESI DI BENEVENTO	Soggetto beneficiario
18.946.815.000	2.620.000.000	741.000.000	1.323.000.000	1.211.000.000	2.540.600.000	1.577.000.000	3.900.000.000	4.473.475.000	3.930.000.000	Costo Stimato
14.680.815.000	2.220.000.000	741.000.000	1.323.000.000	1.093.000.000	2.540.600.000	1.577.000.000	3.300.000.000	3.473.475.000	3.930.000.000	Finanziamento attribuito
4.266.000.000	400.000.000	0	0	118.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	Altre fonti
0	0	83.900.000	154.700.000	0	0	0	330.000.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	83.900.000	154.700.000	0	0	0	330.000.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
13.480.814.467	1.819.882.000	606.600.879	1.078.243.756	892.880.000	0	0	2.432.600.359	2.235.474.181	3.144.000.000	Impegni di spesa
6.740.407.230	909.941.000	303.300.440	539.121.880	446.440.000	0	0	1.216.300.180	1.117.737.090	1.572.000.000	Lavori acconto 50%
0	0	121.320.176	0	0	0	0	0	894.189.672	1.257.600.000	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	1.961.000.000	1.577.000.000	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3792	3773	3771	3761	3751	3719	3714	3703	3700	370	Protocollo
Bonifazi	Trapani	Firenze	Susa	Chiangmai	Chiangmai	Verona	Pavia	Pesaro	San Gennaro	Comune localizzazione
OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER TURISMO SOCIALE	RESTAURIO E SISTEMAZIONE DI PARTE DEL LOCALI DEL TEX SEMINARIO VESCOVICI DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E SALE D'INCONTRIO	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI SPACI DI ACCOGLIENZA PUBBLICA ESISTENTI	INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURIO DEL COMPLESSO MONASTICALE CHIESA MONASTRI DI S. FRANCESCO	RESTAURIO DEL SANTUARIO MADONNA DELLE NEVI E AMPLIAMENTO DELL'ATTIGLIO OSTELLO DEL LAGO MISERIN	RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO AD USO RICETTIVA	OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLE EX CONVENTO DI SANTA CHIARA	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA LEGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER PELLEGRINI	PARCHIEGGIO AUTO E BUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI PERCORSO DI ACCESSIBILITA' ALLA GOLA DELLA DEL SANTO CON ADEGUAMENTO DELLA ZONA PIESHIRTIALE	RISTRUTTURAZIONE DI FORESTERIA ESISTENTE PER IL MOLINO DI S. ANTONIO DELLO SPIRITO A BASSO CASO	Titolo intervento
COMUNE DI BONIFAZI COSENZA	DIOCESI DI TRAPANI	COMUNE DI FIRENZE	PROV. LIGURE PEMONTESE FRATI MINORI	PARROCCHIA DI SAN MICOLA DI GIAMORICHI	COLL. ANTONINO MISSIONI ESTERE FRATI	COMUNE DI VERONA	COMUNE DI PAVIA	PARROCCHIA REG. S. ANTONIO D'ARCELLA	MONASTERO BENEDETTO NE VALL'OMBROSA	Soggetto beneficiario
2.765.000.000	834.750.000	994.000.000	970.000.000	1.000.000.000	4.100.000.000	4.104.300.000	1.688.800.000	1.100.000.000	893.627.000	Costo Stimato
2.265.000.000	784.750.000	884.000.000	820.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	4.104.000.000	1.688.000.000	1.100.000.000	843.627.000	Finanziamento attribuito
500.000.000	50.000.000	110.000.000	150.000.000	0	2.100.000.000	0	0	0	50.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	168.800.000	110.000.000	38.500.000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	168.800.000	110.000.000	38.500.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.264.272.659	779.225.000	882.990.960	820.000.000	993.517.500	1.796.497.600	4.091.661.572	0	989.460.000	755.127.151	Impegni di spesa
1.132.136.329	389.612.500	441.495.480	410.000.000	496.758.750	898.248.800	2.045.830.790	0	494.730.000	377.563.570	Lavori acconto 50%
905.709.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3940	394	3914	3902	3885	3885	3868/C	3868/B	3868/A	3868	Protocollo
Macopiano	Favaro Modenese	Monterodondo	Genova	Siena	Siena	Arezzo	Arezzo	Arezzo	Arezzo	Comune localizzazione
RECUPERO DEI SENTIERI STORICI RELIGIOSI TRADIZIONALMENTE UTILIZZATI NEL PELLEGRINAGGIO VERSO IL SANTUARIO DI MONTEFERRONE	RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DEL PELLEGRINO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE NEL CASTELLO	RECUPERO AI FINI RICETTIVI DI ALCUNI EDIFICI STORICI DISMESSI	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	STRUTTURA RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA CASA PER FEMME	STRUTTURA RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA CASA PER FEMME	LOGGIA DEL VICARIO DELLA SEBENISSIMA	EX CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE	RECUPERO INTERTECNOLOGICO DEGLI IMMOBILI ADIACENTI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA E DEL EX CONVENTO FRANCISCANO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ASSOCIATA ALLE MURIE DELLA PARROCCHIA E DEL EX CONVENTO FRANCISCANO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ASSOCIATA AL CONVENTO DELLA BEATA VERGINE NEL CASTELLO	RECUPERO INTERTECNOLOGICO DEGLI IMMOBILI ADIACENTI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA E DEL EX CONVENTO FRANCISCANO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ASSOCIATA AL CONVENTO DELLA BEATA VERGINE NEL CASTELLO	Titolo intervento
DIOCESI DI MONTEFERRONE	ENTE DIOC. SALVEZZA E EDUCAZIONE	COMUNE DI MONTERODONDO	COMUNE DI GENOVA	SEMINARIO ARCHIEPISCOPALE E DI SIENA	SEMINARIO ARCHIEPISCOPALE E DI SIENA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	Soggetto beneficiario
1.439.000.000	1.499.000.000	8.204.000.000	303.965.000	1.063.770.000	1.063.770.000	447.515.308	2.410.170.000	3.622.094.692	6.885.430.000	Costo Stimato
1.439.000.000	800.000.000	4.900.000.000	203.965.000	823.770.000	823.770.000	244.010.502	2.196.000.000	3.222.769.498	6.068.430.000	Finanziamento attribuito
0	699.000.000	3.304.000.000	100.000.000	240.000.000	240.000.000	203.504.806	214.170.000	399.325.194	817.000.000	Altre fonti
150.000.000	0	0	0	0	84.600.000	0	0	0	616.900.000	O.N.T. Impegni di spesa
150.000.000	0	0	0	0	84.600.000	0	0	0	616.900.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.288.010.206	800.000.000	3.990.610.018	203.964.388	195.200.000	539.170.000	219.325.032	1.972.682.200	2.895.195.594	0	Impegni di spesa
644.005.100	400.000.000	1.995.305.010	101.982.190	0	269.585.000	109.682.516	986.341.100	1.447.597.797	0	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	215.668.000	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	175.680.000	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4019	4015/B	4015/A	400	3992	3990	397	396	3946	3943	Protocollo
Avellino	Asano	Asano	Modena	Asara	Siracusa	Nonara	Modena	San Nazario Sauro	Portofino	Comune localizzazione
OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIFUGIO PER ANZIANI ROSETO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROSETO	REALIZZAZIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELL'ALIZZA	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO DELLA GIOVENTU'	CENTRO DELL'UMANA ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALI EX MONASTERO SS ANNUNZIATA	RESTAURO CONSERVATIVO BASILICA S. MARCELO CONSOLIDAMENTO IDROELETTRICO E RECUPERO AMBIENTALE	OPERE DI MANUTENZIONE COMPLESSO ABBAZIALE	REALIZZAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO DI MODENA	ISTRUTTURAZIONE AL 1° PIANO DELLA ESTESUD DEL CROSTRO BENEDETTO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PERCORSI GIUBILARI	Titolo intervento
PROVINCIA NAPOLI ETNA DEI FRATI CAPPUCCINI	CURIA VESCOVILE DI NARDÒ - GALLIPOLI	CURIA VESCOVILE DI GALLIPOLI	ISTITUTO PROV. S. FILIPPO E S. DEMANDINO	DIOCESI DI AGERIA	COMUNE DI STRADELLA	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONARA	BASILICA METROPOLITANA	ABBAZIA BENEDETTINA SS. NAZARIO E CELSO	AMM. PROVINCIALE DI PORTOFINO	Soggetto beneficiario
5.264.688.068	2.722.000.000	1.180.000.000	2.330.000.000	6.196.000.000	494.000.000	5.584.000.000	2.030.000.000	500.000.000	2.000.000.000	Costo Stimato
1.993.000.000	2.722.000.000	1.180.000.000	1.550.000.000	5.696.000.000	398.000.000	3.584.000.000	1.200.000.000	450.000.000	1.950.000.000	Finanziamento attribuito
3.271.688.068	0	0	780.000.000	500.000.000	96.000.000	2.000.000.000	830.000.000	50.000.000	50.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	612.800.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	612.800.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.993.000.000	2.721.523.650	1.179.726.310	1.389.999.240	4.740.541.500	390.535.400	3.084.000.000	643.359.000	450.000.000	1.626.447.000	Impegni di spesa
996.500.000	1.360.761.825	589.863.155	694.999.620	3.120.270.750	195.267.700	1.542.000.000	321.679.500	225.000.000	813.223.500	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4194	415	4111	4110	4105/B	4104	4083	4062	4061	4027	Protocollo
Firenze	Monopelle	Chiusi Della Verna	Chiusi Della Verna	Castell'Alquato	L'Arnica	Venezia	Firenze	Orta	San Neazaro Seta	Comune localizzazione
RIFACIMENTO CUCINA GENERALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RECUPERO ATTRAVERSO NUOVI SISTEMI IDRAULICI E SPOGLIATORI VIA DEI BRUNI	STRUTTURURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PERI FERIE POSTA ALL'INTERNO DEL SANTUARIO DELLA VERNA	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PERI FERIE OASI DI S. FRANCESCO FINALIZATO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' INTERNA	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' (PIU' LOTTO)	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMANIGO DA DESTINARE AL CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE	RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DELLA BASILICA DELLA SALUTE	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITA' RIETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	RESTAURO E RIUTILIZZO DEL RITIRO MARIA IMMACOLATA DA ADIBIRE A RISTORO PELLEGRINI, CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN VIA BARBAVARA (EX FORNO)	Titolo intervento
COMUNE DI FIRENZE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANOPELLO	PROV. TOSCANA FRATTI MINORI S. FRANCESCO	ENTE MORALE ASS. IAN. FEMM. SACRO CUORE	COMUNE DI CASTELL'ALQUATO	PROVINCIA DI L'ARNICA	BASILICA DI S. MARIA DELLA SALUTE	CONVITTO ECCLESIASTICO DELLA CALZA	SEM. VESCOVILE S. CARLO BORGONOVO	COMUNE DI S. MAZZARO SESA	Soggetto beneficiario
1.175.000.000	410.990.000	1.115.000.000	946.000.000	595.000.000	2.152.000.000	1.908.314.000	4.388.231.000	1.544.400.000	550.000.000	Costo Stimato
1.034.000.000	340.990.000	715.000.000	546.000.000	195.000.000	2.152.000.000	1.408.314.000	2.330.231.000	1.344.400.000	500.000.000	Finanziamento attribuito
141.000.000	70.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	501.000.000	2.058.000.000	200.000.000	50.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
773.785.580	252.993.700	610.000.000	452.400.000	160.119.770	2.152.000.000	1.408.313.412	2.330.231.000	1.307.400.000	443.000.000	Impegni di spesa
386.892.790	126.496.850	305.000.000	226.200.000	80.059.885	1.076.000.000	704.156.710	1.165.115.500	653.700.000	221.500.000	Lavori acconto 50%
0	101.197.200	0	0	0	0	563.325.364	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4271	4262	4254	4252	4248	4247	4246	4245	4203	4198	Protocollo
Modena	Modena	Caltanissetta	Monza	Vicenza	Agropoli	Catania	Capua	Orvieto	Firenze	Comune localizzazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LITURGICI ED ARRETI DEL PRESBITERIO E DEL TRANSETTO DELLA CATEDRALE	RIPISTINO E CONSERVAZIONE DELLA VILLA TERESCHI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI ED ANZIANI	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DEL CLERO DI MONREALE FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	RIQUALIFICAZIONE SALE P. URUSO E ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIADATTAMENTO DELLA CATEDRALE DI AGRIPOLI E LOCALI ANNESSI	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA STRUTTURA RICETTIVA COLONIA DON BOSCO	AMPLIAMENTO DEL PENSIONATO FEMMINILE ISTITUTO G. PASCALE DI CURTI	CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SCAMBIO CULTURALE DI PROMOZIONE E FORMAZIONE	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE CASTELLO	Titolo intervento
CATEDRALE S. NICCOLO' DI BANI	PARROCCHIA DI S. GIORGIO	SEMI VESCOVILE DI CALTANISSETTA	ARCIDIOCESI DI MONREALE	PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE	PARROCCHIA S. GERLANDO	OPERA S. GIOVANNI BOSCO	CONGR. SIORE FRANCESCANE SACRI CUORI	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	COMUNE DI FIRENZE	Soggetto beneficiario
1.120.000.000	1.674.291.000	4.665.000.000	1.627.501.000	1.150.000.000	1.463.300.000	933.000.000	1.000.000.000	3.294.748.000	1.460.000.000	Costo Stimato
1.070.000.000	1.549.291.000	3.821.000.000	1.627.501.000	1.000.000.000	1.463.300.000	653.000.000	1.000.000.000	3.144.748.000	1.241.000.000	Finanziamento attribuito
50.000.000	25.000.000	844.000.000	0	150.000.000	0	280.000.000	0	150.000.000	219.000.000	Altre fonti
0	142.500.000	0	167.500.000	0	150.000.000	0	100.000.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	142.500.000	0	167.500.000	0	150.000.000	0	100.000.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.019.025.832	1.506.780.340	2.633.416.744	1.239.249.932	982.824.600	945.900.000	653.116.867	862.599.430	2.944.747.985	1.125.731.117	Impegni di spesa
509.512.920	753.395.170	1.316.708.370	619.624.970	491.412.300	472.950.000	326.558.430	431.299.710	1.472.373.990	562.865.560	Lavori acconto 50%
0	602.716.140	0	0	0	0	0	345.039.772	1.177.899.190	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4382	4383	4377	4376	4310	4304	4303	4298	4279	4275	Protocollo
Monsummano Terme	Napoli	Urbino	Urbino	Firenze	Angiano	Angiano	San Gimignano	Cava De' Tirreni	Venezia	Comune localizzazione
SEZIONE DI MUSEO DI ARTE SACRA E RELIGIOSA POPOLARE CON ESPOSIZIONE DI EX VOTO	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE SAN CARLO ALL'ARENIA COMPRESO NELL'INTERNO L'ANTICA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	RIPISTINO E CONSOLIDAMENTO ALLO SCOPO DI RENDERE AGIBILE LA CATTEDRALE	CONSOLIDAMENTO CAMPANILE DELLA CATTEDRALE	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SENZA DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	SISTEMAZIONE DI PAREE ATTREZZATE PER SOSTA E INTRONCO IN LOCALITA' MONTE CAMINO A SERVIZIO DEL SANTUARIO	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO RICETTIVO PER OSTELLO	COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO CON RIORDINAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEI VISITATORI DELLA CITTA'	OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO SOCIALE RESTAURATO E RECUPERO DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S.MARIA AL RIFUGIO	RESTAURATO CONSERVATIVO DELL'INTERNO DELLA CHIESA DEL SS. REDENTORE	TITOLO INTERVENTO
COMUNE DI MONSUMMANO TERME	PROV. NAPOLITANA PABRI SCOLOP	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	COMUNE DI FIRENZE	PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE	PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	PARROCCHIA DEL SS. REDENTORE	Soggetto beneficiario
500.000.000	893.000.000	1.331.000.000	879.000.000	21.702.339.998	908.000.000	2.095.000.000	4.000.000.000	4.442.856.000	2.586.759.000	Costo Stimato
330.000.000	580.000.000	1.331.000.000	879.000.000	18.044.339.998	650.000.000	1.970.000.000	3.500.000.000	3.442.856.000	2.136.759.000	Finanziamento attribuito
170.000.000	313.000.000	0	0	3.658.000.000	258.000.000	125.000.000	500.000.000	1.000.000.000	450.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
283.987.600	477.800.000	1.297.443.776	718.902.600	9.112.998.222	588.800.000	1.817.100.000	2.711.253.910	3.442.855.963	1.833.758.099	Impegni di spesa
141.993.800	238.900.000	648.721.888	359.451.300	4.556.499.110	294.400.000	908.550.000	1.355.626.750	1.721.427.980	916.879.050	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	733.503.240	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.A.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4592	4591	4559	4539	4530	450	4442/B	4442/A	4423	440	Protocollo
Melli	Lauria	Firenze	Foggia	Padova	Macerata	Bologna	Dadogna	Parenza	Parenza	Comune localizzazione
LAVORI DI RECUPERO DELL'EX SEMINARIO DELLE AREE DELL'EPISCOPATO A FINI RICETTIVE E SINDACONMANIA DELLA CATEDRALE	SISTEMAZIONE DI UN'AREA ADIACENTE AL SANTUARIO MADONNA DELL'AMMO	SISTEMA INFORMATICO SULLO STATO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ.	AMPLIAMENTO DELL'OPERA PIÙ LONERÒ SULLITANI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DELLA POPOLAZIONE DEI DISABILI	RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FOMANABONA GENOVA	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA DI S. PETRONIO (n° LOTTO)	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA DI S. PETRONIO (n° LOTTO)	RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO AL MONTALI E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO OSTELLO LUNGO IL TRACCATO PRINCIPALE DELLA VIA ROMA	PALAZZO VESCOVILE DI BOBBIO CAMINUS IANUE	Titolo intervento
DIOCESI DI MELLI	COMUNE DI LAURIA	COMUNE DI FIRENZE	OPERA PIÙ LONERÒ SULLITANI DENTRO IL CENTRO SULLITANI	MONASTERO SANTA GIUSTINA	COMUNE DI MACERATA	SOPRINTENDENZA REGIONALE ED ARCHITETTONICA EMILIA	SOPRINTENDENZA REGIONALE ED ARCHITETTONICA EMILIA	PARROCCHIA S. LAZZARO E S. VINCENZO DE PAOLI	ENTE CATTEDRALI E DI BOBBIO	Soggetto beneficiario
2.296.975.000	649.000.000	300.000.000	2.096.224.000	59.000.000	211.000.000	2.600.000.000	1.000.000.000	383.000.000	180.000.000	Costo Stimato
2.296.975.000	649.000.000	267.000.000	2.096.224.000	59.000.000	191.000.000	2.600.000.000	1.000.000.000	350.000.000	170.000.000	Finanziamento attribuito
0	0	33.000.000	0	0	20.000.000	0	0	33.000.000	10.000.000	Altre fonti
259.900.000	0	0	0	59.000.000	0	0	0	0	7.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
259.900.000	0	0	0	59.000.000	0	0	0	0	7.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.872.815.909	630.407.695	157.000.000	2.096.223.524	0	155.362.680	0	0	349.500.000	141.322.000	Impegni di spesa
936.407.950	315.203.847	78.500.000	1.048.111.760	0	77.681.340	0	0	174.750.000	70.661.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	2.600.000.000	1.000.000.000	0	0	Amministrazione dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4668	4660	464/B	4632	462	4619	461	4609	4584	4583	Protocollo
Marecchiano	Lucca	Varallo	Treviso	Varallo	Aosta	Varallo	Firenze	Melli	Venosa	Comune localizzazione
REALIZZAZIONE DEL BI OCIO SERVIZI IGIENICI SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO	SISTEMA MUSEALE DI ARTE SACRA DELLA DIOCESI DI LUCCA EX REAL COLLEGIO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NEL COMPLESSO DELL'EX REAL COLLEGIO	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO STRUTTURALE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA "MADONNA DELLE GRAZIE" (2° LOTTO)	ITINERARI D'ARTE E RELIGIOSI - NEL TRIANGOLO VENETA GUIDA	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ADIACENTE ALLA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	RESTAURO DEL PRORATO DI S. ORSO	COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU	CASA DI ACCOGLIENZA VILLA PIERANCIOLI	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO	RECUPERO DEL CONVENTO DEI CAPUCCINI (MADONNA DELLE GRAZIE) A FINI DI ACCOGLIENZA E DI RICETTIVA A BASSO COSTO	Titolo intervento
DIOCESI DI MONTEVERGINE	COMUNE DI LUCCA	COMUNE DI VARALLO SESIA	SOPRINTENDENZA A.A.A.S. FRIULI V.G.	COMUNE DI VARALLO SESIA	FONDAZIONE S. ORSO AOSTA	COMUNE DI VARALLO SESIA	ENTE ARDIOCESI DI FIRENZE	COMUNE DI MELLI	COMUNE DI VENOSA	Soggetto beneficiario
446.000.000	8.054.000.000	600.000.000	1.367.000.000	450.000.000	2.800.000.000	1.456.000.000	2.270.000.000	3.637.279.000	2.916.031.000	Costo Stimato
446.000.000	7.000.000.000	600.000.000	1.307.000.000	450.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	2.050.000.000	3.637.279.000	2.916.031.000	Finanziamento attribuito
0	1.054.000.000	0	60.000.000	0	800.000.000	456.000.000	220.000.000	0	0	Altre fonti
46.500.000	0	0	0	45.000.000	0	0	0	423.400.000	339.500.000	O.N.T. Impegni di spesa
46.500.000	0	0	0	45.000.000	0	0	0	423.400.000	339.500.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
398.500.000	5.132.448.000	586.649.300	0	0	1.293.402.000	792.320.000	1.872.880.000	2.713.878.979	2.576.530.739	Impegni di spesa
199.750.000	2.566.224.000	293.324.650	0	0	646.701.000	396.160.000	936.440.000	1.356.939.490	1.288.265.370	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	1.307.000.000	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4817	479	478	4767	476	4756	4734	4708	4707	470	Protocollo
Comuna	Comuna	Comuna	Comuna	Comuna	Comuna	Comuna	Comuna	Comuna	Comuna	Comune localizzazione
MUSEO DEL VASCINOCESI E DEL TESORO DI AQUILEA	L'ABBATTIMENTO DEL PARABRISCE ARCHITETTONICO PER LA MOBILITÀ DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITÀ ALLI LUOGHI RELIGIOSI, ARCHEOLOGICI E TURISTICHI	INTERVENTI RIQUALIFICANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO LUNGO LA VIA A GRANDI	OSTELLO DEL LEVANTE	INTERVENTI RIQUALIFICANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL NUOVO CENTRO VISITE DELLA SOBRANTENSERENZA	ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIENZA SOSTA E RISTORO PELLEGRINI	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL RESIDUO COMPLESSO CASERIO MILITARE DEL CENTRO PER RINGRAZIAMENTI	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DENOMINATO CONGREGAZIONE DELLE SUORE TERZIARIE FRANCISCANE IMMACOLATINE	IL FALGIONE RITORNA ALLA CITTA' - RECUPERO DELLA CHIESA E DEI LOCALI ANNESSI	OSPEDALE SOAVE CENTRO POLICLINICO E MUSEALE OPERE DI CONSERVAZIONE ARCHITETTONICHE E TECNOLOGICHE	Soggetto beneficiario
4.470.000.000	1.059.000.000	280.000.000	13.116.346.000	691.000.000	197.000.000	1.692.000.000	5.709.200.000	2.596.528.000	1.255.000.000	Costo Stimato
4.470.000.000	1.049.000.000	270.000.000	12.516.346.000	681.000.000	167.000.000	1.442.000.000	5.509.200.000	2.396.528.000	1.255.000.000	Finanziamento attribuito
0	10.000.000	10.000.000	500.000.000	10.000.000	30.000.000	250.000.000	200.000.000	200.000.000	0	Altre fonti
447.000.000	0	27.000.000	0	58.100.000	0	0	0	0	144.500.000	O.N.T. Impegni di spesa
447.000.000	0	27.000.000	0	58.100.000	0	0	0	0	144.500.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
3.547.842.630	829.537.888	0	9.847.980.031	573.948.898	135.618.137	1.442.000.000	4.503.141.000	2.196.528.000	1.192.098.723	Impegni di spesa
1.773.921.315	414.768.940	0	4.923.990.010	338.834.449	67.809.068	721.000.000	2.251.570.500	1.098.264.000	596.049.360	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	576.000.000	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4882	488	4878	4877	4872	4869	4853	4847	484	4838/A	Protocollo
San Giuliano Milanese	Codogno	Milano	Celle Di Val D'elia	Nardo'	Breda	Opadello D'adorno	Maroggiano	Aquileia	Verona	Comune localizzazione
RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DI UNA ANTICA FORESTERA MONASTICA	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX MATTatoio COMUNALE AD AREA ATTREZZATA PER L'ACCOGLIENZA	RISANAMENTO DELLE FACciate	STRUTTURAZIONE DI ACCOGLIENZA	OASI TABOR COMPLESSO DI ACCOGLIENZA IN NARDO' - CONTRADA CERANTE	OFFERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI E DEL PROPRIO E RISANAMENTO GENERALE	POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' PER GIOVANI AL CENTRO NUDO DELLE AULE DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE A VARELINO OVESTI DA DESTINARE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL FLUSSO DEI PELLEGRINI	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE BISSAL	RECUPERO PER L'UTILIZZO DELLE AREE LIBERE E DEGLI EDIFICI DA RISTRUTTURARE DELL'EX MACELLO ZONA FILIPPINI - I LOTTO	Titolo intervento
MONASTERO BENEDETTINE SS. PIETRO E PAOLO	COMUNE DI CODOGNO	PARROCCHIA DI S. LORENZO MANDIGIONE	SEMINARIO ARCIVESCOVILE E DI SIENA	DIOCESI DI NARDO' GALIPOOLI	ARCIDIOCESI BRESOLINI OSTUNI	COMUNITA' BENEDETTINA MONTEVERGINE	COMUNE DI MEROGLIANO	COMUNE DI AQUILEIA	COMUNE DI VERONA	Soggetto beneficiario
2.471.717.000	1.099.000.000	962.000.000	4.319.752.000	2.608.000.000	2.002.000.000	1.074.000.000	225.000.000	1.564.000.000	2.038.000.000	Costo Stimato
1.381.717.000	1.099.000.000	864.000.000	3.002.752.000	2.000.000.000	1.352.000.000	1.074.000.000	225.000.000	1.554.000.000	2.038.000.000	Finanziamento attribuito
1.090.000.000	0	298.000.000	1.317.000.000	608.000.000	650.000.000	0	0	10.000.000	0	Altre fonti
0	114.000.000	0	316.900.000	0	0	0	22.500.000	159.000.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	114.000.000	0	316.900.000	0	0	0	22.500.000	159.000.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.203.333.057	1.004.142.881	664.000.000	2.222.851.096	1.996.866.123	1.346.352.050	1.065.602.682	0	1.380.600.072	2.007.996.758	Impegni di spesa
601.666.530	502.071.440	332.000.000	1.111.425.548	998.433.060	673.176.020	532.801.340	0	690.300.040	1.003.998.880	Lavori acconto 50%
481.333.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4950	4949	4943	4924	4910	4899	4897	4892	489	4884	Protocollo
Salerno	Venezia	Vallera	Lecco	Cagliari	Montebio Caccia	Rimini	Genova	Pisa	Saludico	Comune localizzazione
RESTAURO ED AMPLIAMENTO DEL MUSEO DI SAN PIO X	ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI	RESTAURO BASTIONE MEDICEO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI AREE DI SOSTA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA	RESTAURO DEL MONASTERO DELLE BENEDETTINE CON ANNESSA CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA DA DESTINARE AD USO RICETTIVO	SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI	RECUPERO DELLA FORESTERIA DEL SANTUARIO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. FORTUNATO	RIPISTINO DI EDIFICIO NEL CAMP. ESSO DI ONFERNO	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSIANO. INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RIGETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO FUNZIONALE	Titolo intervento
PARRROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO AP.	PARRROCCHIA S. CRISTOFORO	COMUNE DI VOLTERRA	MONASTERO DELLE BENEDETTINE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI	DIOCESI DI RIMINI	PARRROCCHIA DI SAN FORTUNATO	COMUNE DI GENOVA	COMUNE DI PISA	COMUNE DI SALUDICO	Soggetto beneficiario
539.517.000	236.000.000	372.000.000	3.398.408.000	3.890.000.000	1.470.000.000	1.221.000.000	752.000.000	8.860.256.000	390.000.000	Costo Stimato
429.517.000	206.000.000	222.000.000	2.848.408.000	3.200.000.000	1.470.000.000	915.000.000	752.000.000	6.660.256.000	390.000.000	Finanziamento attribuito
110.000.000	30.000.000	150.000.000	550.000.000	690.000.000	0	306.000.000	0	3.200.000.000	0	Altre fonti
0	0	0	0	320.000.000	147.000.000	0	75.200.000	0	39.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	320.000.000	147.000.000	0	75.200.000	0	39.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
324.516.400	206.000.000	214.002.929	2.848.407.508	0	1.234.035.854	907.436.673	642.227.994	4.549.090.948	317.768.509	Impegni di spesa
162.258.200	103.000.000	107.001.465	1.424.203.750	0	617.017.930	453.718.335	321.114.000	2.274.545.470	158.884.255	Lavori acconto 50%
129.806.560	0	0	0	0	0	0	0	0	127.107.400	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5000	4998	4995	4994	4990	4989	4978	4973	4961	4955	Protocollo
Santh'angelo Di Torno	Albenga	Albenga	Albenga	Verona	Catolico	Genova	Patti	Pavese	Oruni	Comune localizzazione
OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACHA DI SAN MICHELE	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI ALBENGA	CONCLUSIONE DEL RESTAURO DEI MURATI E DELL'ABBAZIA DI BARBIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI SAN MICHELE E RECUPERO DELLA PIAZZETTA DELL'ENNI PROSPICIENTE L'ABBAZIA	ADATTABILITA' E RISTRUTTURAZIONE LOCALI DELLA FORESTERIA DELL'EREMO	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO	OPERE DI MODIFICHE INTERNE AL FABBRICATO DETTO SEMINARIO VESCOVILE	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SACRA FAMIGLIA DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI E RICETTIVA A BASSO COSTO	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO	RESTAURO CONSOLIDAMENTO RISTORO DEL SEMINARIO DI S. GONZIO E DELLA MANSIURA ESTIVA SEMINARIO PER FINI RICETTIVE	Titolo intervento
PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	SEM VESCOVILE E DI ALBENGA IMPERIA	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	PARROCCHIA S. TOMMASO APOSTOLO	COMUNE DI CASTELFONTE TINO	SEMINARIO VESCOVILE	DIOCESI DI PATTI	COMUNE DI PIETRELLINA	ENTE SEMINARIO VESCOVILE	Soggetto beneficiario
3.250.000.000	1.248.216.000	338.438.000	867.408.000	270.000.000	2.496.000.000	565.900.000	4.296.922.000	6.212.680.000	2.175.000.000	Costo Stimato
3.200.000.000	1.148.216.000	298.438.000	707.408.000	200.000.000	2.196.000.000	490.900.000	4.246.922.000	6.212.680.000	2.175.000.000	Finanziamento attribuito
50.000.000	100.000.000	40.000.000	160.000.000	70.000.000	300.000.000	75.000.000	50.000.000	0	0	Altre fonti
270.000.000	0	0	0	0	0	0	440.000.000	780.000.000	219.600.000	O.N.T. Impegni di spesa
270.000.000	0	0	0	0	0	0	440.000.000	780.000.000	219.600.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	1.148.216.000	298.438.400	707.408.000	177.666.189	1.918.031.395	440.900.000	2.961.541.414	4.941.165.155	1.954.440.800	Impegni di spesa
0	574.108.000	149.219.200	353.704.000	88.833.090	959.015.695	220.450.000	1.480.770.710	2.470.582.080	977.220.400	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5063	5055	5054	5052	5050	5046	5042	5039	5038	5036	Protocollo
Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Balbo	Balbo	Bologna	Bologna	Bologna	Comune localizzazione
RESTAURO DELLA TORRE CAMPANARA DELLA CHIESA DEL CIORE MARCOLATO DI MANTUA DI MONTE ALFEO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO	RECUPERO DI EDIFICIO MUNICIPALE PERI UFFICI E MUSEO DI ARTE SACRA	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. GIACOMO DI BERTONE	CENTRO DI ACCOGLIENZA LE GNAZIE	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA CANONICA DI MEZZANO	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	ALBERGO POPOLARE VIA DEL PALLONE	EX SCUOLA ADA NEGRI	Titolo intervento
PARROCCHIA DI BARCHI	CHIESA DI S. MARZIANO DI OTTONE	COMUNE DI OTTONE	CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	CHIESA DI S. ANDREA DI BARCHI	PARROCCHIA DEL DUOMO	PARROCCHIA S. PAOLO	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	Soggetto beneficiario
170.347.000	276.883.000	800.000.000	350.000.000	127.000.000	200.000.000	483.000.000	1.190.680.000	3.000.000.000	3.082.160.000	Costo Stimato
110.347.000	176.883.000	720.000.000	350.000.000	83.000.000	130.000.000	439.000.000	246.680.000	1.500.000.000	2.282.160.000	Finanziamento attribuito
60.000.000	100.000.000	80.000.000	0	44.000.000	70.000.000	44.000.000	944.000.000	1.500.000.000	800.000.000	Altre fonti
0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
110.346.720	176.882.800	677.744.526	281.868.132	76.354.800	103.260.000	414.235.935	246.655.780	1.499.970.200	1.982.156.750	Impegni di spesa
55.173.360	88.441.400	338.872.260	140.934.070	38.177.400	51.630.000	207.117.970	123.327.890	749.985.100	991.078.370	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5215	5214	5200	5146	5106	5103	5094	5091	5083	507	Protocollo
Genova	Genova	Catania	Milano	Macerchio	Venezia	Aquila	Aquila	Catania	Averza	Comune localizzazione
RESTAURO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI PHE	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CROSTO DI SAN LORENZO	PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE ED ALTESTIMENTO	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PIAZZA DUOMO E AREE ADIACENTI	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SALA DEL PELEGRINO E RELATIVI SERVIZI	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSONATO MARIA MAMMOCOLA A DONSOGRUO	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO E SFERIMENTO AUTOMATICO DELLA BASILICA	RESTAURO VALORIZZAZIONE E RIUSO DEL BATTISTERO CHIESA DEI PAGANI ANNESSI AL COMPLESSO DELLA BASILICA	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	Titolo intervento
SOPRINTENDENZA ZA B A A PER LA LIGURIA	SOPRINTENDENZA ZA B A A PER LA LIGURIA	CHIESA S. EUFEMIA CARINARO	COMUNE DI MILANO	DIOCESI DI MONTEVERONE	CASA PRIMARIA IN BRESCIO DELL'IST. DELLE F.D.C.	SOPRINTENDENZA ZA B A A A S. DEL FRUIV.G.	SOPRINTENDENZA ZA B A A A S. DEL FRUIV.G.	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	Soggetto beneficiario
1.847.000.000	3.429.000.000	1.600.000.000	16.952.000.000	147.000.000	16.807.000.000	2.185.000.000	650.000.000	4.699.475.000	6.684.000.000	Costo Stimato
1.247.000.000	3.179.000.000	1.600.000.000	7.876.000.000	147.000.000	3.687.000.000	1.645.000.000	650.000.000	2.199.475.000	5.984.000.000	Finanziamento attribuito
600.000.000	250.000.000	0	9.076.000.000	0	13.120.000.000	540.000.000	0	2.500.000.000	700.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	0	1.378.224.112	4.435.000.000	145.500.000	1.723.759.468	0	0	2.199.475.000	5.984.369.440	Impegni di spesa
0	0	689.112.060	2.217.500.000	72.750.000	861.879.730	0	0	1.099.737.500	2.992.184.720	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
989.000.000	2.864.000.000	0	0	0	0	1.645.000.000	650.000.000	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5322/D	5322/B	5322/A	5321	5311	5301	5257	5256	5229	5219	Protocollo
Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Reggio	Saracena	Giussano	Giussano	San Marino	Napoli	Comune localizzazione
CATTEDRALE DI SPIRITO A BOLOGNA - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA - IV LOTTO	CATTEDRALE DI SPIRITO A BOLOGNA - MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE - II LOTTO	CATTEDRALE DI SPIRITO A BOLOGNA - SPERIMENTI DELLE PARTI ARCHITETTONICHE - I LOTTO	CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DELL'OPATORIO E DELL'OCALU DELL'EX OSPEDALE DI SANNA DELLA VITA CREAZIONE DEL MUSEO DELLA SANITA' CITTADINA E DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA CHIESA DI BOLOGNA	MANTENIMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DELL'OPATORIO E DELL'OCALU DELL'EX OSPEDALE DI SANNA DELLA VITA CREAZIONE DEL MUSEO DELLA SANITA' CITTADINA E DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA CHIESA DI BOLOGNA	ABBAZIA DI VALLOMBROSA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E PROTEZIONE DALE SCARICHE ELETTRICHE ATMOSFERICHE	AREA DI SOSTA PER AUTOBUS ED AUTOVETTURE SERVIZI IGIENICI UFFICIO ACCOGLIENZA	ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RISOZO DELLO SCOPPIO DI MONTENAPOLI RIELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO	Titolo intervento
CATTEDRALE METROP. DI SPIRITO	CATTEDRALE METROP. DI SPIRITO	CATTEDRALE METROP. DI SPIRITO	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	SOPRINTENDENZA ZABANA DI FIRENZE	SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI MONDELINFIA	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI MONDELINFIA	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	DIOCESI DI NAPOLI	Soggetto beneficiario
2.267.000.000	1.877.000.000	1.972.000.000	4.649.000.000	3.141.000.000	4.746.300.000	439.000.000	633.000.000	520.257.000	9.203.000.000	Costo Stimato
2.087.000.000	1.761.000.000	1.792.000.000	3.448.000.000	2.941.000.000	4.596.300.000	307.000.000	443.000.000	309.257.000	8.203.000.000	Finanziamento attribuito
180.000.000	116.000.000	180.000.000	1.501.000.000	200.000.000	150.000.000	132.000.000	190.000.000	211.000.000	1.000.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	429.600.000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	429.600.000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.646.728.457	1.271.544.454	1.780.651.150	3.347.329.212	0	4.166.628.390	280.860.000	442.920.472	309.256.335	7.598.546.360	Impegni di spesa
823.364.230	635.772.230	890.325.595	1.673.664.610	0	2.083.314.190	140.430.000	221.460.240	154.628.170	3.799.273.180	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	1.666.651.355	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	2.941.000.000	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Stimazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5349	5343	5342	5340	5335	5333	5331	5330	5326	5324	Protocollo
Fidenza	Compiano	Fontanello	Berceto	Medesano	Parma	Foronovo Di Taro	Parma	Parma	Pellegrino Parmense	Comune localizzazione
MUSEO DEL DUOMO DI FIDENZA	FORESTIERIA DEL CASTELLO A BASSO COSTO E SERVIZI CATEGORIA LVF	RECUPERO DI PARTE DI BOCCA SANITALE A MUSEO DI BIRCOVA DI FONTE SANITALE FONDAZIONE E DELL'ESISTENTE MUSEO ROCCA SANITALE	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE SEMINARIO VESCOVILE	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICETTIVITA' POVERA IN TERRITORIO PARMAENSE	FORESTIERIA DEL CENTRO CIVICO CINGHIO	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX FORO BOARIO	OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA', ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FINANZIARIO DELLA CHIESA	RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E PASSEGIA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ANTIKO ENFICIO CONVENTUALE	Titolo intervento
ENTE DIOCESI DI FIDENZA	COMUNE DI COMPIANO	COMUNE DI FONTANELLO	SEMINARIO VESCOVILE DI PARMA	PARRROCCHIA DI SAN PAIALEONE	COMUNE DI PARMA	COMUNE DI FORONOVO TARO	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	DIOCESI DI PARMA	COMUNE DI PELLEGRINO PARMAENSE	Soggetto beneficiario
991.678.000	2.352.000.000	1.031.000.000	1.237.000.000	1.407.000.000	401.000.000	3.277.000.000	3.174.457.000	2.470.868.000	2.106.520.000	Costo Stimato
991.678.000	1.002.000.000	781.000.000	1.157.000.000	832.000.000	263.000.000	2.294.000.000	2.634.457.000	1.010.868.000	1.496.520.000	Finanziamento attribuito
0	1.350.000.000	250.000.000	80.000.000	575.000.000	138.000.000	983.000.000	540.000.000	1.460.000.000	610.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
991.677.812	596.872.122	756.075.000	1.048.426.096	600.000.000	232.279.000	1.907.454.149	2.634.457.000	1.010.868.000	1.212.290.400	Impegni di spesa
495.838.905	298.436.060	378.037.500	524.213.050	300.000.000	116.139.500	953.727.070	1.317.228.500	505.434.000	606.145.200	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Simulazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5488	5487	5486	5485	5484	5451	5405	5400/B	5400/A	5375	Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
Trieste	Trieste	Trieste	Trieste	Trieste	Bari	Vico Venezia	Bari	Bari	Imperia in Val D'Ario																			
CASA RELIGIOSA ORATORIO S. SALESIANO RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZI INTERNI CON AUMENTO DELLA RICETTIVITA'	ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CONVITTO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COLE DI MADRGA VECCHIA E DEL SUO SANTUARIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	LOCALI DI ACCOGLIENZA PER RISTORO CON AMMESSI SERVIZI IMPIANTISTICI E PERCORSI ATTEZZATI INTERNI ED ESTERNI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER DISABILI	RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELL'ABAZIA DI S. MARIA DI BANZI	ACCORDIENZA PER EDIFICI ANCHE DISABILI	REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E SALA DI LETTURA, ESECUZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO ED ADEGUAMENTO PERCORSI DISABILI - II LOTTO	OPERE DI RESTAURO, EPIRCI MONUMENTALI, CHIOSTRO RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO - I LOTTO	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO INTERNAZIONALE E DI STUDI ED ESPERIENZE SOCIALI DI LOPPIANO ALLOGGI CASLETTE	OPERA S. MARIA ASSUNTA	OPERA S. MARIA ASSUNTA	OPERA S. MARIA ASSUNTA	OPERA S. MARIA ASSUNTA	625.000.000	495.000.000	130.000.000	0	0	484.304.000	242.152.000	0	0	0	0	0	0	0	
OPATORIO S. G. BOSCO INTERNO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZI INTERNI CON AUMENTO DELLA RICETTIVITA'	OPERA SAN GIUSEPPE	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	PARROCCHIA MARIA MADRE E REGINA	COMUNE DI BANZI	PROV. CALABRIA PRAZI CAPUCCINI	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	ASSOCIAZIONE OPERA S. MARIA ASSUNTA	OPERA S. MARIA ASSUNTA	OPERA S. MARIA ASSUNTA	OPERA S. MARIA ASSUNTA	OPERA S. MARIA ASSUNTA	76.000.000	76.000.000	0	7.600.000	7.600.000	60.895.490	30.447.740	24.358.195	0	0	0	0	0	0	
														1.073.000.000	732.000.000	341.000.000	0	0	723.449.329	361.724.619	0	0	0	0	0	0	0	
														702.000.000	702.000.000	0	70.200.000	70.200.000	582.080.684	291.040.340	0	0	0	0	0	0	0	
														1.382.000.000	1.382.000.000	0	145.000.000	145.000.000	1.229.460.800	614.730.400	0	0	0	0	0	0	0	
														1.907.000.000	1.207.000.000	700.000.000	0	0	1.065.418.705	532.709.350	0	0	0	0	0	0	0	
														3.211.434.000	2.911.434.000	300.000.000	0	0	2.911.440.000	1.455.720.000	1.164.576.000	0	0	0	0	0	0	
														780.000.000	658.000.000	122.000.000	0	0	600.473.687	300.236.690	0	0	0	0	0	0	0	
														2.314.000.000	2.314.000.000	0	0	2.172.611.154	1.086.305.580	0	0	0	0	0	0	0		
														572.000.000	272.000.000	300.000.000	0	0	272.000.000	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0	

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5530	5523	5514	5512	5502	5498	5497	5493	5492	5489	Protocollo
Misoglia	Momiano Al Mare	Sepino	Sepino	Omero	Casina	Pedova	Trieste	Trieste	Trieste	Comune localizzazione
AMMODERNAMENTO DELLA FORESTERIA DI MONTEVERGINE CON I RELATIVI SERVIZI ED IL PRELIDIO MEDICO	RESTAURIO CONSERVATIVO DEI CONVENTI DEI CAPPUCCINI PER UNA RISTRUTTURAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA SANTO STEFANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE ESPOSITIVA E PRIMA ACCOGLIENZA	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ACCOGLIENZA	ESPERIENZA FRANCESE NEL GIULIERO	RECUPERO DEL COMPLESSO DI SARZANO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' E DELLA ACCOGLIENZA TURISTICA E CANONICA DELLA EX CHIESA PARROCCHIALE	RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI SCATERINA	FORESTERIA PER I PELLEGRINI	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	Titolo intervento
DIOCESI DI MONTEVERGINE	PROV. GENOVA - FRAZIONI MINORI CAPPUCCINI	COMUNE DI SEPINO	COMUNE DI SEPINO	FAMIGLIA DEI DISCEROLI IST. REL.	COMUNE DI CASINA	IRPEA IST. RIUN. PADOVANI DI EDUCAZIONE	COMUNE DI TRIESTE	COMUNE DI TRIESTE	CASA FAMIGLIA DELLA GIOVANE MATER DEI	Soggetto beneficiario
632.000.000	1.759.470.000	1.054.601.000	1.169.000.000	3.606.000.000	560.000.000	3.750.000.000	1.620.000.000	850.000.000	308.000.000	Costo Stimato
632.000.000	1.280.470.000	1.054.601.000	1.169.000.000	2.972.000.000	218.000.000	2.000.000.000	1.620.000.000	730.000.000	308.000.000	Finanziamento attribuito
0	479.000.000	0	0	634.000.000	342.000.000	1.750.000.000	0	120.000.000	0	Altre fonti
0	0	109.600.000	116.900.000	0	0	0	180.000.000	0	30.800.000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	109.600.000	116.900.000	0	0	0	180.000.000	0	30.800.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
627.048.232	1.067.968.661	735.000.013	0	2.066.478.000	212.750.000	1.610.085.180	1.437.971.227	629.315.182	256.506.292	Impegni di spesa
313.524.115	533.984.330	367.500.005	0	1.033.239.000	106.875.000	805.042.590	718.985.615	314.657.590	128.253.150	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5753	5748/B	5748/A	5721	5718	5688	5673	566	566	5656	Protocollo
Genova	Catanzaro	Catanzaro	Lauria	Venezia	Aulla	Bagno a Ripoli	Mariano	Mariano	La Spezia	Comune localizzazione
OPERAZIONE DI SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE A BASSO COSTO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DELLA COMANDA DI PIRE	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE COMPLESSO C.D. VILLAGGIO MARINA - OPERE CIVILI ED INFRASTRUTTURICHE	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE COMPLESSO C.D. VILLAGGIO MARINA - VANTAGGI DI ACCESSO E SERVIZI - OPERE DI CONSOLIDAMENTO	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA NATIA DEL BEATO DOMENICO LENTINI E DELLA CASA DEL PELLEGRINO	INSTITUZIONE E ADEGUAMENTO DI UNO SPAZIO COMPRENSIVO ALLA LOCALITÀ DI MONTANA E ADATTAMENTO DI UNO SPAZIO PER LA MENSA CUCINALE, DISPENSA E LOCALI LAVABO - PRESSIONE SERVIZI PER ASSISTENZA IGIENICA E SANITARIA - ADEGUAMENTO SALE DI INCONTRO ED.	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA SOTTILEZZA DELLA BRINNELLA	OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURATA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME DEL MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME DEL MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	IL MONASTERO DEL TERZO MILLENNIO E L'OSPITALITÀ BENEDETTINA	Titolo intervento
GRAN PRIORALE DI GENOVA E LIG	ARCHIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOMANO	ARCHIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOMANO	COMUNITA' MONTANA LAGONE GRESE	PROV. VENEZIA FRAZIONORI CARPICIONI	COMUNE DI AULLA	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	MONASTERO S. MARIA DEL MARÈ	Soggetto beneficiario
933.000.000	2.663.000.000	1.623.000.000	1.241.260.000	1.100.000.000	612.600.000	1.447.000.000	871.790.000	871.790.000	11.196.000.000	Costo Stimato
933.000.000	2.663.000.000	1.623.000.000	1.241.260.000	600.000.000	462.600.000	815.000.000	871.750.000	871.790.000	7.291.000.000	Finanziamento attribuito
0	0	0	0	500.000.000	150.000.000	632.000.000	0	0	3.905.000.000	Altre fonti
33.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
33.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
657.457.983	2.557.517.975	1.547.332.100	1.141.259.211	597.270.900	461.941.440	814.612.646	18.270.000	856.566.259	7.066.265.517	Impegni di spesa
328.728.940	1.278.758.985	773.666.050	570.629.605	298.635.450	230.970.720	407.306.320	0	428.283.130	3.533.132.750	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	342.626.500	2.826.506.210	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	18.270.000	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria in dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5868	5853	5848	5806	5797	5793	579	5768	5764	5763	Protocollo
Bagno Di Romagna	Comiglio	Recanati	Macerogno	Bologna	Giungine	Teggo Di Calabria	Marone	Montelice	Savona	Comune localizzazione
RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALA NORD DEL CASTELLO DI CORNIGLIO E RECUPERO FUNZIONALE PER INCETTIVA A BASSO COSTO	CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. M. LA NOVA ED ANNESSO CONVENTO	ACCOGLIENZA PRESSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE POTENZIAMENTO DELL'OSPIZIO VECCHIO	LAVORI DI RESTAURO E DI CONSOLIDAMENTO DEL PORTICO DI S. LUCA	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA AL FIANCO DELL'ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO OPERA ANTONIOMANDELLE CALABRILE	OSTELLO S. GIACOMO	CENTRO DI OSPITALITA' PER I PELLEGRINI	CENTRO DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE	Titolo intervento
IST. CLARISSE SACRAMENTO	COMUNE DI CORNIGLIO	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARITIME	COMUNITA' BENEDETTINA DI MONTEVERGINE	SOPRINTENDENZA S. B. A. DI BOLOGNA	PROV. S. FRANCESCO DI PAOLA	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	PROV. FRATI MINORI S. FRANCESCO	COMUNE DI MONSELICE	SEMINARIO VESCOVILE DI SAVONA	Soggetto beneficiario
1.488.000.000	940.238.000	1.687.021.000	466.000.000	5.000.000.000	2.167.000.000	6.968.059.000	280.000.000	5.500.000.000	961.000.000	Costo Stimato
1.288.000.000	940.238.000	1.687.021.000	466.000.000	5.000.000.000	1.967.000.000	6.188.059.000	250.000.000	3.850.000.000	681.000.000	Finanziamento attribuito
200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	780.000.000	30.000.000	1.650.000.000	280.000.000	Altre fonti
0	0	0	46.600.000	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	46.600.000	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.287.260.000	840.237.503	1.687.020.944	405.402.313	0	1.357.000.000	6.188.059.237	221.641.395	3.399.686.310	627.485.168	Impegni di spesa
643.630.000	420.118.750	843.510.470	202.701.155	0	678.500.000	3.094.029.620	110.820.700	1.699.843.150	313.742.580	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	542.800.000	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5963	5954	5951	5950	590	5885	5873	5869/C	5869/B	5869/A	Protocollo
Nocera	Brescia	Brescia	Bergamo	Catania	Isola	Napoli	Catania	Catania	Catania	Comune localizzazione
RESTAURO DELLA ROCCA E PARCO DELLA ROCCA DI NOCETO	RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICIE ESTERNE ED INTERNE DELLA CHIESA CATTEDRALE	SISTEMAZIONE AREA AL VETERANO DEL CENTRO STORICO SPANIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN CENTRO STORICO	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI EDIFICIO "CASA DELLA GIOVANE"	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO ALI MATERNE PER ADIBIRLO AD OPERE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	SISTEMA A CARTELLA MESSAGGIO VARIABILE	RIQUALIFICAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA AL RICETTIVITA' DEI PELEGRINI NELLA NAPOLI SACRA	AUDITORIUM, PIAZZE E SOSTA AUTOMILEZZI	OSPIZIO VECCHIO - ACCOGLIENZA PELEGRINI	OSPIZIO NUOVO - ACCOGLIENZA PELEGRINI E SERVIZI	Titolo intervento
COMUNE DI NOCETO	CATTEDRALE DI BRESCIA	FOND CENTRO PASTORALE PAOLO VI	DIOCESI DI BERGAMO	DIOCESI DI OPPIDO - PALMI	COMUNE DI JESOLO	ISTITUTO FERDINANDI E GIOVANNI BOSCO CASA DELLO ST	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	Soggetto beneficiario
570.000.000	2.595.000.000	300.000.000	3.583.541.000	4.317.930.000	193.070.000	3.205.000.000	2.456.000.000	1.535.000.000	6.241.000.000	Costo Stimato
320.000.000	425.000.000	150.000.000	2.583.541.000	4.167.930.000	143.070.000	2.421.000.000	1.681.000.000	1.050.000.000	4.270.000.000	Finanziamento attribuito
250.000.000	2.170.000.000	150.000.000	1.000.000.000	150.000.000	50.000.000	784.000.000	775.000.000	485.000.000	1.971.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
296.920.466	425.000.000	149.975.304	2.537.844.240	3.284.036.961	141.842.944	2.420.703.208	1.419.660.837	874.882.734	3.305.528.553	Impegni di spesa
148.460.230	212.500.000	0	1.268.922.120	1.642.018.480	70.921.470	1.210.351.600	709.830.420	437.441.365	1.652.764.280	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	149.975.300	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6104/B	6092	6012	6003	599	5987	5980	5976	5972	5964	Protocollo
Palermitana	Caravaggio	Matera	Pontremoli	Matera	Bologna	Bologna	Torino	Fidenza	Fontero	Comune localizzazione
RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIRASANTA. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DUOMO.	RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL SANTUARIO	ITINERARIO DEGLI HABITAT RUPESTRI CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI DI MATERA	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE FORESTIERIA CASTELLO DEL PIACIANO	CASA DEL PELLEGRINO FORESTIERA OSTELLO DELLE MONACHELLE	RESTAURO CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CERCHIO DI S. VITTORE AD USO DI ACCOGLIENZA NOSTRO E LORO DI CALTO	RESTAURO DELL'ORGANO STORICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA	RESTAURO DELLA PIEVE DI BARDONE E RECUPERO A FINI MUSEALI DI LOCALI ACCESSORI	RESTAURO DELLA CASA CREMONANI E DELLA PIRRE MEDICI E LA PORTA DELLA VIA MEDICI DELLA PROVINCIA DI PARMA	RESTAURO DELL'EX COLLEGGIO MARIA LUDVIG ABBAZIA CISTERCIENSE CON REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PICETTINA A BASSO COSTO	TITOLO INTERVENTO
PARROCCHIA S. MARTINO	COMUNE DI CARAVAGGIO	ARCIDIOCESI DI MATERA IRISMA	COMUNE DI PONTREMOLI	I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	CONGREGAZIONE ORATORIO DI S. FILIPPO NERI	PARROCCHIA S. MARIA DELLA PIETA	PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA	COMUNE DI FIDENZA	COMUNE DI FONTERO PARMA	Soggetto beneficiario
2.666.000.000	3.075.000.000	8.387.340.000	666.000.000	4.441.651.000	3.670.000.000	150.000.000	1.282.000.000	690.000.000	2.683.070.000	Costo Stimato
1.981.000.000	2.075.000.000	2.887.340.000	531.000.000	3.496.651.000	3.670.000.000	100.000.000	977.000.000	690.000.000	2.505.070.000	Finanziamento attribuito
685.000.000	1.000.000.000	5.500.000.000	135.000.000	945.000.000	0	50.000.000	305.000.000	0	178.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	411.400.000	418.600.000	0	77.700.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	411.400.000	418.600.000	0	77.700.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.966.819.999	1.774.875.850	2.845.000.000	482.950.840	2.515.251.915	3.013.984.649	100.000.000	0	675.330.956	2.383.666.667	Impegni di spesa
983.410.000	887.437.925	1.422.500.000	241.475.420	1.257.625.960	1.506.992.320	50.000.000	0	337.665.480	1.191.833.330	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	1.006.100.766	0	0	0	270.132.380	953.466.670	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV - 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6173	616	6159	6156	6153	6122	6121	611	6109	6104/C	Protocollo
Santa Sole	Messina	Pavia	Mantova	Lodi Vecchio	Firenze	Firenze	Firenze	Paola	Pesersana	Comune localizzazione
COMPLETAMENTO DI STRUTTURAZIONE TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RINNOVO DELLE DIPENDENZE DI PALAZZO GRANDI	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURAZIONE ALTA PROVINCIA NEL DIOCESI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'ORIONE DI DON ORIONE	CONSERVAZIONE, RESTAURO E ADEGUAMENTO AD USO LITURGICO CULTURALE DELLA CHIESA DI S. LUCA A PAVIA	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'ABBATTEGGIO STORICO E LA COPERTURA ACCOGLIENZA LA MANTOVA CENTRALE E LA CURIA L'ABSIDE ED I TRANSEPTI	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	BASILICA DI S. CROCE IN FIRENZE: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA	RISTRUTTURAZIONE RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL SANTUARIO DI S. FRANCESCO DI PAOLA AI FINI DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA RESTAURO DI AFFRESCHI	Titolo intervento
COMUNE DI SANTA SOFIA	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	PARROCCHIA S. PRIMO E FELICIANO	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	BASILICA DEI XII APOSTOLI	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	FONDO EDIFICI DI CULTO	PROV. DI S. PAOLA DEI MINIMI	PARROCCHIA S. MARTINO	Soggetto beneficiario
2.143.077.000	7.963.532.000	2.133.000.000	2.100.000.000	120.000.000	4.013.000.000	5.000.000.000	5.860.274.727	7.851.600.000	547.000.000	Costo Stimato
762.077.000	7.118.532.000	1.248.000.000	1.890.000.000	80.000.000	3.336.000.000	4.450.000.000	5.260.274.727	6.351.600.000	547.000.000	Finanziamento attribuito
1.381.000.000	845.000.000	885.000.000	210.000.000	40.000.000	677.000.000	550.000.000	600.000.000	1.500.000.000	0	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
467.076.580	6.968.532.000	1.240.991.753	1.782.670.400	80.000.000	2.888.013.748	4.252.674.814	0	6.351.600.000	543.793.611	Impegni di spesa
233.538.290	3.184.266.000	620.495.875	891.335.200	40.000.000	1.444.006.874	2.126.337.410	0	3.175.800.000	271.896.805	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	2.540.640.000	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uff. tecnici
0	0	0	0	0	0	0	4.598.000.000	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6230	6229	6227	6222	6220	6219	6201	6193	6192	6191	Protocollo
Cesena	Chioggia	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	Carpi	Pisa	Pisa	Pisa	Comune localizzazione
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA RISTORAZIONE	MUSEO DI ARTE SACRA PALAZZO VESCOVILE CHIOGGIA	CHIESA DI S. MARIA NOVELLA INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E PULITURA DEGLI INTERNI SUPERFICI INTONACATE COLONNE E ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI ED INFRISI	SECOLARETTICA E ARREDO GIUBBARE E DEI PERCORSI SPECIALI	VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI	CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE	SISTEMAZIONE URBANISTICA ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA DELLA PIAZZA VESCOVADO	SEMINARIO VESCOVILE DI PISTOIA RECUPERO DELLA FORESTERIA COME RESIDENZA A BASSO COSTO TRAMITE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE DI VILLA HOSPITALI	RESTAURO DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DELLA CATTEDRALE	Titolo intervento
MONASTERO DI S. MARIA DEL MONTE	ENTE DIOCESI DI CHIOGGIA	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI CARPI	SEMINARIO VESCOVILE LEONIANO DI PISTOIA	DIOCESI DI PISTOIA	CATTEDRALE DIOCESI DI PISTOIA	Soggetto beneficiario
1.515.000.000	3.500.000.000	4.291.000.000	1.500.000.000	946.000.000	1.386.000.000	3.580.000.000	775.521.000	824.000.000	880.696.000	Costo Stimato
1.515.000.000	3.109.000.000	3.175.000.000	1.335.000.000	544.000.000	1.160.000.000	1.580.000.000	475.521.000	432.000.000	680.696.000	Finanziamento attribuito
0	391.000.000	1.116.000.000	165.000.000	402.000.000	226.000.000	2.000.000.000	300.000.000	392.000.000	200.000.000	Altre fonti
153.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
153.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.310.881.977	3.085.926.400	2.908.184.000	977.741.833	543.606.000	1.049.581.150	1.543.677.000	395.520.300	431.613.835	652.900.000	Impegni di spesa
655.440.988	1.542.963.200	1.454.092.000	488.870.920	271.803.000	524.790.575	771.838.500	197.760.150	215.806.915	326.450.000	Lavori acconto 50%
524.352.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.A.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6279	6274	6272	625	6246	6245	6240	6239	6233	6231	Protocollo
Bioasz	Ainudi	Padova	Leondara	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Crema	Crema	Comune localizzazione
RECUPERO DEL FABBRICATO LA BAYISE AD USO OSTELLO	CASA PATRIOTICHALE DI ACCOGLIENZA	CENTRO PER IL RECUPERO SOCIO EDUCATIVO DEI CIECHI L'UMMINORATI	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI LENDINARA	RIQUALIFICAZIONE LOCALI CONVENTO SAN DOMENICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI	RIQUALIFICAZIONE LOCALI CONVENTO SAN DOMENICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI	VILLA GIUSTAVILLANI UNA RESIDENZA RINASCIMENTALE IMMERSA NEL VERDE COLTIVARE RESTITUIRE A NUOVA VITA GLI URBANI E DI ACCOGLIENZA	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL PELLEGRINO SANTUARIO S. MARIA DELLA CROCE	RESTAURIO FACCEATE DELLA BASILICA DI S. ABRONDIO	Titolo intervento
COMUNE DI BIONAZ	IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	IST. CONFRATELLI PERMINORATI	CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA	PREFETTURA DI BOLOGNA	PREFETTURA DI BOLOGNA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA	OPERA PIA DEI POVERI VERGONZOSI	PARROCCHIA DI S. MARIA AD INVERES	SEMINARIO VESCOVILE DI S. ABRONDIO	Soggetto beneficiario
2.094.912.000	1.575.000.000	4.350.917.000	2.177.000.000	350.000.000	365.000.000	14.898.000.000	2.873.000.000	2.116.000.000	1.218.000.000	Costo Stimato
1.461.912.000	1.000.000.000	3.150.917.000	1.627.000.000	350.000.000	365.000.000	4.898.000.000	748.000.000	1.516.000.000	568.000.000	Finanziamento attribuito
633.000.000	575.000.000	1.200.000.000	550.000.000	0	0	10.000.000.000	2.125.000.000	600.000.000	650.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.212.516.445	929.000.000	3.010.916.760	1.461.997.000	0	0	815.839.934	622.185.117	1.475.808.980	567.378.145	Impegni di spesa
606.256.220	464.500.000	1.505.458.380	730.998.500	0	0	407.919.970	311.092.560	739.904.490	283.689.070	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6295	6294	6293	6292	6291	6290	6289	6288	6287	6283	Protocollo
Loeao	Loeao	Loeao	Loeao	Loeao	Loeao	Loeao	Loeao	Loeao	Loeao	Comune localizzazione
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E D'ISCRIZIONE DELL'AMBITO ESTERNO DELLA NAVATA CENTRALE DEI DESTINATI AD ATTIVITA' DI CULTO	COMPLETAMENTO DEI CONSOLIDAMENTI E RESTAURI DELLE FACCIATE DELLA CUPOLA	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA DELLE ABSIDI DELLA BASILICA	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CAMPIDANO DELLA BASILICA DELLA S. CASA	IMPIANTI TECNICI OGICI E DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DEL SOTTOTETTO DELLA BASILICA	BONIFICA VALONIZZAZIONE E RESTAURO DEGLI AMBIENTI DEL SOTTOTETTO E STRUTTURE PORTANTI DELLA COPERTURA	RECUPERO FUNZIONALE AMBIENTI DEL PALAZZO APOSTOLICO DESTINATI A MUSEO E SERVIZI PER L'ACQUILENZA	COMPLETAMENTO DEI RESTAURI E CONSOLIDAMENTI DELLE FACCIATE E COPERTURE NELLA ZONA ADIACENTE AL POMARANCIO AREA SERVIZI DEL CLENO FIANCESSANO	BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERATO DELLA ZONA ABSIDIALE CENTRALE DELLA BASILICA	RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI DESTINATI AD ACCOGLIENZA DEL POMARANCIO	Titolo intervento
SOPRINTENDEN ZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN ZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN ZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN ZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN ZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN ZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN ZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN ZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN ZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN ZA B.A.A. PER LE MARCHE	Soggetto beneficiario
1.150.000.000	750.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	800.000.000	1.000.000.000	2.850.000.000	1.200.000.000	1.900.000.000	1.150.000.000	Costo Stimato
1.150.000.000	750.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	800.000.000	1.000.000.000	2.850.000.000	1.200.000.000	1.900.000.000	1.150.000.000	Finanziamento attribuito
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
1.150.000.000	750.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	800.000.000	1.000.000.000	2.850.000.000	1.200.000.000	1.900.000.000	1.150.000.000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6325	6316	6314	6308	6302	6301	6300	6299	6297	6296	Protocollo
Levato	Cingoli	Foligno	Levato	Levato	Levato	Levato	Levato	Levato	Levato	Comune localizzazione
RESTAURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI NEI SOTTOTETTO DEL CORPO CENTRALE DEL PALAZZO ULTRICO DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ DI ACCORDIENZA E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SICUREZZA	ADDEGUAMENTO FUNZIONALE CONSOLIDAMENTO E RESTAURAZIONE DEL MONASTERO DI S. BENEDETTO AI FINI DELLA RICETTIVITÀ A BASSO COSTO	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE CONSOLIDAMENTO E RESTAURAZIONE AI FINI DELLA RICETTIVITÀ DI DUE PORZIONI ATTUALMENTE NON UTILIZZATE DEL MONASTERO DI S. ANNA	LAVORI DI RESTAURAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DELLE NAVATE DELLA BASILICA.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA ED OPERE DI FINITURA PITTORICA DEI PARAMENTI ALL'INTERNO DELLA BASILICA	LAVORI DI BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PRIMO SOTTOTETTO DELLA ZONA ABSIDIALE DESTINATA ALLA BASILICA DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ DI CULTO	LAVORI DI BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE E CONSOLIDAMENTO DEI FINESTRONI ISOPRATI SULLE ABSIDI DELLA BASILICA DELLA S.CASA DI LORETO	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA DEL POMANUNCIO SOTTOTETTO LIGNEO E COPERTURA E SUO RECUPERO FUNZIONALE.	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURAZIONE DEI FONDI DELLA COPOLA DELLA BASILICA DELLA S. CASA	BONIFICA VALORIZZAZIONE E RESTAURAZIONE DEGLI AMBIENTI DEL SOTTOTETTO E STRUTTURE PORTANTI DELLA COPERTURA DEGLI ABSIDI DELLA BASILICA	Titolo intervento
SOPRINTENDENZA ZABA PER LE MARCHE	ISTITUTAZIONE FRANCESCOANE	ISTITUTAZIONE FRANCESCOANE	SOPRINTENDENZA ZABA PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA ZABA PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA ZABA PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA ZABA PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA ZABA PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA ZABA PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA ZABA PER LE MARCHE	Soggetto beneficiario
1.900.000.000	4.387.000.000	3.566.000.000	1.200.000.000	750.000.000	1.900.000.000	1.200.000.000	1.150.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	Costo Stimato
1.900.000.000	4.167.000.000	3.388.000.000	1.200.000.000	750.000.000	1.900.000.000	1.200.000.000	1.150.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	Finanziamento attribuito
0	220.000.000	178.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Altre fonti
0	196.700.000	160.800.000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	196.700.000	160.800.000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	3.656.300.000	3.085.519.400	0	0	0	0	0	0	0	Impegni di spesa
0	1.828.150.000	1.542.759.700	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 50%
0	1.462.520.000	1.234.207.760	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
1.900.000.000	0	0	1.200.000.000	750.000.000	1.900.000.000	1.200.000.000	1.150.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6389	6376	6366	6352	6344	6337	6329	6328	6327	6326	Protocollo
Orvieto	Loreto	Parate	Assisi	Assisi	Assisi	Loreto	Loreto	Loreto	Loreto	Comune localizzazione
RECUPERO DEL CONVENTO DI SAN CRISPINO DA VITERBO IN ORVIETO ACCOGLIENZA POVERA	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F.	CONSOGLIAMENTO E RESTAURO SANTUARIO DI MONGIOVINO	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO MECCANIZZATO COMPOSTO DA TRATTI PEDONALI E COPPE DI ASCENSORI DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI	RIQUALIFICAZIONE DEGLI ITINERARI STORICI DI ACCESSO AD ASSISI	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITÀ FONTE SAN VETTURINO	COMPLETAMENTO DELLA PULITURA E CONSOLIDAMENTO DEGLI ELEMENTI DELLE FACCIATE ANTERIE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI BASE DELLA CUPOLA DELLA BASILICA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL E COPERTURE NELLA ZONA DEL POMABIANCO, DESTINATA AD ACCOGLIENZA AL SECONDO LIVELLO DEL PALAZZO APOSTOLICO	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI RESTAURI DELLE FACCIATE NELLA ZONA ABSIDALE DELLA BASILICA	LAVORI DI BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERNO DELLA ZONA ABSIDALE SINISTRA DELLA BASILICA DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ DI CULTO	Titolo intervento
PROV. ROMANA FRATI MINORI CAPPUCCINI	COMUNE DI LORETO	SOPRINTENDENZA Z.A.B.A.A.S. DELL'UMBRIA	COMUNE DI ASSISI	COMUNE DI ASSISI	COMUNE DI ASSISI	SOPRINTENDENZA Z.A.B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA Z.A.B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA Z.A.B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA Z.A.B.A.A. PER LE MARCHE	Soggetto beneficiario
800.000.000	5.074.000.000	4.322.000.000	1.944.000.000	1.282.000.000	839.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.100.000.000	2.250.000.000	Costo Stimato
800.000.000	5.074.000.000	4.322.000.000	1.944.000.000	1.282.000.000	839.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.100.000.000	2.250.000.000	Finanziamento attribuito
0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	194.400.000	128.200.000	83.900.000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	194.400.000	128.200.000	83.900.000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
703.856.000	4.349.409.574	0	0	949.418.547	0	0	0	0	0	Impegni di spesa
351.828.000	2.174.704.787	0	0	474.709.275	0	0	0	0	0	Lavori acconto 50%
281.542.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	3.600.000.000	0	0	0	1.000.000.000	1.200.000.000	1.100.000.000	2.250.000.000	Amministrazioni dello Stato

TAV.4 - Situazione Finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

647G	6453	6446	6442/C	6442/B	643	6424	642	6409/B	6390	Protocollo
San Venerzo	Asisi	Forino	Norcia	Norcia	Monteagote Al Miele	Macerata	Napoli	Norcia	Loreto	Comune localizzazione
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO ABITATO FIAZZ COLLELUONGO	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E LA CRESCITA DELLA STRUTTURA RICETTIVA CASA DI S. BRIGIDA	SISTEMAZIONE FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E DEL PIAZZALE ANTIANTE	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEL CENTRO STORICO - RINNOVAMENTO DEL CENTRO STORICO - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEL CENTRO STORICO - RINNOVAMENTO DEL CENTRO STORICO - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA	COMPLESSO MONUMENTALE E DEL SANTUARIO DI SOVORE PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER I FIANZIATI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI GIBRINI E ASSISTENZA PELLEGRINA CON RISTORAZIONE E RICETTIVA NOTTURNA CENTRO STUDI NICOMANO	DUOMO DI NAPOLI	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO (IV LOTTO)	RISTRUTTURAZIONE DEI TERZINI POBBLICI E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELLE ZONE DI SOSTA E RISTORO ED ALTRE ALLEGATI DI PIANO SISTEMATI PER L'ACCOGLIENZA	Titolo intervento
COMUNE DI SAN VENERZO	ORDINE DEL SS.MO SALVATORE DI S. BRIGIDA	CONFR. SS. SACRAMENTO	COMUNE DI NORCIA	COMUNE DI NORCIA	SANTUARIO DI S. DI SOVORE	SEM. MISS. DIOC. RIFORMATORI MATER	SOPRINTENDEN. ZABA DI NAPOLI E PROV	COMUNE DI NORCIA	COMUNE DI LORETO	Soggetto beneficiario
200.000.000	950.000.000	575.000.000	6.257.000.000	2.337.000.000	4.329.000.000	17.535.000.000	5.298.000.000	4.607.000.000	375.000.000	Costo Stimato
185.000.000	950.000.000	350.000.000	6.257.000.000	1.717.000.000	4.059.000.000	12.729.000.000	5.298.000.000	4.607.000.000	375.000.000	Finanziamento attribuito
15.000.000	0	225.000.000	0	620.000.000	270.000.000	4.806.000.000	0	0	0	Altre fonti
0	95.000.000	0	0	0	135.900.000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	95.000.000	0	0	0	135.900.000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
159.860.835	855.000.000	322.713.642	5.667.758.764	2.035.424.062	3.495.101.640	10.648.283.165	0	3.885.085.040	339.415.410	Impegni di spesa
0	427.500.000	161.356.820	2.833.879.390	1.017.712.030	1.747.550.800	5.324.141.580	0	1.942.542.000	169.707.705	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	4.259.313.270	0	0	0	Lavori acconto 90%
159.860.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	4.298.000.000	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6537	6528	6526	650	6498	6495	6490	6488	6481	6480	Protocollo
Passio	Genoa	Fabriano	Luca	Fabriano	Sassorosso	Serra De' Conti	Castellano	Monzello	Ascoli Piceno	Comune localizzazione
ACCOGLIENZA POVERA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DISMESSO DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE	CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA ED OSTELLO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO FUMI SEMALTE	CASA ALBERGO PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER TRASFORMAZIONE AL PUBBLICO DI INTERNI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI OSPITALITA' PER IL TURISMO E BARBIERE ARCHITETTONICHE	RESTAURO E RIUSO DELLA ABAZIA DI S. DIONISIO IN CAPRAL E (PS P. I.)	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RIUSO DEL PALAZZO DEGLI SCALZI	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA CHIESA DI SAN MICHELE	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'ABAZIA DI SAN BENEDETTO IN CASTELPLANNO PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN LAPIDE E REALIZZAZIONE DI PICCOLO CENTRO DI ACCOGLIENZA PERI PELLEGRINI	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO GENERALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO	Titolo intervento
SEMINARIO VESCOVILE	COMUNE DI GENOVA	PROV. ITAL. CONGR. FRATELLI DI N. SIGNORA	PROVINCIA DI LUCCA	COMUNE DI FABRIANO	COMUNE DI SASSOROSSO	COMUNE DI SERA DE' CONTI	DIOCESI DI JESI	PARROCCHIA S. MARIA IN LAPIDE	CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO	Soggetto beneficiario
4.469.024.000	1.882.581.000	7.892.000.000	12.424.872.000	2.300.000.000	8.777.126.000	714.000.000	2.343.000.000	812.400.000	1.210.000.000	Costo Stimato
4.269.024.000	1.782.581.000	3.630.000.000	8.724.872.000	1.750.000.000	7.222.126.000	614.000.000	1.968.000.000	812.400.000	870.000.000	Finanziamento attribuito
200.000.000	100.000.000	4.262.000.000	3.700.000.000	550.000.000	1.555.000.000	100.000.000	375.000.000	0	340.000.000	Altre fonti
287.000.000	90.000.000	0	0	0	0	0	0	83.900.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
287.000.000	90.000.000	0	0	0	0	0	0	83.900.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
3.901.023.832	1.550.080.975	2.950.803.606	8.724.871.347	1.163.538.950	6.479.764.724	422.714.981	1.818.000.000	708.450.000	799.803.000	Impegni di spesa
1.950.511.920	775.040.490	1.475.401.800	4.362.435.670	581.769.475	3.239.882.360	211.357.490	909.000.000	354.225.500	399.901.500	Lavori acconto 50%
1.560.409.532	0	0	0	0	0	0	727.200.000	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6656	6652	6628	6615	6603	6598	6589	6565	6558	6538	Protocollo
Città Di Casale	Strozzi	Perugia	Perugia	Perugia	Camerino	Pavoneghjani	Sala	Fano	Perano	Comune localizzazione
MUSEO DIOCESANO ADEGUAMENTI ED ABBATTIMENTO BARRIERE	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO PRESSO IL CONVENTO DI S. FRANCESCO	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATIVI PER L'ACCOGLIENZA. PROGETTO UMBRIA 2000	OSTELLO PIAN DI MASSIMO E ANNESSO PARCO PUBBLICO	AREE ATTREZZATE PER SOSTARE RISTORO	RECUPERO STATICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO	RECUPERO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI ISOLA	RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA CIMITERIALE DI AGOLA	OSTELLO DELLA GIOVENTU' IN PALAZZO PIERANTONI	RECUPERO FUNZIONALE E ALTRI CENTRI DI SOSTE RISTORO INADATTI ALLA FUNZIONE DELL'EX CONVENTO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI	Titolo intervento
DIOCESI DI CITTÀ DI CASTELLO	PROV. SERRAVALLE DI S. FRANCESCO	REGIONE DELL'UMBRIA	COMUNE DI PERUGIA	COMUNE DI PERUGIA	CATTEDRALE DI SAN FILIPPO	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA	COMUNE DI SERRA	COMUNE DI FOLIGNO	COMUNE DI PERANO	Soggetto beneficiario
848.791.000	412.000.000	19.404.000.000	4.611.000.000	600.000.000	1.800.000.000	400.000.000	491.430.000	5.767.000.000	5.440.450.000	Costo Stimato
755.791.000	400.000.000	12.877.000.000	2.611.000.000	300.000.000	1.800.000.000	400.000.000	476.430.000	3.400.000.000	4.325.450.000	Finanziamento attribuito
93.000.000	12.000.000	6.527.000.000	2.000.000.000	300.000.000	0	0	15.000.000	2.367.000.000	1.115.000.000	Altre fonti
0	40.000.000	0	0	0	180.000.000	40.000.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	40.000.000	0	0	0	180.000.000	40.000.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
240.590.000	337.759.326	12.877.000.000	2.361.000.000	289.444.360	1.573.246.000	345.372.202	472.428.829	2.581.405.608	3.706.948.969	Impegni di spesa
0	168.879.660	6.438.500.000	1.180.500.000	144.722.180	786.623.000	172.686.100	236.214.410	1.290.702.800	1.853.474.480	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
120.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6706	6705	6693	6689	6668	6664	6663	6659	6658	6656	Protocollo
Foligno	Montelupo	Canzano	San Benedetto Del Tronto	Santa Vittoria in Matenano	San Giustino	Castello	Umbertide	Todi	Civita Di Castellino	Comune localizzazione
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO PER PELLEGRINI E O TIRISTI PREVA. RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI	AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DEL CAROLUCCO RIGIUAIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSO ALLA SOSTA E LA MOBILITA'	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DESTINATA ALL'ASSETTIVITA' A BASSO COSTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO DA EX STUDENTATO EUCARISTICO DEI PADRI SACRAMENTINI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNITA' ABITATIVE AUTONOME	RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX CHIESA DELLA RESURREZIONE E ADIACENTE PARCO DELLE RIMEBRANZE	CHIESA DI S. SILVESTRO IN CORPOSANO	RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTADELLA SAN RORINDO	RESTAURO DELL'ABBAZIA DI MONTECORONA	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO AGOSTINIANO DI S. PAVESSE AL FINE DELL'ACCOGLIENZA POVERA DISABILE E DEI SERVIZI SOCIALI CULTURALI E INFORMATIVI	MUSEO DIOCESANO ADEGUAMENTI ED ABBATTIMENTO BARBIERE	TITOLO INTERVENTO
AZIENDA USL N. 3	COMUNE DI MONTEFALCO	PARROCCHIA S. GIULIANI BATTISTA	PROV. ITAL. ISTITUTO DEI PRETI DEL SS	COMUNE DI S. VITTORIA IN MATENANO	PARROCCHIA SAN GIUSTINO	DIOCESI DI CASTELLO	PARROCCHIA DI SAN SALVATORE	ISTITUTO ARTIGIANELLI CRISTOLTI	DIOCESI DI CASTELLO	Soggetto beneficiario
3.584.000.000	1.800.000.000	1.000.000.000	1.214.656.000	1.317.000.000	314.000.000	1.700.245.000	850.000.000	5.464.000.000	848.791.000	Costo Stimato
3.584.000.000	1.280.000.000	900.000.000	807.656.000	967.000.000	100.000.000	1.444.245.000	730.000.000	5.394.000.000	755.791.000	Finanziamento attribuito
0	320.000.000	100.000.000	407.000.000	350.000.000	214.000.000	256.000.000	120.000.000	70.000.000	93.000.000	Altre fonti
400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	469.400.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	469.400.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.258.213.827	1.127.565.267	899.152.835	621.000.000	837.371.418	60.883.200	1.354.745.500	729.326.960	4.011.032.807	510.790.500	Impegni di spesa
1.129.106.910	563.782.635	449.576.420	310.500.000	418.685.710	30.441.600	677.372.750	364.663.480	2.005.516.400	255.395.250	Lavori acconto 50%
0	0	359.661.130	0	334.948.570	0	0	291.730.785	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6808	6804	6800	6790	6782	6775	6767	6734	6717	6712	Protocollo
Comarato	Nocera	Guido Tardio	Spello	Guido	Jesi	Jesi	Spello	Assisi	Città di Castro	Comune localizzazione
ACCOGLIENZA E RESIDENZA SANTA MARIA GORETTI	RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONASTICALI DI SAN BENEDETTO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI GANFANA	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S. VENTURA DA ADIBRE AD ACCOGLIENZA POVERA	RECUPERO DELL'EREMO DI S. AMBROGIO	RESTAURO DELLE COPERTURE DELLA CATTEDRALE DI S. SETTIMO DUOMO DI JESI	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER GIOVANI	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RISANAMENTO DI EDIFICI DELLA COLLAGIATA DI S. MARIA MAGGIORE	ADEGUAMENTO LITURGICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA	MUSEO DIOCESANO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO	Titolo intervento
COMUNE DI COMARALDO	ARCIDIOCESI DI SPELTO SPOLETO NONOIA	PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO	PARROCCHIA DI S. MARIA MAGGIORE	CANONICI REGOLARI LATERNENSIS	ENTE DIOCESI DI JESI	COMUNE DI JESI	PARROCCHIA DI S. M. MAGGIORE	PROTONASTICHIARA ASSISI	DIOCESI DI CITTÀ DI CASTELLO	Soggetto beneficiario
2.204.330.000	3.830.103.000	524.000.000	478.000.000	2.000.000.000	650.000.000	3.500.000.000	2.537.000.000	2.000.000.000	248.337.000	Costo Stimato
1.904.330.000	3.640.057.651	400.000.000	442.000.000	700.000.000	455.000.000	2.450.000.000	1.090.000.000	2.000.000.000	227.337.000	Finanziamento attribuito
300.000.000	190.045.349	124.000.000	36.000.000	1.300.000.000	195.000.000	1.050.000.000	1.447.000.000	0	21.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.904.332.142	3.630.102.202	326.264.262	431.650.000	700.000.000	455.000.000	1.985.360.344	1.075.592.500	1.964.647.381	209.336.100	Impegni di spesa
952.166.070	1.815.051.100	163.132.130	215.825.000	350.000.000	227.500.000	992.680.170	537.796.250	982.323.690	104.668.050	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6969	6960/C	6960/B	6960/A	6821	6906	6905	6896	6888	6884	Protocollo
Spoleto	Orano	Orano	Orano	Città Di Castello	Assisi	Assisi	Cascia	Monemoneo	Spoleto	Comune localizzazione
PIANO GENERALE E PROGETTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI LUNGO I PERCORSI E LE METE QUADRARI NEL CENTRO STORICO DI SPOLETO	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - 1° LOTTO - LATO OVEST - RISTRUTTURAZIONE PER L'ACQUEDUZIONE	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - II LOTTO - OVEST - RISTRUTTURAZIONE PER L'ACQUEDUZIONE	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - 1° LOTTO - NUOVO NEFFETORIO E GARAGE	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI E OPERE PER IL MIGLIORAMENTO VEICOLARE E PEDONALE PER L'ACCESSO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI CANOSCIO DALLE FRAZIONI DI FABBECCO E BIVOLLIQUANO	REALIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI E SALA POLIVALENTE DI S. MARIA DELLE MOSE	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	SISTEMAZIONE DI AREA URBANA DI SOSTA E INIZIO TERMINI, BUS E VERDE ATTREZZATO DEL PIAZZALE E DEI SAGRATI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA CASA GIOIOSA	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONASTICALE DI SAN NICOLÒ SPOLETO	Titolo intervento
COMUNE DI SPOLETO	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI	COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO	CATEGORIALE DI S. RUFINO	IST. TERAPIE FISIOTERAPICHE ALCANTARINE	COMUNE DI CASCIA	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO IN FERRA	PROVINCIA DI PERUGIA	Soggetto beneficiario
795.000.000	2.117.000.000	1.563.000.000	1.771.000.000	885.000.000	1.058.380.000	3.207.430.000	5.840.000.000	1.255.000.000	2.432.000.000	Costo Stimato
605.000.000	1.917.000.000	1.363.000.000	1.571.000.000	796.000.000	637.996.667	1.642.975.000	5.840.000.000	1.000.000.000	2.207.000.000	Finanziamento attribuito
190.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	89.000.000	420.383.333	1.564.455.000	0	255.000.000	225.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
604.775.000	1.812.422.068	1.303.690.415	1.570.569.485	767.069.250	633.371.735	1.500.560.393	5.839.032.000	930.000.000	2.136.307.791	Impegni di spesa
302.387.500	906.211.030	651.845.200	785.284.740	383.534.625	316.685.865	750.280.200	2.919.516.500	465.000.000	1.068.153.890	Lavori acconto 50%
0	724.968.825	521.476.165	628.227.795	0	0	0	2.335.613.200	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7014	6997	6989	6986	6984	6980	6975	6974	6971	6970	Protocollo
Montecassini	Pesci	Lugnano In Teverina	Loreto	Terni	Toch	Castiglione Del Lago	Castiglione Del Lago	Spello	Spello	Comune localizzazione
TORRE AMERICANA	RISTRUTTURAZIONE PER AGGETTIVITA' A BASSO COSTO DELLA ABBAZIA DI SANT'EUFONIO E SISTEMAZIONE DEI MUSEI ESISTENTI A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI	AREA URBANA PREDISPOSTA PER LA SOSTA ED IL RISTORNO	RESTAURO E RISANAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO EDIZIO SANTA CECILIA SITO A COLLESCIPOLI DI TERNI DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA	CENTRO DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E ZONA DI PARCHEGGIO	RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ISOLA POLVESE	ISOLA POLVESE SULL LAGO TRASIMENO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER LA GIOVENTU'	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA EX LOMONIA PER SERVIZI TURISTICI E CULTURALI	RECUPERO DEL MONASTERO DI S. PONTANO TRASFORMAZIONE PARZIALE IN CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' E RESTAURO DEL MONASTERO ESISTENTE	TITOLO INTERVENTO
COMUNE DI MONTICASSINI LT	COMUNE DI PESCI	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	COMUNE DI LORETO	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	CONGREGAZIO NE DEI FIGLI DELL'AMORE MISERICORDIA SO	PROVINCIA DI PERUGIA	PROVINCIA DI PERUGIA	PROVINCIA DI PERUGIA	MONASTERO DI S. PONTANO	Soggetto beneficiario
122.000.000	4.077.264.000	4.971.452.000	478.000.000	1.077.000.000	2.600.000.000	1.849.000.000	2.375.000.000	822.000.000	3.906.000.000	Costo Stimato
110.000.000	4.077.264.000	2.880.452.000	478.000.000	877.000.000	2.600.000.000	1.349.000.000	1.575.000.000	200.000.000	3.406.000.000	Finanziamento attribuito
12.000.000	0	2.091.000.000	0	200.000.000	0	500.000.000	800.000.000	622.000.000	500.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
93.517.554	3.867.263.044	2.523.352.088	434.160.000	787.349.167	2.525.659.987	1.268.076.789	1.344.020.540	111.454.316	2.838.598.263	Impegni di spesa
46.758.780	1.933.631.520	1.261.676.040	217.080.000	393.674.580	1.262.829.990	634.038.395	672.010.270	55.727.160	1.419.299.130	Lavori acconto 50%
0	0	1.009.340.835	0	0	0	0	0	0	567.719.652	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Stimazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7064	7064	7061	7077	7074	7068	7067	7065	7052	7041	Protocollo
Vallo di Nera	Vallo di Nera	Amelia	Todi	Urbino	Urbino	Urbino	Cagli	Assisi	Montecastelli	Comune localizzazione
SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO	SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO	RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA VILLA VESCOVILE IN LOC. FODERE ANGELETTI	RESTAURO ED AGRILAMENTO PER UN CENTRO DI ACCOGLIENZA NELLA LOCALITA' COLLEVALENTA	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MONASTERO DI S. CATERINA	PALAZZO DEL COLLEGGIO SISTEMAZIONE AREA MUSEO E COPERTURA	PALAZZO BONAVENTURA ODASI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MONASTERO BENEDETTO DI SAN PIETRO	PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IN TERMINI DI ATRIO URBANO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA CIRCOSTANTE LA CHIESA DI SAN BERNARDINO	PALAZZO MASSI PENSIONE	Titolo intervento
COMUNE DI VALLO DI NERA	COMUNE DI VALLO DI NERA	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	MONASTERO AGOSTINIANI DI S. CATERINA	COMUNE DI URBINO	COMUNE DI URBINO	MONASTERO BENEDETTO DI SAN PIETRO	PREBENDA PARI DI SAN BERNARDINO	COMUNE DI MONTECASTELLI	Soggetto beneficiario
2.056.470.000	2.056.470.000	1.222.000.000	6.907.000.000	1.930.000.000	1.100.000.000	2.400.000.000	3.500.990.000	174.000.000	330.000.000	Costo Stimato
1.956.470.000	1.956.470.000	922.000.000	3.307.000.000	1.645.000.000	1.100.000.000	1.800.000.000	3.282.990.000	174.000.000	294.000.000	Finanziamento attribuito
100.000.000	100.000.000	300.000.000	3.600.000.000	285.000.000	0	600.000.000	218.000.000	0	36.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	170.400.000	0	0	127.500.000	17.400.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	170.400.000	0	0	127.500.000	17.400.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.316.470.000	100.000.000	813.000.000	2.752.328.294	1.329.307.013	816.000.000	1.445.000.000	2.767.486.283	110.218.798	293.052.290	Impegni di spesa
658.235.000	0	406.500.000	1.376.164.150	664.653.510	408.000.000	722.500.000	1.383.743.140	55.109.400	146.526.145	Lavori acconto 50%
526.588.000	0	325.200.000	0	0	0	0	1.106.594.510	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazione dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7227	7201	7176	7171	7167	7166/B	7143	713	7102	7088	Protocollo
Assisi	Guibio	Foligno	Guibio	San'Anastasia Di Nervo	Foligno	Porto Recanati	Teolo	Assisi	Assisi	Comune localizzazione
RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI S. RUFINO	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCESCANO DI GUIBIO CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO	REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA A BASSO COSTO A COLFORITO LUNGO LA VIA CHE COLLEGA ASSISI A LORETO	RESTAURO DEL PALAZZO DEL CAPITULO DEI CANONICI ANNESSO ALLA CATTEDRALE DI GUIBIO MOSE DIOCESANO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERA IN SAN FELICE	ISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO FRANCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE E LAVORI DA ESEGUIRE	PISTA CICLABILE PORTO RECANATI LORETO	PARCHEGGIO DELL'ABBZIA DI FRAGLIA	PATRIBARCALE BASILICA DI S. FRANCESCO DI ASSISI PALAZZO PAPALE RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ACCOGLIENZA	CASA MADRE IN VIA SAN FRANCESCO	Titolo intervento
SOPRINTENDEN ZA B.A.A.A.S. DELL'UMBRIA	CHIESA DI S. FRANCESCO GUIBIO	PARRROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	CAPITULO CANONICI DELLA CATTEDRALE	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	COMUNE DI FOLIGNO	COMUNE DI PORTO RECANATI	COMUNE DI TEOLO	PATRIBARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	ISTITUTO FRANCESCO MISSIONARIE	Soggetto beneficiario
750.000.000	3.041.895.000	619.000.000	5.017.000.000	1.909.397.000	4.320.000.000	300.000.000	1.572.670.000	19.583.063.000	386.000.000	Costo Stimato
400.000.000	2.955.340.753	569.000.000	4.079.000.000	1.770.147.087	1.744.000.000	300.000.000	1.220.670.000	18.583.063.000	300.000.000	Finanziamento attribuito
350.000.000	86.554.247	50.000.000	938.000.000	139.249.913	2.576.000.000	0	352.000.000	1.000.000.000	86.000.000	Altre fonti
0	203.500.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	203.500.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	2.643.394.746	518.021.417	4.074.000.213	1.599.396.415	1.307.324.278	265.207.000	1.230.662.700	17.807.562.490	244.000.000	Impegni di spesa
0	1.321.697.370	259.010.710	2.037.000.110	799.698.210	653.662.140	132.603.500	615.331.350	8.903.781.240	122.000.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	1.629.600.085	0	0	0	0	7.820.974.996	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7278	7271	7268	7266	7265	7258	7257	7245	7241/A/B	7235	Protocollo
Assisi	San Severino Marche	Spoleto	Terni	Terni	Gufo	Montelupone	Fassembione	Assisi	Assisi	Comune localizzazione
RESTAURO CONSERVATIVO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. MARIA DEI QUADRANGOLI IN PIAZZA SAN FRANCESCO	RESTAURO DELLA BASILICA DI S. LORENZO IN DOLICO	CONSERVAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO COLLEOLA IN SPOLETO. OPALE GENIO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIARDINE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ANTIURBICHE CONNESSE, MEDIANTE LA	FEBRACCIO. RESTAURO DEL PALAZZO COLLEOLA IN SPOLETO. OPALE GENIO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIARDINE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ANTIURBICHE CONNESSE, MEDIANTE LA	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL PALAZZO COLLEOLA IN SPOLETO. OPALE GENIO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIARDINE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ANTIURBICHE CONNESSE, MEDIANTE LA	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL PALAZZO COLLEOLA IN SPOLETO. OPALE GENIO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIARDINE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ANTIURBICHE CONNESSE, MEDIANTE LA	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL PALAZZO COLLEOLA IN SPOLETO. OPALE GENIO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIARDINE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ANTIURBICHE CONNESSE, MEDIANTE LA	CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI FOSSEMBRONE	ALTERNANZA DEL SANTUARIO BASILICA	RECUPERO DEL COMPLESSO ENILICO IMBACATO NEL BORGO MEDIOEVALE DI S. GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURALE RICETTIVA	Titolo intervento
PROV. SEPARATA DI S. FRANCESCO	PARROCCHIA DI S. LORENZO	COMUNE DI SPOLETO	COMUNE DI TERNI	COMUNE DI TERNI	COMUNE DI GUFO	COMUNE DI MONTELUPONE	PARROCCHIA S. ALDEBRANDO S. AGOSTINO	PROV. SEPARATA DI S. FRANCESCO	PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO	Soggetto beneficiario
13.579.571.000	311.673.000	5.257.654.000	920.000.000	1.650.000.000	2.453.000.000	2.690.596.000	1.300.000.000	22.765.193.000	1.531.770.000	Costo Stimato
4.587.697.302	311.673.000	4.392.785.074	920.000.000	1.650.000.000	2.453.000.000	2.690.596.000	1.040.000.000	22.765.193.000	836.384.538	Finanziamento attribuito
8.991.873.698	0	864.868.926	0	0	0	0	260.000.000	0	695.385.462	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	2.738.900.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	2.738.900.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.895.571.000	311.070.000	4.257.654.000	882.000.000	1.590.000.000	2.452.199.987	2.690.595.400	1.007.000.000	18.263.292.880	779.770.000	Impegni di spesa
947.785.500	155.535.000	2.128.827.000	441.000.000	795.000.000	1.337.099.993	1.345.297.700	503.500.000	5.131.646.440	389.885.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	636.000.000	0	0	0	8.830.373.036	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7367	7356/B	7352	7351	7335	7334	7323	7306	7301	7297	Protocollo
Perugia	Terni	Assisi	Loreto	Macerata	Senigallia	Casca	Monte Cavallo	Pieve Torina	Fano	Comune localizzazione
RIPIRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CANTERALE DI SAN LORENZO	RIQUALIFICAZIONE DEL COLLE DI SAN VALENTINO	PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNO STABILE DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E PRIMO SOCCORSO NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA E STOP CAMPER NEL COMUNE DI ASSISI	CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI E PELLEGRINI VILLA PIO XII	RESTAURINO RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICHE PER UNO STABILE ADIBITO A PRIMO SOCCORSO ARCHITETTONICHE DELL'EX ASILO RICCI PER REALIZZAZIONE DI OSTELLO	RECUPERO PIAZZA E PALAZZO DEL DUCA PER UNIFICAZIONE CENTRO LOUISITICO E PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI PER LA LOGISTICA ALL'ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DEI RIFUGI DEI VISITATORI PER L'ACCESSO ALLA BASILICA DI S. RITA DA CASCA	RESTAURINO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO	RESTAURINO E CONSOLIDAMENTO DELLA PIEVE DI SANTA MARIA ASSISINA	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO CASI DI SPIRITUALITÀ ED ACCOGLIENZA VILLAGGIARETTI	Titolo intervento
SOPRINTENDENZA REGIONALE PER IL TERRITORIO DELLA VALLE DEL Tevere	COMUNE DI TERNI	CONFRATERNITA' A DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E SAN BERN	PROV. ITALIANA CONGR. MISSIONARI	COMUNE DI MACERATA	COMUNE DI SENIGALLIA	COMUNE DI CASCA	PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO	PARROCCHIA S. MARIA ASSISINA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	Soggetto beneficiario
5.887.000.000	3.161.000.000	462.000.000	3.402.245.000	5.877.372.000	6.832.000.000	12.077.198.000	450.000.000	370.000.000	1.639.435.000	Costo Stimato
5.457.000.000	3.161.000.000	462.000.000	2.802.245.000	4.677.372.000	6.832.000.000	5.953.198.000	390.000.000	330.000.000	1.439.435.000	Finanziamento attribuito
430.000.000	0	0	600.000.000	1.200.000.000	0	6.124.000.000	60.000.000	40.000.000	200.000.000	Altre fonti
0	0	46.200.000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	46.200.000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	2.656.231.235	0	2.290.249.310	3.977.656.204	6.126.425.127	5.952.698.000	380.100.000	321.580.561	1.269.435.000	Impegni di spesa
0	1.328.115.620	0	1.145.124.655	1.988.828.100	3.063.212.560	2.976.349.000	190.050.000	160.790.280	634.717.500	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	2.381.079.200	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
5.457.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7503	7502	7465	7454	7420	7416	7401	7394	7377	7374	Protocollo
Tolentino	Tolentino	Ancona	Cervetera	Sara Sant'Abbondio	Caserta	Perugia	Nuora	Perugia	Spoleto	Comune localizzazione
RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA A PERIA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA A PERIA PER REALIZZARE STRUTTURE DI RICETTIVITA' POTERA	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	COMPILAMENTO DEL COMPILAZIONE DENOMINATO SAN GIULIO PER DESTINARLO A RESIDENZE A BASSO COSTO	REALIZZAZIONE DI ZONE DI SOSTA E PARCHeggio A SERVIZIO DEL MONASTERO DI FONTE AVELLANA ED ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI BUS NAVETTE	CASA DEL BELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN MODERNITA'	RECUPERO FUNZIONALE E DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ED ARCHITETTONICO DA DESTINARE A ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'ABBAZIA DI S. CASSIANO AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' VIA BONTEMPI 13	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ALTA SUD DELL'EX OSPEDALE S. CARLO DORRONEO IN OSTELLO	TITOLO intervento
COMUNE DI TOLENTINO	COMUNE DI TOLENTINO	COMUNE DI ANCONA	IST. DIOC. SOSTENTAMENTO CLERO	CONGREGAZIONE DEL MONASTERO DI SAN CARLO ESISTENTE IN ORDINE DI SAN	CHIESA SANT'ANDREA DI S. NITA'	SEMINARIO ARCIVESCOVILE E DI PERUGIA	DIOCESI DI TERNI VARI AMELIA	OPERA PIA M. PAOLETTI	IST. CIV. RIUNITI DI BENEVOLENZA I.C.N.B.	Soggetto beneficiario
607.564.000	847.575.000	1.731.860.000	2.794.000.000	750.000.000	4.279.306.476	1.191.230.000	961.000.000	2.166.000.000	6.383.850.000	Costo Stimato
607.564.000	847.575.000	1.231.860.000	1.764.000.000	700.000.000	3.699.844.500	1.129.230.000	961.000.000	1.936.000.000	4.163.850.000	Finanziamento attribuito
0	0	500.000.000	1.000.000.000	50.000.000	579.461.976	62.000.000	0	230.000.000	2.220.000.000	Altre fonti
89.000.000	92.800.000	0	0	0	0	0	96.100.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
89.000.000	92.800.000	0	0	0	0	0	96.100.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
538.564.000	754.775.000	1.231.860.000	1.565.800.000	694.354.960	3.172.283.268	871.953.000	804.900.000	1.501.125.000	3.597.084.201	Impegni di spesa
269.282.000	377.387.500	615.930.000	782.900.000	347.177.480	1.586.141.630	435.976.500	402.450.000	750.562.500	1.798.542.100	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	1.268.913.310	0	0	0	1.438.833.680	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazione dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

757	7560	7528	7516	7514	7513	7509	7507	7506	7505	Protocollo
Venezia	Canpi Santona	Spoleto	Foligno	Foligno	Tolentino	Tolentino	Tolentino	Tolentino	Tolentino	Comune localizzazione
RESTAURO CONSERVATIVO	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORNO IN LOCALITA' PIROTTA	VILLA REGENTA - EX FANTERIA ED EX SQUADRINI DEL COMPLESSO PATRIMONIALE E CREAZIONE DI RICEETTIVITA' A BASSO COSTO E PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICO	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	ACCOGLIENZA E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE E DI SAN FRANCESCO E SANTUARIO DELLA BEATA ANGELA	COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL PARCHEGGIO DEL FORO BOARIO	REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO ESCLUSIVO DAL PARCHEGGIO DI OSIMANI FELZI ALLA CHIESA SANTA MARIA NUOVA	CONSERVAZIONE E RESTAURO TETTO ED INTERRI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	RESTAURO CON OMNATO CRISTOFORO DEL COMPLESSO MONUMENTALE E DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	RESTAURO AFFRESCHI CRISTOFORO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	TITOLO Intervento
FONDAZ. DI CULTO OPERA INTREPIDA	CASA RELIGIOSA DEI CHIERICI REGOLARI	PROVINCIA DI PERUGIA	DIOC. FOLIGNO CATTEDRALE DI S. FELICIANO	PROV. UMBRIA DI SAN FRANCESCO	COMUNE DI TOLENTINO	COMUNE DI TOLENTINO	COMUNE DI TOLENTINO	COMUNE DI TOLENTINO	COMUNE DI TOLENTINO	Soggetto beneficiario
1.056.000.000	2.764.000.000	2.382.000.000	11.078.067.989	5.927.800.000	1.100.000.000	600.000.000	321.000.000	377.261.000	717.521.000	Costo Stimato
686.000.000	750.000.000	1.882.000.000	6.840.610.420	5.927.800.000	400.000.000	600.000.000	321.000.000	377.261.000	717.521.000	Finanziamento attribuito
370.000.000	2.014.000.000	500.000.000	4.237.457.569	0	700.000.000	0	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	32.100.000	39.200.000	74.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	32.100.000	39.200.000	74.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
686.000.000	695.000.000	1.705.476.629	5.678.067.989	5.927.798.227	398.599.515	577.568.504	286.018.054	338.060.454	643.521.000	Impegni di spesa
0	347.500.000	852.738.310	2.839.033.990	2.963.899.110	199.299.760	288.784.250	143.009.030	169.030.230	321.760.500	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

931	791	7903	7902	7663	7622	7605	7581	7581	7570	Protocollo
Torino	Lanusei	Agdèda	Agdèda	Cabreria al Ticino	Arcade	Viggiano	Assisi	Assisi	Bevagna	Comune localizzazione
RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA BASILICA DI SUPERGA	RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARSI AD OSTELLO	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURATURE DELLA BASILICA	RESTAURO DELLA CANTINA LIGNEA DELLA BASILICA	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO ED ARTISTICO DEL COMUNE DELLA FASCIA LITORANEA OCCIDENTALE DEL TICINO SULLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE DEL SEMINARIO ESTIVO ADIBITO A CENTRO STUDI	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	RESTAURO PIAZZA INFERIORE SAN FRANCESCO	RESTAURO PIAZZA INFERIORE SAN FRANCESCO	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DEL SS. DOMENICO E GIACOMO IN STRADA DA ADRINIA A RICETTIVITA' POVERA	Titolo intervento
PROV. PIEMONTESE OPINIE SERV. DI MARIA	COMUNE DI LANUSEI	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRULLI V.G.	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRULLI V.G.	COMUNE DI CARONNARA AL TICINO	SEMINARIO VESCOVILE AGRICOLE	COMUNE DI VIGGIANO	PATRIBONALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	PATRIBONALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	COMUNE DI BEVAGNA	Soggetto beneficiario
2.902.000.000	1.224.685.000	900.000.000	1.490.000.000	555.772.000	1.059.799.000	3.000.000.000	8.306.110.000	8.306.110.000	2.225.984.000	Costo Stimato
2.902.000.000	1.104.685.000	900.000.000	1.490.000.000	505.772.000	559.799.000	1.500.000.000	7.806.110.000	7.806.110.000	1.805.043.459	Finanziamento attribuito
0	120.000.000	0	0	50.000.000	106.000.000	1.500.000.000	500.000.000	500.000.000	420.940.541	Altre fonti
335.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
335.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.565.572.985	966.684.685	0	0	428.246.390	599.798.146	1.149.062.627	6.418.697.500	1.148.339.903	1.624.918.869	Impegni di spesa
1.282.786.490	483.342.340	0	0	214.123.195	299.899.070	574.531.310	3.209.348.750	0	812.459.430	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	239.919.258	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	1.148.339.903	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	900.000.000	900.000.000	0	0	0	0	0	0	Amministrazione dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

953	951	93R	905	904	899	897E	897	896/B	896/A	Protocollo
Codigno	Codigno	Napoli	San Giovanni Rotondo	San Giovanni Rotondo	San Giovanni Rotondo	Assisi	Venezia	Venezia	Venezia	Comune localizzazione
LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHEGGI E DELLA VIABILITA' DI RACCORDO A SERVIZIO DI POMPOSA	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABITAZIALE DI POMPOSA	CONVENIO DI S. LUCIA A MONTE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO A CENTRO DI ACCOGLIENZA PERI PELLEGRINI	AREDO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE CAPPUCCINI	PARCHEGGIO MULTIPLO NORD OVEST	SINISTRI ACCOGLIENZA NOZZO CAMO	CASTELLO DI PORZANO RECUPERO PARZIALE	RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL CROSTRO MONUMENTALE DEL CONVENTO DA ADIBIRE A RICETTIVA IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	STABILIMENTO E INTERVENTI DI CARATTERE TECNOLOGICO	PARTI MONUMENTALE COSTITUITA DA CHIESA ORATORIO E CROSTRO DI S. CHIARA	Titolo intervento
COMUNE DI CODIGNO	COMUNE DI CODIGNO	PROVINCIA DI S. GIOVANNI DELLA CRUCE	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	PARROCCHIA SANTILIORENZO E ANNA	COMUNITA' FRANCISCANI MINORI CONVENTI	ISTITUTO PALAZZOLI IN S. CHIARA DELLE FIORE	ISTITUTO PALAZZOLI IN S. CHIARA DELLE FIORE	Soggetto beneficiario
4.197.070.000	560.000.000	1.395.800.000	1.601.000.000	9.613.310.000	4.573.000.000	630.000.000	180.000.000	4.044.140.000	1.436.000.000	Costo Stimato
3.277.070.000	444.000.000	1.295.800.000	1.601.000.000	9.613.310.000	4.573.000.000	680.000.000	180.000.000	3.879.140.000	1.251.000.000	Finanziamento attribuito
920.000.000	116.000.000	100.000.000	0	0	0	250.000.000	0	165.000.000	185.000.000	Altre fonti
0	0	0	199.800.000	1.388.700.000	570.000.000	0	180.000.000	438.600.000	125.100.000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	199.800.000	1.388.700.000	570.000.000	0	180.000.000	438.600.000	125.100.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
3.277.070.845	443.867.151	1.239.348.888	1.400.972.000	8.224.610.000	4.022.779.960	632.400.000	0	3.440.535.500	1.111.116.865	Impegni di spesa
1.638.525.420	221.933.570	619.674.440	700.486.000	4.112.305.000	2.001.389.980	316.200.000	0	1.720.267.500	555.558.430	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

981	Protocollo
Venezia	Comune localizzazione
CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI	Titolo intervento
IST. PROV. PER L'INFERMIA S. MARINA	Soggetto beneficiario
2.500.000.000	Costo Stimato
2.500.000.000	Finanziamento attribuito
0	Altre fonti
250.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
250.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.204.891.386	Impegni di spesa
1.102.445.690	Lavori acconto 50%
0	Lavori acconto 90%
0	Lavori saldo
0	Fornitura acconto 50%
0	Fornitura ulteriore acconto
0	Fornitura saldo
0	Acquisizione aree e immobili
0	O.N.T. Uffici tecnici
0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziata di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

3. PARTE TERZA – IL PIANO PER REGIONI – STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AL 30 SETTEMBRE 1999

3.3. Il quadro riepilogativo

Sulla base della Relazione di monitoraggio relativa al III trimestre del 1999 è possibile definire lo stato di avanzamento dei diversi interventi che compongono il Piano per il Giubileo al di fuori del Lazio.

Per effetto delle rimodulazioni avvenute il Piano consiste al 30 settembre 1999 di 1.128 interventi per un costo complessivo di 3.519,3 miliardi di lire di cui 1.988,6 a carico dello Stato.

La situazione rispetto all'inizio dell'anno risulta variata in termini non significativi a seguito di definanziamenti e rinunce (al 31 marzo gli interventi erano 1.165 per un costo complessivo di 3.716,8 miliardi di lire).

Gli interventi ultimati o in corso di realizzazione risultano pari a 939, quelli in fase pre-realizzativa 189.

In particolare, gli *interventi ultimati* al III trimestre '99 risultano 96 pari al 3,7% del finanziamento ed al 5,5% degli investimenti complessivi.

Il completamento degli interventi ha subito un'accelerazione nel corso dell'anno: gli interventi ultimati erano 12 nel I trimestre e sono saliti a 28 nel II trimestre (tab. 5).

Tab. 5 - Avanzamento degli interventi in fase di realizzazione o completati (al I, II, III trimestre 1999)

Trimestre riferimento	di	Interventi in fase di realizzazione			Interventi completati		
		N.	% sul totale interventi	% sul totale finanzia- menti	N.	% sul totale interventi	% sul totale finanzia- menti
al 31 marzo 1999	455	39,1	46,6	12	1,0	0,2	
al 30 giugno 1999	856	75,6	86,8	28	2,5	0,5	
al 30 settembre 1999	843	74,7	90,6	96	8,5	3,7	

Gli *interventi in fase di realizzazione* pari a 843 costituiscono in termini di risorse finanziarie il 74,7% del finanziamento pubblico disponibile ed il 90,6% dell'investimento complessivo.

Infine, gli *interventi in fase pre-realizzativa* costituiscono il 16,8% del totale in numero ma solo il 5,7% sul finanziamento pubblico. Si tratta di 189 iniziative prevalentemente localizzate in Campania, Puglia, Toscana, Veneto dove il Piano prevede una maggiore diffusione di programmi.

Dal punto di vista territoriale, le regioni che registrano un valore più elevato della media per quanto attiene alla quota di interventi ultimati o in fase di realizzazione (83,2% sul complesso delle iniziative) sono: l'Emilia Romagna con il 99,2%, la Sicilia con il 96,4%, la Basilicata con il 95,0%, la Liguria con il 93,0%, il Piemonte con il 92,5%, l'Umbria con il 91,2%, le Marche con il 90,6%, la Lombardia con l'89,4%, la Valle d'Aosta con l'85,7% (tab. 6).

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.1.1. Tabelle relative al 1° trimestre

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
TAVOLA 1

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER REGIONE

REGIONI	Num.	Finanz. milioni	Costo milioni	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA			INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE			INTERVENTI COMPLETATI					
				numero	% num.	% finanz.	numero	% num.	% finanz.	numero	% num.	% finanz.	costo		
VALLE D'AOSTA	14	12.163	18.491	6	42,9	40,1	39,3	8	57,1	59,9	60,7	0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	40	159.836	201.413	27	67,5	87,2	86,3	40	25,0	11,7	11,3	3	7,5	1,1	2,4
LIGURIA	42	65.858	106.197	25	59,5	57,6	67,1	16	38,1	41,8	32,5	1	2,4	0,6	0,4
LOMBARDIA	48	85.170	259.273	31	64,6	68,0	69,6	16	33,3	31,7	29,9	1	2,1	0,3	0,6
FRIL-VENEZIA GIULIA	44	46.258	57.451	33	75,0	76,4	79,0	11	25,0	23,6	21,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	5	17.473	23.968	2	40,0	35,6	28,5	3	60,0	64,4	71,5	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	104	200.089	373.966	61	58,7	52,3	54,5	42	40,4	47,5	45,4	1	1,0	0,2	0,1
EMILIA-ROMAGNA	123	161.165	374.886	58	47,2	42,5	64,0	63	51,2	57,0	35,7	2	1,6	0,5	0,3
TOSCANA	133	209.761	392.036	78	58,6	46,8	60,5	53	39,8	53,0	39,3	2	1,5	0,2	0,2
UMBRIA	135	239.202	484.555	74	54,8	41,0	55,0	60	44,4	58,9	44,3	1	0,7	0,1	0,7
MARCHE	112	177.424	265.285	46	41,1	33,8	38,8	65	58,0	66,0	60,9	1	0,9	0,2	0,3
ABRUZZO	21	45.782	109.965	14	66,7	56,7	67,0	7	33,3	43,3	33,0	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	6	17.886	19.369	3	50,0	36,8	36,7	3	50,0	63,2	63,3	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	126	190.361	397.581	101	80,2	60,4	76,6	25	19,8	39,6	23,4	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	112	152.160	292.790	76	67,9	55,5	61,1	36	32,1	44,5	38,9	0	0,0	0,0	0,0
BASILICATA	19	43.256	57.324	10	52,6	48,2	49,0	9	47,4	51,8	51,0	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	22	39.965	74.078	17	77,3	72,9	82,0	5	22,7	27,1	18,0	0	0,0	0,0	0,0
SICILIA	30	55.350	59.576	16	53,3	49,0	49,0	14	46,7	51,0	51,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	23	46.732	120.157	19	82,6	83,0	92,0	4	17,4	17,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	6	24.867	28.434	1	16,7	0,0	8,3	5	83,3	100,0	91,7	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	1.165	1.990.758	3.716.795	698	59,9	53,2	62,7	455	39,1	46,6	36,9	12	1,0	0,2	0,4

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
TAVOLA 3
NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO E REGIONE

REGIONI	Numb.	Finanz. milioni	Costo miliardi	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				numero	% num.	finanz. %	costo %	numero	% num.	finanz. %	costo %	numero	% num.	finanz. %	costo %
ABRUZZO	5	3.765	5.409	0,0	0,0	65,5	65,5	2	40,0	34,5	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0
VALLE D'AOSTA	0	14.405	17.405	88,5	11,3	81,6	81,6	1	11,3	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	9	13.280	19.822	90,0	10,6	81,4	81,4	2	22,2	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
LIGURIA	10	12.051	22.059	80,0	10,0	92,7	92,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMBARDIA	13	11.133	24.333	100,0	0,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	31	46.771	69.380	61,6	70,9	72,9	72,9	7	18,4	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	26	36.118	48.631	60,7	58,6	58,0	58,0	10	35,7	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	57	16.906	190.224	77,7	71,9	65,2	65,2	14	24,6	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0
LAZIO	51	67.916	94.765	72,5	56,4	58,0	58,0	14	27,5	43,6	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	29	28.947	51.690	86,2	79,3	85,3	85,3	3	10,3	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	10	17.157	27.053	70,0	50,0	60,1	60,1	3	30,0	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	1	3.973	1.507,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	16	19.186	69.607	85,7	71,6	80,3	80,3	4	14,3	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0
VALLE D'AOSTA	24	3.000	5.330	100,0	0,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAZIO	3	1.000	1.616	100,0	0,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SICILIA	1	1.033	1.194	100,0	0,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	5	10.818	17.551	80,0	61,1	81,3	81,3	1	20,0	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	5	17.867	20.934	20,0	0,0	0,0	0,0	1	20,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	375	550.982	950.988	78,7	69,7	76,3	76,3	77	20,5	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	4	3.159	4.763	25,0	19,6	17,9	17,9	3	75,0	80,1	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0
VALLE D'AOSTA	11	26.654	52.370	67,1	18,5	17,9	17,9	5	35,7	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	15	23.276	29.269	61,3	49,9	49,9	49,9	9	40,0	39,7	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0
LIGURIA	12	14.319	136.406	50,3	57,7	67,4	67,4	5	11,7	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMBARDIA	11	12.001	14.930	91,5	62,0	63,1	63,1	5	18,5	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-SOUTH TYROL	4	16.340	22.835	25,0	31,1	25,0	25,0	3	75,0	69,5	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-SOUTH TYROL	13	75.309	231.304	33,2	46,2	46,2	46,2	24	54,9	57,6	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	31	32.472	251.071	35,2	54,3	54,3	54,3	30	96,8	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	17	85.770	258.816	46,4	47,9	48,0	48,0	14	34,1	31,3	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	30	16.302	76.469	6,0	3,9	3,9	3,9	20	66,7	66,7	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0
LAZIO	7	14.013	15.295	0,0	0,0	0,0	0,0	2	25,0	23,9	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	66	73.351	192.693	52	70,8	69,4	69,4	14	21,2	66,7	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	69	80.279	181.563	62,3	47,8	51,8	51,8	26	37,7	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0
LAZIO	12	20.689	31.689	5	11,7	35,2	35,2	7	58,3	64,2	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	17	38.765	67.262	70,6	66,4	70,6	70,6	5	29,4	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SICILIA	22	45.934	49.805	60	35,5	44,4	44,4	12	24,5	35,6	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	7	5.067	68.387	5	71,4	62,7	62,7	2	28,6	37,3	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	492	752.399	1.919.981	55,1	13,6	61,1	61,1	216	43,9	56,1	56,1	38,3	0,3	0,3	0,2
ABRUZZO	5	4.929	6.259	40,0	30,4	26,3	26,3	3	60,0	69,6	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VALLE D'AOSTA	11	12.170	131.638	64,7	94,4	92,3	92,3	4	23,5	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	17	24.341	57.169	47,1	33,1	68,5	68,5	8	47,1	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0
LIGURIA	17	27.700	48.269	52,9	47,5	50,3	50,3	7	41,2	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMBARDIA	11	14.780	15.340	61,6	61,3	61,4	61,4	4	36,3	39,7	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-SOUTH TYROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRENTINO-SOUTH TYROL	11	77.12	86.33	50,0	52,2	53,4	53,4	11	30,0	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	22	56.352	71.492	47,7	41,6	42,7	42,7	23	52,3	57,3	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	29	30.143	65.816	48,3	40,6	47,8	47,8	15	50,4	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	29	84.486	149.974	13,0	16,5	23,3	23,3	25	86,2	63,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0
LAZIO	53	80.600	85.520	18,7	18,6	18,7	18,7	47	79,2	81,1	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	3	12.113	12.413	33,3	47,6	47,5	47,5	2	66,7	52,4	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABRUZZO	14	36.178	59.541	50,0	42,9	43,1	43,1	7	50,0	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	15	30.685	39.624	60,0	68,7	68,7	68,7	6	40,0	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	3	6.967	8.287	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	5	8.102	8.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARDEGNA	11	30.217	33.717	30,9	58,4	58,4	58,4	2	40,0	41,6	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	297	679.177	872.426	44,4	50,8	52,7	52,7	161	54,2	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.1.2. Tabelle relative al II° trimestre

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
TAVOLA 1

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER REGIONE

REGIONI	Nim.	Finanz. millioni	Costo millioni	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				numero	% num.	finanz. %	costo %	numero	% num.	finanz. %	costo %	numero	% num.	finanz. %	costo %
VALLE D'AOSTA	14	12.339	18.667	2	14,3	14,7	14,1	11	78,6	81,2	82,6	1	7,1	4,1	3,2
PIEMONTE	40	159.652	178.394	7	17,5	66,3	60,1	27	67,5	31,6	34,4	6	15,0	2,1	5,5
LIGURIA	43	66.278	94.647	4	9,3	2,7	14,9	37	86,0	96,0	84,2	2	4,7	1,2	0,9
LOMBARDIA	47	80.645	214.571	5	10,6	15,6	8,5	40	85,1	83,7	90,2	2	4,3	0,7	1,3
FRIULI-VENEZIA GIULIA	42	45.053	55.891	5	11,9	18,6	27,4	37	88,1	81,4	72,6	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	5	46.144	23.968	1	20,0	7,0	4,7	4	80,0	93,0	95,3	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	107	195.814	406.786	22	20,6	4,7	18,2	82	76,6	94,8	81,5	3	2,8	0,5	0,3
EMILIA-ROMAGNA	122	160.397	399.475	11	9,0	2,4	42,9	106	86,9	96,4	56,4	5	4,1	1,2	0,7
TOSCANA	130	211.035	394.970	30	23,1	4,1	29,0	96	73,8	95,4	70,6	4	3,1	0,5	0,4
UMBRIA	123	243.966	485.259	20	16,3	3,5	24,3	100	81,3	96,3	73,8	3	2,4	0,2	2,0
MARCHE	106	177.255	257.746	13	12,3	7,0	11,5	91	85,8	92,5	87,8	2	1,9	0,5	0,7
ABRUZZO	21	43.656	100.878	6	28,6	2,6	22,9	15	71,4	97,4	77,1	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	8	19.886	21.369	4	50,0	24,2	23,5	4	50,0	75,8	76,5	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	117	184.725	372.551	65	55,6	15,0	48,0	52	44,4	85,0	52,0	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	106	150.305	290.905	30	28,3	4,9	17,3	76	71,7	95,1	82,7	0	0,0	0,0	0,0
BASILICATA	20	47.055	61.123	4	20,0	15,4	15,0	16	80,0	84,6	85,0	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	21	42.880	75.361	7	29,2	14,1	39,8	17	70,8	85,9	60,2	0	0,0	0,0	0,0
SICILIA	29	58.508	63.074	1	3,4	3,4	3,7	28	96,6	96,6	96,3	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	23	44.758	110.378	11	47,8	46,7	73,8	12	52,2	53,3	26,2	0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	6	24.867	28.434	1	16,7	0,0	8,3	5	83,3	100,0	91,7	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	1.133	1.965.219	3.654.417	249	22,0	12,7	28,7	856	75,6	86,8	70,5	28	2,5	0,5	0,9

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
TAVOLA 2

PER SOGGETTO

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO

REGIONI	Nimm.	Finanz. millonari	Costo millonari	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA			INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE			INTERVENTI COMPLETATI		
				numero	%	financ.	numero	%	financ.	numero	%	financ.
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
PIEMONTE	21	137.318	127.263	25	23,0	30,1	5	75,0	69,6	3	14,3	1,1
LIGURIA	11	13.851	16.130	7	7,7	2,3	11	84,6	96,3	1	7,7	1,4
LOMBARDIA	27	50.180	89.337	4	18,7	25,1	18	81,6	84,1	0	0,0	0,0
TRENTINO-SOUTH TYROL	7	11.487	10.438	4	57,1	37,7	3	100,0	100,0	0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	40	78.521	102.475	9	22,5	10,8	31	89,6	96,9	2	2,5	1,3
TOSCANA	75	101.565	159.666	4	5,3	1,6	59	83,1	97,7	2	3,1	0,3
MARCHE	67	18.046	13.191	5	8,6	4,8	54	87,9	95,0	2	3,1	0,3
ABRUZZO	8	20.586	20.686	11	16,1	10,1	55	82,1	89,6	1	1,5	0,3
MOLISE	5	5.874	6.074	4	80,0	82,0	1	20,0	18,0	0	0,0	0,0
CAMPANIA	32	76.510	82.325	15	46,9	36,2	17	53,1	53,9	0	0,0	0,0
PUGLIA	17	51.575	55.191	1	5,9	4,3	16	94,1	95,7	0	0,0	0,0
PIEMONTE	10	19.237	26.292	2	20,0	13,5	8	80,0	96,5	0	0,0	0,0
CALABRIA	4	9.921	13.265	4	100,0	20,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SICILIA	1	7.719	17.716	1	100,0	54,5	0	0,0	100,0	0	0,0	0,0
SARDEGNA	5	24.057	28.072	6	120,0	0,0	5	100,0	100,0	0	0,0	0,0
TOTALE	500	1.018.390	1.347.354	89	17,6	19,0	396	79,2	79,7	10	3,2	1,4
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
PIEMONTE	19	41.734	51.111	2	10,5	29,8	14	83,3	92,2	1	16,7	7,8
LIGURIA	29	52.127	66.310	6	20,7	2,4	26	90,5	98,0	1	3,8	1,2
LOMBARDIA	21	30.466	42.215	0	0,0	1,9	14	66,7	97,9	2	9,5	6,8
TRENTINO-SOUTH TYROL	7	12.191	20.018	1	14,3	9,1	6	85,7	90,9	0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	37	117.293	153.981	5	13,5	0,7	32	86,5	99,0	1	1,8	0,3
TOSCANA	51	47.986	72.744	1	2,4	0,2	10	19,6	99,8	0	0,0	0,0
MARCHE	15	125.890	156.318	11	73,3	17,7	11	73,3	86,6	2	13,7	0,7
ABRUZZO	7	23.070	24.748	1	14,3	1,2	6	85,7	96,5	0	0,0	0,0
MOLISE	3	6.513	79.930	1	33,3	9,9	2	66,7	96,1	0	0,0	0,0
CAMPANIA	32	108.115	129.593	0	0,0	0,0	3	100,0	100,0	0	0,0	0,0
PUGLIA	10	27.818	34.731	3	30,0	5,2	7	70,0	94,8	0	0,0	0,0
PIEMONTE	13	32.966	39.128	2	15,4	10,2	8	80,0	89,8	0	0,0	0,0
CALABRIA	28	56.229	59.795	1	3,6	3,6	11	84,6	96,4	0	0,0	0,0
SARDEGNA	5	11.398	13.099	1	20,0	21,1	4	80,0	70,9	0	0,0	0,0
TOTALE	400	926.029	1.193.395	37	9,3	4,7	411	89,3	94,7	12	2,6	1,0
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
PIEMONTE	1	12.147	12.147	100,0	100,0	4,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
LOMBARDIA	4	82.960	82.960	25,0	4,0	0,0	3	75,0	33,2	0	0,0	0,0
TRENTINO-SOUTH TYROL	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	8	149.310	167.025	8	100,0	40,5	2	20,0	59,5	0	0,0	0,0
TOSCANA	6	167.025	167.025	6	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
MARCHE	11	105.008	105.008	1	9,1	9,1	1	9,1	4,5	0	0,0	0,0
ABRUZZO	20	155.719	155.719	17	60,0	69,2	3	40,0	40,8	0	0,0	0,0
MOLISE	4	42.692	42.692	1	25,0	29,3	3	75,0	70,6	0	0,0	0,0
ABRUZZO	6	55.171	55.171	1	16,7	31,3	2	33,3	60,7	0	0,0	0,0
MOLISE	0	0	0	0	0,0	0,0	1	5,7	6,8	0	0,0	0,0
CAMPANIA	53	160.633	160.633	27	50,9	30,5	0	0,0	60,5	0	0,0	0,0
PUGLIA	3	102.692	102.692	0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
PIEMONTE	3	51.800	51.800	3	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SARDEGNA	1	2.362	2.362	1	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTALE	173	1.113.668	1.113.668	49	28,3	67,6	0	0,0	32,4	0	0,0	0,0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO

PER TIPOLOGIA

REGIONI	N. int.	Finanz. (millioni)	Costo (millioni)	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA			INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE			INTERVENTI COMPLETATI		
				numero	%	financ.	numero	%	financ.	numero	%	financ.
VALLE D'AOSTA	5	3.765	5.469	40,0	38,2	18,3	50,0	51,8	0,0	0,0	0,0	
PIEMONTE	7	12.368	15.363	42,9	24,3	25,6	57,1	73,3	0,0	0,0		
LIGURIA	14	15.534	20.276	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
LOMBARDIA	14	25.311	49.934	0,0	37,4	27,0	71,4	92,0	7,1	0,6		
FRUII-VENEZIA GIULIA	18	17.054	25.113	2,2	14,3	56,3	77,8	55,7	0,0	0,0		
TRENTINO-ALTO ADIGE	1	1.131	1.131	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
VENETO	32	43.971	66.367	12	37,5	22,7	59,1	81,2	3,1	0,3		
EMILIA-ROMAGNA	26	31.173	43.704	11	41,5	2,7	11,6	96,2	3,8	1,1		
TOSCANA	10	45.829	94.761	22,9	17,4	7,7	70,0	73,9	2,0	0,2		
MARCHE	36	45.816	36.133	7,4	15,8	55,2	17,4	52,6	0,0	0,0		
ABRUZZO	4	15.143	10.423	11	71,4	22,0	5,6	32,6	0,0	0,0		
MOLISE	5	6.071	6.071	80,0	82,0	82,6	20,0	17,1	0,0	0,0		
CAMPANIA	38	55.656	91.032	20	52,6	11,7	17,4	16,3	0,0	0,0		
PUGLIA	23	49.862	68.238	8	34,8	24,8	55,2	108,5	75,2	0,0		
BASILICATA	5	5.540	6.998	2	40,0	51,2	60,0	60,0	0,0	0,0		
CALABRIA	3	1.500	1.646	33,3	33,3	30,9	66,7	66,7	0,0	0,0		
SARDEGNA	1	1.000	1.000	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
SARDEGNA	1	7.205	12.605	2	50,0	13,7	50,0	56,3	0,0	0,0		
VALLE D'AOSTA	1	17.100	20.914	1	20,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
TOTALE	312	508.585	774.721	31,7	17,9	27,7	66,7	82,3	1,5	0,3		
VALLE D'AOSTA	5	4.645	6.514	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
PIEMONTE	17	27.886	27.915	1,1	1,1	1,8	75,0	91,2	77,6	7,7		
LIGURIA	15	20.330	40.784	3	20,0	7,4	73,3	91,7	65,8	1,0		
LOMBARDIA	13	16.430	104.894	2	15,4	18,9	84,6	81,1	95,5	0,0		
FRUII-VENEZIA GIULIA	13	12.279	14.308	7	53,8	6,8	92,3	93,2	91,7	0,0		
TRENTINO-ALTO ADIGE	4	15.911	22.835	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0		
VENETO	51	76.907	257.130	9	17,6	3,1	86,3	96,1	76,9	0,5		
EMILIA ROMAGNA	52	71.581	275.921	6	11,5	6,7	81,6	95,2	38,9	2,0		
TOSCANA	16	51.291	73.943	14	87,5	7,8	66,7	91,5	53,2	4,2		
MARCHE	17	63.103	78.378	2	11,8	0,0	95,6	100,0	93,2	1,9		
ABRUZZO	8	15.173	69.385	2	25,0	0,0	75,0	100,0	72,6	0,0		
MOLISE	3	14.013	15.298	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0		
CAMPANIA	66	68.465	215.802	45	68,2	6,6	31,8	93,4	41,0	0,0		
PUGLIA	69	10.569	183.854	19	27,5	0,0	72,5	100,0	86,3	0,0		
BASILICATA	11	27.828	32.829	1	9,1	1,5	90,9	95,5	91,1	0,0		
CALABRIA	17	35.330	64.795	3	17,6	1,8	82,4	95,2	61,0	0,0		
SARDEGNA	7	48.793	53.014	1	14,3	4,3	95,7	95,9	95,6	0,0		
SARDEGNA	7	5.363	60.985	4	57,1	43,1	42,9	56,9	5,4	0,0		
TOTALE	109	728.639	1.977.717	121	21,9	34,5	73,3	96,1	65,0	0,1		
VALLE D'AOSTA	4	3.939	6.684	0,0	0,0	0,0	75,0	87,3	21,0	0,0		
PIEMONTE	21	124.898	135.146	3	14,3	62,1	66,7	16,6	20,9	1,4		
LIGURIA	17	30.114	33.586	5	29,4	1,1	96,2	96,9	97,2	2,0		
LOMBARDIA	20	38.964	60.719	0,0	0,0	0,0	95,0	90,9	95,7	1,1		
FRUII-VENEZIA GIULIA	11	15.721	16.371	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0		
TRENTINO-ALTO ADIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VENETO	24	74.336	92.779	1	4,2	0,1	91,7	93,3	94,3	0,2		
EMILIA ROMAGNA	14	42.240	68.809	2	14,3	3,6	70,7	91,8	81,3	0,7		
TOSCANA	14	30.463	126.943	0	0,0	0,0	94,1	93,8	92,7	0,2		
MARCHE	38	104.846	144.141	1	2,6	1,1	96,6	98,4	97,1	0,7		
ABRUZZO	4	13.040	13.070	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0		
MOLISE	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
CAMPANIA	13	59.601	62.917	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0		
PUGLIA	14	29.871	38.813	3	21,4	22,6	76,6	76,1	76,1	0,0		
BASILICATA	1	1.687	21.287	1	25,0	14,5	75,0	76,1	85,9	0,0		
CALABRIA	1	6.019	8.949	3	75,0	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
SARDEGNA	5	8.715	8.910	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0		
SARDEGNA	12	31.501	36.701	5	41,7	48,0	36,3	52,0	31,7	0,0		
TOTALE	321	728.464	895.049	216	67,3	18,9	87,5	90,3	80,8	0,8		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.1.3. Tabelle relative al III trimestre 1999

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
(LEGGE 270/97)

TAVOLA 1

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER REGIONE

REGIONI	Num.	Finanz. millioni	Costo millioni	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA			INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE			INTERVENTI COMPLETATI					
				numero	%	finanz. costo	numero	%	finanz. costo	numero	%	finanz. costo			
VALLE D'AOSTA	14	12.339	18.667	2	14,3	14,7	14,1	9	64,3	75,1	77,4	3	21,4	10,2	8,5
PIEMONTE	40	157.714	176.503	3	7,5	2,5	2,4	29	72,5	94,7	91,4	8	20,0	2,8	6,1
LIGURIA	43	66.703	95.042	3	7,0	2,0	14,2	34	79,1	92,9	81,6	6	14,0	5,1	4,3
LOMBARDIA	47	80.586	214.621	5	10,6	15,6	8,5	34	72,3	80,5	88,5	8	17,0	3,8	3,0
FRULLI-VENEZIA GIULIA	42	46.220	57.911	4	9,5	5,3	5,3	36	85,7	92,4	92,8	2	4,8	2,3	1,9
TRENTINO-ALTO ADIGE	5	16.144	23.968	1	20,0	7,0	4,7	4	80,0	93,0	95,3	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	108	195.618	366.871	19	17,6	11,7	12,4	77	71,3	83,3	82,9	12	11,1	5,0	4,6
EMILIA-ROMAGNA	121	160.481	348.997	1	0,8	0,0	3,4	96	79,3	90,1	91,0	24	19,8	9,9	5,6
TOSCANA	129	210.799	344.901	20	15,5	2,0	16,9	100	77,5	96,4	81,7	9	7,0	1,6	1,4
UMBRIA	123	252.212	493.505	12	9,8	2,1	12,6	104	84,6	94,2	73,3	7	5,7	3,7	11,1
MARCHE	106	177.729	259.013	10	9,4	6,1	8,9	92	86,8	92,6	89,8	4	3,8	1,3	1,4
ABRUZZO	21	45.559	102.781	5	23,8	2,5	19,4	16	76,2	97,5	80,6	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	8	19.886	21.369	2	25,0	12,1	12,2	6	75,0	87,9	87,8	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	116	181.300	369.125	64	55,2	15,3	44,5	47	40,5	81,2	53,7	5	4,3	3,5	1,8
PUGLIA	104	151.798	292.259	25	24,0	0,1	16,2	76	73,1	94,0	77,0	3	2,9	5,9	6,8
BASILICATA	20	45.593	59.661	1	5,0	1,0	0,8	19	95,0	99,0	99,2	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	24	42.766	75.247	4	16,7	10,2	6,3	18	75,0	86,5	60,9	2	8,3	3,4	32,8
SICILIA	28	55.902	60.468	1	3,6	3,6	3,9	24	85,7	90,4	90,0	3	10,7	6,0	6,1
SARDEGNA	23	44.381	110.001	6	26,1	18,0	27,5	17	73,9	82,0	72,5	0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	6	24.867	28.434	1	16,7	0,0	8,3	5	83,3	100,0	91,7	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	1.128	1.988.596	3.519.345	189	16,8	5,7	14,7	843	74,7	90,6	79,8	96	8,5	3,7	5,5

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
(LEGGES 270/97)
TAVOLA 2
NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO
PER SOGGETTO BENEFICIARIO E REGIONE

REGIONI	Numb.	Finanz. milioni	Costo milioni	INTERVENTI IN FASE PRE REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI				
				numero	%	Finanz.	%	numero	%	Finanz.	%	numero	%	Finanz.	%	numero	%	Finanz.	%	
SUB-REGIONI																				
VALLE D'AOSTA	0	5.957	0.787	0	0,0	30,5	30,1	4	50,0	56,7	50,7	2	25,0	12,0	11,2					
PEMONTE	21	116.003	125.969	2	9,5	1,3	1,2	13	71,3	37,2	35,5	1	10,0	5,0	5,0					
LOMBARDIA	22	50.160	89.307	1	4,5	26,1	15,9	10	45,5	74,9	84,1	0	0,0	0,0	0,0					
VENETIA	26	32.943	42.574	4	14,3	7,4	7,2	22	78,6	89,3	90,3	2	7,3	3,1	2,6					
TRENTINO-SOUTH TYROL	0	3.750	4.550	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0					
EMILIA-ROMAGNA	40	78.575	102.818	7	17,5	9,5	10,1	27	67,5	85,7	85,6	6	15,0	13,0	12,7					
TOSCANA	75	103.714	160.629	0	0,0	0,0	0,0	59	78,7	80,9	90,9	16	21,1	17,0	16,2					
LAZIO	65	118.807	213.578	6	9,2	1,2	1,3	51	83,1	97,5	97,2	3	4,7	1,3	1,4					
ABRUZZO	67	10.594	13.551	3	4,5	3,1	1,3	36	52,5	38,3	31,5	7	10,4	7,6	5,9					
MARCHE	5	2.874	6.074	2	40,0	40,3	42,8	1	20,0	33,1	57,2	0	0,0	0,0	0,0					
CAMPANIA	12	76.610	92.325	15	45,0	36,2	35,3	16	50,0	63,5	64,4	1	3,1	0,3	0,3					
PUGLIA	17	51.050	55.009	0	0,0	0,0	0,0	16	94,1	94,7	94,7	1	5,9	5,7	5,1					
BASILICATA	10	19.110	26.642	0	0,0	0,0	0,0	10	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0					
CALABRIA	10	9.110	11.151	7	70,0	10,2	7,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0					
SICILIA	1	2.053	3.053	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0					
SARDEGNA	15	2.101	2.107	0	0,0	20,9	20,1	5	33,3	24,7	100,0	0	0,0	0,0	0,0					
TOTALE	501	1.050.782	1.351.642	61	12,2	7,7	7,6	395	78,8	89,6	89,1	15	3,0	2,4	2,3					
SUB-REGIONI																				
VALLE D'AOSTA	6	6.382	9.000	0	0,0	0,0	0,0	5	83,3	92,7	91,9	1	16,7	7,8	6,1					
PIEMONTE	19	41.705	51.134	1	5,3	0,0	0,0	14	73,7	80,0	81,5	4	21,1	6,0	10,0					
LOMBARDIA	29	52.230	65.143	1	3,5	1,3	1,5	23	86,2	91,1	91,6	5	10,1	3,0	1,9					
VENETIA	21	30.325	42.335	0	0,0	0,0	0,0	11	52,4	50,0	50,0	0	0,0	0,0	0,0					
TRENTINO-SOUTH TYROL	1	12.343	20.018	0	0,0	0,0	0,0	3	75,0	90,0	91,0	0	0,0	0,0	0,0					
EMILIA-ROMAGNA	59	117.043	155.759	5	8,5	13,2	10,0	40	67,8	81,7	81,8	9	10,2	3,1	6,1					
TOSCANA	41	55.747	72.703	0	0,0	0,0	0,0	13	80,5	93,9	93,3	9	19,5	6,1	6,7					
LAZIO	54	47.890	76.117	5	9,1	4,5	6,4	15	92,9	92,9	91,2	4	7,4	2,6	2,5					
ABRUZZO	15	13.105	16.178	3	6,7	2,1	1,7	10	88,3	91,2	97,6	2	5,7	2,2	2,1					
MARCHE	35	60.785	90.770	0	0,0	0,0	0,0	31	91,3	97,8	97,6	2	5,7	2,2	2,1					
CAMPANIA	7	23.617	25.266	1	14,3	3,4	3,6	6	85,7	94,4	94,0	0	0,0	0,0	0,0					
PUGLIA	10	101.840	124.708	0	0,0	0,0	0,0	27	87,1	94,2	94,9	3	12,9	5,8	5,1					
BASILICATA	35	99.909	134.038	1	2,9	0,2	0,0	52	91,4	93,0	86,6	2	5,7	0,0	12,6					
CALABRIA	10	26.105	33.018	1	10,0	1,7	1,4	9	90,0	98,3	98,6	0	0,0	0,0	0,0					
SARDEGNA	13	32.916	39.128	2	15,4	10,2	9,6	10	76,9	85,5	86,1	1	7,7	1,3	1,3					
SICILIA	27	53.819	57.115	1	3,7	3,7	4,1	23	85,2	90,1	89,5	3	11,1	0,7	6,3					
SARDEGNA	5	11.398	11.899	0	0,0	0,0	0,0	5	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0					
TOTALE	490	937.014	1.196.201	22	4,0	3,4	3,1	389	94,7	91,7	89,9	10	10,5	1,9	7,0					
SUB-REGIONI																				
VALLE D'AOSTA	0	0	0																	
PIEMONTE	1	12.117	12.360	1	100,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0					
LOMBARDIA	1	82.360	82.360	1	25,0	0,0	0,0	3	75,0	0,0	95,2	0	0,0	0,0	0,0					
VENETIA	0	0	0																	
TRENTINO-SOUTH TYROL	0	0	0																	
EMILIA-ROMAGNA	5	105.665	145.665	7	77,8	18,1	10,1	2	22,2	0,0	81,9	0	0,0	0,0	0,0					
TOSCANA	10	53.206	75.719	9	90,0	91,3	91,3	1	10,0	0,0	8,7	0	0,0	0,0	0,0					
ABRUZZO	20	12.692	15.374	1	5,0	3,6	3,6	11	55,0	36,6	36,6	2	10,0	0,0	26,3					
MARCHE	1	55.374	55.374	3	50,0	33,6	33,6	3	50,0	0,0	66,4	0	0,0	0,0	0,0					
ABRUZZO	0	0	0																	
MARCHE	10	100.513	100.513	10	100,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	15,9	0	0,0	0,0	0,0					
CAMPANIA	53	102.913	102.913	24	45,3	45,3	45,3	28	53,8	54,7	54,7	0	0,0	0,0	0,0					
BASILICATA	1	22.968	22.968	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0					
SICILIA	0	0	0																	
SARDEGNA	3	54.800	54.800	7	66,7	32,1	32,1	1	33,3	0,0	67,9	0	0,0	0,0	0,0					
TOTALE	169	871.503	871.503	106	62,7	38,9	38,9	60	35,5	54,3	54,3	3	1,8	0,0	6,7					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
IN ERRE 574674

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO
PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO E REGIONE

REGIONE	N. int.	Finanz. miliardi	Costo miliardi	INTERVENTI IN FASE PRE-RELAZZATIVA			INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE			INTERVENTI COMPLETATI				
				numero	%	finanz. %	numero	%	finanz. %	numero	%	finanz. %		
ALCANTARA	5	3.765	5.489	2	40,0	48,2	2	40,0	36,6	41,3	1	20,0	15,2	10,5
VALLE D'AOSTA	7	13.656	13.656	2	28,6	10,6	5	71,4	89,4	89,4	0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	14	26.243	49.945	3	21,4	37,5	10	71,4	62,0	62,7	2	14,3	10,3	6,0
EMILIA	19	10.591	27.300	4	21,1	13,1	14	73,7	66,8	60,7	1	5,1	3,6	2,4
FRILAVENEZIA GIULIA	1	1.153	1.153	1	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO ALTO ADIGE	32	33.373	65.486	10	31,3	19,3	17	53,1	79,6	74,6	5	15,6	7,1	5,2
EMILIA ROMAGNA	26	15.364	46.346	0	0,0	0,0	23	88,5	51,6	53,6	3	11,5	8,3	6,2
TOSCANA	50	25.365	106.372	7	14,0	1,2	40	80,0	39,2	30,6	2	4,0	0,3	0,7
MARCHE	16	31.057	31.057	0	0,0	0,0	16	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	16	15.443	18.423	3	18,8	30,9	9	56,3	45,4	45,4	2	12,5	3,0	1,5
MOLISE	5	5.074	6.074	3	60,0	7,1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	17	51.456	89.832	2	11,8	42,0	3	17,6	59,1	57,2	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	27	39.262	67.638	6	22,2	15,1	16	59,3	54,5	57,8	1	3,7	2,7	2,0
BASILICATA	5	5.340	6.340	0	0,0	0,0	5	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	1	1.000	1.000	0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	1	6.301	11.301	2	50,0	48,0	2	50,0	51,1	51,1	0	0,0	0,0	0,0
ADIRIO INDEBITATO	5	17.867	20.534	1	20,0	0,0	4	80,0	100,0	88,7	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	311	501.797	771.067	77	24,8	13,5	215	69,1	64,5	76,8	13	4,1	2,0	1,7
VALLE D'AOSTA	5	1.035	1.035	0	0,0	0,0	4	80,0	105,3	93,6	1	20,0	11,7	6,1
PIEMONTE	16	20.243	40.898	2	12,5	4,9	11	68,8	62,7	62,8	2	12,5	12,1	21,6
LIGURIA	14	16.148	101.091	0	0,0	0,0	8	57,1	74,8	94,1	3	21,1	7,1	1,2
FRILAVENEZIA GIULIA	1	1.153	1.153	0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO ALTO ADIGE	32	33.373	65.486	7	21,9	2,9	25	78,1	66,9	66,3	3	9,4	2,4	1,5
EMILIA ROMAGNA	26	15.364	46.346	0	0,0	0,0	26	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	50	25.365	106.372	7	14,0	1,2	43	86,0	69,7	69,7	0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	16	15.443	18.423	0	0,0	0,0	16	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	16	15.443	18.423	3	18,8	30,9	9	56,3	45,4	45,4	2	12,5	3,0	1,5
MOLISE	5	5.074	6.074	2	40,0	42,0	3	60,0	59,1	57,2	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	17	51.456	89.832	20	54,1	15,1	16	43,2	54,5	57,8	1	2,7	0,0	0,0
PUGLIA	27	39.262	67.638	0	0,0	0,0	27	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
BASILICATA	5	5.340	6.340	0	0,0	0,0	5	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	1	1.000	1.000	0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	1	6.301	11.301	2	50,0	48,0	2	50,0	51,1	51,1	0	0,0	0,0	0,0
ADIRIO INDEBITATO	5	17.867	20.534	1	20,0	0,0	4	80,0	100,0	88,7	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	311	501.797	771.067	77	24,8	13,5	215	69,1	64,5	76,8	13	4,1	2,0	1,7
VALLE D'AOSTA	5	1.035	1.035	0	0,0	0,0	4	80,0	105,3	93,6	1	20,0	11,7	6,1
PIEMONTE	16	20.243	40.898	2	12,5	4,9	11	68,8	62,7	62,8	2	12,5	12,1	21,6
LIGURIA	14	16.148	101.091	0	0,0	0,0	8	57,1	74,8	94,1	3	21,1	7,1	1,2
FRILAVENEZIA GIULIA	1	1.153	1.153	0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO ALTO ADIGE	32	33.373	65.486	7	21,9	2,9	25	78,1	66,9	66,3	3	9,4	2,4	1,5
EMILIA ROMAGNA	26	15.364	46.346	0	0,0	0,0	26	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	50	25.365	106.372	7	14,0	1,2	43	86,0	69,7	69,7	0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	16	15.443	18.423	0	0,0	0,0	16	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	16	15.443	18.423	3	18,8	30,9	9	56,3	45,4	45,4	2	12,5	3,0	1,5
MOLISE	5	5.074	6.074	2	40,0	42,0	3	60,0	59,1	57,2	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	17	51.456	89.832	20	54,1	15,1	16	43,2	54,5	57,8	1	2,7	0,0	0,0
PUGLIA	27	39.262	67.638	0	0,0	0,0	27	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
BASILICATA	5	5.340	6.340	0	0,0	0,0	5	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	1	1.000	1.000	0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	1	6.301	11.301	2	50,0	48,0	2	50,0	51,1	51,1	0	0,0	0,0	0,0
ADIRIO INDEBITATO	5	17.867	20.534	1	20,0	0,0	4	80,0	100,0	88,7	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	311	501.797	771.067	77	24,8	13,5	215	69,1	64,5	76,8	13	4,1	2,0	1,7
VALLE D'AOSTA	5	1.035	1.035	0	0,0	0,0	4	80,0	105,3	93,6	1	20,0	11,7	6,1
PIEMONTE	16	20.243	40.898	2	12,5	4,9	11	68,8	62,7	62,8	2	12,5	12,1	21,6
LIGURIA	14	16.148	101.091	0	0,0	0,0	8	57,1	74,8	94,1	3	21,1	7,1	1,2
FRILAVENEZIA GIULIA	1	1.153	1.153	0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO ALTO ADIGE	32	33.373	65.486	7	21,9	2,9	25	78,1	66,9	66,3	3	9,4	2,4	1,5
EMILIA ROMAGNA	26	15.364	46.346	0	0,0	0,0	26	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	50	25.365	106.372	7	14,0	1,2	43	86,0	69,7	69,7	0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	16	15.443	18.423	0	0,0	0,0	16	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	16	15.443	18.423	3	18,8	30,9	9	56,3	45,4	45,4	2	12,5	3,0	1,5
MOLISE	5	5.074	6.074	2	40,0	42,0	3	60,0	59,1	57,2	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	17	51.456	89.832	20	54,1	15,1	16	43,2	54,5	57,8	1	2,7	0,0	0,0
PUGLIA	27	39.262	67.638	0	0,0	0,0	27	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
BASILICATA	5	5.340	6.340	0	0,0	0,0	5	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	1	1.000	1.000	0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	1	6.301	11.301	2	50,0	48,0	2	50,0	51,1	51,1	0	0,0	0,0	0,0
ADIRIO INDEBITATO	5	17.867	20.534	1	20,0	0,0	4	80,0	100,0	88,7	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	311	501.797	771.067	77	24,8	13,5	215	69,1	64,5	76,8	13	4,1	2,0	1,7
VALLE D'AOSTA	5	1.035	1.035	0	0,0	0,0	4	80,0	105,3	93,6	1	20,0	11,7	6,1
PIEMONTE	16	20.243	40.898	2	12,5	4,9	11	68,8	62,7	62,8	2	12,5	12,1	21,6
LIGURIA	14	16.148	101.091	0	0,0	0,0	8	57,1	74,8	94,1	3	21,1	7,1	1,2
FRILAVENEZIA GIULIA	1	1.153	1.153	0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO ALTO ADIGE	32	33.373	65.486	7	21,9	2,9	25	78,1	66,9	66,3	3	9,4	2,4	1,5
EMILIA ROMAGNA	26	15.364	46.346	0	0,0	0,0	26	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	50	25.365	106.372	7	14,0	1,2	43	86,0	69,7	69,7	0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	16	15.443	18.423	0	0,0	0,0	16	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	16	15.443	18.423	3	18,8	30,9	9	56,3	45,4	45,4	2	12,5	3,0	1,5
MOL														

3.2. Il Piano per Regioni - Stato di attuazione al 30 settembre 1999

3.2.1. Regione Abruzzo

Grafico A1a - REGIONE ABRUZZO
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

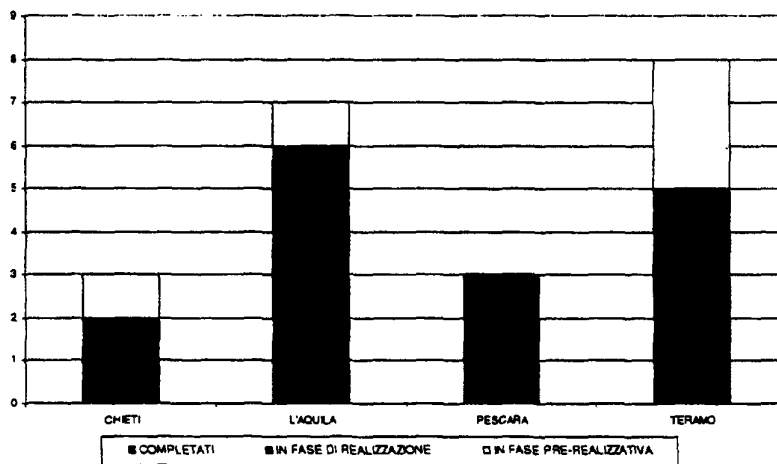


Grafico A 2b - REGIONE ABRUZZO
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


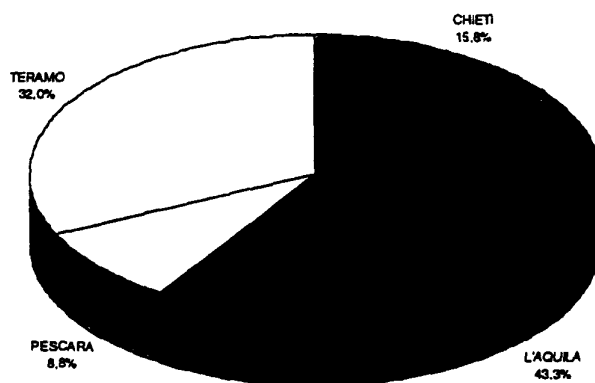


Grafico A 3 - REGIONE ABRUZZO
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

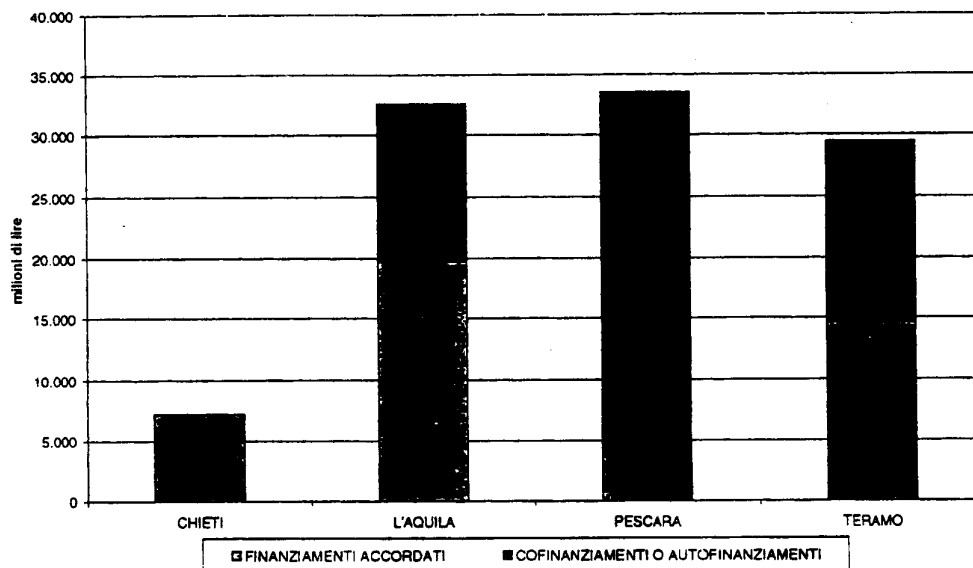

3.2.2. Regione Basilicata

Grafico A1a - REGIONE BASILICATA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

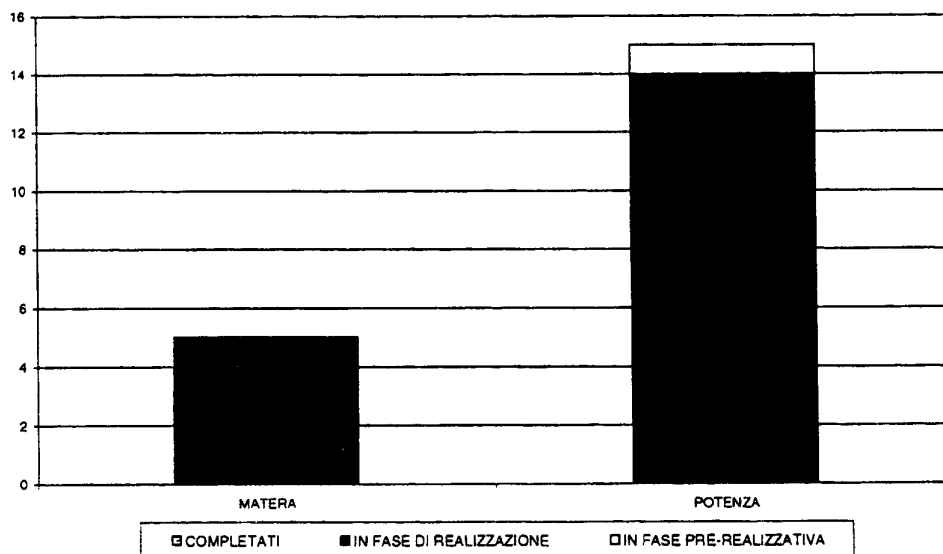


Grafico A 2b - REGIONE BASILICATA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


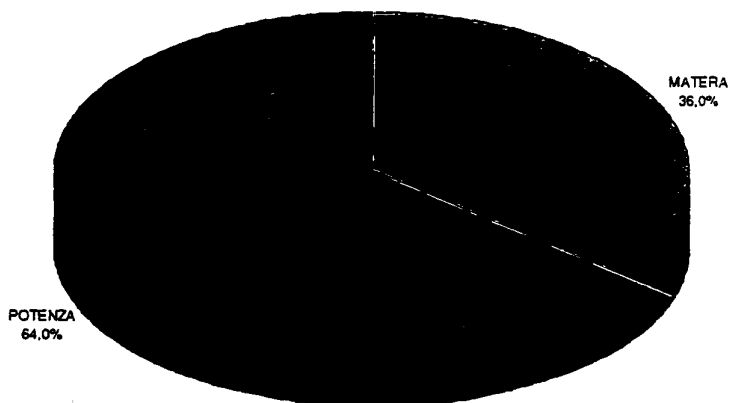


Grafico A 3 - REGIONE BASILICATA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

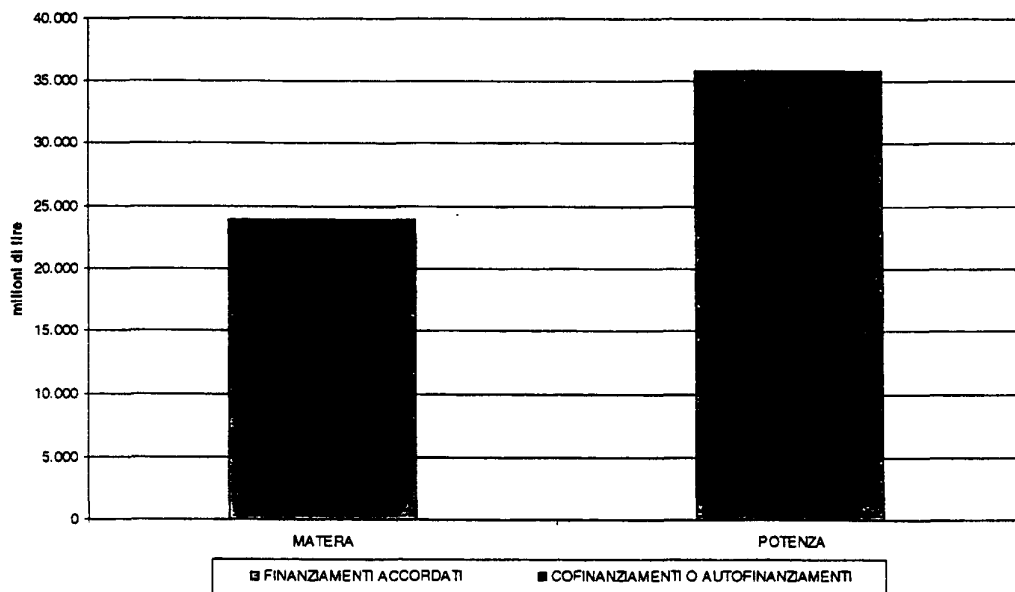

3.2.3. Regione Calabria

Grafico A1a - REGIONE CALABRIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

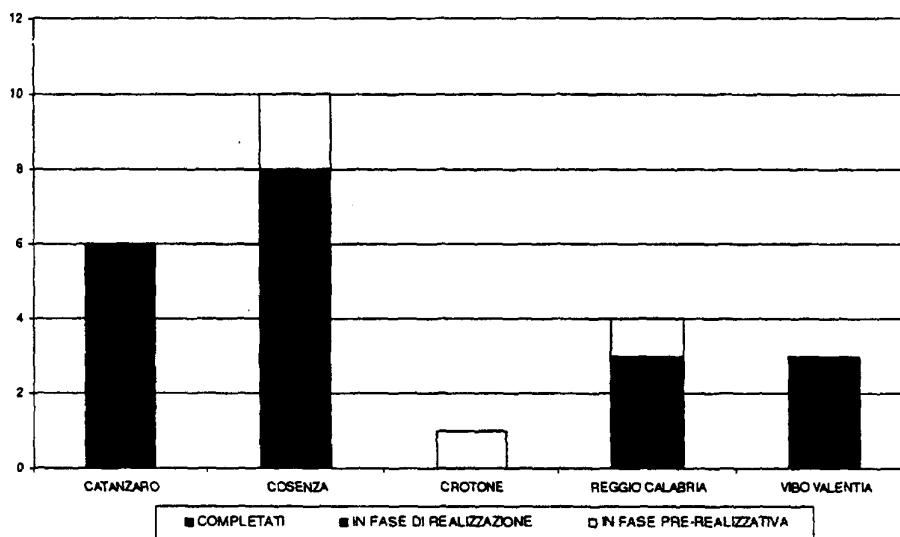


Grafico A 2b - REGIONE CALABRIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER PROVINCIA


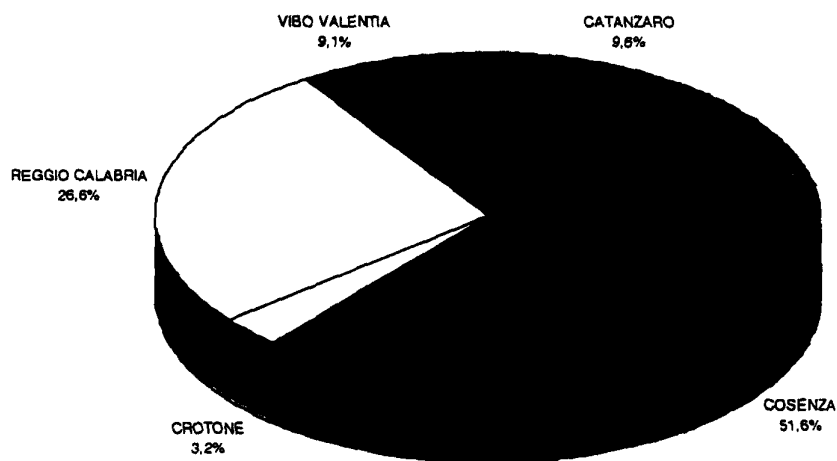


Grafico A 3 - REGIONE CALABRIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

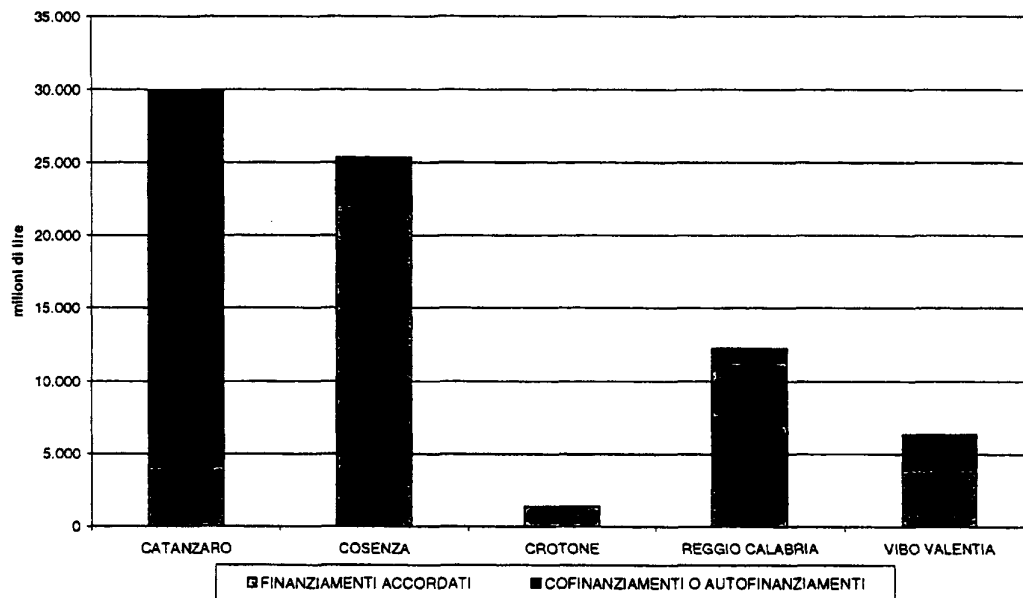

3.2.4. Regione Campania

Grafico A1a - REGIONE CAMPANIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

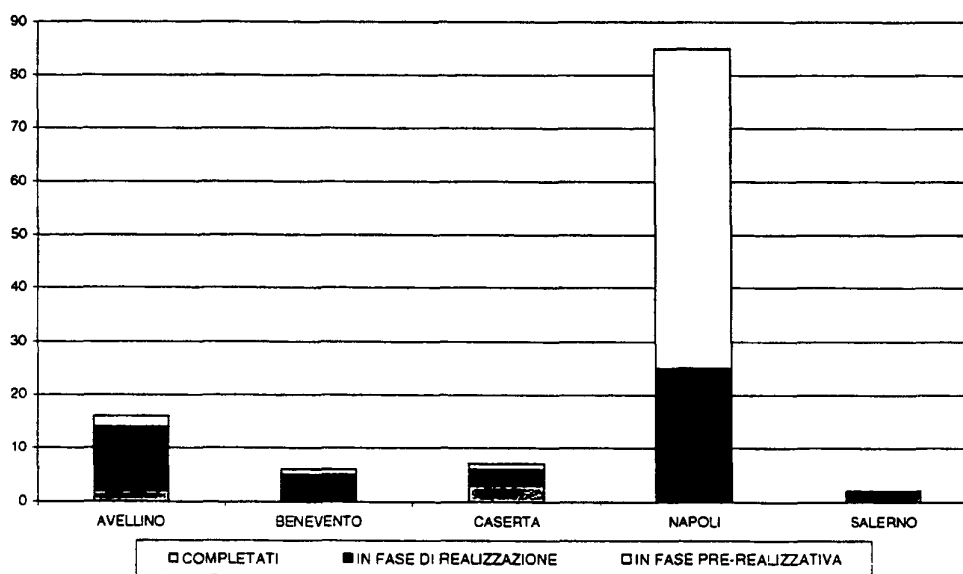


Grafico A 2b - REGIONE CAMPANIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


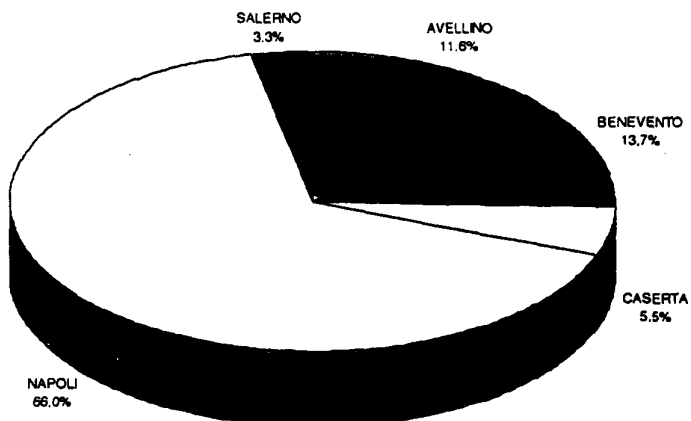


Grafico A 3 - REGIONE CAMPANIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

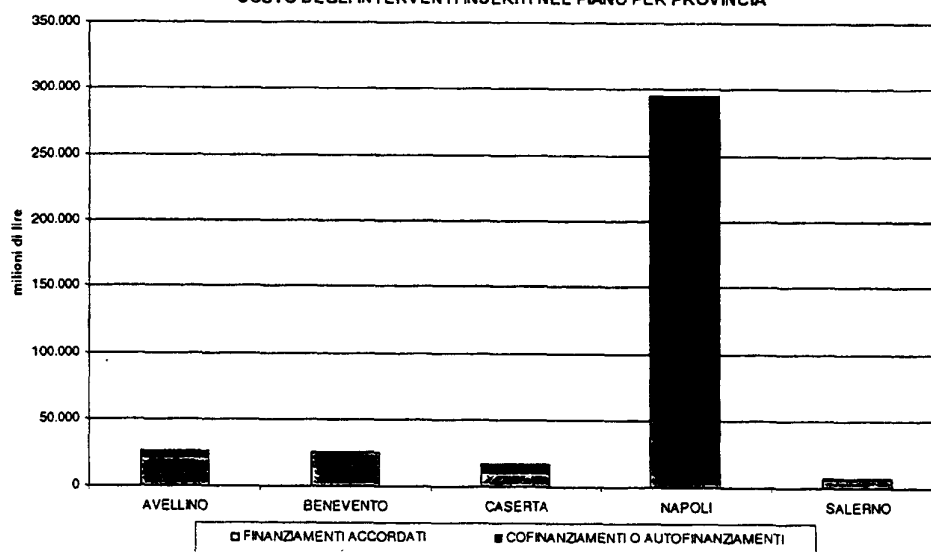

3.2.5. Regione Emilia Romagna

Grafico A1a - REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

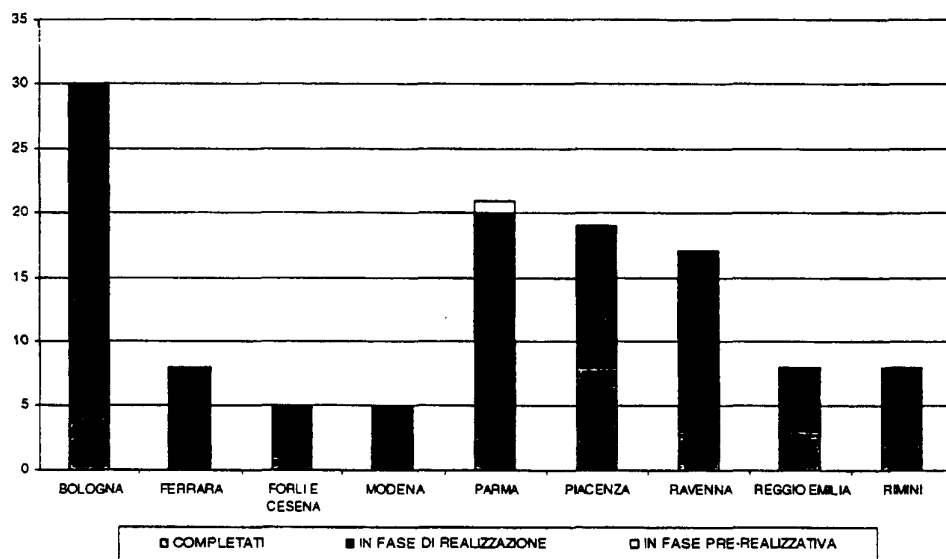


Grafico A 2b - REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA



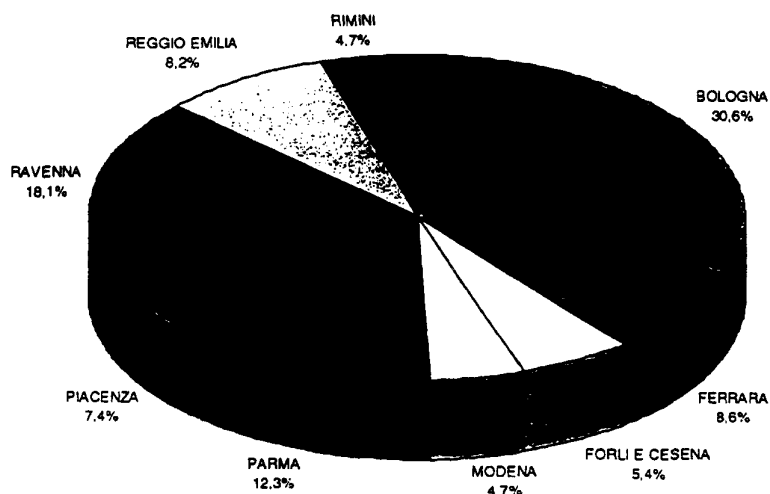


Grafico A 3 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

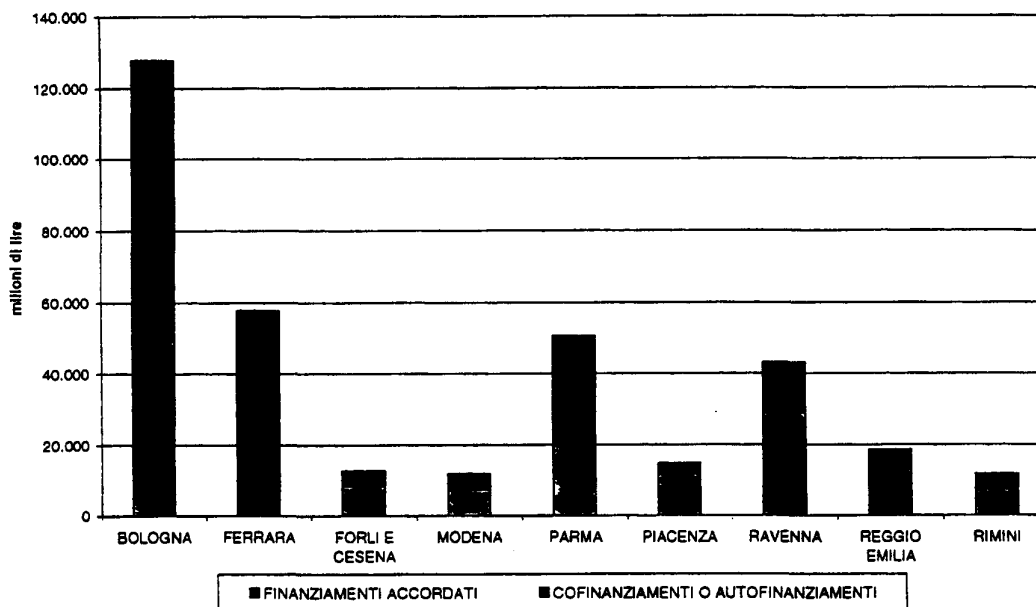

3.2.6. Regione Friuli

Grafico A1a - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

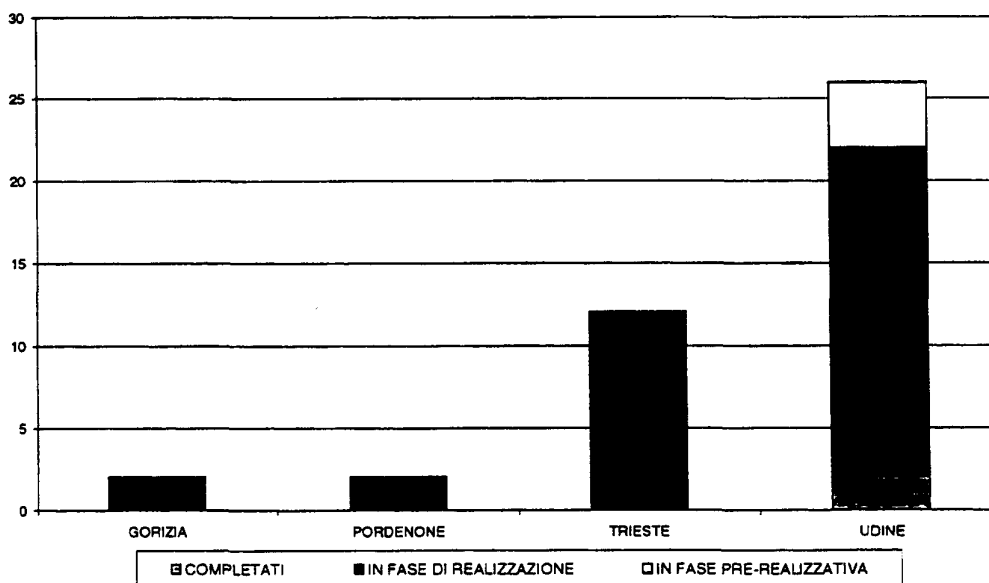

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Grafico A 2b - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


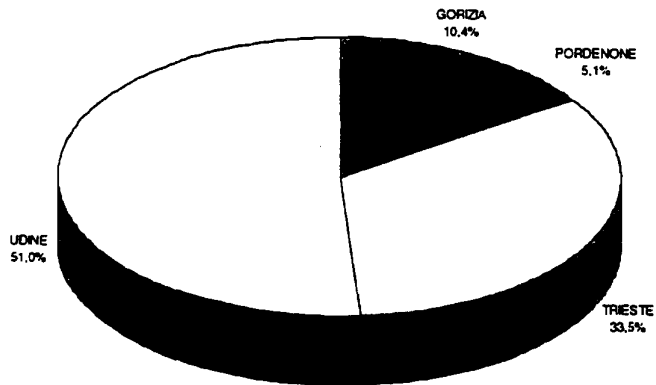


Grafico A 3 - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

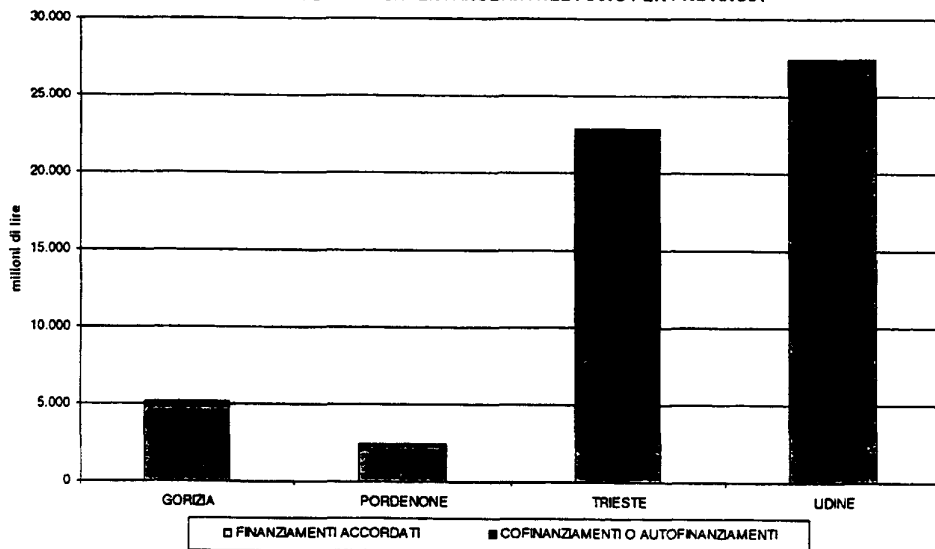

3.2.7. Regione Liguria

Grafico A1a - REGIONE LIGURIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA



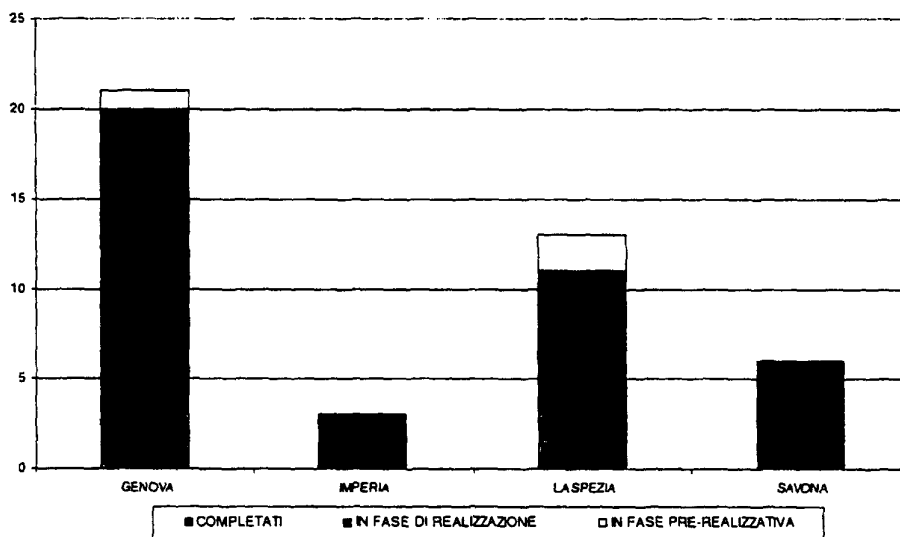


Grafico A 2b - REGIONE LIGURIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER PROVINCIA

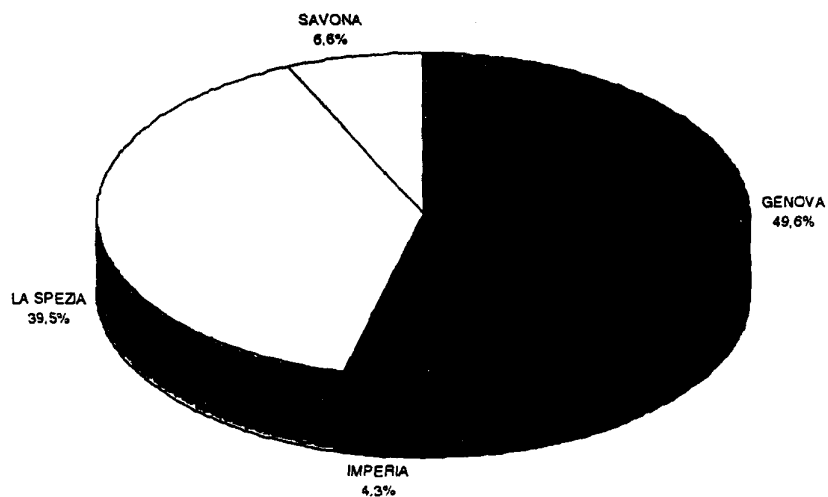

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Grafico A 3 - REGIONE LIGURIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

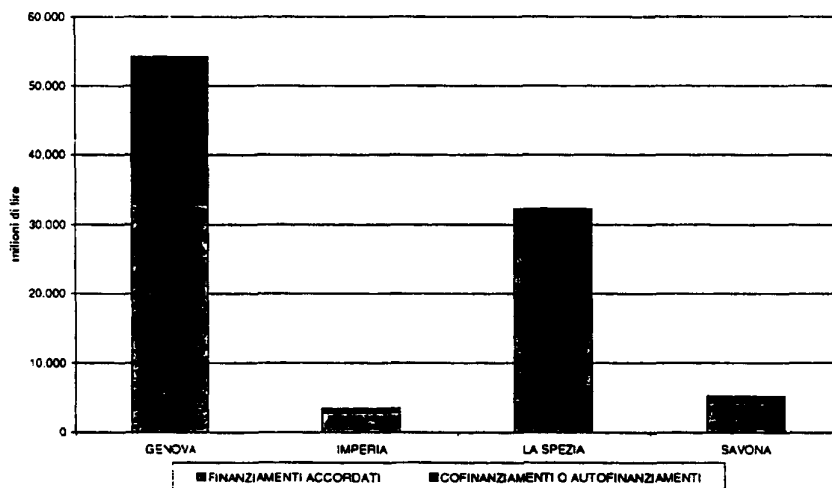

3.2.8. Regione Lombardia

Grafico A1a - REGIONE LOMBARDIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

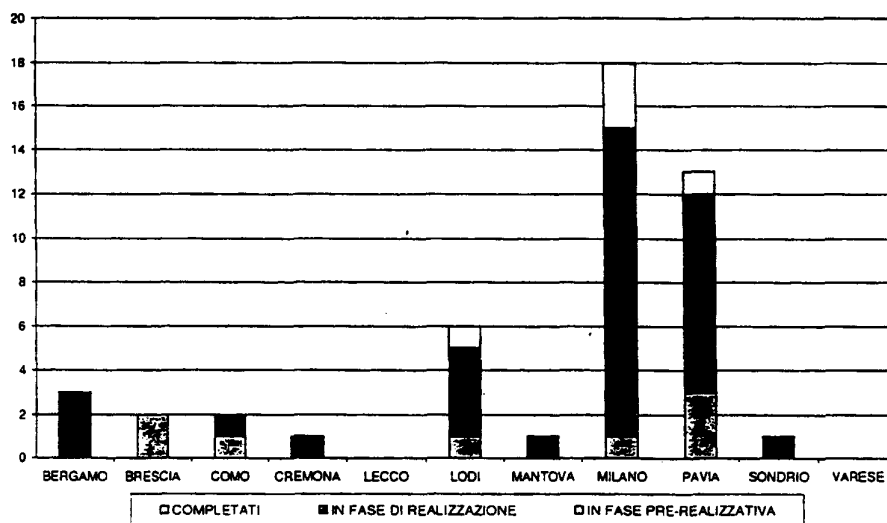


Grafico A 2b - REGIONE LOMBARDA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


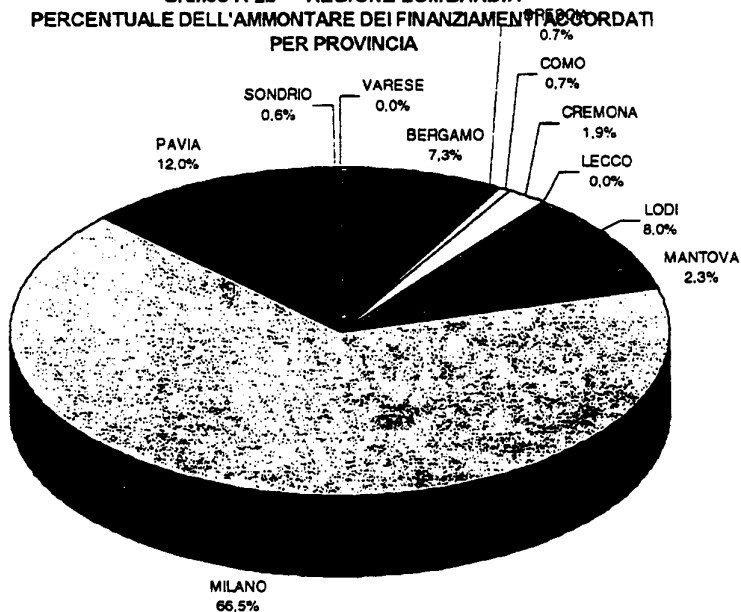


Grafico A 3 - REGIONE LOMBARDA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

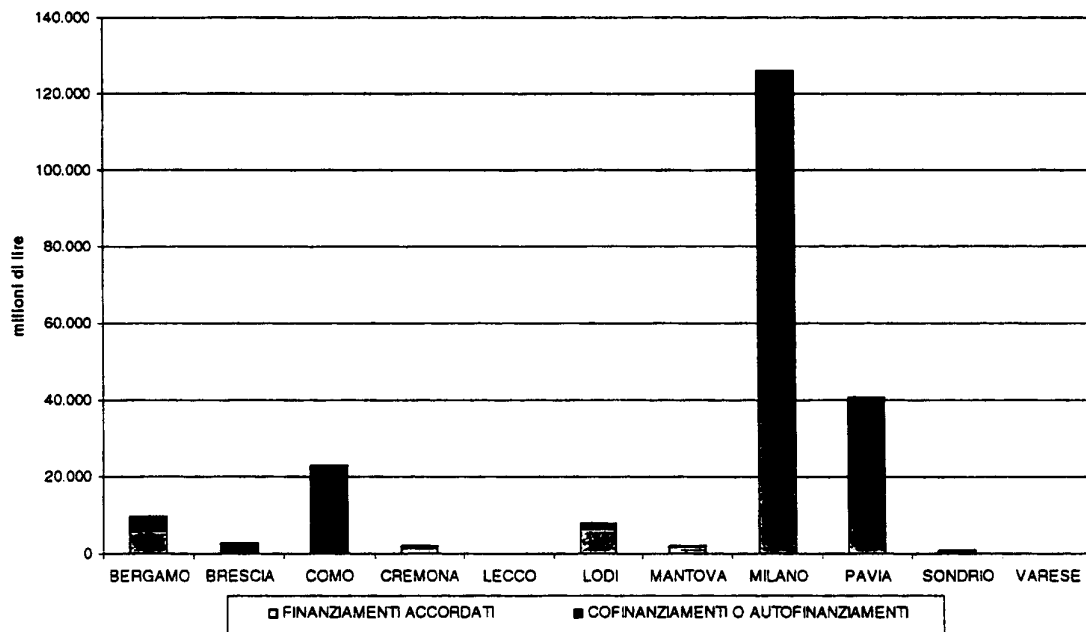

3.2.9. Regione Marche

Grafico A1a - REGIONE MARCHE
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

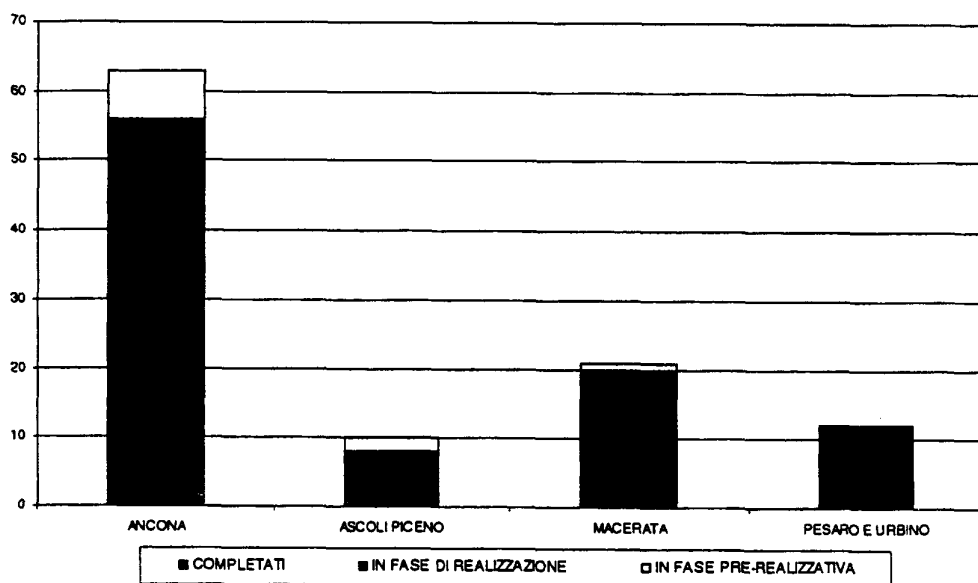


Grafico A 2b - REGIONE MARCHE
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER PROVINCIA


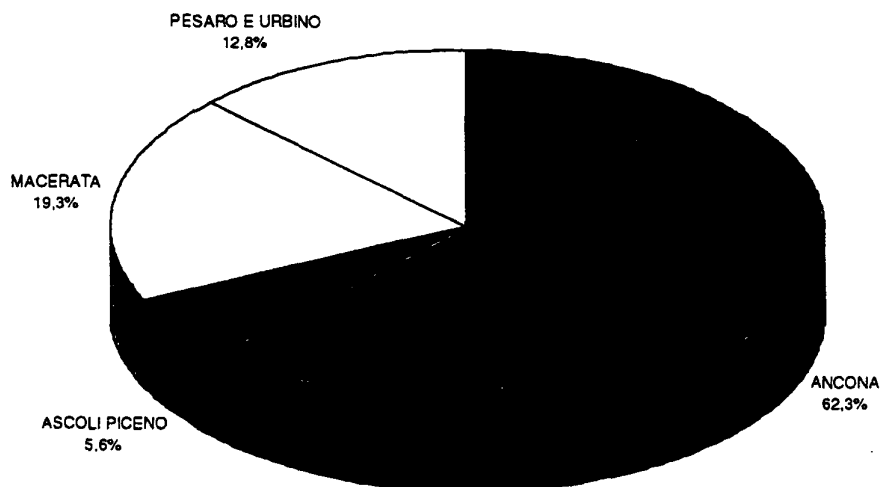


Grafico A 3 - REGIONE MARCHE
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

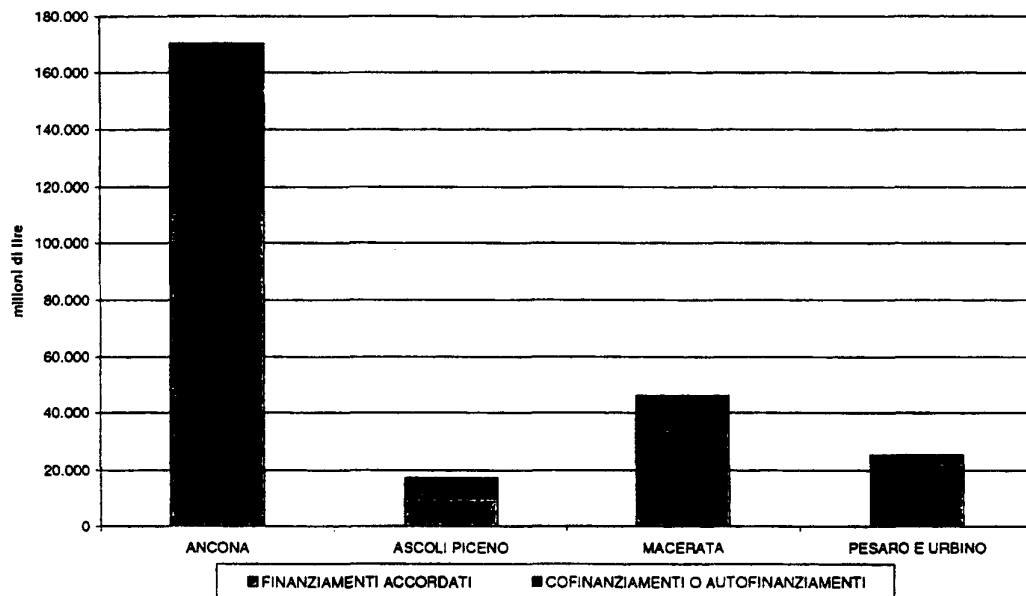

3.2.10. Regione Molise

Grafico A1a - REGIONE MOLISE
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

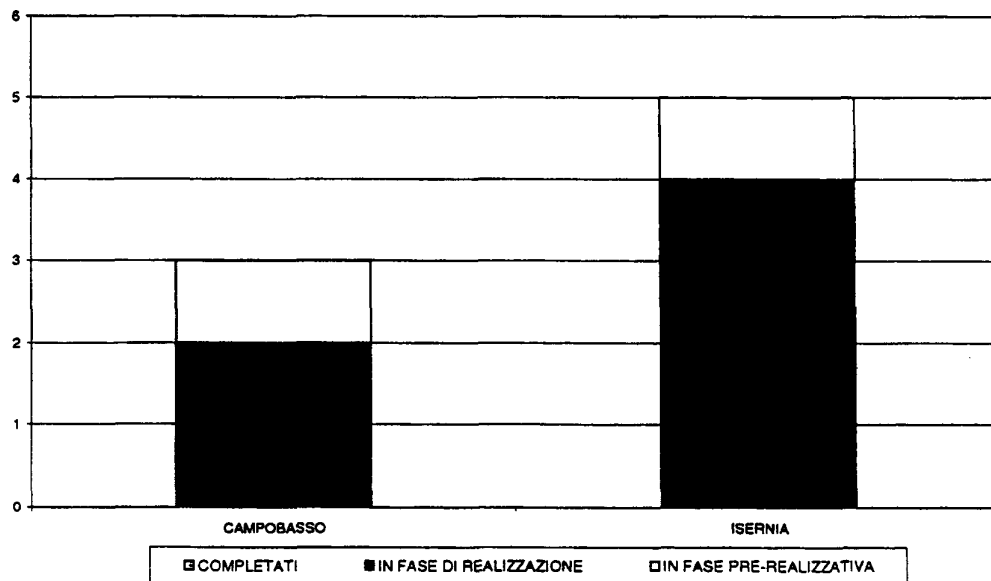


Grafico A 2b - REGIONE MOLISE
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


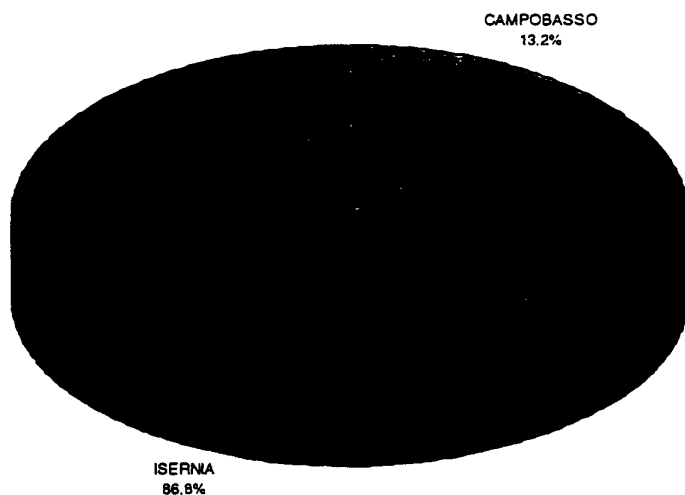


Grafico A 3 - REGIONE MOLISE
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

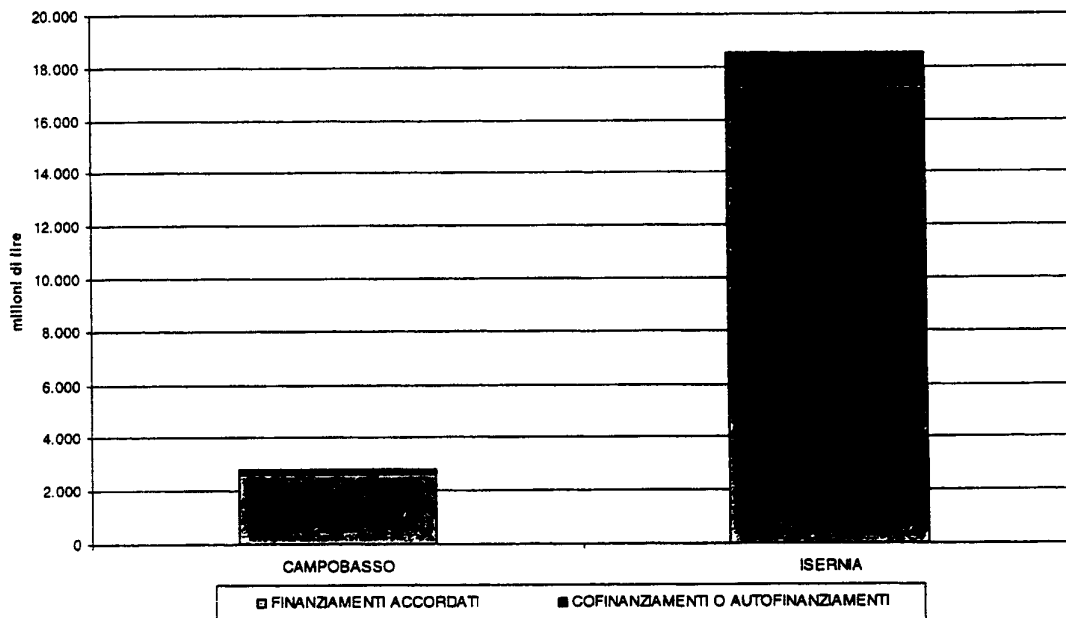

3.2.11. Regione Piemonte

Grafico A1a - REGIONE PIEMONTE
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

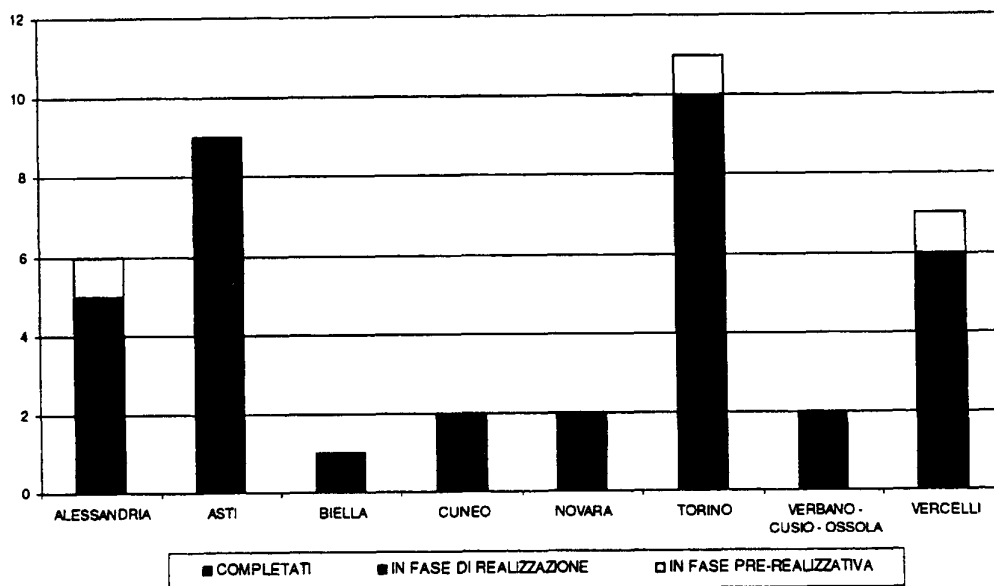


Grafico A 2b - REGIONE PIEMONTE
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER PROVINCIA


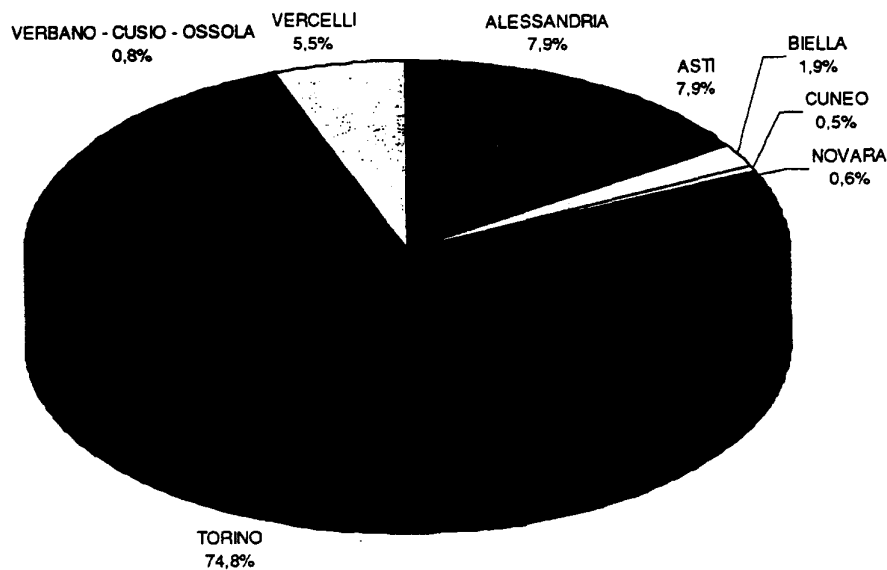


Grafico A 3 - REGIONE PIEMONTE
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

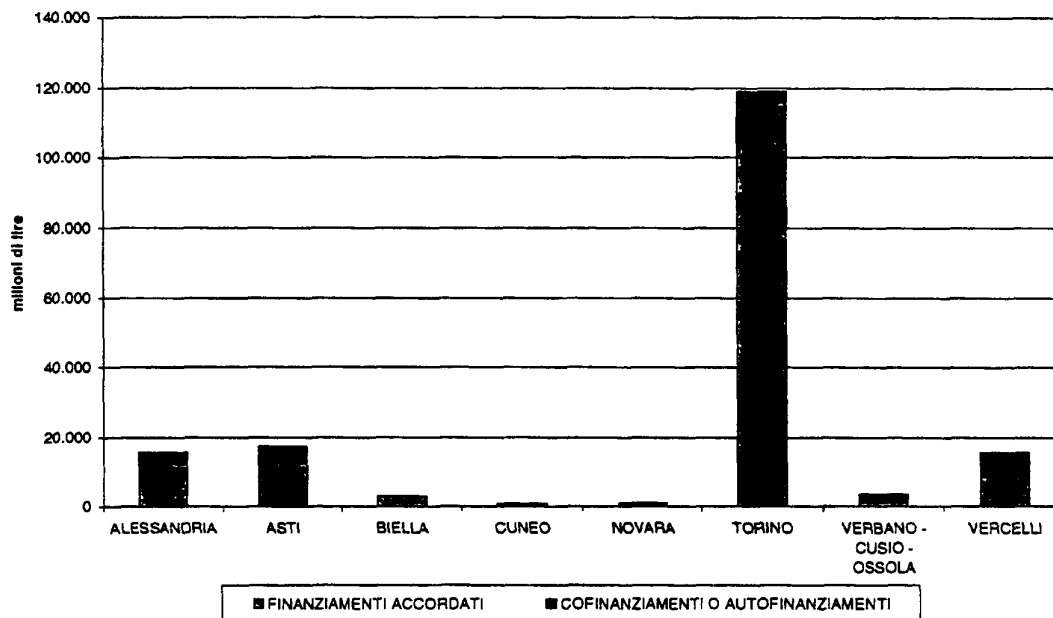

3.2.12. Regione Puglia

Grafico A1a - REGIONE PUGLIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

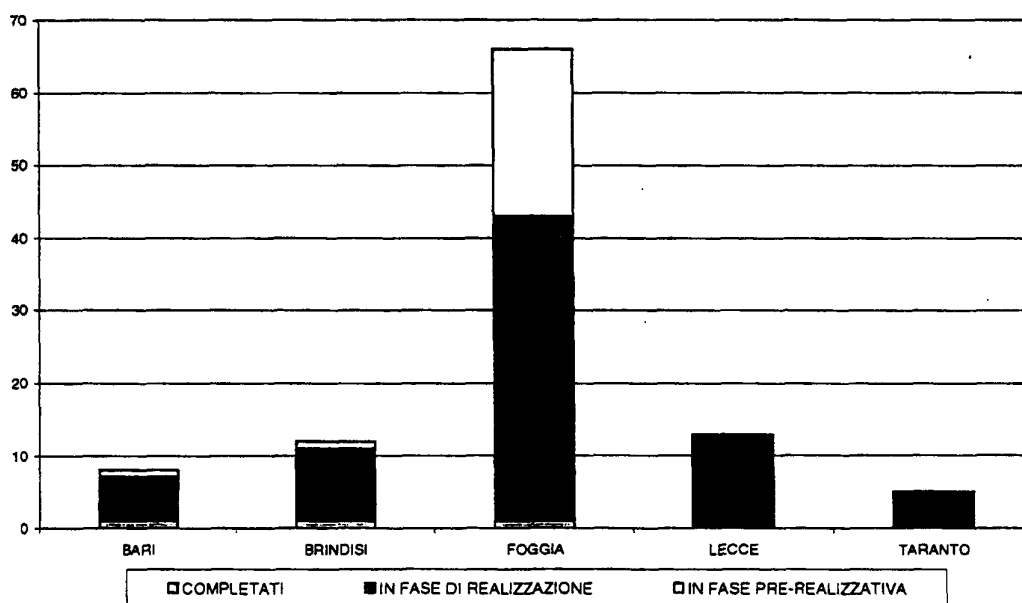


Grafico A 2b - REGIONE PUGLIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


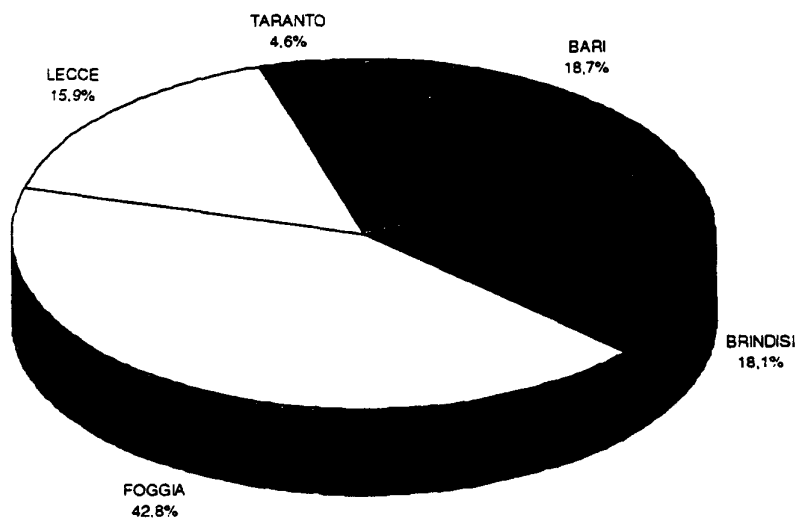


Grafico A 3 - REGIONE PUGLIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

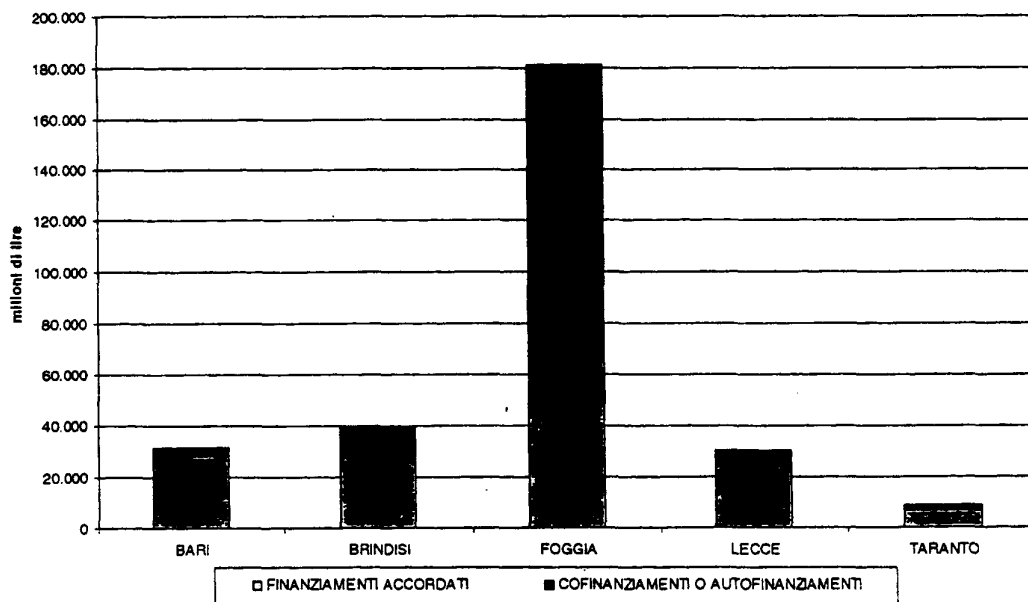

3.2.13. Regione Sardegna

Grafico A1a - REGIONE SARDEGNA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

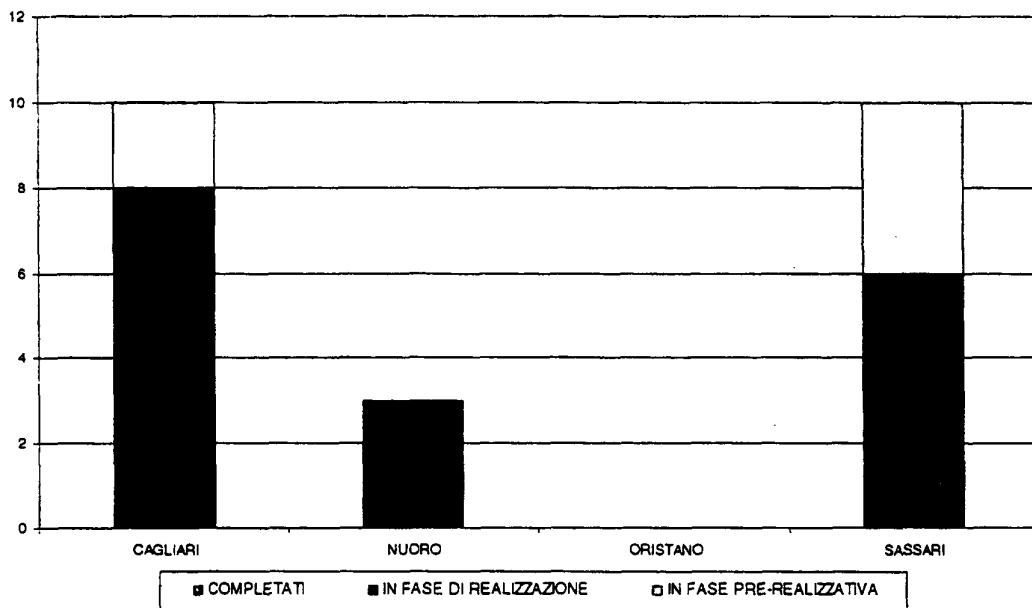


Grafico A 2b - REGIONE SARDEGNA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER PROVINCIA


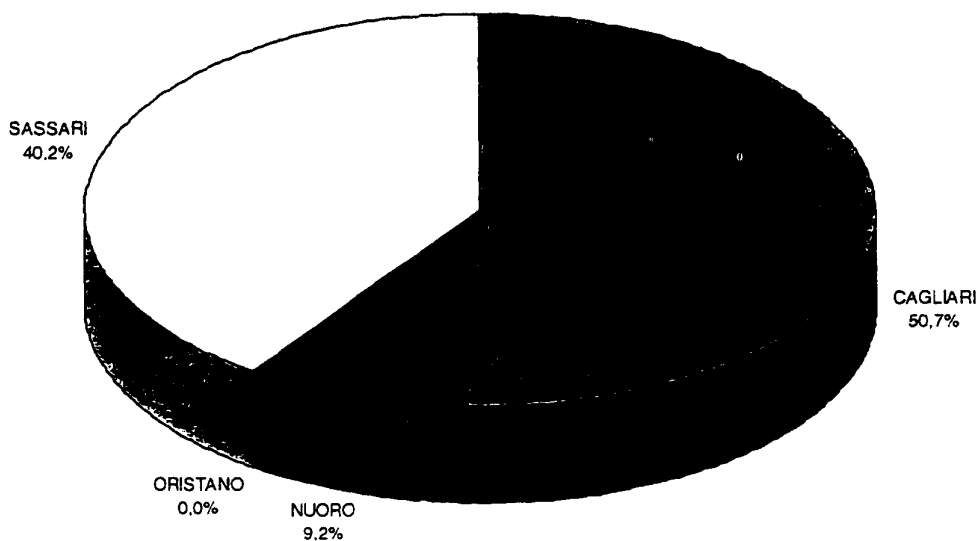


Grafico A 3 - REGIONE SARDEGNA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

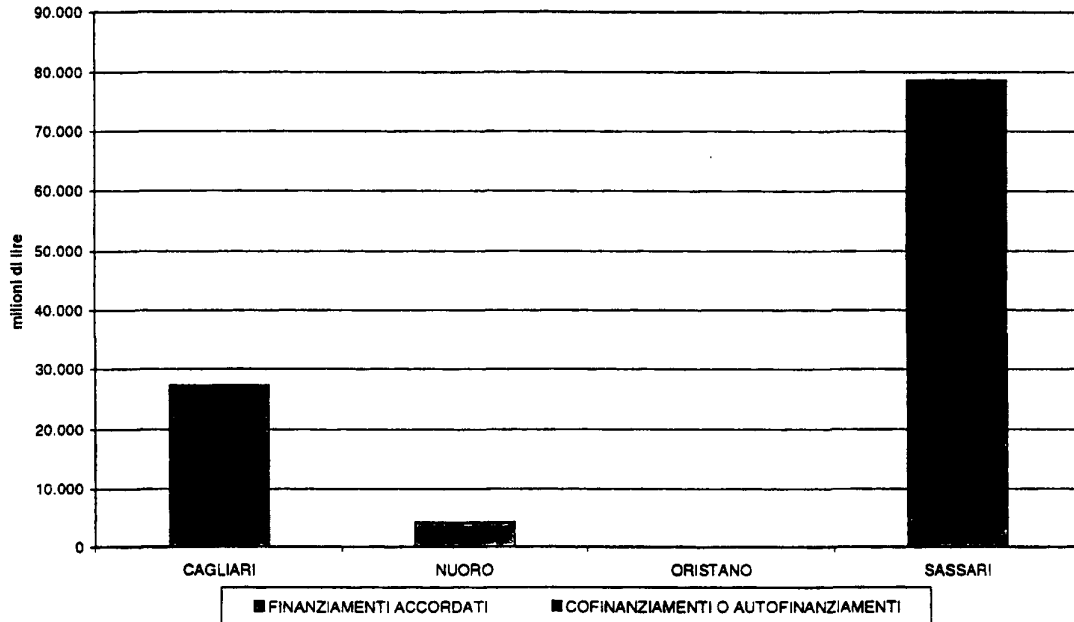

3.2.14. Regione Sicilia

Grafico A1a - REGIONE SICILIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

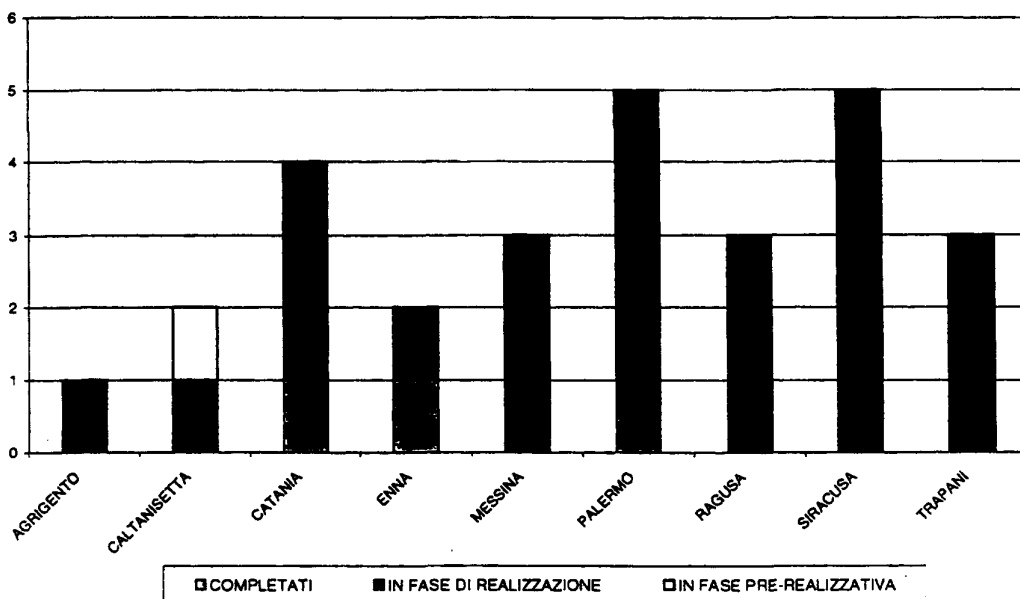


Grafico A 2b - REGIONE SICILIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


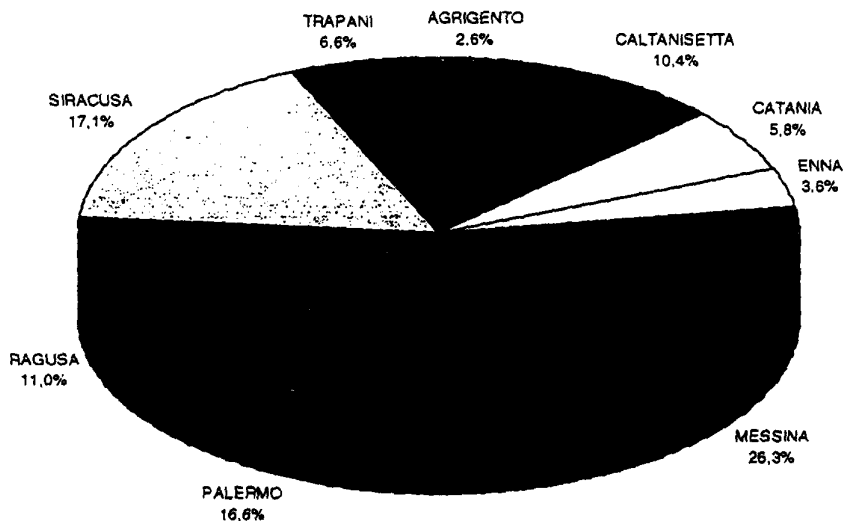


Grafico A 3 - REGIONE SICILIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

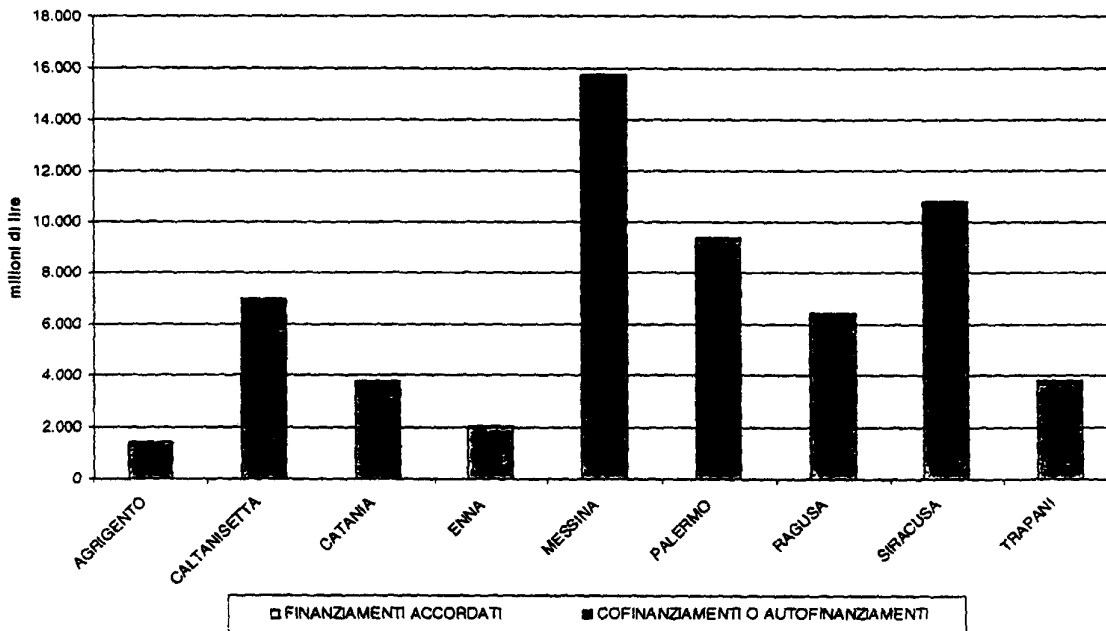

3.2.15. Regione Toscana

Grafico A1a - REGIONE TOSCANA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

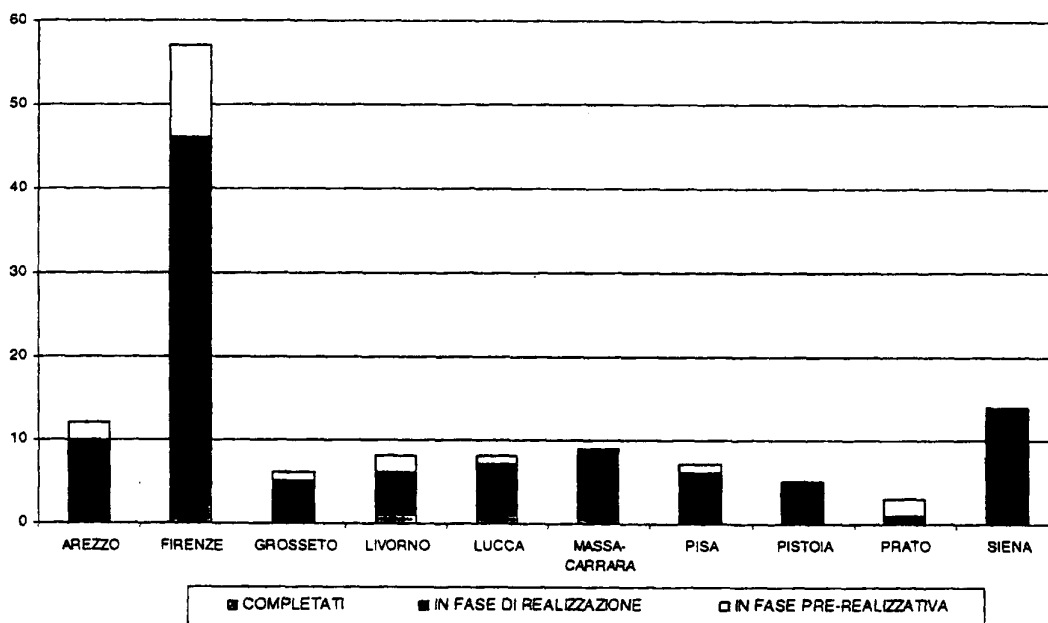


Grafico A 2b - REGIONE TOSCANA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER PROVINCIA


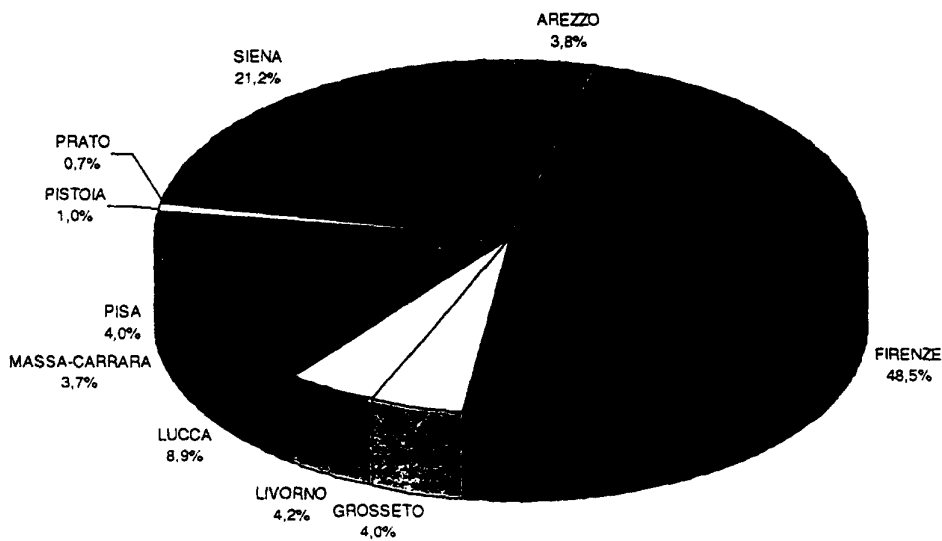


Grafico A 3 - REGIONE TOSCANA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

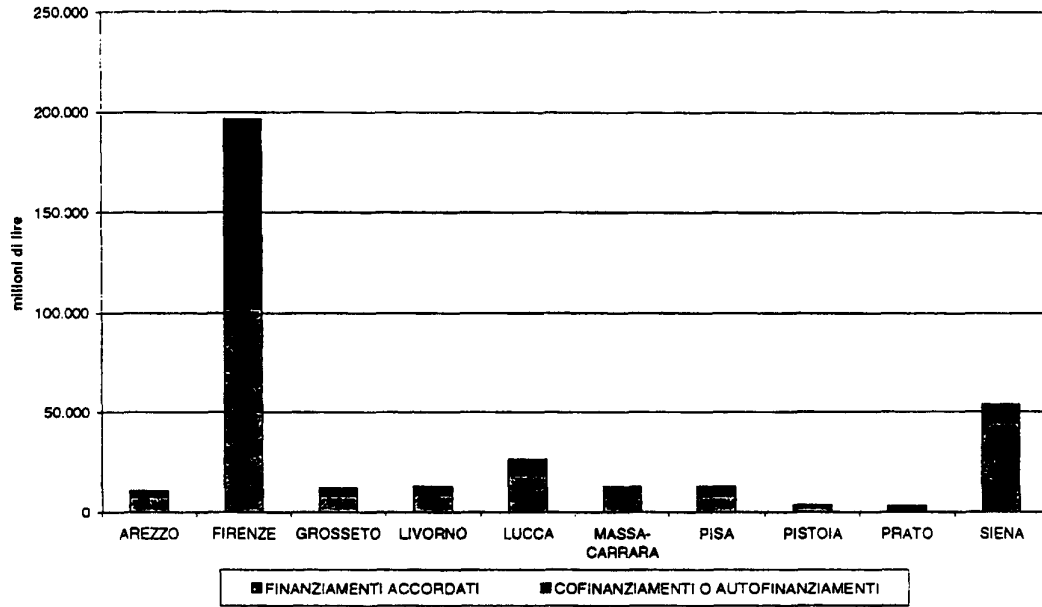

3.2.16. Regione Trentino Alto Adige

Grafico A1a - REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

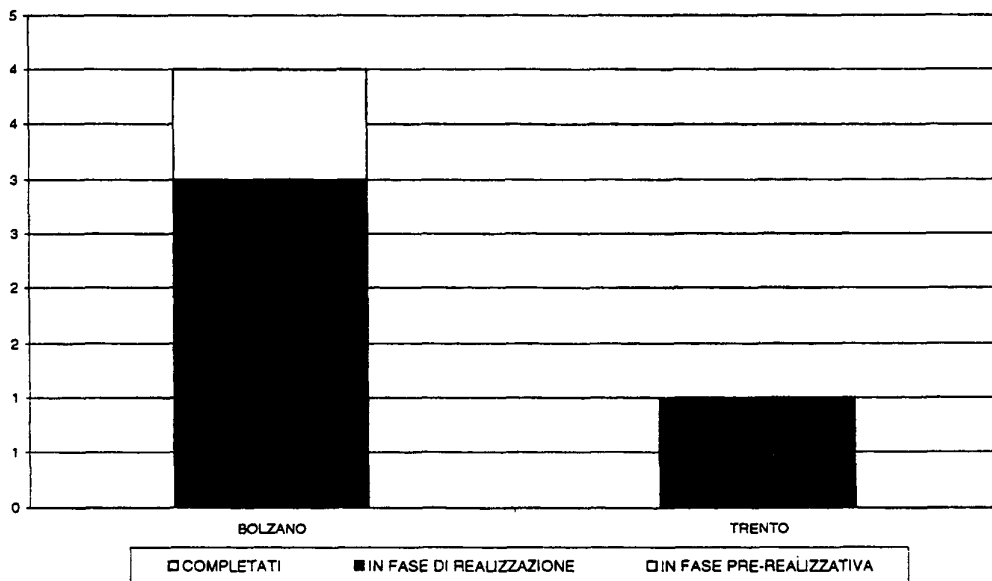


Grafico A 2b - REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


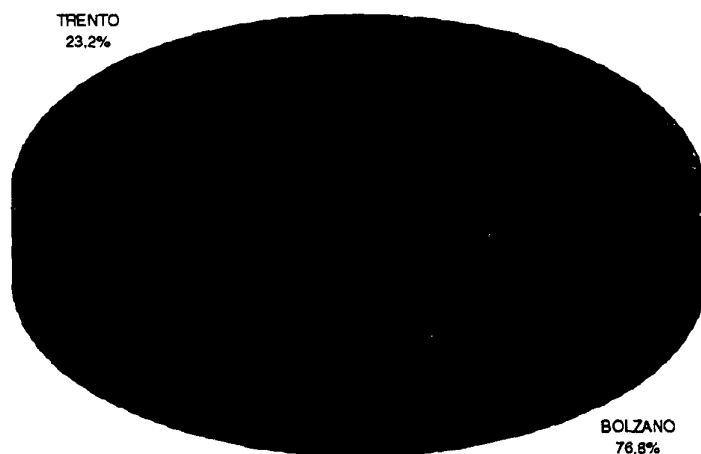


Grafico A 3 - REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

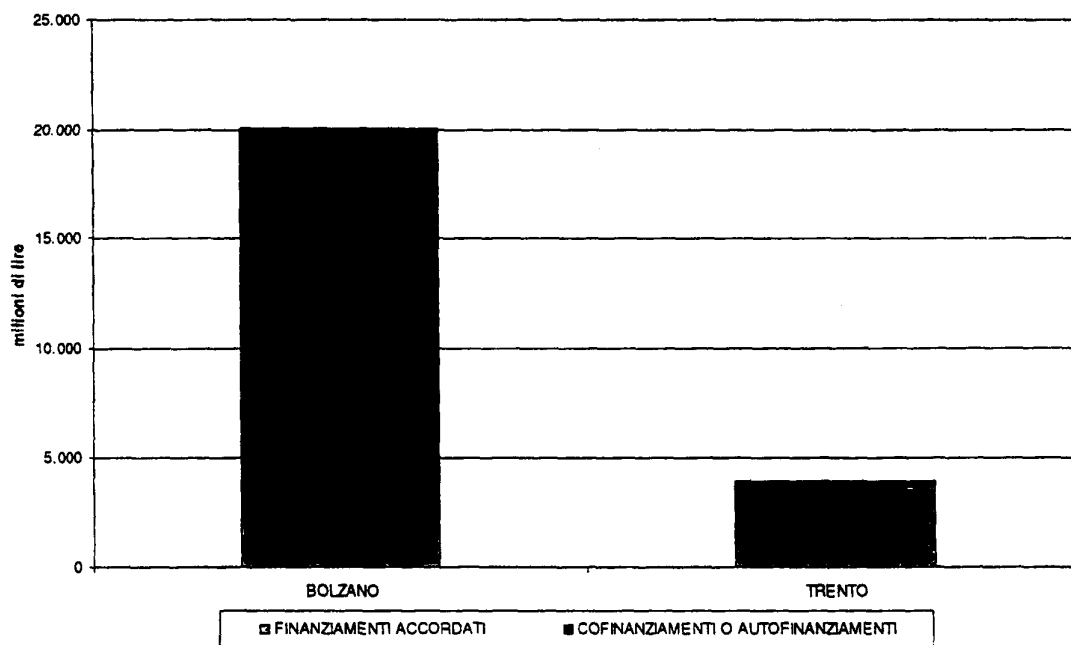

3.2.17. Regione Umbria

Grafico A1a - REGIONE UMBRIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

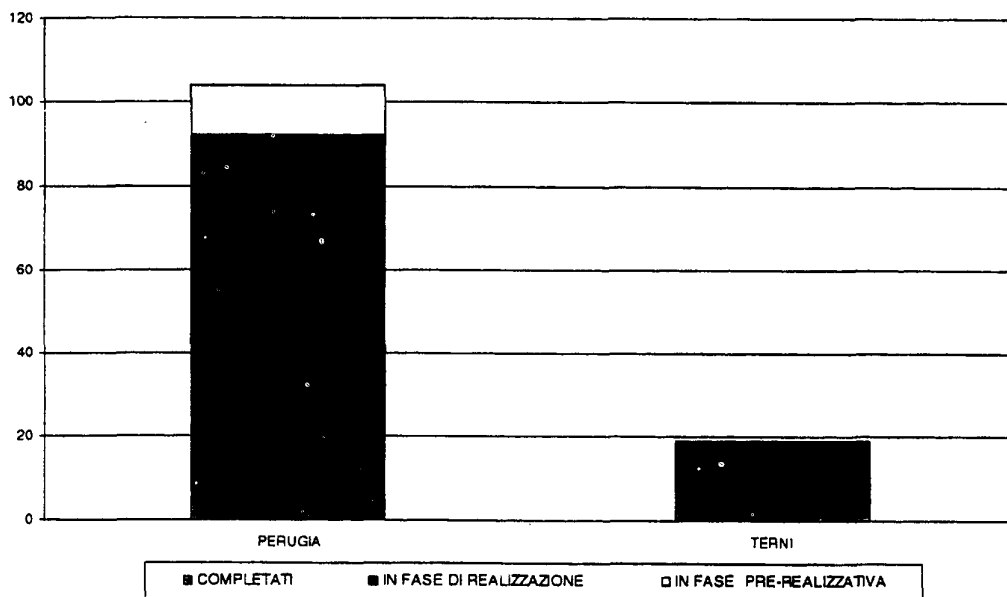


Grafico A 2b - REGIONE UMBRIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER PROVINCIA





Grafico A 3 - REGIONE UMBRIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

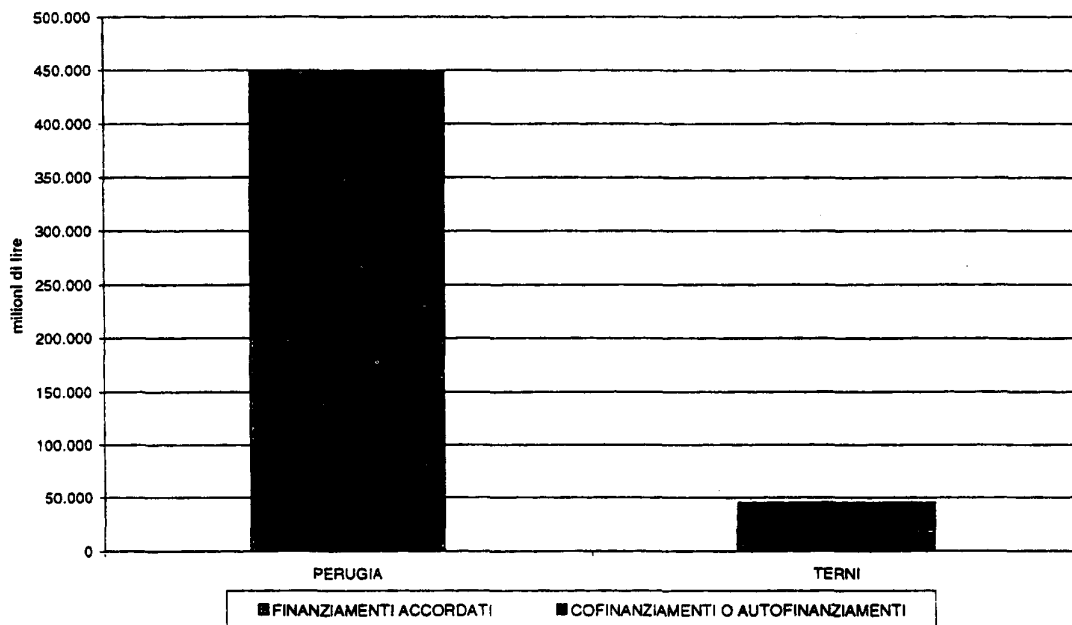

3.2.18. Regione Valle d'Aosta

Grafico A1a - REGIONE VALLE D'AOSTA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

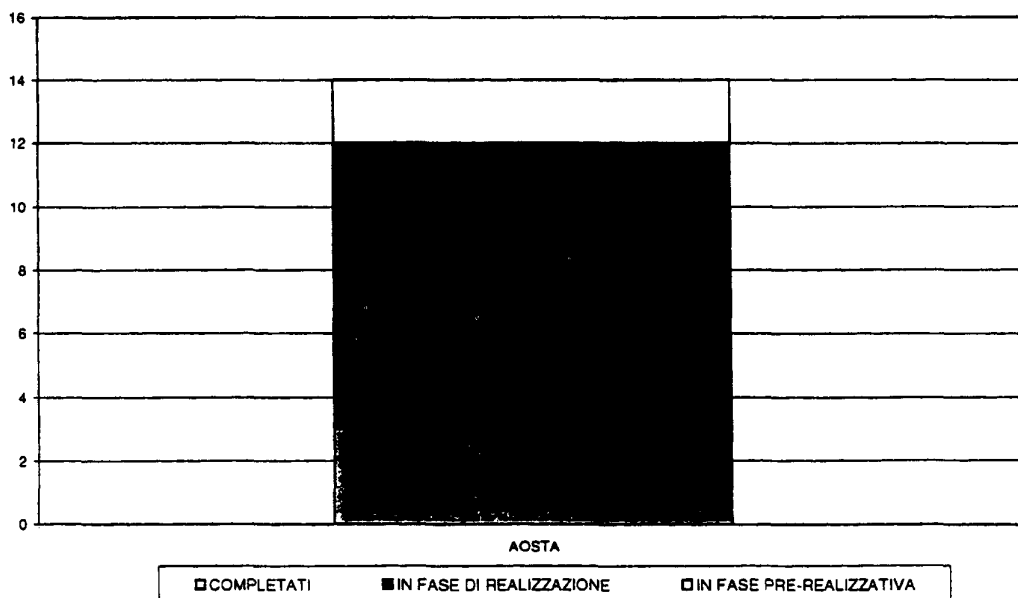


Grafico A 2b - REGIONE VALLE D'AOSTA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA





Grafico A 3 - REGIONE VALLE D'AOSTA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

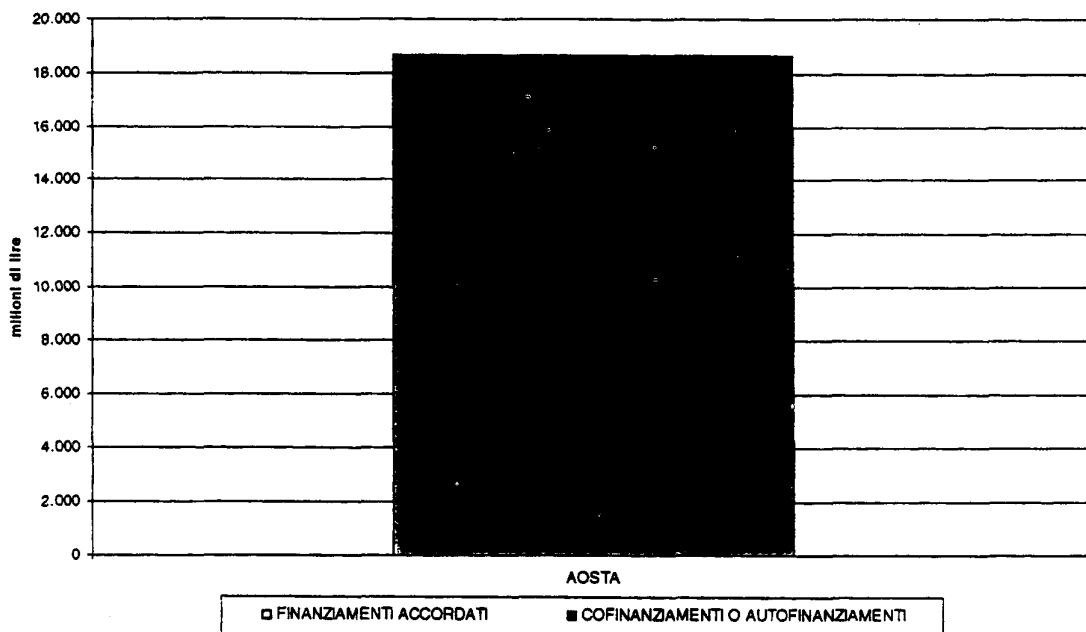

3.2.19. Regione Veneto

Grafico A1a - REGIONE VENETO
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

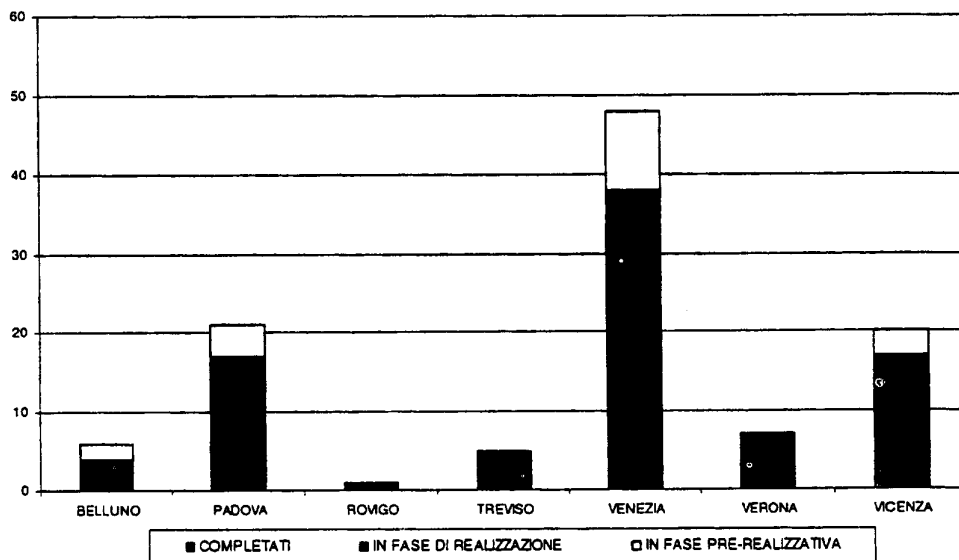


Grafico A 2b - REGIONE VENETO
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER PROVINCIA



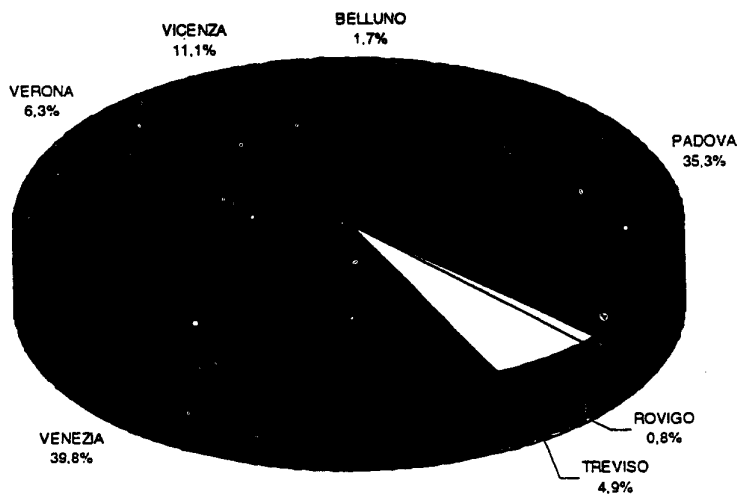


Grafico A 3 - REGIONE VENETO
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

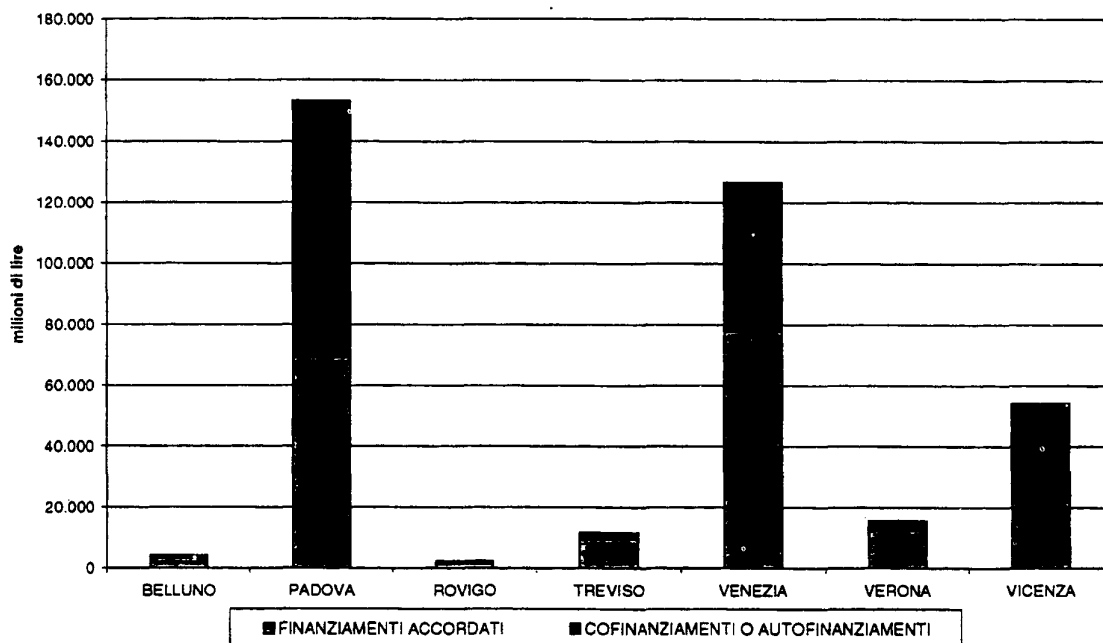

3.3. Totali regioni d'Italia al I° trimestre 1999

Grafico A 1a
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)

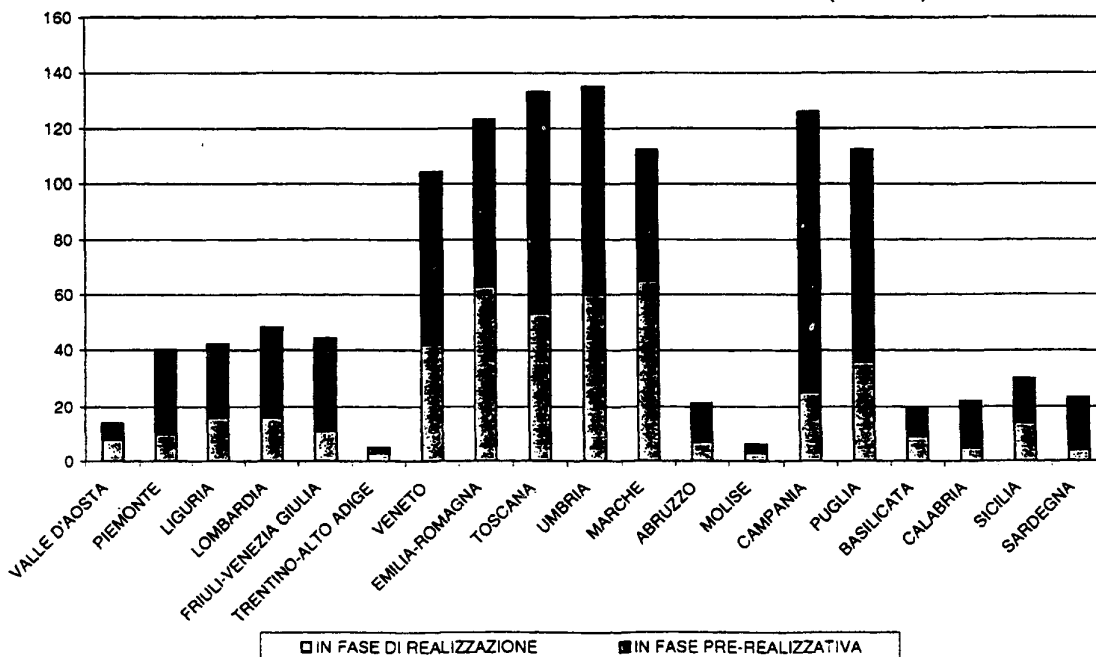

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

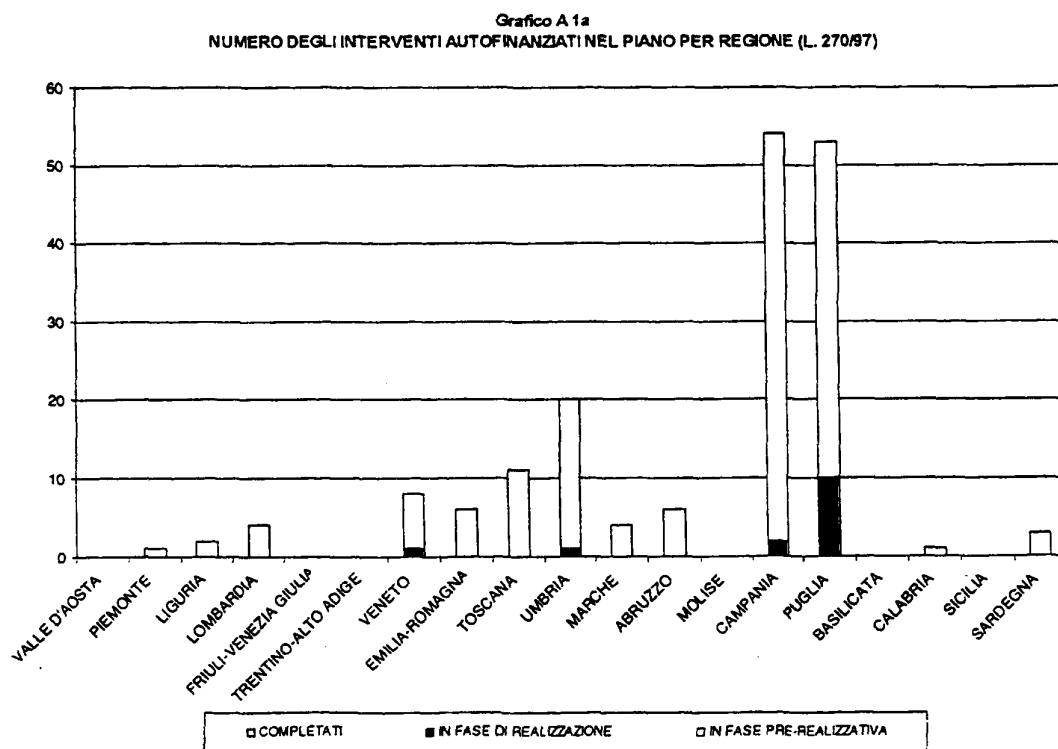
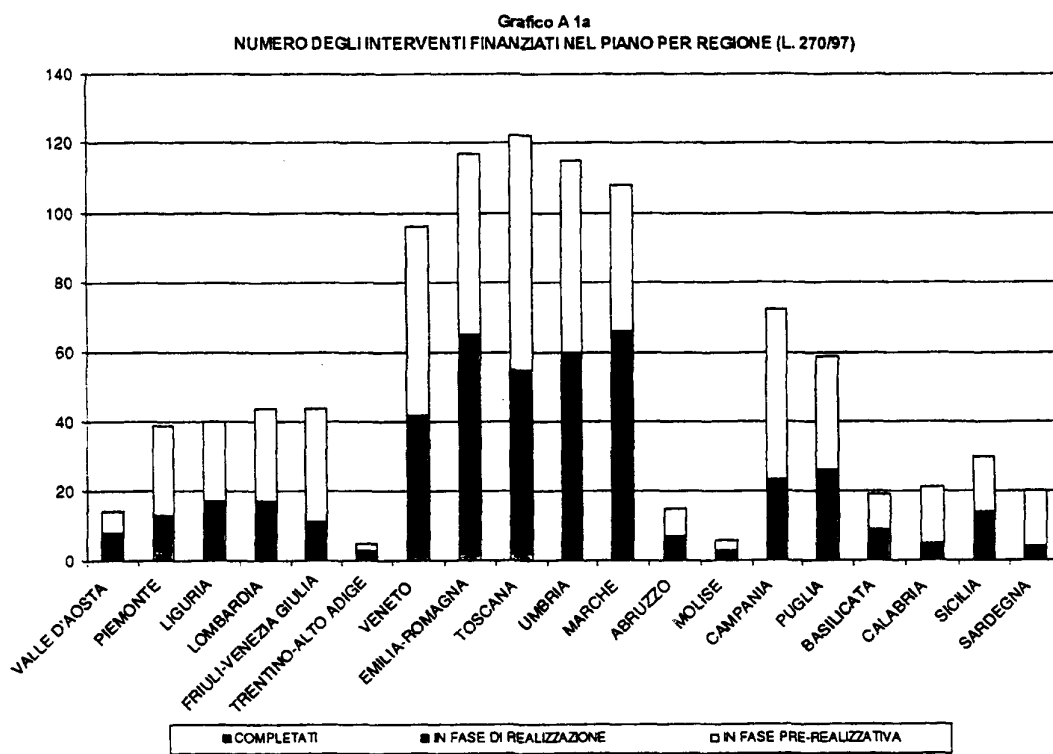


Grafico A 2b
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER REGIONE (L. 270/97)




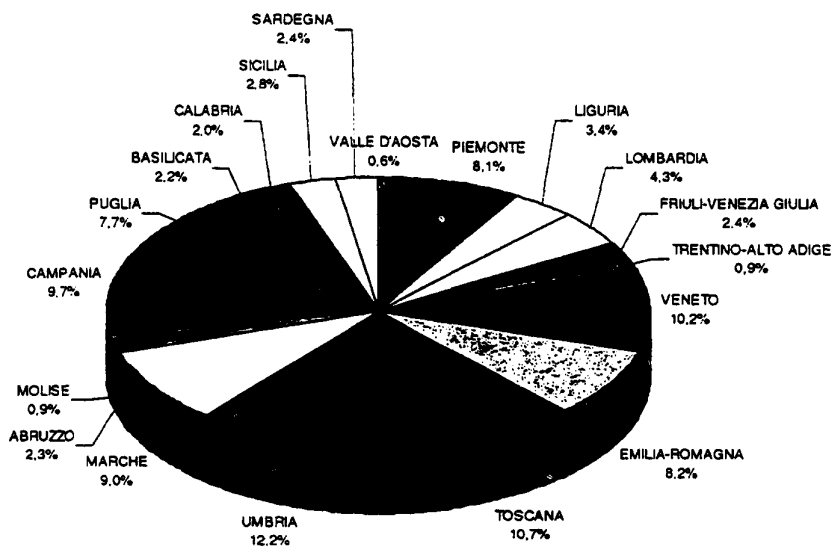


Grafico A 3
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)

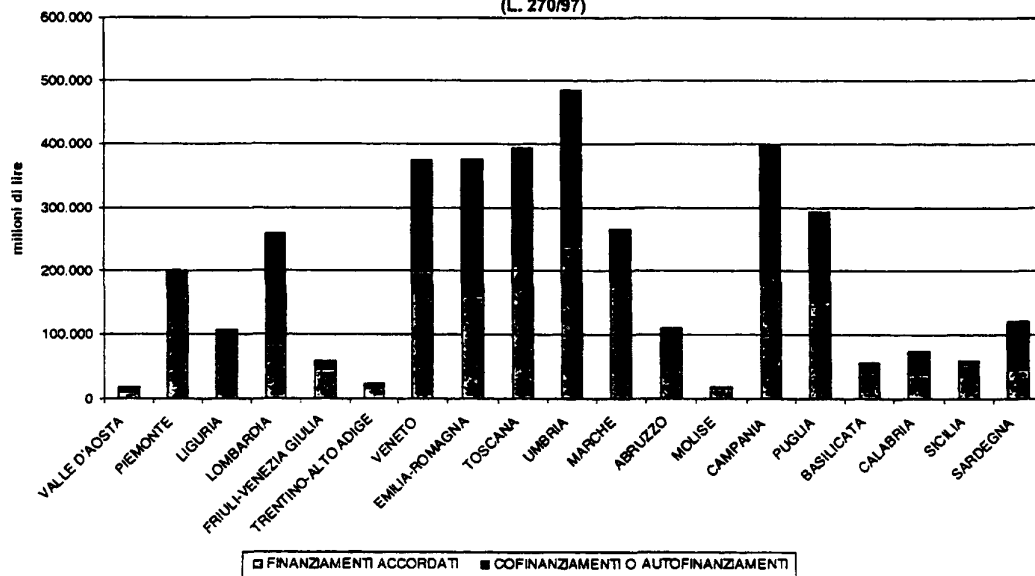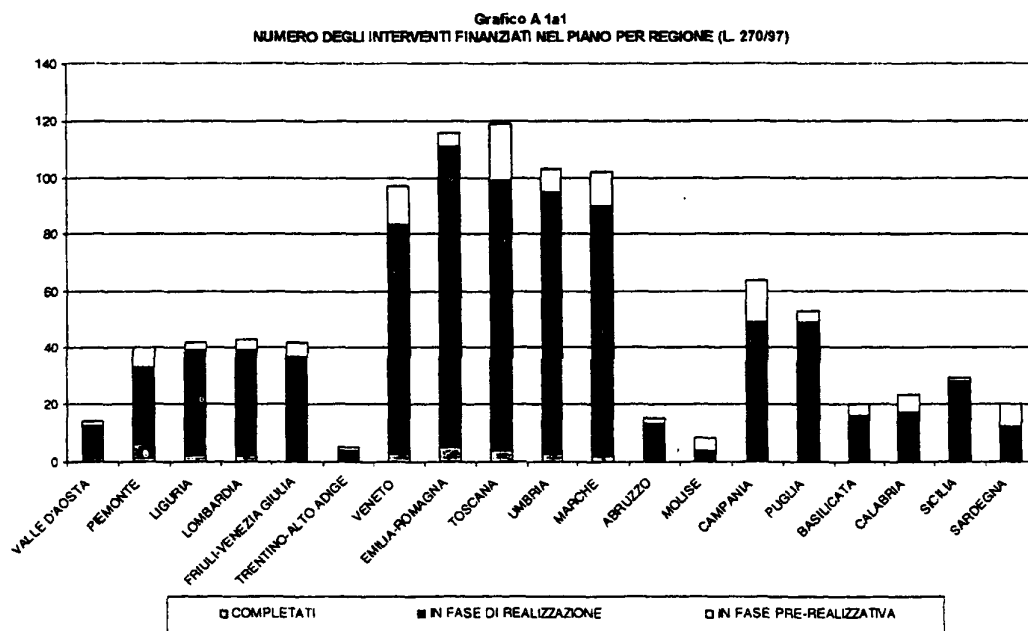

3.4. Totali regioni d'Italia al II° trimestre 1999

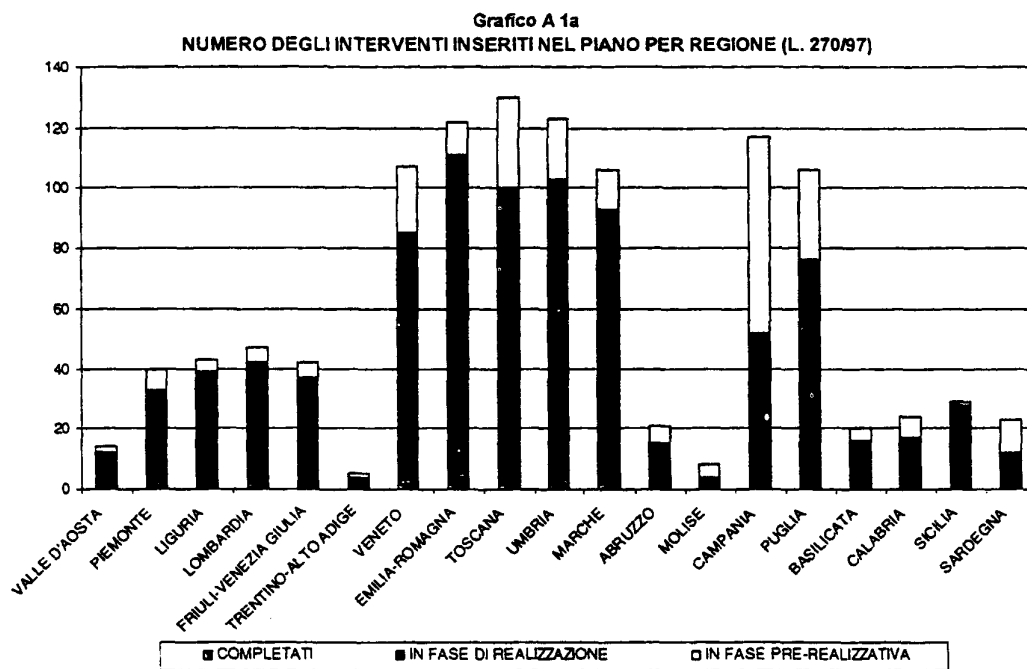

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



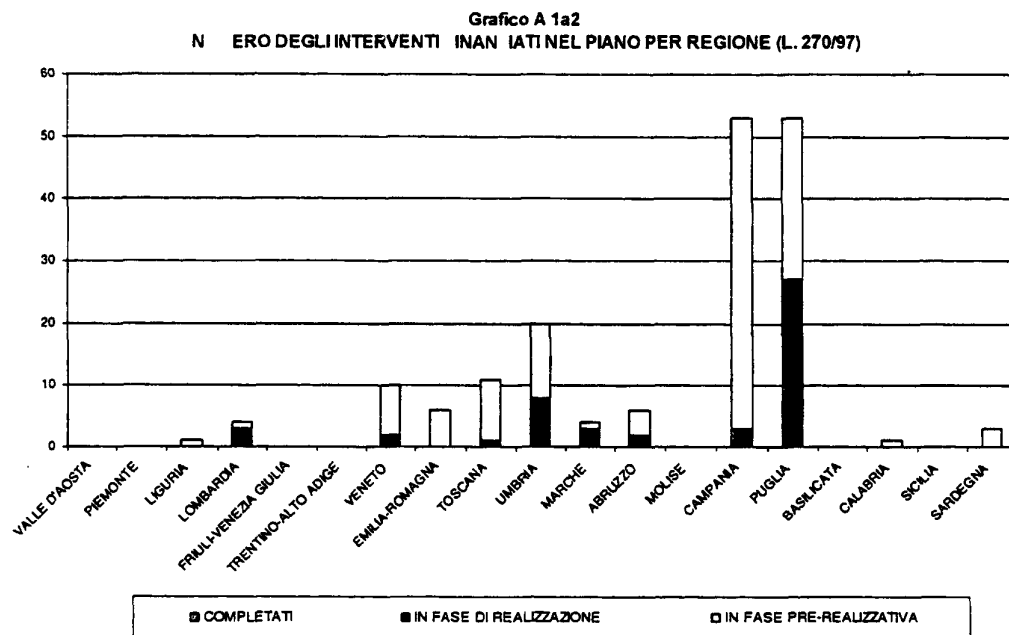


Grafico A 2b
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER REGIONE (L. 270/97)

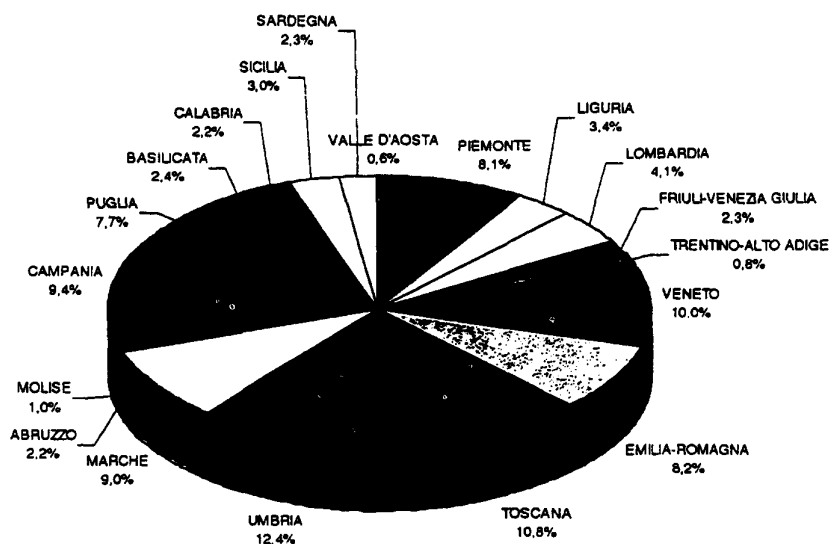


XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Grafico A 3
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE
 (L. 270/97)

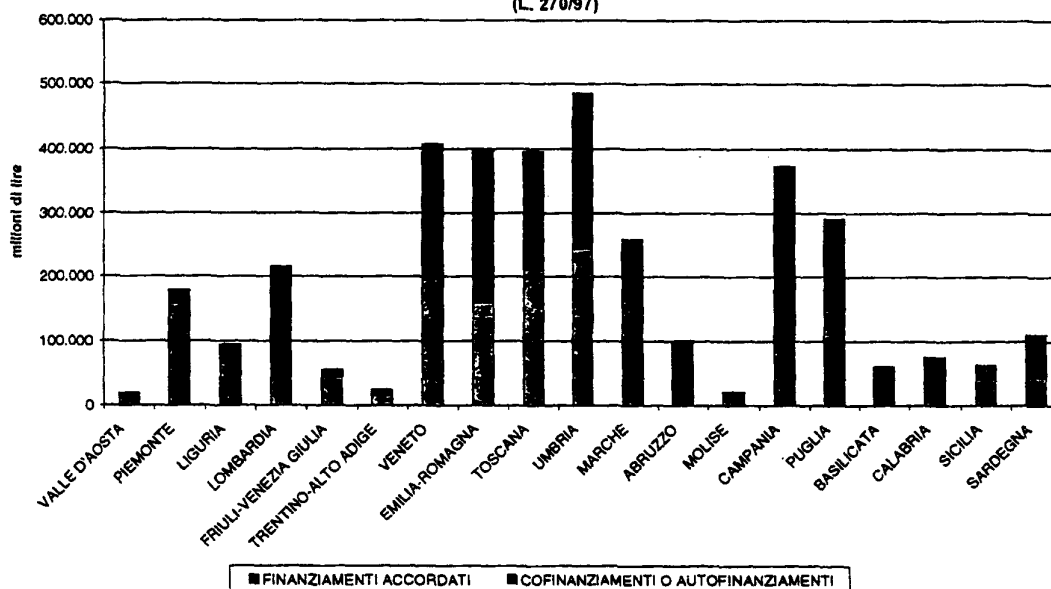

3.5. Totali regioni d'Italia al 30 settembre 1999

Grafico A 1a
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)

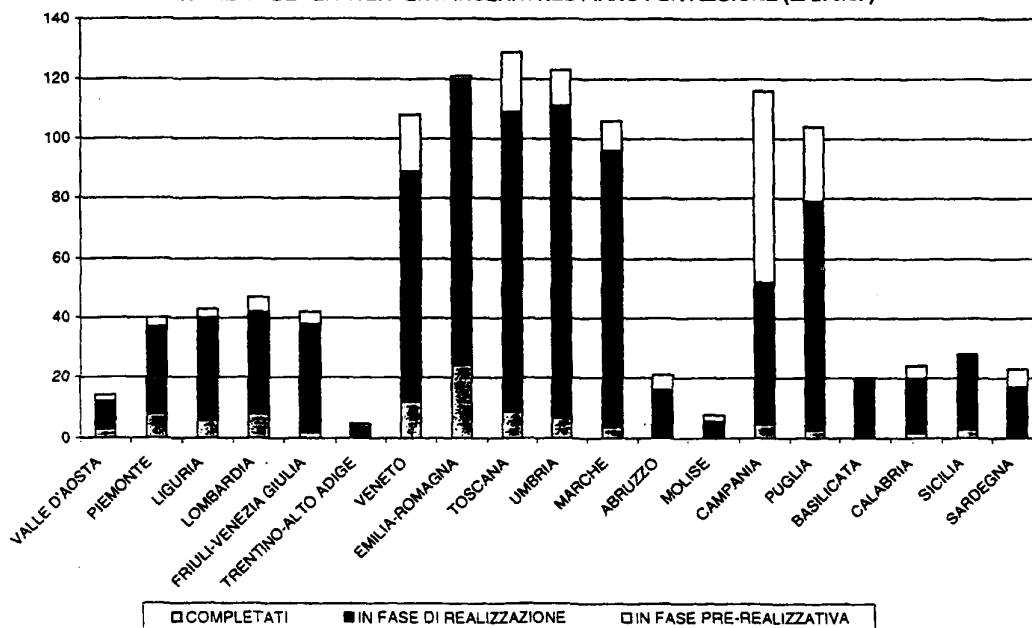

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Grafico A 2b
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER REGIONE (L. 270/97)


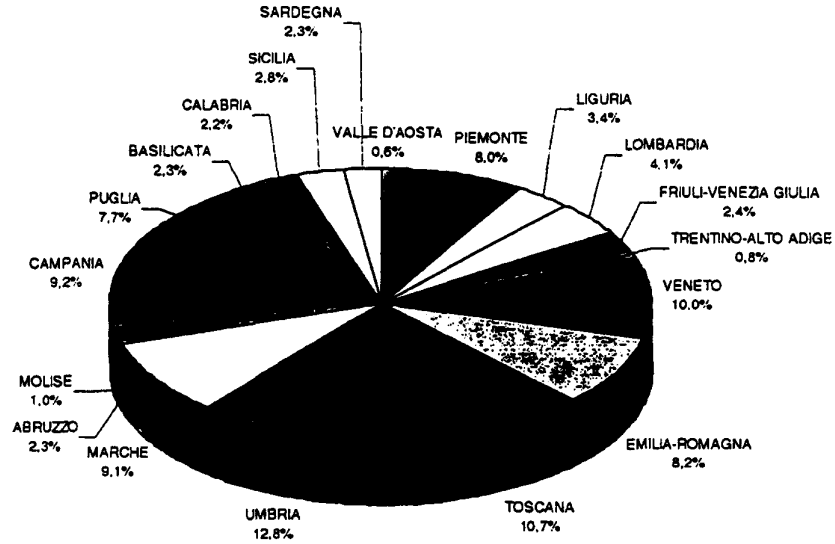


Grafico A 3
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)

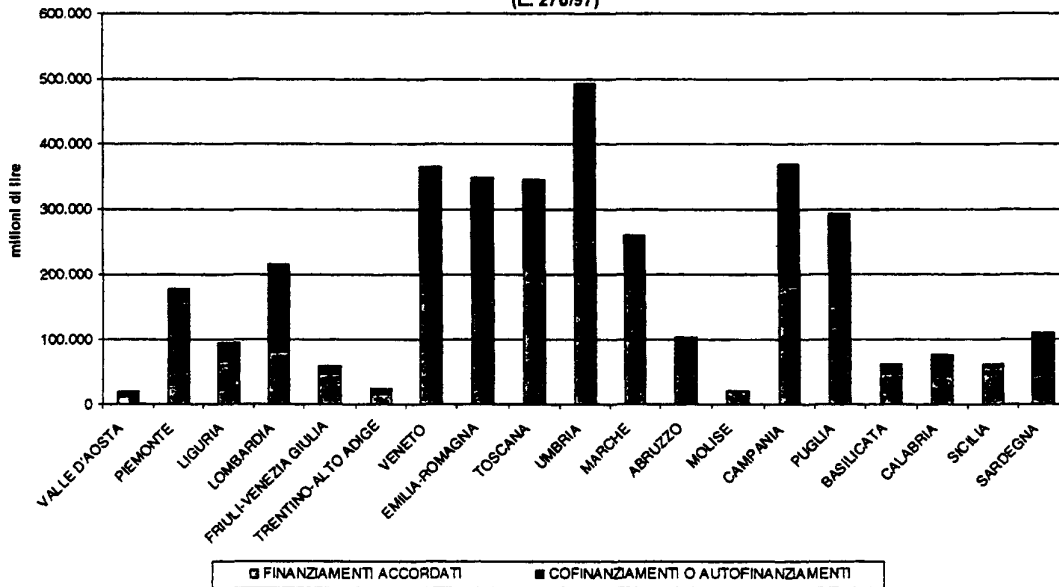

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Grafico A 2b
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER REGIONE (L. 270/97)


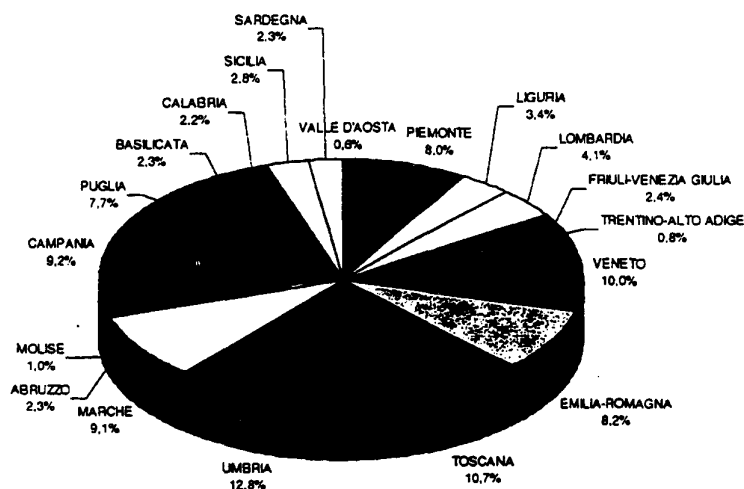


Grafico A 3
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)

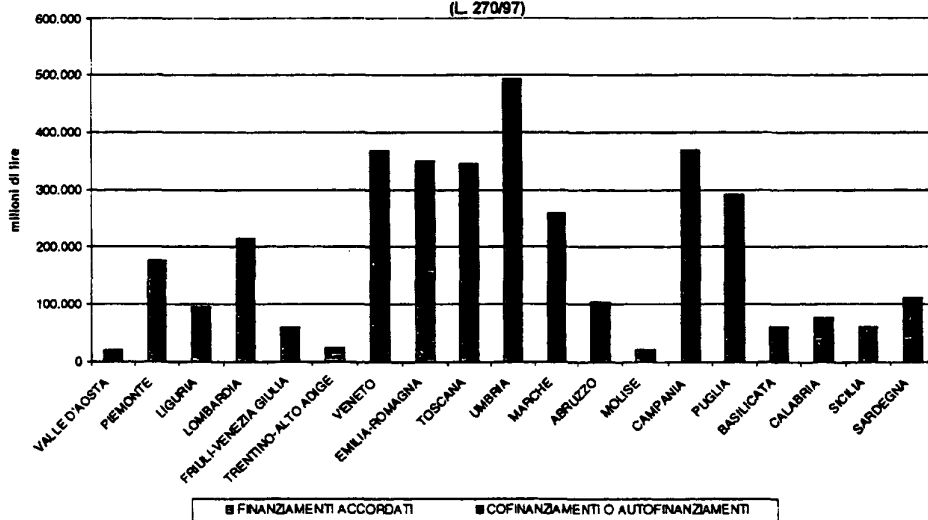

3.6. Lo stato di attuazione per singolo intervento (istogrammi)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici	Riferimenti legislativi ed oggetto del disegno		Titolo dell'intervento		Stipendio (€ annuo)		Finanze		Data		Fasi dell'intervento												
	Regione	Provincia	Comune di appartenenza	Comune di destinazione	Comune di provenienza	Comune di destinazione	Comune di provenienza	Comune di provenienza	Comune di destinazione	Comune di provenienza	Comune di destinazione	Comune di provenienza	Comune di destinazione	Comune di provenienza	Comune di destinazione	Comune di provenienza	Comune di destinazione	Comune di provenienza	Comune di destinazione	Comune di provenienza	Comune di destinazione	Comune di provenienza	
B	EMILIA	RA	4105A	RA	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco
B	EMILIA	RA	4105B	RA	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco	Castelfranco
R	EMILIA	RA	4123	RA	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì	Forlì
B	EMILIA	BO	4412B	BO	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna
B	EMILIA	BO	4412A	BO	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna
B	EMILIA	RN	4884	RN	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio	Silberio
B	EMILIA	RN	4886	RN	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi	Monte Colombi
R	EMILIA	RN	4892	RN	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano	Comano
B	EMILIA	RN	4897	RN	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini	Rimini
R	EMILIA	RN	4899	RN	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese	Manciare ovese
A	EMILIA	BO	5023	BO	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna
A	EMILIA	BO	5024	BO	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna
A	EMILIA	BO	5025	BO	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna	Bolegna

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Regione	Provincia	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetti beneficiari	Costo stimato	Finanz. Annuale	Altre fonti finanzi.	Data	Programma	Program. spec.	Program. previm.	Contenzioso	Proposta	Attribuzione	Approvazione	Voto	Misure	Prestazioni funzionali
B	LOMBARDIA	MI	Manova	validazione di s. edizio in materia progettuale e la concessione di s. edizio per la costruzione di s. edizio in materia progettuale e la concessione di s. edizio per la costruzione di s. edizio in materia progettuale	204	1824	210	18/09/99										
B	LOMBARDIA	PA	Paris	completamento e adeguamento al suo disegno urbanistico della chiesa di s. Maria Annunziata a Paris	2115	1238	885	22/06/99										
B	LOMBARDIA	CO	Como	realizzazione della biblioteca di s. abbondio	1218	568	650	26/07/99										
A	LOMBARDIA	CR	Crema	ceduto di accoglienza per i pellegrini santuari e turisti della chiesa	2116	1516	600	18/06/99										
A	LOMBARDIA	PV	Castelvetro di Stabia	valorizzazione e promozione di un itinerario turistico nel territorio del comune della fascia costiera, connesso al centro storico	556	576	50	22/06/99										

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Regioni	Provincia	Comunicazione all'Ufficio	Titolo dell'incarico	Soggetto beneficiario	Cognome e Nome	Data	Periodo di validità	Programma	Progetto	Attività	Altre informazioni	Altre note
R VALLE D'AOSTA	AO	Annali	caso particolare di invecchiamento	in discorso mentenzione caso	1575	1460	575	20/09/99	21/09/99	21/09/99	21/09/99	21/09/99
R VALLE D'AOSTA	AO	Annali	recupero del fabbricato in bilico ad uso scuola	comune di Biella	2005	1467	8	20/09/99	21/09/99	21/09/99	21/09/99	21/09/99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Settore	Regione	Prov. (C.R.C.E.)	Codice	Comune di beneficiario	Beneficiario (esigibilità ed oggetto dell'intervento)	Soggetto beneficiario	Costo stimato	Finanz. Annuale	Altre fonti (esent.)	Data													
										programmazione	esec.	programmi	interventi	progetti	affidamento	opere	stipuli contr.	app.	verif. final.	liquidazione	previd.		
R	VENETO	AC30EEM	VI04	Portogruaro	Trabucchi d'Inverigo	Insediamento culturale religioso nel collegio marconi	3840	2830	1030	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	
R	VENETO	AA12EHI	VE17	Mira	progetto di restauro e ampliamento scavo edonisti di interesse di pianificazione urbanistica	comune di mira	917	917	0	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	
B	VENETO	AA30LAB	PD	Cortezze	recupero edifica benedettina di cortezze	comune di cortezze	2303	1643	760	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	
A	VENETO	AA12EHI	PD	Padova	compraventa di un terreno antistante la chiesa fondata e la chiesa del santo con abbellimento integrale delle murature architettoniche e materiali	comune di padova	2057	2057	0	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	
A	VENETO	AA31ERT	VI	Vicenza	riqualificazione del vicolo d'accesso di viale berio con interventi di sicurezza	comune di vicenza	2509	2402	27	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	
A	VENETO	AA31ERT	VI	Vicenza	riqualificazione del parco delle scuderie di monte berio	comune di vicenza	121	121	0	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	
A	VENETO	AA31ERT	VI	Vicenza	ristrutturazione del parco della chiesa di san giorgio al sestadio di monte berio	comune di vicenza	616	616	0	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	
A	VENETO	AA31EAL	VI	Vicenza	realizzazione area di accoglienza nelle adiacenze del parco storico di villa gualtieri	comune di vicenza	620	620	0	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	
A	VENETO	AA31EJF	VI	Vicenza	sistema idraulico pubblico 2000 vicenza	comune di vicenza	420	420	0	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	
R	VENETO	AA31EJF	VI	Vicenza	arricchimento del muro di cinta della galleria	comune di vicenza	169	169	0	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	
R	VENETO	AA31EJF	VI	Vicenza	ristrutturazione barocca del palazzo bismarck	comune di vicenza	1250	1250	0	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99
B	VENETO	AA31EAM	VI	Vicenza	restauro della chiesa dei santi antonio e bellino	comune di vicenza	913	613	300	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99
R	VENETO	AC310AL	PD	Padova	ristrutturazione della palazzina della facoltà per accoglienza studenti del politecnico di padova v. n.	comune di padova	354	350	4	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99	20/06/99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Settore	Regione	Codice	Provincia	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Spesite beneficiarie	Comunità	Finanze attribuite	Altre fonti finanziarie	Data	Procedimento	Procedura	Profilo	Posti dell'Amministrazione
R	VENETO	297	AN141UP	VE	Venezia	attività produttive per il patrimonio e basso costo	2701	1981	720	20/05/99				11/04/99
A	VENETO	292	AN111EP	VE	Venezia	realizzazione servizi igienici mobili e aree di sosta pedonali e di rilievo e di informazione - tra c. società mobile per i pedonali	433	2216	2217	20/05/99				11/04/99
A	VENETO	294	AN112EM	VE	Venezia	realizzazione servizi igienici	512	256	256	20/05/99				11/04/99
A	VENETO	295	AN112EM	VE	Venezia	realizzazione servizi igienici	416	228	228	20/05/99				11/04/99
R	VENETO	297	AN112IM	VE	Venezia	ricezione* e servizi per ospiti non soddisfacenti all'ambito della struttura per anziani - cura di giorno al me. giorno e posto a tavola	120	1200	0	20/05/99				20/05/99
R	VENETO	299	AN112AM	TV	Mogliana Veneto	realizzazione adeguamento inquadro e sistemazione delle pedane di marciapiedi da abitare ai servizi, cubetti per mensa di servizio e rifugio comune con il servizio sanitario beneficiario anziani di 65 anni	215	215	0	18/05/99				11/04/99
A	VENETO	297	AN112IM	VE	Venezia	collegamento navetta busse venezia via acqua accessibile ai disabili	1800	720	1080	20/05/99				11/04/99
A	VENETO	298	AN112AL	VE	Venezia	ristrutturazione approdi di frisa e salire	691	600	0	20/05/99				11/04/99
A	VENETO	299	AN112AL	VE	Venezia	ristrutturazione approdi di frisa e fondamento mura	600	600	0	20/05/99				11/04/99
A	VENETO	298	AN112IM	VE	Venezia	ristrutturazione approdi di quota salone	400	400	0	20/05/99				11/04/99
R	VENETO	296	AN112EM	TV	Mogliana Veneto	manutenzione invernale e sistemazione al fine di accogliere a basso costo i malati	534	441	90	18/05/99				11/04/99
R	VENETO	298	AN112AB	PD	Padova	realizzazione della cripta onomastica della basilica di s. Giustina	764	776	6	20/05/99				11/04/99
R	VENETO	290	AN112IM	VR	Venezia	liquidazione del centro pedonale roma centro	2017	2017	300	10/05/99				10/05/99

5. PARTE QUARTA - LA VIGILANZA

4.1. Il monitoraggio

L'articolo 2, comma 13, della legge 7 agosto 1998 n. 270, "*Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio*" pubblicata sulla G.U.R.I. del 12 agosto 1998 affida al Ministro delegato per le aree urbane il compito di provvedere al monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano.

In applicazione della suddetta disposizione legislativa l'articolo 6, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 17 settembre 1997, concernente i *criteri per la formazione del piano*, ha stabilito che la individuazione del soggetto monitore dovesse essere effettuata mediante gara ad evidenza pubblica e che gli oneri per il servizio di monitoraggio dovessero essere contenuti nel cinque per cento delle risorse disponibili.

Sulla base di tali disposizioni l'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi (U.R.C.G.E) ha provveduto preliminarmente a specificare la natura e l'articolazione del servizio da richiedere al soggetto monitore, partendo dall'assunto che per monitoraggio debba intendersi l'organizzazione di una serie di operazioni intese a massimizzare la probabilità che un progetto di qualsiasi natura, venga realizzato. L'attività di monitoraggio contempla, dunque, anche adeguati meccanismi di retroazione che permettano una possibile revisione degli obiettivi in base alle risultanze del processo di monitoraggio stesso.

L'aspetto fondamentale dell'attività di monitoraggio è, pertanto, la verifica dell'avanzamento di un intervento. Questa può essere effettuata attraverso la determinazione di specifici indicatori attraverso i quali misurare gli scarti tra quanto previsto e quanto realizzato. Il principale problema da definire nella fase di progettazione di un sistema di monitoraggio e, quindi, lo studio e la specificazione degli indicatori più adatti al tipo di intervento da sottoporre a controllo.

In base a tali considerazioni si è ritenuto che la attività di monitoraggio di norma riguardi:

- la fase ex ante: messa a punto del progetto e la selezione e ammissione al finanziamento;
- la fase on going: implementazione e controllo sulla gestione dei fondi;
- la fase ex post: verifica e collaudo dei risultati.

All'interno di un processo di monitoraggio si possono, pertanto, distinguere tre livelli:

- quello della raccolta dei dati di avanzamento degli interventi e di organizzazione di un sistema informativo;
- quello del controllo e della certificazione, intesi come aspetto formale dell'attuazione degli interventi;
- quello della diagnostica e delle raccomandazioni, intesi come aspetti propriamente valutativi dell'intervento.

L'U.R.C.G.E. ha ritenuto che nel caso in esame i servizi dovessero essere:

- l'acquisizione, al fine di preconstituire un quadro di riferimento rispetto al quale riportare i successivi riscontri, di informazioni relative alle caratteristiche strutturali degli interventi

contenuti nel piano;

- il rilevamento dei dati consuntivi degli adempimenti in relazione alle diverse fasi attuative degli interventi (progettazione, affidamento dei lavori, stipula contrattuale, inizio dei lavori, esecuzione dei lavori e collaudo dei lavori);
- confronto dei dati consuntivi con quelli del quadro di riferimento iniziale in modo da rilevare gli scostamenti e da permettere le opportune decisioni e azioni;
- analisi ed organizzazione dei dati rilevati in un sistema informativo unificato in grado da renderli disponibili ai soggetti competenti;
- elaborazioni di grafici e tabelle con l'impiego di procedure informatizzate, compatibili con il sistema informativo unificato utilizzato dall'U.R.C.G.E, sulla scorta dei dati del singolo intervento e delle eventuali interconnessioni spazio - temporali con altri interventi del contesto;
- elaborazione trimestrale di indicatori sintetici attinenti ai costi, ai tempi, ai fabbisogni e gli aspetti ambientali, tecnologici e procedurali, di competenza del Ministro delegato per le aree urbane, della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 270/97.

Per quanto riguarda la specificazione degli indicatori in base ai quali valutare l'andamento degli interventi, l'U.R.C.G.E. ha ritenuto necessario preliminarmente individuare, per ogni intervento, oltre ai normali indici fisici, amministrativi e finanziari, anche un indice, definito indice di criticità, che permettesse di misurare quale fosse il rischio dell'intervento di non essere realizzato nei tempi programmati.

L'U.R.C.G.E. ha individuato quali elementi di criticità degli interventi: lo stato della progettazione; il rapporto tra la durata degli adempimenti amministrativi e la durata complessiva dell'intervento; il rapporto tra il tempo residuo ed il tempo di esecuzione; il rapporto tra il costo dell'intervento e la durata dello stesso; la complessità di realizzazione in relazione alla priorità dell'obiettivo; la necessità di fare ricorso a procedure di variante urbanistica; la disponibilità dell'area; la dimensione sopra/sotto soglia comunitaria dell'appalto; ed ha determinato il loro contributo al suddetto indice impiegando il metodo del confronto a coppie.

Tale indice ha permesso di graduare quale dovesse essere, durante il monitoraggio, la cadenza temporale e il contenuto delle verifiche da effettuare. E' stato, inoltre, programmato il ricalcolo di tale indice durante l'attività di monitoraggio. Qualora l'indice aumenta è previsto di incrementare i momenti di verifica e, se è possibile, di prendere delle decisioni correttive.

L'U.R.C.G.E. successivamente alla definizione dei contenuti del servizio di monitoraggio ha provveduto a predisporre gli elaborati necessari per indire la gara ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione del soggetto monitore stabilendo, fra l'altro, che il compenso relativo alle prestazioni del servizio fosse previsto parte a corpo (a forfait) e parte a misura.

Sono stati predisposti:

- il disciplinare tecnico contenente la descrizione e le prescrizioni delle diverse attività da affidare;
- un elaborato contenente i criteri per la determinazione della parte del compenso da corrispondere a corpo (tariffa);
- l'elenco dei prezzi unitari per la determinazione della parte del compenso da corrispondere a misura;
- il bando di gara;
- disciplinare di gara;

- schema di contratto.

Si è proceduto ad indire una gara a procedura aperta in ambito Europeo in quanto l'importo presunto dei servizi è stato stimato in lire 6.320.557.000.

Il bando di gara è stato predisposto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 157/95.

Va sottolineato che il tempo intercorrente fra la pubblicazione del citato decreto 17 settembre 1997 concernente i *criteri per la formazione del piano* e l'invio del relativo bando alla GUCE (circa tre mesi) si è reso necessario per poter disporre se non del piano definitivo almeno di una base certa sulla quale dimensionare l'importo da porre a base di gara. Va ricordato che il termine ultimo per le richieste di inserimento nel piano fu prorogato dal 21 novembre al 22 dicembre 1998. Solo dopo tale data è stato così possibile per l'U.R.C.G.E. dimensionare in via definitiva il numero delle richieste pervenute, la loro tipologia e la ripartizione geografica delle stesse.

Per l'individuazione dell'importo presunto da porre a base di gara si è fatto riferimento alla gara già conclusa per il servizio di monitoraggio del piano del Giubileo nella regione Lazio. In particolare per determinare la durata del servizio ed i relativi costi si è ipotizzato che il soggetto monitoratore avrebbe dovuto produrre, per la maggior parte degli interventi, sei rapporti trimestrali, l'ultimo dei quali a gennaio dell'anno 2000 e ciò in quanto per legge tutti gli interventi dovranno essere ultimati entro il 31 ottobre 1999.

Il termine per il ritiro della documentazione era fissato al 24 febbraio 1998 ed a tale data risultavano 37 richieste di acquisizione della documentazione.

4.2. Le Relazioni del soggetto monitoratore

A conclusione della gara di cui sopra, il Servizio di monitoraggio è stato affidato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi (URCGE) - alla Associazione Temporanea di Imprese costituita tra Sovis - Società Vesuviana d'investimenti e servizi S.p.A. e T.E.C.N.I.C. - Tecniche e Consulenze nell'Ingegneria Civile S.p.A. (ATI) con contratto del 24 febbraio 1999, approvato e reso esecutivo con Decreto del 15 marzo 1999.

Per consentire una lettura dell'evoluzione dello stato di attuazione del Piano, così come emergente dall'attività di "monitoraggio", si allega di seguito una sintesi della Relazione prodotta dal Soggetto Monitoratore. Il documento di che trattasi costituisce il **1° Rapporto Trimestrale** elaborato nell'ambito del Servizio di Monitoraggio del Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio (il Piano) approvato ai sensi della Legge 7 agosto 1997, n. 270.

4.2.1. Sintesi del primo rapporto trimestrale

Il primo Rapporto fa riferimento al periodo marzo/maggio 1999 e, in base alle direttive dell'URCGE, prende in considerazione tutti gli interventi che alla data del 19 marzo 1999 risultavano inclusi nel Piano in base a Decreti Ministeriali, anche se non ancora registrati dalla Corte dei Conti né pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Come da istruzioni ricevute dall'URCGE, restano esclusi dal servizio di monitoraggio:

gli interventi di competenza dell'ENIT;

l'intervento relativo al monitoraggio del Piano;

gli interventi di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 270/97 (ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino);

l'intervento prot. n° 249 (codice URCGE BA 41 ED F) che si riferisce alla realizzazione di un circuito nazionale di comunicazione ed informazione relativo ai luoghi ed eventi particolari (proponente Factory S.r.l.).

In base a questo criterio, pertanto, il Rapporto fa riferimento a n. 1.157 interventi, come da tabella che segue:

Descrizione	Protocollo	Num.
Interventi ricompresi nel Piano al 19.3.1999		1.164
Interventi ENIT	0001-0002-0003A	3
Intervento Ambito Nazionale	249	1
Interventi ex articolo 2, comma 8, Legge 270/97	10484-10484/A	2
Monitoraggio interventi	9700	1
Interventi soggetti a monitoraggio		1.157

Il periodo cui si riferisce il primo Rapporto ha rappresentato una fase particolarmente delicata ed impegnativa sotto il profilo gestionale ed organizzativo, avendo dovuto essere dedicato contemporaneamente, oltre che all'impostazione iniziale dell'attività, anche all'avvio delle operazioni "ordinarie" di monitoraggio e nello stesso tempo alla stesura di un non previsto "Rapporto Intermedio" che, secondo le indicazioni dell'URCGE, fosse di supporto all'azione dell'Ufficio per la stesura del Rapporto al Parlamento.

Nel corso di tale periodo, un considerevole impegno è stato profuso dalla struttura nella messa a punto delle metodologie da utilizzare nello svolgimento del servizio di monitoraggio e delle relative procedure informatiche di supporto.

Ancorché, infatti, il Disciplinare Tecnico di gara prevedesse l'utilizzo di procedure operative già individuate e di una modulistica unificata predisposta sulla base dei modelli allegati allo stesso Disciplinare, l'URCGE ha invece ritenuto opportuno coinvolgere anche gli esperti del Monitor in un approfondito processo di revisione/re-impostazione delle procedure.

Tale processo si è reso necessario in quanto una buona parte delle indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico si sono rivelate non perfettamente compatibili con il Servizio richiesto, in quanto:

il Disciplinare fu sviluppato in analogia con il servizio di monitoraggio in corso di esecuzione per gli interventi situati nella Regione Lazio, che si è constatato avere caratteristiche, anche organizzative, considerevolmente diverse da quelle applicabili nel caso specifico, anche in relazione al più elevato numero di interventi, alla loro vasta diffusione territoriale ed alla loro diversificazione tipologica;

il Disciplinare fu sviluppato sulla base del presupposto che il servizio di monitoraggio potesse essere avviato pressoché contemporaneamente all'avvio del Piano e, quindi, potesse seguire un ordinato svolgersi del processo attuativo degli interventi. Il prolungarsi delle procedure di affidamento dell'incarico ha comportato, invece, che il servizio di monitoraggio sia venuto ad innestarsi in una situazione di avanzata fase di attuazione del Piano stesso, caratterizzata, inoltre,

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da una situazione di avvio degli interventi estremamente disomogenea.

Occorre inoltre sottolineare che, d'intesa con l'URCGE, nel periodo cui il Rapporto si riferisce, anziché procedere a rilevazioni cadenzate in base alle "fasi programmatiche" degli interventi ed alla loro criticità teorica iniziale, si è provveduto ad effettuare una "rilevazione generale", che ha comportato la ricognizione dello stato di attuazione di tutti gli interventi inseriti nel Piano, provvedendo, nel contempo, alla raccolta di tutte le informazioni relative a tutte le fasi che risultavano concluse alla data di rilevazione, oltre a quelle relative alla fase in corso.

Nel Disciplinare Tecnico era previsto che, per poter disporre della base di partenza cui riportare le successive rilevazioni, il Monitore compilasse, per ciascun intervento, un modello di rilevazione (modello A, Quadro 1) relativo ai "dati programmatici" così come dichiarati dal Soggetto Beneficiario del finanziamento e trasferisse poi all'URCGE i dati così acquisiti su supporto magnetico.

Nelle more dell'assegnazione dell'incarico, l'URCGE ha invece provveduto autonomamente ad acquisire i dati "anagrafici" ed i "dati programmatici" degli interventi, sulla base dei modelli MM e dei modelli A ritornati dai Soggetti Beneficiari.

- Elaborazione dei cronogrammi degli interventi

Il processo di attuazione degli interventi è stato suddiviso, come da Disciplinare, in una sequenza di fasi corrispondenti agli adempimenti via via occorrenti per portare a completa definizione le azioni programmate, a ciascuna delle quali è associato un evento conclusivo che consente di predeterminare il momento di passaggio alla fase successiva secondo i seguenti schemi:

LAVORI			
Fasi del processo di attuazione		Eventi conclusivi della fase	
1	Programmazione esecutiva	T1	Definizione programma esecutivo (delibera)
2	Progettazione preliminare	T2	Approvazione progetto preliminare (delibera)
3	Progettazione definitiva	T3	Approvazione progetto definitivo/Confer.za di servizi
4	Progettazione esecutiva	T4	Approvazione progetto esecutivo (delibera)
5	Appalto	T5	Affidamento dell'appalto (verbale)
6	Contratto d'appalto	T6	Stipula del contratto di appalto
7	Consegna cantiere	T7	Verbale di inizio lavori
8	Esecuzione lavori	T8.1-T8.F	Verbale di ultimazione lavori
9	Collaudo tecnico-amministrativo	T9	Emissione certificato di collaudo
10	Messa in esercizio	TF	Piena funzionalità delle opere

FORNITURE			
Fasi del processo di attuazione		Eventi conclusivi della fase	
1	Programmazione esecutiva	T1	Definizione programma esecutivo (delibera)
2	Definizione dell'oggetto	T3	Approvazione progetto definitivo (delibera)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3	Predisposizione della Commessa	T5	Affidamento della Commessa (verbale)
4	Contratto di fornitura	T6	Stipula del contratto di fornitura
5	Avvio della fornitura	T7	Constatazione d'inizio della fornitura
6	Erogazione della fornitura	T8.1-T8.F	Constatazione di compimento della fornitura
7	Collaudo tecnico-amministrativo	T9	Emissione certificato liberatorio
8	Utilizzazione del bene/servizio	TF	Piena funzionalità delle opere

INTERVENTI ESEGUITI DAL MINISTERO BB.CC.AA.			
Fasi del processo di attuazione		Eventi conclusivi della fase	
1	Programmazione esecutiva	T1	Definizione programma esecutivo (delibera)
2	Progettazione definitiva	T3	Approvazione progetto definitivo (delibera)
3	Appalto	T5	Affidamento dell'appalto (verbale)
4	Contratto d'appalto	T6	Stipula del contratto di appalto
5	Consegna cantiere	T7	Verbale di inizio lavori
6	Esecuzione lavori	T8.1-T8.F	Verbale di ultimazione lavori
7	Collaudo tecnico-amministrativo	T9	Emissione certificato di collaudo
8	Messa in esercizio	TF	Piena funzionalità delle opere

D'intesa con l'URCGE e tenendo conto del fac-simile allegato al Disciplinare Tecnico, è stato altresì predisposto il modello di cronogramma da utilizzare nel corso dell'attività di monitoraggio.

I cronogrammi vengono presentati sotto forma di Diagramma di Gantt in cui a ciascuna fase del processo di attuazione corrispondono tre barre di colore diverso, con riferimento a tre scenari temporali:

- la previsione programmatica (colore nero)
- la previsione rimodulata al precedente momento di rilevazione (colore verde)
- la previsione rimodulata all'attuale momento di rilevazione (colore rosso)

Sul diagramma vengono anche indicate le date sulla base delle quali il cronogramma è stato costruito, evidenziando con un asterisco quelle calcolate secondo le procedure sopra descritte.

Sul diagramma viene inoltre sempre evidenziata la data del 31.10.1999.

Nella "Documentazione degli interventi per Regioni" che viene presentata insieme al Rapporto di che trattasi, sono rappresentati - oltre ai diagrammi di criticità ed ai modelli di rilevazione - i cronogrammi di attuazione del processo di ogni intervento per le diverse categorie (ad eccezione dei Privati).

Essi, ovviamente, presentano le sole due barre relative alla previsione programmatica (colore

nero) ed alla previsione rimodulata all'attuale momento di rilevazione (colore rosso), con le date programmatiche e le date effettive relative alle fasi risultate concluse alla data di rilevazione, oltre alle date di previsione rimodulate, elaborate ipotizzando uno slittamento di tutte le successive fasi dell'intervento di un tempo pari al ritardo di esecuzione accumulato fino all'ultima fase conclusa; ciò a prescindere da eventuali possibili "recuperi" nelle fasi successive dichiarati dal titolare dell'intervento, recuperi che si intende registrare nel modello soltanto allorquando se ne sia riscontrata l'avvenuta effettività.

Si fa notare, peraltro, che in taluni casi l'inesattezza di alcune date programmatiche potrebbe rendere incongruente anche la determinazione delle nuove date di attuazione previste calcolate secondo i criteri sopra illustrati. Questo tipo di eventuale anomalia che qui si evidenzia sarà rimosso con le successive rilevazioni ed elaborazioni.

Con le successive rilevazioni ed elaborazioni si provvederà inoltre ad aggiornare i cronogrammi ad ogni momento conclusivo di ciascuna fase, trasmettendoli all'URCGE insieme al modello A o B relativo alla fase stessa.

- Elaborazione dei coefficienti di criticità e definizione delle "classi di monitoraggio"

All'interno di ciascuna delle categorie d'intervento, ad eccezione di quella riferita ai Privati, sono state individuate tre "classi di monitoraggio", definite in funzione di un "coefficiente di criticità" attribuito ad ogni singolo intervento in relazione al valore risultante dalla somma ponderale di parametri significativi.

I coefficienti di criticità sono stati calcolati sulla base delle modifiche proposte dall'URCGE per adeguarli a criteri simili a quelli adottati per gli interventi situati nel Lazio; tali modifiche hanno portato a variare parzialmente le procedure di calcolo indicate nel Disciplinare Tecnico.

In funzione del rapporto tra il valore massimo teoricamente possibile in ciascuna fase ed il valore effettivo raggiunto dal coefficiente di criticità nella fase stessa, agli interventi sono state attribuite le seguenti "classi" di monitoraggio:

Coefficiente di criticità (in % rispetto al massimo)		Classe di monitoraggio
Da	A	
0,000	0,250	1 - BASSA
0,251	0,500	2 - MEDIA
0,501	1,000	3 - ALTA

Occorre peraltro segnalare che l'indice di criticità determina soltanto la necessità di un controllo più frequente sullo stato di attuazione dell'intervento, non implicando, di per sé, un giudizio tecnico sulla "fattibilità" dell'intervento, per formulare il quale è necessario prendere in

considerazione anche altri elementi, quali, ad esempio, la possibilità di eventuali "recuperi" o, al contrario, i rischi di un blocco duraturo dovuto a circostanze esterne, elementi che, tempestivamente segnalati dal Monitor all'URCGE, daranno luogo alla determinazione dell'indicatore "livello di rischio di mancata esecuzione".

Complessivamente, i 984 interventi, con esclusione dei Privati, presentano i seguenti livelli di criticità:

Criticità	Interventi (privati esclusi)	
	Numero	%
ALTA	444	46
MEDIA	132	14
BASSA	380	40
Totale	956	100.0
Non calcolabile	28	

Diagrammi di criticità

D'intesa con l'URCGE e tenendo conto del fac-simile allegato al Disciplinare Tecnico, è stato predisposto il diagramma di criticità che riporta, per ciascun intervento, una tabella con i valori puntuali assunti dal coefficiente di criticità con riferimento a tre scenari temporali:

- la programmazione iniziale;
- il precedente periodo di rilevazione;
- l'attuale momento di rilevazione;

nonché la rappresentazione grafica delle relative curve di criticità, che sono di tre colori:

- colore nero, per la programmazione iniziale;
- colore verde, per il precedente periodo di rilevazione;
- colore rosso, per l'attuale momento di rilevazione.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALORI MASSIMI DEI COEFFICIENTI DI CRITICITA'

CATEGORIA L									
PARAM.	PESO	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8.n
A	5,12%	1	0,7	0,4	0	0	0	0	0
B	2,57%	1	1	1	1	0	0	0	0
C	17,95%	1	1	1	1	1	1	1	1
D	5,12%	1	1	1	1	1	1	1	1
E	17,95%	1	1	1	1	1	1	1	1
F	17,95%	1	1	0	0	0	0	0	0
G	15,39%	1	1	1	1	1	1	0	0
H	17,95%	1	1	1	1	0	0	0	0
	100,00%	1,00000	0,98464	0,78978	0,76930	0,56410	0,56410	0,41020	0,41020
	soglia criticità alta	0,50000	0,49232	0,39489	0,38465	0,28205	0,28205	0,20510	0,20510
	soglia criticità media	0,25000	0,24616	0,19745	0,19233	0,14103	0,14103	0,10255	0,10255
CATEGORIA BC									
PARAM.	PESO	T1	T3	T5	T6	T7	T8.n		
A	2,90%	1	0	0	0	0	0		
B	5,80%	1	1	0	0	0	0		
C	11,59%	1	1	1	1	1	1		
D	14,49%	1	1	1	1	1	1		
E	17,39%	1	1	1	1	1	1		
F	0,00%								
G	0,00%								
H	14,49%	1	1	0	0	0	0		
	66,66%	0,66660	0,63760	0,43470	0,43470	0,43470	0,43470		
	soglia criticità alta	0,33330	0,31880	0,21735	0,21735	0,21735	0,21735		
	soglia criticità media	0,16665	0,15940	0,10868	0,10868	0,10868	0,10868		
CATEGORIA BC - CATEGORIA F									
PARAM.	PESO	T1	T3	T5	T6	T7	T8.n		
A	2,90%	1	0	0	0	0	0		
B	5,80%	1	1	0	0	0	0		
C	11,59%	1	1	1	1	1	1		
D	14,49%	1	1	1	1	1	1		
E	17,39%	1	1	1	1	1	1		
F	0,00%								
G	0,00%								
H	14,49%	1	1	0	0	0	0		
	66,66%	0,66660	0,63760	0,43470	0,43470	0,43470	0,43470		
	soglia criticità alta	0,33330	0,31880	0,21735	0,21735	0,21735	0,21735		
	soglia criticità media	0,16665	0,15940	0,10868	0,10868	0,10868	0,10868		

Rilevazioni

In questo primo periodo di attività si è proceduto alla "rilevazione generale", per ciascuno degli interventi di categoria L, BC ed F, di tutte le informazioni relative alla fase in corso ed a quelle relative alle fasi precedenti già concluse. Sono state altresì acquisite informazioni anche su alcuni interventi di pertinenza dei Privati, in attesa di ricevere dall'URCGE istruzioni in merito alle scadenze ed alle metodologie di rilevazione da applicare a questa categoria di interventi che, si ricorda, non godono di finanziamenti pubblici ma solo di facilitazioni procedurali.

L'attività di raccolta delle informazioni presso i Beneficiari ha presentato non poche problematiche, tra cui le più ricorrenti sono state:

irreperibilità e/o indisponibilità dei referenti;

cambiamento dei referenti, con conseguente ricerca dei nuovi referenti ufficiali e, non infrequentemente di quelli "di fatto", specie per le comunità ecclesiastiche;

indirizzi dei titolari/referenti errati o cambiati, etc.

difficoltà nel reperire da parte dei Soggetti Beneficiari la documentazione richiesta o nel renderla disponibile;

referenti con scarsa dimestichezza con le operazioni connesse con le attività giubilari;

suddivisione degli interventi in lotti, non identificati nella Banca dati URCGE, con conseguente "moltiplicazione" degli atti formali necessari .

Su tutto, la problematica più rilevante riscontrata nel corso delle rilevazioni è stata proprio la suddivisione in lotti degli interventi, conseguente all'affidamento, per uno stesso intervento, di più appalti in relazione alla tipologia delle opere da eseguire o alla semplice suddivisione dell'intervento in più cantieri.

- Stato di attuazione del Piano

Come già evidenziato in precedenza, il Rapporto ha per oggetto n. 1.157 interventi che, in forma tabellare ed in forma grafica, sono stati raggruppati per Regioni e per Categoria .

I dati degli interventi per Regioni suddivisi per fasi, sono riportati in forma grafica negli allegati riportati in calce al presente paragrafo.

In sintesi di seguito si riporta la ripartizione degli interventi (Privati esclusi) in funzione della fase in corso di attuazione:

Fase	Lavori		Forniture		Beni culturali		Totale	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
T1/nd	39	4.5	10	14.2	2	3.6	51	5.2
T2	5	0.6					5	0.5
T3	23	2.7	13	18.6	1	1.8	37	3.8
T4	21	2.4					21	2.1
T5	85	9.9	16	22.9	2	3.6	103	10.5
T6	14	1.6	10	14.2	0	-	24	2.4
T7	20	2.4	4	5.7	0	-	24	2.4
T8	639	74.4	15	21.4	49	89.2	703	71.5
T9	5	0.6	1	1.5	1	1.8	7	0.7
TF	1	0.1	0	-	0	-	1	0.1
Comp l.	7	0.8	1	1.5	0	-	8	0.8
Totale	859	100.0	70	100.0	55	100.0	984	100.0

Per ciascuno degli interventi (Privati esclusi) si è proceduto alla raccolta - attraverso l'azione di rilevazione - ed alla successiva elaborazione di tutte le informazioni che si riferiscono alla fase in corso alla data di rilevazione ed alle fasi precedenti già concluse.


Il livello di rischio

L'indicatore di rischio - frutto delle valutazioni effettuate dai rilevatori sulla base degli elementi conoscitivi in loro possesso, inizialmente non previsto, è stato introdotto per poter segnalare con immediatezza gli interventi che, per qualche motivo, presentano situazioni che possono determinare un ritardato completamento rispetto alla data del 31 ottobre 1999, termine entro il quale, ai sensi della Legge 270/97, dovranno essere completati gli interventi del Piano.

Nei parametri elaborati sulla base delle disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, è stata riscontrata la non immediata possibilità di evidenziazione di un eventuale allarme in relazione soprattutto all'eventualità di mancato completamento dell'intervento nel termine ultimo legalmente possibile (31/10/99). Ciò ha indotto il Monitor ad elaborare questo indicatore **sintetico** denominato "**Livello di Rischio di mancata esecuzione**", che è conseguenza diretta del sopralluogo (controllo fisico dello stato di attuazione dell'intervento) e della valutazione tecnico-professionale (quindi autonoma ed indipendente) della effettiva probabilità che l'intervento stesso sia completato entro le scadenze di legge (tenuto anche conto della complessità delle attività da realizzare, del tempo mediamente necessario per l'attuazione di attività similari, dell'entità delle risorse necessarie, di quelle impiegate e di quelle oggettivamente impiegabili, etc.).

Si intende così segnalare con immediatezza all'attenzione dell'URCGE gli interventi con particolari problematicità. Da parte del Monitor tali interventi sono sottoposti ad ulteriori più frequenti controlli al fine di tenere informato l'URCGE sulla loro evoluzione nel tempo.

Numero degli interventi, per Regione, suddivisi in base al livello della criticità calcolata all'ultima fase del processo di attuazione conclusa

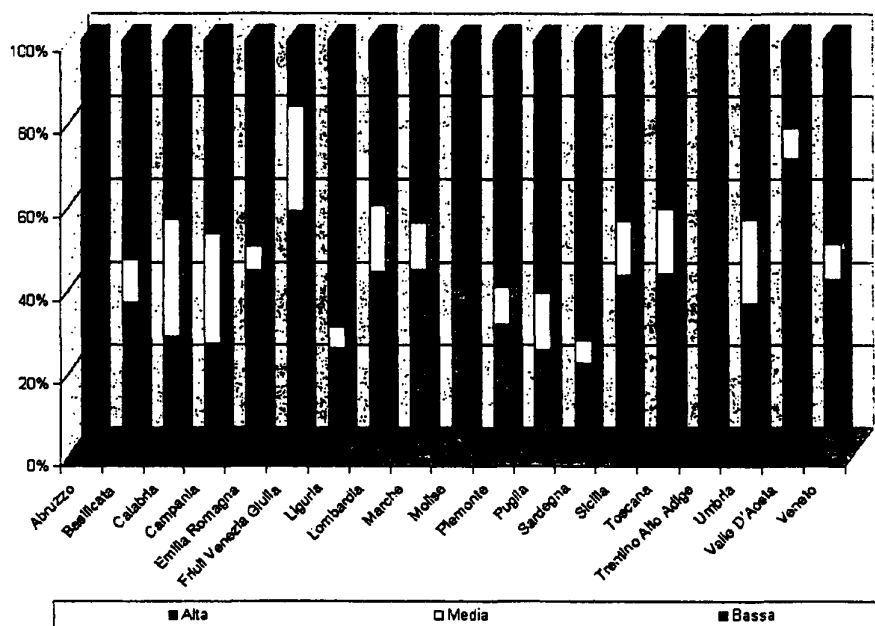

4.2.2. Sintesi del secondo rapporto trimestrale

In data 15.09.1999 l'associazione temporanea di imprese SOVIS - e T.E.C.N.I.C. ha presentato il 2° Rapporto trimestrale elaborato nell'ambito del Servizio di Monitoraggio del Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio. Tale Rapporto fa riferimento al periodo 1 giugno / 31 agosto 1999 e tiene conto di tutte le variazioni/rimodulazioni del Piano intervenute sino alla data del 28 luglio 1999, come da tabella riepilogativa che segue:

Estremi dei provvedimenti di modificazione ed integrazione del Piano

Delibera Commissione		Dec. Min.		Reg. Corte dei conti		Gazzetta ufficiale	
Num.	Del.	Del.	Num.	Del.	Num.	Del.	
3/98	28/03/98	21/04/98	1 Pres./258	20/05/98	122	28/05/98	
4/98	13/05/98	02/06/98	2 Pres./274	03/07/98	171	24/07/98	
5/98	16/07/98	06/08/98	3 Pres./ 27	10/10/98	252	28/10/98	
6/98	08/10/98	20/11/98	3 Pres./173	23/12/98	31	08/02/99	
7/98	10/12/98	27/01/99	1 Pres./115	12/03/99	76	01/04/99	
8/98	16/12/98	27/01/99	1 Pres./116	12/03/99	77	02/04/99	
9/99	27/01/99	09/02/99	1 Pres./142	31/03/99	91	20/04/99	
10/99	04/05/99	01/06/99	2 Pres./278	30/07/99	191	16/08/99	
11/99	19/05/99						
12/99	28/07/99						

Andando al di là di quanto originariamente previsto, peraltro, è parso opportuno al Soggetto Monitore, d'intesa con l'URCGE, avviare le attività di monitoraggio anche per i nuovi interventi inseriti nel Piano con le ultime due deliberazioni, ancorché queste non abbiano ancora trovato formalizzazione in un Decreto Ministeriale, anche in considerazione dell'ormai prossima scadenza del termine ultimo concesso per la realizzazione delle opere (31/10/1999) e della conseguente necessità di fornire con tempestività all'URCGE informazioni su tutti gli interventi interessati.

In base ai provvedimenti elencati nella tabella precedente, risultano inclusi nel Piano n. 1.131 interventi, come da dettaglio che segue:

Numero degli interventi

Decreto	Inser.		Elimin.		Accorpamenti		Disaggregazioni		Num. Progr.
	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)			
21/04/98	1.050								1.050
02/06/98	1								1.051
06/08/98	10	4	2	1	8	20			1.068
20/11/98	4	6	11	5	7	17			1.070
27/01/99	1	2							1.069
27/01/99	59	25	2	1	11	28			1.119
09/02/99	47	4			1	3			1.164
01/06/99	1	3	51	1	6	16			1.122
19/05/99*	22	11							1.133
28/07/99*	1	5			2	4			1.131

* (sola delibera Commissione)

Come da istruzioni ricevute dall'URCGE, sono stati esclusi dal servizio di monitoraggio anche nel secondo Rapporto:

gli interventi di competenza dell'ENIT;

l'intervento prot. n° 249 (codice URCGE BA 41 ED F) che si riferisce alla realizzazione di un circuito nazionale di comunicazione ed informazione relativo ai luoghi ed eventi particolari (proponente Factory S.r.l.).

gli interventi di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 270/97 (ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino);

l'intervento relativo al monitoraggio del Piano;

Risultano inclusi, invece, i n. 51 interventi dell'Ente Poste distribuiti su tutto il territorio nazionale che, per motivi amministrativi, sono stati accorpati in un unico intervento con Delibera n. 10/99 ma che, ai fini del monitoraggio, devono continuare ad essere considerati separatamente.

In base a questo criterio, pertanto, il Rapporto fa riferimento a n. 1.174 interventi, come da tabella che segue:

Descrizione	Protocollo	Num.
Interventi ricompresi nel Piano al 31.08.99		1.131
Interventi ENIT	0001-0002-0003A	-3
Intervento Ambito Nazionale	249	-1
Interventi ex articolo 2, comma 8, Legge 270/97	10484-10484/A	-2
Monitoraggio interventi	9700	-1
Intervento Ente Poste unico ex Delibera 10/99	17729	-1
Interventi Ente Poste accorpati nel prot. 17729		+51
Interventi soggetti a monitoraggio		1.174

Nel corso del trimestre, al fine di rimuovere talune anomalie riscontrate nella Banca Dati dell'URCGE, il soggetto Monitore ha acquisito presso l'URCGE stesso copia della documentazione (modelli A, modelli MM, altra documentazione) relativa a tutti gli interventi inseriti nel Piano al fine di verificare, in particolare:

la coerenza dei termini di cui alla lettere c) (data prevista per l'affidamento dell'appalto) ed alla lettera d) (data prevista per la piena funzionalità delle opere) con le altre date programmatiche inserite nel Data Base;

la corrispondenza tra il costo dell'intervento/finanziamento risultante dal Data Base e quella indicata nella relativa documentazione di cui sopra.

I controlli e le relative correzioni si sono potuti effettuare, anche attraverso una azione correlata presso i beneficiari, per la quasi totalità degli interventi, salvo alcuni casi "atipici" che hanno richiesto e/o richiederanno ulteriori approfondimenti presso i rispettivi Beneficiari.

- Rilevazioni

E' proseguita durante il trimestre l'attività di raccolta delle informazioni presso i Beneficiari, secondo i criteri e le modalità illustrate nel precedente 1° Rapporto trimestrale.

Le verifiche riferite agli adempimenti amministrativi (fasi da T2 a T7 e fase T9) sono state effettuate a ridosso delle scadenze previste per ciascuna fase, al fine di accertare che l'evento conclusivo previsto per quella fase si fosse effettivamente verificato.

I controlli effettuati hanno portato alla segnalazione di n. 124 "mancati adempimenti"; di questi, n. 80 comporteranno, salvo recuperi nelle fasi successive, uno slittamento del termine di realizzazione dell'intervento oltre il 31.10.1999.

Per gli interventi già cantierizzati, invece, le verifiche hanno avuto cadenze differenziate in relazione alla categoria di appartenenza del singolo intervento ed alla "classe di monitoraggio" dello stesso, come da tabella che segue:

CATEGORIA INTERVENTI	CRITICITA'/CLASSE DI MONITORAGGIO		
	ALTA	MEDIA	BASSA
Lavori	Mensile	Bimestrale	Trimestrale
Forniture di beni	Stipula del contratto/Completamento fornitura		
Prestazioni di servizi	Stipula del contratto/Completamento fornitura		

Superate, nella maggior parte dei casi, quelle difficoltà iniziali legate alla errata indicazione e/o cambiamento dei nominativi e/o degli indirizzi dei titolari/referenti/rappresentanti, etc., con conseguente ricerca dei nuovi referenti/indirizzi, sono state ribadite invece le considerazioni già svolte nel precedente rapporto in ordine alle problematiche riscontrate nel corso dell'attività di rilevazione, tra cui le più ricorrenti sono state:

difficoltà nel reperire da parte dei Soggetti Beneficiari la documentazione richiesta o scarsa disponibilità a renderla disponibile;

referenti con scarsa dimestichezza con le operazioni connesse con le attività giubilari;

suddivisione degli interventi in lotti, non identificati nella Banca Dati URCGE, con conseguente "moltiplicazione" degli atti formali necessari.

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi già cantierizzati, sono state riscontrate non poche difficoltà nell'acquisizione del Programma Lavori; molto spesso, infatti, quello contenuto nel progetto esecutivo posto a base dell'appalto è molto generico ed anche quello predisposto dall'impresa è alquanto sommario. Il Soggetto Monitoratore ha dovuto quindi effettuare la valutazione dell'avanzamento fisico dei lavori sulla base di informazioni non del tutto esaurienti e quasi sempre conducendo ripetuti approfondimenti da condurre con la Direzione Lavori.

- Elaborazione dei cronogrammi degli interventi

Per gli interventi per i quali mancano, a livello programmatico, le date di ultimazione di una o più

fasi intermedie rispetto alle fasi T5 (affidamento dell'appalto - termine lettera c) e TF (piena funzionalità delle opere - termine lettera d), si è provveduto a calcolare convenzionalmente le date programmatiche mancanti utilizzando la seguente procedura:

Fasi precedenti la T5 (affidamento dell'appalto)

la prima data disponibile di ultimazione di una fase viene considerata come data di ultimazione anche per le fasi precedenti;

qualora manchi la data di ultimazione di uno o più fasi intermedie (ad esempio la T2 e la T3 avendo disponibili le date relative alla T1 ed alla T4), queste vengono calcolate mediando la data immediatamente precedente con quella immediatamente successiva (la differenza in giorni calcolata tra la prima fase precedente e la prima fase successiva viene divisa per il numero delle fasi per le quali manca la data di ultimazione);

Fasi intermedie tra la T5 (affidamento dell'appalto) e la TF (piena funzionalità delle opere)

le date mancanti vengono calcolate mediando la data immediatamente precedente con quella immediatamente successiva (la differenza in giorni calcolata tra la prima fase precedente e la prima fase successiva viene divisa per il numero delle fasi per le quali manca la data di ultimazione).

I cronogrammi sono stati presentati sotto forma di Diagramma di Gantt in cui a ciascuna fase del processo di attuazione corrispondono tre barre di colore diverso, con riferimento a tre scenari temporali:

la previsione programmatica (colore nero)

la previsione rimodulata al precedente momento di rilevazione (colore verde)

la previsione rimodulata all'attuale momento di rilevazione (colore rosso)

Sul diagramma sono state anche indicate le date sulla base delle quali il cronogramma è stato costruito, evidenziando con un asterisco quelle calcolate secondo le procedure sopra descritte.

Sul diagramma è stato inoltre sempre evidenziata la data del 31.10.1999.

- Elaborazione dei coefficienti di criticità

Nel trimestre di riferimento è stata apportata una modifica alla metodologia di calcolo già approfonditamente illustrata nel Rapporto precedente. Al fine di rendere più significativo l'indice di criticità per gli interventi che si trovano in fase di esecuzione dei lavori, infatti, è apparso opportuno adottare un criterio per la valutazione della durata residua dei lavori che tiene conto di 2 distinti elementi:

la proiezione a fine lavori del ritmo di avanzamento effettivamente rilevato a partire dall'inizio lavori, sintetizzabile nella formula

$$Tr = Ttr * (1-X) / X \text{ dove}$$

Tr = tempo residuo previsto;

Ttr = tempo trascorso dall'inizio lavori fino alla rilevazione;

X = indice di avanzamento, compreso tra 0 e 1 (valore percentuale / 100).

Secondo questo criterio, molto semplicemente, se per il 25% dei lavori si sono impiegati 2 mesi, per il restante 75% se ne prevedono altri 6.

Il problema di questo criterio, da solo, è che fornisce indicazioni tanto meno significative, quanto più piccolo è l'avanzamento, sia perchè il campione è esiguo, sia perchè l'andamento nelle fasi iniziali può avere aspetti particolari, sia perchè la previsione può risentire fortemente di piccoli errori di valutazione (un errore nella stima dell'avanzamento dal 15% al 10% aumenta la durata residua prevista del 59%). Inoltre il modello non è in grado di fornire indicazioni per avanzamento pari a 0 (la durata tende all'infinito e l'applicazione della formula produrrebbe un errore di divisione per 0).

Si è pertanto introdotto un secondo criterio, parallelo al primo, basato sulla quota residua della durata totale programmata

Tr = Tpg * (1-X) dove

Tpg = tempo totale programmato (gli altri simboli conservano il significato visto sopra).

In definitiva, la previsione è ottenuta dalla media ponderale dei due criteri, utilizzando come pesi, rispettivamente, lo stesso indice di avanzamento dei lavori ed il suo complemento a 1, corrispondente alla quota parte residua. Si ottiene così di rendere poco influente il primo criterio quando l'avanzamento è piccolo e, viceversa, di rendere poco influente il secondo quando la storia del già fatto risulta maggiormente significativa. La formula completa pertanto è la seguente:

$$Tr = Tr1 * X + Tr2 * (1-X) = Ttr * (1-X) + Tpg * (1-X)^2$$

- Stato di attuazione complessivo

Come già evidenziato in precedenza, dei n. 1.174 interventi cui il secondo Rapporto si riferisce, n. 23 interventi sono di competenza INAIL e n. 51 sono di competenza dell'ENTE POSTE e raggruppati a livello nazionale. In ambito "regionale", pertanto, sono stati considerati n. 1.100 interventi, per un importo di finanziamenti concessi pari a L./Mil. 1.861,6.

Detti interventi, in forma tabellare ed in forma grafica, sono stati raggruppati per Regioni e per Categoria. Nel complesso, la ripartizione per categoria è la seguente:

Categoria	Interventi		Finanziamenti	
	Num.	%	L./Mil.	%
Lavori	826	75,1%	1619,7	87,0%
Forniture	70	6,4%	126,8	6,8%
Beni Culturali	56	5,1%	115,1	6,2%
Privati	148	13,5%	0	0,0%
Totale	1.100	100,0%	1.861,6	100,0%

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel complesso, la ripartizione degli interventi (Privati esclusi) in funzione della fase in corso di attuazione è la seguente:

	Rilevazione		Esecuzione dei lavori		Fase successiva o completato		Totale	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
T1/nd	36	4,4%	5	7,1%	1	1,8%	42	4,4%
T2	0	0,0%					0	0,0%
T3	2	0,2%	1	1,4%	0	0,0%	3	0,3%
T4	5	0,6%					6	0,6%
T5	15	1,8%	5	7,1%	0	0,0%	20	2,1%
T6	15	1,8%	7	10,0%	0	0,0%	22	2,3%
T7	5	0,6%	4	5,7%	0	0,0%	9	0,9%
T8	678	82,1%	43	61,4%	53	94,6%	774	81,3%
T9	51	6,2%	2	2,9%	2	3,6%	55	5,8%
TF	4	0,5%	2	2,9%	0	0,0%	6	0,6%
Compl.	15	1,8%		0,0%	0	0,0%	15	1,6%
Totale	826	100,0%	70	100,0%	56	100,0%	952	100,0%

Nel complesso, dunque, l'81,3% degli interventi si trova in fase di esecuzione dei lavori (rispetto al 72% della rilevazione al 31.5.1999) e l'8% risulta in una fase successiva o completato (rispetto al 2% della rilevazione al 31.5.1999).

Nel complesso, la ripartizione degli interventi (Privati esclusi) in funzione del livello di criticità è la seguente:

Criticità	Interventi (privati esclusi)	
	Numero	%
ALTA	506	66
MEDIA	38	5
BASSA	218	29
Totale	762	100.0
Non calcolabile	190	

Per completezza di informazione, infine, sono state altresì presentate le informazioni relative a:

Interventi completati

Interventi di competenza INAIL;

Interventi di competenza ENTE POSTE accorpati.

- Stato di attuazione per categoria

Categoria lavori

Il Piano comprende 826 interventi della categoria Lavori, per un costo totale stimato di L./Mld.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.114,9 e Finanziamenti per L./Mld. 1619,7

Nella tabella che segue è riportato lo stato di attuazione rispetto a quanto programmato:

Fase di attuazione	Programmata		Al 15.9.99	
	Num.	%	Num.	%
T1/nd	3	0.4%	56	6.8%
T2	0	0.0%	1	0.1%
T3	0	0.0%	5	0.6%
T4	0	0.0%	10	1.2%
T5	0	0.0%	21	2.5%
T6	2	0.2%	12	1.5%
T7	4	0.5%	7	0.8%
T8	375	45.4%	650	78.7%
T9	216	26.2%	45	5.4%
TF	123	14.9%	4	0.5%
Compl.	103	12.5%	15	1.8%
Totale	826	100.0%	826	100.0%

Complessivamente, gli interventi in esame presentano i seguenti livelli di criticità:

Criticita	Interventi	
	Numero	%
ALTA	431	64
MEDIA	37	6
BASSA	204	30
Totale	672	100.0
Non calcolabile	154	

Categoria forniture

Il Piano comprende 70 interventi della categoria Forniture, per un costo totale stimato di L./Mld. 177,0 e Finanziamenti per L./Mld. 126,8

Nella tabella che segue è riportato lo stato di attuazione rispetto a quanto programmato:

Fase di attuazione	Programmata		Al 15.9.99	
	Num.	%	Num.	%
T1/nd	0	0.0%	5	7.1%
T3	0	0.0%	1	1.4%
T5	2	2.9%	6	8.6%
T6	0	0.0%	7	10.0%
T7	0	0.0%	4	5.7%
T8	25	35.7%	43	61.4%
T9	12	17.1%	2	2.9%
TF	19	27.1%	0	0.0%
Compl.	12	17.1%	2	2.9%
Totale	70	100.0%	70	100.0%

Complessivamente, gli interventi in esame presentano i seguenti livelli di criticità:

Criticità	Interventi	
	Numero	%
ALTA	46	92
MEDIA	1	2
BASSA	3	6
Totale	50	100.0
Non calcolabile	20	

Categoria beni culturali

Il Piano comprende 56 interventi della categoria Beni culturali, per un costo totale stimato di L./Mld. 124,1 e Finanziamenti richiesti per L./Mld. 115,1.

Nella tabella che segue è riportato lo stato di attuazione rispetto a quanto programmato:


Fase di attuazione	Programmata		Al 15.9.99	
	Num.	%	Num.	%
T1/nd	0	0.0%	1	1.8%
T3	0	0.0%	0	0.0%
T5	0	0.0%	0	0.0%
T6	0	0.0%	0	0.0%
T7	0	0.0%	0	0.0%
T8	17	30.4%	53	94.6%
T9	30	53.6%	2	3.6%
TF	5	8.9%	0	0.0%
Compl.	4	7.1%	0	0.0%
Totale	56	100.0%	56	100.0%

Complessivamente, gli interventi in esame presentano i seguenti livelli di criticità:


Criticità	Interventi	
	Numero	%
ALTA	29	72
MEDIA	0	0
BASSA	11	28
Totale	40	100.0
Non calcolabile	16	

ALLEGATI AL SECONDO RAPPORTO TRIMESTRALE (ESTRATTO)

Numero interventi con categoria "BC" suddivisi per fase del processo di attuazione in corso

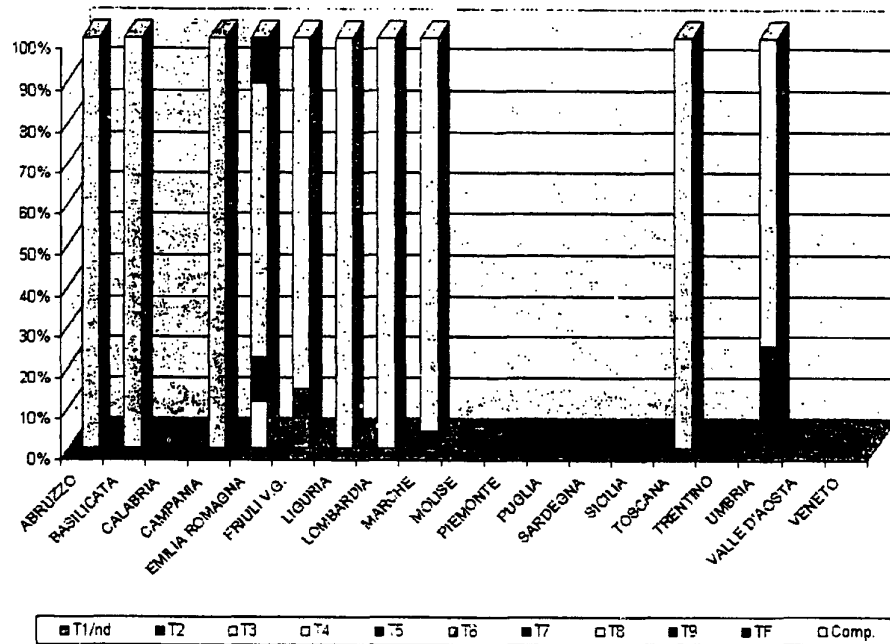


Numero interventi con categoria "F" suddivisi per fase del processo di attuazione in corso

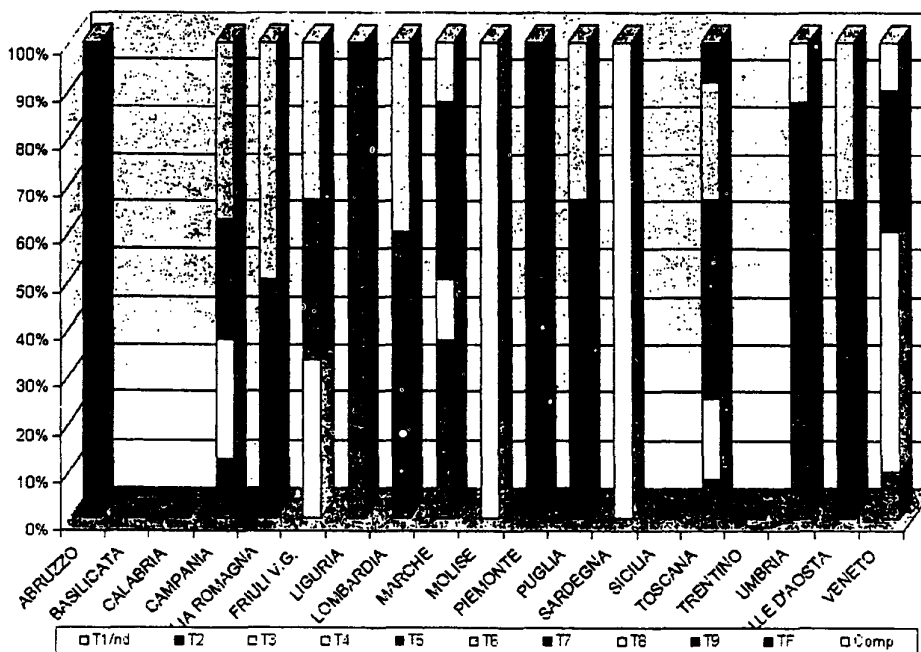

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero degli interventi, per Regione, suddivisi in base al livello della criticità calcolata all'ultima fase del processo di attuazione conclusa

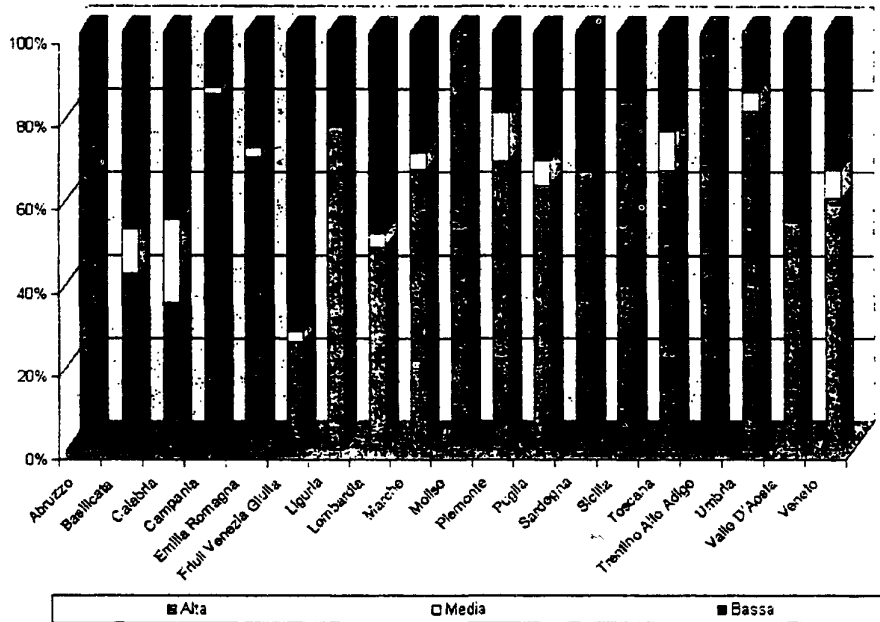

5. PARTE QUINTA – IL PIANO ENIT E LA TASK FORCE PER LA COMUNICAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

5.1. Il Piano ENIT e la Task Force per la Comunicazione presso la Presidenza del Consiglio.

La legge 270/97 affidava all'ENIT il compito di effettuare la comunicazione e la promozione nell'ambito delle sue attività istituzionali.

Successivamente, il Decreto del Ministro Costa, di fissazione delle procedure di costruzione del Piano degli Interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, ha previsto la presentazione da parte del Ministro delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000 di un Programma dettagliato di iniziative di comunicazione e di promozione mirato anche a garantire la compatibilità non solo con il Piano stesso ma anche con il Piano "Roma e Lazio".

Le attività dell'ENIT diventano così complementari alle altre iniziative inerenti al Giubileo finanziate dallo Stato italiano.

Tutte le iniziative dell'ENIT si inseriscono in due filoni distinti ma collegati: il primo intende contribuire alla gestione ottimale dei flussi turistici nell'Anno Santo a livello nazionale, regionale e locale, e il secondo intende favorire la valorizzazione del prodotto turistico nazionale.

A prescindere dai contenuti del Programma, esso deve rispondere ed in effetti risponde ad alcune esigenze di tipo generale.

La prima esigenza è che tutte le iniziative di comunicazione e di promozione siano basate su uno scenario unico e condivisibile: l'evento del Grande Giubileo. Questo scenario è quello utilizzato dalla Commissione e descritto altrove. Gli input per questo scenario sono – da un lato - il quadro regionalizzato del flusso turistico previsto per il 2000 e – dall'altro - la realizzazione di nuove offerte, strutture ricettive, eventi e itinerari turistico - religiosi prevista dai Piani.

La seconda esigenza è che le iniziative di comunicazione e di promozione siano concertate e coordinate con quelle programmate dagli altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'organizzazione del Giubileo (ad esempio il Dipartimento per il Turismo, il Vaticano, il TCI, Regioni, Province, Comuni, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, le Associazioni di Imprese, i gestori di importanti nodi di trasporto - come FS, Società Autostrade, Aeroporti e Porti - e le Amministrazioni Locali), anche per utilizzare al meglio le risorse finanziarie disponibili. In particolare si deve curare il rapporto tra comunicazione e promozione all'estero, oggetto di questo Programma, e in Italia e, ancora più specificamente, quello tra le stesse iniziative per il pacchetto Roma e Lazio e quelle che riguardano il resto d'Italia.

La terza esigenza di fondo riguarda le intese che dovranno essere cercate anche con altri attori non direttamente coinvolti dal Piano, come ad esempio gli enti ecclesiastici all'estero (usufruendo della rete gestita dalla Santa Sede in questo momento), i tour operators specializzati nei viaggi a sfondo religioso nei paesi dove la partecipazione dei fedeli cattolici risulta essere più attiva ed il Comitato degli Italiani all'Estero (COMITES).

Oltre a rispondere alle finalità generali suindicate, il Programma delle Iniziative di Comunicazione e di Promozione contiene anche una serie di indicazioni circa il contenuto dei messaggi da diffondere, i segmenti di mercato ai quali questi messaggi vanno indirizzati ed i canali più

appropriati di diffusione.

Il primo elemento che connota il programma è quello di essere di respiro nazionale per promuovere un unico marchio italiano ed escludere destinazioni particolari. Un secondo aspetto rilevante è che il Programma si propone di essere non solo strumento di promozione ma soprattutto uno strumento di orientamento e di gestione dei flussi di visitatori, sia a livello nazionale che a livello locale.

Molti, ed in particolare gli operatori turistici, temono infatti che il Giubileo provochi una ricaduta negativa sul turismo abituale che interessa l'Italia poiché questo fenomeno si è verificato frequentemente nel passato in occasione di altri grandi eventi.

Un altro messaggio forte che verrà lanciato è quello di un paese che si sta organizzando seriamente ad accogliere un flusso di visitatori di eccezionali dimensioni e che questi sforzi non solo permettono a chi verrà in Italia in quell'anno di non risentire di questo improvviso aumento della domanda, ma anzi consentono che la qualità complessiva dell'offerta turistica italiana risulti migliorata strutturalmente e a beneficio di tutti i visitatori.

Ciò che è sembrato essenziale trasmettere a tutti i potenziali visitatori di quell'anno è il senso dell'evento, non solo in termini religiosi, ma anche in termini culturali, sociali ecc. Verranno inoltre comunicati tempestivamente i tempi (giornate particolari, break estivo) e le modalità degli eventi (eventi speciali e quelli ricorrenti), sulla base del calendario pastorale approvato dalla Santa Sede e dei programmi culturali adottati dai singoli soggetti istituzionalmente competenti (Teatro dell'Opera, Conservatorio di Santa Cecilia ecc.).

Mentre il Piano per il Giubileo Fuori Lazio ha cercato di concentrare i finanziamenti in alcuni progetti di primaria importanza per l'evento stesso, il Programma di Comunicazione e di Promozione offre innanzitutto un'opportunità di valorizzazione dei prodotti e delle destinazioni complementari a quelle per le quali si prevede attualmente un massiccio interesse turistico - religioso.

La promozione dell'alternativo diventa così la possibilità di canalizzare parte della pressione turistica su luoghi che a priori sono considerati meno frequentati, e contemporaneamente offre l'opportunità di promuovere località meno conosciute. Si fondono così in maniera naturale gli obiettivi di gestione e di promozione del Programma.

Particolare attenzione meriteranno le regioni Marche ed Umbria. Queste regioni, colpite dal terremoto, hanno visto calare drasticamente la domanda turistica. Siccome le loro economie dipendono fortemente dalle attività turistiche, il calo della domanda comprometterebbe la loro base economica, pertanto nel Programma di Comunicazione e di Promozione uno spazio maggiore verrà dedicato proprio a queste regioni, pur tutelando l'immagine unitaria e nazionale che tutta la operazione dovrà mantenere.

Ultimo aspetto rilevante del Programma è quello della calendarizzazione delle attività articolate in iniziative da svolgere da subito fino al 2000, iniziative da porre in essere nel corso dello stesso Anno Santo ed in quelle di follow - up da sviluppare nei primi anni dopo il Giubileo.

Il messaggio predominante nella fase pre - Giubileo dovrà essere rassicurante verso i segmenti tradizionali ed informativo verso i potenziali turisti religiosi. Invece durante il Giubileo, il messaggio che dominerà è quello di orientamento, informando in tempo reale i visitatori che stanno per arrivare sulla disponibilità di strutture e infrastrutture, collegandosi anche ai sistemi finanziati di prenotazione e di gestione dei flussi locali e regionali.

Innovativo del Programma ENIT non è soltanto l'approccio generale, ma anche il fatto che si prevede la costituzione di una specifica Task Force per la Comunicazione inerente al Giubileo presso la Presidenza del Consiglio. Membri della Task Force sono rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici, Dipartimento per il Turismo, Vaticano, Agenzia romana per la preparazione del

Giubileo, ENIT e delle Regioni. Questa Task Force, operativa da settembre 1998, avrà il compito di coordinare alcune importanti iniziative di comunicazione, di assicurarne l'omogeneità, e – infine - di monitorare le iniziative di comunicazione che sono state finanziate dallo Stato.

Il Gruppo di Lavoro per il coordinamento delle iniziative di comunicazione e di promozione del Giubileo affidate all'ENIT dalla legge 270/1997 si è riunito sei volte nel corso del 1998. Le prime tre riunioni sono state dedicate esclusivamente alla messa a punto del Piano di Comunicazione e di Promozione proposto dal Ministro dei Lavori Pubblici, approvato dalla Commissione e incluso nel Piano per il "Giubileo Fuori Lazio". Infatti questo Piano implicava ingenti cofinanziamenti a carico dell'ENIT che, viceversa non era in grado di garantire.

Sulla base delle proposte del citato Gruppo di Lavoro, per effetto delle sinergie generate dalla collaborazione tra gli attori rappresentati (sito Internet, raccolta informazioni sulle manifestazioni, ecc.), l'ENIT ha richiesto la riprogrammazione con l'eliminazione di alcuni interventi ritenuti meno significativi e l'accorpamento di altri, per garantire la fattibilità oltre che la funzionalità dell'intero pacchetto di iniziative.

Il Gruppo di Lavoro ha presieduto alla preparazione dei Bandi di Gara per le diverse iniziative dell'ENIT ed alcuni componenti hanno fatto parte delle commissioni aggiudicatrici dei due appalti di servizi.

Attualmente l'attività del Gruppo è focalizzata sui contenuti della comunicazione e della promozione, sui messaggi comuni diretti a guidare, ove possibile, i flussi di pellegrini e di turisti in Italia nel 2000 e negli anni successivi al mega-evento.

5.2. Aggiornamento Lavori Svolti dalla Task Force per il Coordinamento delle Iniziative per la Comunicazione e la Promozione del Giubileo 2000

Già dalla prima riunione del Gruppo di Lavoro per il Coordinamento delle Iniziative per la Comunicazione e la Promozione del Giubileo 2000 è emersa la necessità di chiarire quali possano essere i principali elementi della strategia di comunicazione che poi determineranno i contenuti delle Iniziative di Comunicazione e di Promozione da sottoporre alla Commissione e da affidare quindi all'ENIT.

Alcuni di questi elementi potevano essere trovati nel Programma di Iniziative predisposto il 21 Novembre 1998 dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi che parla di due obiettivi strategici distinti ma collegati, cioè quello di contribuire alla gestione ottimale dei flussi turistici nell'Anno Santo a livello nazionale, regionale e locale, e quello di favorire la valorizzazione del prodotto turistico nazionale. Tutte le iniziative di comunicazione e di promozione devono basarsi su uno scenario unico e condivisibile di quello che sarà l'Evento del Grande Giubileo, uno scenario che parte da una conoscenza della domanda, dell'offerta e delle combinazioni di prodotti/mercati che ne seguiranno. La consapevolezza che la comunicazione è un elemento fondamentale del Piano Giubileo e l'esigenza di coordinare le diverse iniziative ha portato all'istituzione di un apposito Gruppo di Lavoro presso l'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi che raccoglie i principali attori giubilari.

Oltre ad essere coordinato, il Programma delle Iniziative di Comunicazione e di Promozione contiene una serie di elementi precisi che determineranno il contenuto dei messaggi da diffondere, i segmenti di mercato ai quali questi messaggi vanno comunicati e i canali più appropriati di diffusione. Il programma ha respiro nazionale, promuovendo un unico marchio italiano ed

escludendo attenzioni per destinazioni particolari. Si propone di essere non solo uno strumento di promozione ma soprattutto uno strumento di orientamento e di gestione dei flussi di visitatori, sia a livello nazionale che a livello locale. Il messaggio principale che la campagna divulga è quello di un paese, l'Italia, che si sta organizzando seriamente a questo evento. La promozione dell'alternativo diventa, da una parte, la possibilità di dirottare una fetta della pressione turistica su luoghi che a priori possono essere meno frequentati quell'anno e, contemporaneamente, l'opportunità di promuovere località meno conosciute. Si fondono così in maniera naturale gli obiettivi di gestione con quelli di promozione del Programma.

Le sedute della Task Force si sono sempre tenute seguendo questo spirito, un approccio questo che rende valutabile e verificabile ogni singola azione proposta e presa. Più concretamente, nelle diverse sedute della Task Force che si sono svolte nel periodo a cui si riferisce questa relazione sono state portate modifiche significative al modo di allestire il sito Internet dedicato al Giubileo, allo house style di tutta la campagna di comunicazione "Più Italia che Mai", al cosiddetto piano media e agli interventi proposti dalle delegazioni ENIT all'estero. Inoltre, sono nate spontaneamente alcune iniziative di collaborazione - connesse sì alla comunicazione e all'informazione verso i cittadini ed i pellegrini ma non strettamente legate al Piano ENIT - tra gli enti rappresentati nel gruppo di Lavoro, iniziative che si auspica migliorino lo svolgimento del mega-evento. Infine, alcuni componenti del Task Force hanno rappresentato lo Stato Italiano nei diversi momenti di presentazione del Piano ENIT, suscitando non solo un forte interesse ma anche consenso riguardo l'impostazione dell'iniziativa.

5.3. Incontro di Coordinamento tra Soggetti Beneficiari Settore 'Gestione dei Flussi di Visitatori' del 14 aprile 1999

Per far fronte all'ingente numero di pellegrini che visiterà il nostro Paese ed evitare l'emergere di situazioni di disagio per visitatori ed abitanti, è stata selezionata e finanziata una serie di iniziative che mirano a sviluppare sistemi di gestione dei flussi in diverse parti d'Italia. Proprio per la procedura 'bottom-up' con cui è stato costruito il Piano Giubileo gli interventi finanziati si caratterizzano per una eterogeneità progettuale di tipo quantitativo e qualitativo.

Per rendere più omogenee e compatibili tra di loro le diverse proposte e, di conseguenza, per cercare di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dallo Stato per la loro realizzazione, è stato deciso di avviare un processo di coordinamento tra i soggetti che stanno realizzando sistemi di gestione dei flussi di visitatori in diverse parti d'Italia. Questo processo è stato avviato con un seminario che si è tenuto il 23 giugno 1998 a Roma. Obiettivo del seminario era proprio quello di porsi come momento di confronto e riflessione sul tema della gestione dei flussi, per innescare un processo di cooperazione e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nella costruzione di tali sistemi.

A nove mesi dal seminario, l'Ufficio ha deciso di organizzare un secondo incontro di tipo tecnico, tenutosi il 14 aprile 1999, per verificare alcuni punti: se il coordinamento auspicato dal Ministro dei Lavori Pubblici nel giugno del '98 sia stato effettivamente avviato, se ai suggerimenti forniti dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi per l'integrazione delle proposte sia stato dato seguito e - infine - se si possano identificare insieme, a lavori avanzati, nuove opportunità di collaborazione.

L'analisi trasversale, da una parte, di una serie di schede-progetto uniformi contenenti le principali caratteristiche strutturali degli interventi finanziati e, dall'altra, di alcuni significativi esempi di best-practice dei progetti - che era alla base della discussione del seminario del giugno del 1998 - ha evidenziato una estrema eterogeneità degli interventi proposti, sia per la varietà dei sistemi di gestione sviluppati, sia per il diverso peso attribuito, da ciascun progetto, ad ognuna delle componenti del sistema. In generale, a parte l'intervento onnicomprensivo proposto dall'Agenzia Romana per la Preparazione del Giubileo, le altre iniziative possono essere raccolte in due categorie principali:

Iniziative incentrate sull'informazione e la comunicazione, dove si presume che la gestione dei flussi avviene automaticamente una volta fornite le informazioni sui percorsi da seguire, sulla disponibilità ricettiva, sul traffico e la mobilità, ecc.

Iniziative incentrate sulla gestione e la logistica dove la necessità di gestire i flussi in loco è prioritaria, trascurando, tuttavia, la possibilità di regolamentare i visitatori già prima della partenza o durante il viaggio.

In particolare, le componenti più "forti", ossia quelle che risultano maggiormente sviluppate e dove si concentra la maggior parte degli interventi, sono la raccolta e l'erogazione delle informazioni. Meno sviluppate, o comunque meno dettagliate dal punto di vista organizzativo e gestionale, sono invece l'analisi e la previsione dei flussi, il monitoraggio, la logistica e le prenotazioni. Si ha la netta impressione che i progetti confidino troppo nelle capacità autogestionali dei visitatori, un eccesso di fiducia che alla fine potrebbe compromettere la funzionalità dei sistemi realizzati.

L'analisi indicava anche una serie di esempi di best practice, cioè alcune componenti delle proposte con caratteristiche interessanti, che possano essere seguite dagli altri soggetti titolari di finanziamenti in questo ambito.

Infatti, per quanto riguarda i sistemi di teleprenotazione, che possono essere considerati come uno degli elementi fondamentali per la logistica dei flussi, va sottolineato come in alcuni casi essi tendano ad essere limitati alla sola ricettività, trascurando altri servizi rilevanti, come il trasporto, il parcheggio, le visite ai luoghi di culto e gli eventi, nonché la prenotazione di pacchetti "all inclusive". A parte la tipologia di servizi prenotabili, l'efficacia di tali sistemi, in termini gestionali, è diversa a seconda che la prenotazione sia obbligatoria, cioè sia una condizione indispensabile per l'accesso alla città, oppure facoltativa, cioè si configuri come un servizio aggiuntivo offerto all'utente, di cui egli può usufruire o meno.

Tuttavia, lo sviluppo sinergico di tutte le componenti considerate ha notevoli effetti positivi sulla gestione complessiva. La previsione dei flussi, la raccolta, gestione ed erogazione delle informazioni rilevanti ai fini del Giubileo (trasporti, ricettività, eventi, servizi, ecc.) e, soprattutto, i tempi ed i modi in cui le comunicazioni devono essere effettuate (prima della partenza del pellegrino, durante il viaggio e in loco) necessitano, per essere efficaci, di un supporto dal punto di vista del monitoraggio e della logistica. Viceversa, l'implementazione di metodologie adeguate per il controllo e la ridistribuzione dei flussi, e quindi l'ottimizzazione delle politiche di governo

della domanda, presuppone la conoscenza delle caratteristiche e delle dinamiche del mercato ed un'accurata organizzazione delle informazioni raccolte e veicolate agli utenti finali.

La necessità di controllare ed organizzare i consistenti volumi di visitatori che transiteranno su tutto il territorio italiano richiede, quindi, la realizzazione di interventi che seguano logiche omogenee e che si basino su standard comuni di azione, pur nel rispetto delle specifiche esigenze locali e delle particolarità territoriali. L'individuazione di questi standard può avvenire su due livelli.

Il primo concerne le singole componenti del sistema di gestione, e consiste nel definire gli elementi indispensabili per un'efficace progettazione del sistema e la sua messa in rete. Da questo punto di vista, l'analisi trasversale evidenziava, per ciascuna componente, alcuni elementi da non sottovalutare, come: l'adozione di metodi di previsione dei flussi sia in fase preparatoria che di monitoraggio del fenomeno; l'utilizzo di architetture aperte basate su piattaforme Internet/Intranet per la raccolta e l'erogazione di informazioni in tempo reale ed a basso costo e l'agile collegamento con tutti gli attori del sistema; l'implementazione di sistemi automatizzati, informatici e telematici, per il monitoraggio e la logistica dei flussi ed, in particolare, la distribuzione di carte multiservizi (le cosiddette smart card) e la teleprenotazione dell'alloggio e dei servizi complementari, per favorire un controllo anticipato dei flussi di domanda.

A parità di componente considerata, un secondo livello comune di azione dovrebbe svilupparsi a livello territoriale. Si tratta, in pratica, di favorire forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti che interessino parti diverse di uno stesso territorio (ad esempio una stessa regione), oppure di azioni che interessino vari territori ma lungo uno stesso itinerario (per esempio la Via Francigena, la Via Romea). In questo caso, le sinergie che si verrebbero a creare porterebbero indubbi vantaggi sia dal punto di vista informativo che gestionale.

Si auspica ovviamente che anche dopo il Giubileo i sistemi di gestione dei flussi possano contribuire ad una più efficace gestione del turismo in alcune parti del paese. Un ulteriore sforzo di coordinamento tra i singoli sistemi potrebbe eventualmente portare ad un unico sistema nazionale di informazione turistica e di gestione dei flussi. Anche se troppi tentativi di questo tipo sono falliti in passato è forse presto per avere concrete speranze. Tuttavia, solo nel corso di realizzazione dei progetti si sono dovute affrontare scelte più precise di metodi di lavoro e di tecnologie adottate e quindi si possono presentare ulteriori momenti di coordinamento e di collaborazione che rendono più efficace ed efficiente questo settore del Piano Giubileo Lazio e Fuori Lazio.

L'incontro del 14 aprile 1999, dove erano presenti tutti i rappresentanti dei progetti di gestione dei flussi in molti casi accompagnati da loro tecnici, ha di fatto potuto dare un nuovo impulso agli scambi di idee e di know-how tra soggetti e, quindi, si auspica che renderà ancora più efficiente ed efficace l'investimento pubblico in questi sistemi.

APPENDICE**I Decreti**

Rep. N. 187/RC del 9 febbraio 1999

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 9 del 27 gennaio 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G. U. n. 247 del 22 ottobre 1997;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 9/99, adottata in data 27 gennaio 1999 dalla Commissione ex lege n. 270/97;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all "A" sono risultate necessarie, per la relativa realizzazione minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di £ 31.069.730.000;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia al finanziamento, formulata dai soggetti titolari degli interventi sotto indicati:

- n. 1681 "Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi" £. 960.000.000

- n. 3173 "Centro Casa del Carmelo" £. 2.100.000.000

che vengono, pertanto, cancellati dal Piano;

RITENUTO di disporre il definanziamento totale, con il conseguente recupero di £ 131.000.000, dell'intervento rubricato:

n. 5645 "Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto servoscala",

per l'intervenuta realizzazione dei lavori a totale carico del soggetto proponente;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia al finanziamento formulata dal titolare dell'intervento rubricato:

n. 4530 "Recupero della Cripta medioevale per accoglienza dei pellegrini",

il cui stanziamento è ridotto da £ 620.000.000 a £ 59.000.000, con una economia immediata pari a £ 561.000.000, fatta salva la maggior somma che risulterà all'esito della procedura contabile di recupero delle somme già trasferite e non utilizzate;

RITENUTO di assentire alle richieste di riduzione delle quote di cofinanziamento, conseguenti alla riduzione del costo degli interventi, in quanto tali da non precludere la piena funzionalità degli interventi stessi, nella loro originaria configurazione;

RITENUTO di prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento proposte da taluni soggetti beneficiari e del conseguente aumento del costo stimato dell'intervento, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

RITENUTO di accogliere la ulteriore richiesta di disaggregazione dell'intervento rubricato con n. 6104, disposto con D. M. del 6 agosto 1998, pubblicato su G.U n. 252 del 28 10 1998, al fine di razionalizzare le procedure realizzative con conseguente modifica del titolo e della ripartizione della quota di finanziamento e di cofinanziamento;

RITENUTO di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dall'Ente Arcidiocesi di Firenze, soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con n. 4062, in ordine al subentro nella titolarità dell'intervento medesimo, da parte del Convitto Ecclesiastico della Calza, quale usuario dell'immobile oggetto dei lavori;

RITENUTO di dover rettificare il D.M. n. 183/RC del 27 gennaio 1999, approvativo della delibera della Commissione n. 8/98 del 16 dicembre 1998, nella parte in cui dispone il defianziamento totale per £ 1.800.000.000 dell'intervento rubricato con n. 897 "Recupero e riorganizzazione funzionale del Chiostro monumentale del Convento di San Lorenzo da adibire a ricettività in comunità religiose e i relativi servizi", anziché il defianziamento parziale per £ 1.620.000.000, avendo l'U.R.C.G.E. già provveduto a trasferire al soggetto beneficiario £ 180.000.000, a titolo di anticipazione per gli oneri di progettazione;

RITENUTO, sulla base della documentata richiesta dei soggetti titolari, di accogliere il cambio del titolo di taluni interventi in conseguenza della diversa localizzazione o tipologia realizzativa;

RITENUTO di dover correggere alcuni errori materiali segnalati dai soggetti interessati ed attinenti la localizzazione o l'individuazione del soggetto beneficiario relativo;

RITENUTO di includere nel Piano nuovi interventi, in quanto coerenti con i criteri di cui al D.M. 17 settembre 1997 ed anche in conformità al parere n. 582 espresso dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 dicembre 1998, relativamente agli interventi localizzati nella regione Toscana ed afferenti la proposta di modificazione del Piano, approvata dalla Commissione con deliberazione n. 8 del 16 dicembre 1998, le cui statuizioni, in parte de qua, sono state stralciate con relativo D.M. di approvazione n. 183/RC del 27 gennaio 1999;

VISTO il parere favorevole n. 609, reso dalla Conferenza Stato-Regioni in data 4 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 9 del 28 gennaio 1999 della Commissione di cui all'art. 2 della stessa legge;

All'unanimità

DECRETA

- 1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £. 31.069.730.000.*
- 2. Sono totalmente defianziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, gli interventi sottoindicati, per un ammontare complessivo di £ 3.060.000.000:*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- n. 1681 "Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi" £. 960.000.000
- n. 3173 "Centro Casa del Carmelo" £. 2.100.000.000

3. E' totalmente defanziato, per un ammontare di £. 131.000.000, le conseguentemente cancellato dal Piano l'intervento rubricato:

n. 5645 "Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto servoscala",

avendo il titolare provveduto a realizzare i lavori a proprio totale carico.

4. E' parzialmente defanziato l'intervento rubricato con n. 4530 "Recupero della Cripta medioevale per accoglienza dei pellegrini", il cui stanziamento è ridotto da £ 620.000.000 a £ 59.000.000, con una economia immediata pari a £ 561.000.000, e fatta salva la maggior somma che risulterà all'esito della procedura contabile di recupero delle somme non utilizzate.

5. A rettifica del D. M. n. 183/RC del 27 gennaio 1999, in ordine al defanziamento totale di £ 1.800.000.000 dell'intervento rubricato con n. 897, è disposto il defanziamento parziale di £ 1.620.000.000, avendo l'URCGE già trasferito al titolare dell'intervento la somma di £ 180.000.000 per oneri di progettazione, fino all'esito del procedimento di recupero delle somme non utilizzate, previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge n. 270/97.

6. Le risorse disponibili sono, pertanto determinate in complessive £ 44.512.172.360, pari alla somma dei seguenti importi:

- 9.690.442.360 Risorse resesi disponibili e non riassegnate con D.M. del 27 gennaio 1999, decurtate dei 180 milioni di cui al punto 5;
- 31.069.730.000 Risorse rivenienti da ribassi d'asta di cui al punto 1;
- 3.191.000.000 Risorse rivenienti da defanziamenti totali di cui ai punti 2 e 3;
- 561.000.000 Risorse rivenienti dal defanziamento parziale di cui al punto 4.

7. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d), dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, i cambi titolo e di soggetto beneficiario, le aggregazioni e disaggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato B;

8. Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato B, per un ammontare complessivo di £ 2.430.000.000.

9. Sono inclusi nel Piano, in coerenza con le finalità della legge e sulla base di esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato C, per un importo complessivo di £ 41.732.000.000, restando nella disponibilità della Commissione £ 530.172.360

Roma, li 9 febbraio 1999

Il Ministro

Registrato alla Corte dei Conti il 31 marzo 1999

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 142

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 27 gennaio 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
370	San Gimignano	SI	RISTRUTTURAZIONE DI FORESTERIA ESISTENTE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OSPITALITA' A BASSO COSTO	MONASTERO DELLE MONACHE BENEDET. VALLOMBROSIANE	41.373.000
397	Nonantola	MO	OPERE DI MANUTENZIONE COMPLESSO ABBAZIALE	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA	916.000.000
507	Avezzano	AQ	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	PROV. RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	1.322.000.000
558	Bagnacavallo	RA	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO	COMUNE DI BAGNACAVALLO	253.180.000
579	Reggio di Calabria	RC	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO OPERA ANTONIANA DELLE CALABRIE	PROV. RELIGIOSA SS. APOSTOLI	806.941.000
599	Matera	MT	CASA DEL PELLEGRINO FORESTERIA OSTELLO DELLE MONACELLE	I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	617.349.000
616	Messina	ME	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	1.198.468.000
650	Lucca	LU	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ITINERARI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI LUCCA	514.128.000
904	San Giovanni Rotondo	FG	PARCHEGGIO MULTIPIANO NORD	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	4.273.690.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT. COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
1098	Lecce	LE RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALTARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTROSOFFITTO LIGNEO LACUNARI DELLE SALE A PIAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	33.470.000
1187	Brindisi	BR RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E ARREDO DELLA SALA CONVEGNI NEL COMPLESSO RELIGIOSO DON BOSCO	ISTITUTO DON BOSCO	242.936.000
1268	Asti	AT RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO	PROVINCIA DI ASTI	706.672.000
1292	Marzabotto	BO REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO	PROVINCIA DI BOLOGNA	238.287.000
1485	Bobbio	PC RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'	COMUNE DI BOBBIO	153.034.000
1496	Paola	CS REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PAOLA	341.376.000
1537	Fucecchio	FI RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	373.330.000
1820	Milano	MI CHIARAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO	MONASTERO COMUNITA' CISTERCENSE CHIARAVALLE	45.760.000
2013	Saint-Marcel	AO CASA DI ACCOGLIENZA	ISTITUTO DIOCESIANO SOSTENTAMENTO CLERO	18.000.000
2437	Catania	CT RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO DELLA DOMUS PACIS	ARCIDIOCESI DI CATANIA	125.636.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
2543	Caprese Michelangelo	AR	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO EREMO DELLA CASELLA DEDICATO A SAN FRANCESCO	PARROCCHIA DI SANTA MARIA E SAN MICHELE IN CAPRESE	41.600.000
2552/b	Bologna	BO	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIAZIONE (1° MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO	SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA	133.900.000
2578	Aquileia	UD	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELL'AULA SETTENTRIONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE	ARCIDIOCESI DI GORIZIA	270.341.000
2617	Messina	ME	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA	635.652.000
2897	Isernia	IS	RECUPERO A FINI RICETTIVI E CREAZIONE INFRASTRUTTURE PER ACCOGLIENZA NELL'AREA DEL SANTUARIO DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO	DIOCESI DI ISERNIA VENAFRO	1.816.200.000
2913	Fiesole	FI	RISTRUTTURAZIONE DI CASA CARROZZA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI	COMUNE DI FIESOLE	255.660.000
3151	Milano	MI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. EUSTORGIO	PARROCCHIA DI S. EUSTORGIO	38.964.000
3253	Venezia	VE	OPERE RELATIVE AL RESTAURO DELL'ANTICO OSPEDALE DEI PELLEGRINI E DELLE COPERTURE DELL'INTERO COMPLESSO ARCHITETTONICO	CONGREGAZION E ARMENA MECHITARISTA	353.400.000
3627	Grottaglie	TA	RESTAURO CONSERVATIVO A FINI DI RIUTILIZZO DELLA CHIESA E CONVENTO MARIA SS. DEL MONTE CARMELO	PARROCCHIA MARIA SS. DEL MONTE	433.024.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
3696	Reggio Nell'Emilia	RE	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA NEL CONVENTO DELLA BASILICA DELLA MADONNA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	205.986.000
3714	Verona	VR	OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA	COMUNE DI VERONA	525.000.000
3902	Ginosa	TA	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	COMUNE DI GINOSA	96.035.000
4061	Oria	BR	RESTAURO E RIUTILIZZO DEL RITIRO MARIA IMMACOLATA DA ADIBIRE A RISTORO PELLEGRINI CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	SEMINARIO VESCOVILE S.CARLO BORROMEO	140.000.000
4062	Firenze	FI	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITA' RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	ARCIDIOCESI DI FIRENZE	656.769.000
4110	Chiusi Della Verna	AR	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE OASI DI S. FRANCESCO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' INTERNA	ASSOCIAZIONE FEMMINILE SACRO CUORE	65.000.000
4111	Chiusi Della Verna	AR	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE POSTA ALL'INTERNO DEL SANTUARIO DELLA VERNA	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI DI S.FRANCESCO	62.000.000
4252	Monreale	PA	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DEL CLERO DI MONREALE FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	ARCIDIOCESI DI MONREALE	47.499.000
4668	Mercogliano	AV	REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO	DIOCESI DI MONTEVERGINE	19.000.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT. COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)	
4707	Firenze	FI	IL FULIGNO RITORNA ALLA CITTA' - RECUPERO DELLA CHIESA E DEI LOCALI ANNESSI	I. P. A. B. EDUCATORIO DELLA SS. CONCEZIONE	363.472.000
4767	Bari	BA	OSTELLO DEL LEVANTE	ENTEAUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	1.883.654.000
4961	Pietrelcina	BN	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO	COMUNE DI PIETRELCINA	1.587.320.000
4994	Albenga	SV	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI SAN MICHELE E RECUPERO DELLA PIAZZETTA DEI LEONI PROSPICIENTE L'ABSIDE	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	32.592.000
4995	Albenga	SV	CONCLUSIONE DEL RESTAURO DEL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI ALBENGA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	11.562.000
4998	Albenga	SV	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI ALBENGA	SEMINARIO VESCOVILE DI ALBENGA IMPERIA	171.784.000
5006	Montalcino	SI	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A SERVIZIO DELL'ABBAZIA DI S. ANTIMO PER LA SOSTA ED IL RISTORO COSTITUITA DA SPAZI PER L'ACCOGLIENZA E LOCALI DEDICATI ALLA PREGHIERA PARCHEGGIO PUBBLICO ATTREZZATO CON SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI	PARROCCHIA DI SS. FILIPPO E GIACOMO	24.702.000
5023	Bologna	BO	PARCHEGGI SCAMBIATORI CERTOSA VIA TANARI ANTISTADIO MANIFATTURA VIA MICHELINO FIERA SUD PARCO NORD CARRACCI GIURIOLO ARCOVEGGIO	COMUNE DI BOLOGNA	144.440.000
5025	Bologna	BO	PARCHEGGIO FOSCOLO PORTA SARAGOZZA	COMUNE DI BOLOGNA	364.310.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT. COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)	
5033	Bologna	BO	MANUTENZIONE E RESTAURO DEGLI ARCHI DI PASSAGGIO VIARIO DEL PORTICO DI S. LUCA TRATTO DI PIANURA	COMUNE DI BOLOGNA	128.070.000
5036	Bologna	BO	EX SCUOLA ADA NEGRI	COMUNE DI BOLOGNA	417.840.000
5039	Bologna	BO	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	COMUNE DI BOLOGNA	269.320.000
5083	Catanzaro	CZ	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	837.525.000
5301	Siracusa	SR	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO	ENTE CHIESA SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME	1.199.700.000
5326	Parma	PR	RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E RASSEGNA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA	DIOCESI DI PARMA	89.132.000
5330	Parma	PR	OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S. FRANCESCO	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	565.543.000
5514	Sepino	CB	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA SANTO STEFANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE ESPOSITIVA E PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	41.399.000
5559	Tortona	AL	OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA BASILICA SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA	PROVINCIA RELIGIOSA DI S. MARZIANO DI DON ORIONE	72.089.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
5638	Aosta	AO	VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA E DEI PERCORSI PERIFERICI PER I TRATTI COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNITARIO	COMUNITA' MONTANA GRAND COMBIN	257.760.000
5688	Aulla	MS	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA FORTEZZA DELLA BRUNELLA	COMUNE DI AULLA	59.400.000
5721	Lauria	PZ	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA NATIA DEL BEATO DOMENICO LENTINI E DELLA CASA DEL PELLEGRINO	COMUNITA' MONTANA LAGONEGRESE	58.740.000
5853	Corniglio	PR	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALA NORD DEL CASTELLO DI CORNIGLIO E RECUPERO FUNZIONALE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI CORNIGLIO	97.762.000
5950	Bergamo	BG	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI EDIFICIO "CASA DELLA GIOVANE"	DIOCESI DI BERGAMO	416.459.000
6012	Matera	MT	ITINERARIO DEGLI HABITAT RUPESTRI CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI DI MATERA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	418.660.000
6481	Montegallo	AP	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN LAPIDE E REALIZZAZIONE DI PICCOLO CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA DI S. MARIA IN LAPIDE DI MONTEGALLO	26.600.000
6490	Serra De' Conti	AN	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA CHIESA DI SAN MICHELE	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	20.000.000
6537	Pesaro	PS	ACCOGLIENZA POVERA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DISMESSO DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	681.976.000
6656	Citta' Di Castello	PG	MUSEO DIOCESANO ADEGUAMENTI ED ABBATTIMENTO BARRIERE	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	51.209.000
6663	Citta' Di Castello	PG	RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTADELLA SAN FLORIDO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	153.755.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
6712	Citta' Di Castello	PG	MUSEO DIOCESANO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	22.663.000
6989	Lugnano In Teverina	TR	RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	419.548.000
7167	Sant'Anatolia Di Narco	PG	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERA IN SAN FELICE	ARCIDIOCESI DI SPOLETO	321.603.000
7351	Loreto	AN	CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI E PELLEGRINI VILLA PIO XII	PROV. ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI	138.100.000
7465	Ancona	AN	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	COMUNE DI ANCONA	286.140.000
7502	Tolentino	MC	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI TOLENTINO	80.425.000
7503	Tolentino	MC	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI TOLENTINO	82.436.000
7505	Tolentino	MC	RESTAURO AFFRESCHI CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	22.479.000
7506	Tolentino	MC	RESTAURO COLONNATO CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	14.739.000
7570	Bevagna	PG	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA. DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI BEVAGNA	234.016.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

<i>PROT. COMUNE</i>	<i>PROV.</i>	<i>TITOLO</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)</i>
7663 Carbonara Al Ticino	PV	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO ED ARTISTICO DEI COMUNI DELLA FASCIA LITORANEA OCCIDENTALE DEL TICINO SULLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CARBONARA AL TICINO	82.978.000
11243 Lagonegro	PZ	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI	900.168.000
<i>Numero interventi</i>	78		<i>Totale</i>	31.069.730.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato "B"

Riunione commissione ex lege n. 270/97 del 27 gennaio 1999

modifiche (*) degli interventi inclusi nel Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

N° Prot. Urge	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
227	AA - 12 - EL - M	CALENDASCO	IL GIUOCO DI SIERICO APPRODO VIABILITA' E OPERE ACCESSORIE	COMUNE DI CALENDASCO	270	270	0	03/02/99	31/10/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
237	AC - 26 - ED - B	GENOVA	RECUPERO DI UNA CHIESA SECENTESCA OUALE CENTRO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI	CONGREGAZIONE OPERAI EVANG. FRANZONIANI	4.476	2.988	1.480			
394	AC - 14 - GA - L	FIORANO MODENESE	RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DEL PELLEGRINO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE NEL CASTELLO	ENTE DIOC. SALVEZZA E EDUCAZIONE	1.398	700	698	31/01/99	30/10/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
459	AA - 12 - ED - M	LAVAGNA	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI	COMUNE DI LAVAGNA	697	590	107			
643	AC - 12 - GA - M	MONTEROSSO AL MARE	COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO (REFEZIONE ED OSPITALITA')	SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE	4.328	4.058	270	28/02/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
								25/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 1 di 11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urge	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. C)	Termini Let. D)	Note
742	AB-26-HA-M	CAGLIARI	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - V. R.	ENTE POSTE ITALIANE	22	17	5			PROROGA TERMINE LETT. C)
897	AC-31-GA-L	VICENZA	RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL CHOSTRO MONUMENTALE DEL CONVENTO DA ADIBIRE A RICETTIVITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	COMUNITA' FRANCESCANI MINORI CONVENT.	2.182	1.800	382	28/01/99		ASSEGNAZIONE FINANZIARIA DI L. 186.000.000 PER DEFINIZIONE PARZIALE IL LUOGO DEL DEFINANZIAMENTO TOTALE DISPOSTO CON DELIBERA DEL 16/12/98
1133	AC-11-FD-L	CAROVIGNO	RESTAURO RECUPERO DEL SANTUARIO DI MARIA SANTISSIMA DI BELVEDERE E DEGLI IMMOBILI ADIACENTI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO MARIA S.S. DI BELVEDERE ED AMPLIAMENTO CON NUOVA STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	1.360	1.360	0			MODIFICA TITOLO
1183	PA-25-FD-M	S. GIOVANNI ROTONDO MANFREDONIA	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RICETTIVA	IMMOBILIARE FRANCESCO CACCAVO SRL	4.700	0	4.700			MODIFICA LOCALIZZAZIONE
1681	AA-26-FD-L	UDINE	RISANAMENTO CONSERVATIVO CORPO EST EX AULE SCOLASTICHE RICETTIVA A BASSO COSTO CON RELATIVI SERVIZI	ISTITUTO MONS. F. TOMADINI I.P.A.B.	1.200	960	240			DEFINANZIAMENTO TOTALE DI L. 960.000.000
1857	AC-12-GA-M	CHIOGGIA	CENTRO ACCOGLIENZA SALESIANA 2001 TURISMO GIOVANILE	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	538	488	50	8/2/99		PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
1912	AC - 12 - IA - L	SAN MARCO IN LAMIS	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANDELO DEI FRATI M.	5.085	4.155	930			
1988	AC - 12 - IA - B	TORTONA	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI S.M.ASSUNTA DI RIVALTA SCRIVA	PARROCCHIA S. M. ASSUNTA ABBAZIA CISTERCENSE	3.410	2.760	650	28/2/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
2012	AD - 12 - IA - M	AOSTA	CASA ACCOGLIENZA BARILLIER	ENTE MOR. ASILO PRINC. AMEDEO ECOLE MATERNELLE	2.495	900	1.595	30/11/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
2055	AA - 41 - IA - B	CIMITILE	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	5.100	3.400	1.700	12/10/98	30/10/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
2357	AC - 26 - GB - M	PIAZZA ARMERINA	RUTILIZZO DI UN'ALA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI D'ACIBRE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA	OPERA PIA CARMELA TRIGONA DI GERACI	953	833	20			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 506.000.000
2358	AC - 26 - FB - L	UDINE	OSTELLO PER LA GIOVENTU	PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE SPOSO B.V.M.	301	200	101	17/12/98	15/7/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
2405	AC - 14 - GB - M	RUINO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TICONE SULLA ROTTA GIULIARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	506	508	0	15/02/99		PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz. Let. C)	Termini Let. D)	Note
2440	AA-12-FD-M CASTELL'AZZARA	RECUPERO DI VILLA SFORZESCA	COMUNE DI CASTELL'AZZARA	6.000	5.500	500		
				6.620	6.120	500		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 620.000.000
2443	BA-25-FD-M SAN GIOVANNI ROTONDO	AFFITTACAMERE SCARALE	SCARALE FILOMENA SCARALE GIUSEPPE	287	0	287		MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO
2552/A	AC-53-IA-B BOLOGNA	RESTAURO DEL TRATTO URBANO DEL PORTICO DI S. LUCA, ARCHIDA 1 A 68 E DA 214 A 299	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	2.068	1.718	350		
2552/B	AC-53-IA-B BOLOGNA	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIATIONE (MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	932	782	150	21/12/98	PROROGA TERMINE LETT. C)
2617	AC-26-LA-B MESSINA	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI	4.145	4.000	145	21/12/98	PROROGA TERMINE LETT. C)
2639	AA-26-IA-B CAGLIARI	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	6.500	3.000	3.500	07/11/98	PROROGA TERMINE LETT. C)
2847/A	AA-26-IA-B CAGLIARI	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ENTE DIOCESI CATTEDRALE DI CAGLIARI	5.128	5.128	0	31/10/98	PROROGA TERMINE LETT. C)
2847/B	AA-26-IA-B CAGLIARI	RESTAURO LOCALI ADIACENTI AL CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	ENTE PARROCCHIA DI S. CECILIA	2.900	2.900	0	31/12/98	PROROGA TERMINE LETT. C)
2847/C	AA-26-IA-B CAGLIARI	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VICO DUOMO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	1.090	1.090	0	31/12/98	PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urge	Codice Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3034	AA-41-EA-L FIRENZE	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE SUD	COMUNE DI FIRENZE	3.710	3.154	556			
							16/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
3173	AD-22-FD-M LORETO	CENTRO CASA DEL CARMELO	DEL. PONTIFICIA SANT. DELLA SANTA CASA	2.100	2.100	0			
									DEFINANZIAMENTO TOTALE DI L. 2.100.000.000
3194	AA-41-EL-M FIRENZE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	2.100	1.889	231			
							10/02/99	30/10/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
3315	AA-41-LC-B FIRENZE	CHIESA DI S. M. NOVELLA E CHIOSTRI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC RIVELAZIONE INCENDIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	COMUNE DI FIRENZE	1.831	1.481	470			
							12/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
3506	AC-12-GA-M AREZZO	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CONVENTO DI SAN PIER PICCOLO	DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	1.318	1.200	118			
							19/11/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
3510	AA-41-FB-L FIRENZE	RECUPERO LOCALI NEL COMPLESSO DEL CARMINE PER OSTELLO	COMUNE DI FIRENZE	2.847	2.250	397			
							30/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
3572	AC-28-LA-M SAVONA	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAVONA	DIOCESI DI SAVONA NOLI	530	530	0			
							26/09/98	31/10/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

№ Prot. Uрге	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz. Lett. C)	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
3683	AA - 12 - EE - L	CARRODANO	RIPRISTINO DI UN TRATTO DELL' ANTICA VIA ROMEA CHE A PIEDI CONDUCEVA DA CARRODANO AL SANTUARIO DI N. S. DI ROVERANO AL PASSO DEL BRACCO CON RESTAURO DEL PONTE MEDIOVALE A DUE ARCHI	COMUNE DI CARRODANO	308	258	50			
4015/A	AC - 14 - FD - M	ALEZIO	COMPLESSO DI ACCOGLIENZA S. MARIA DELL' ALIZZA (1° LOTTO) - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELL' ALIZZA	CURIA VESCOVILE DI NARDO' - GALLUPOLI	1.340	1.340	0	30/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
4082	AC - 41 - GA - B	FIRENZE	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITA' RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	ENTE ARCIDIOSI DI FIRENZE	5.045	2.987	2.058	15/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
4194	AA - 41 - EF - M	FIRENZE	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	1.285	1.144	141	15/2/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
4198	AA - 41 - EA - L	FIRENZE	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICIA FIRENZE CASTELLO	COMUNE DI FIRENZE	1.480	1.241	219	9/2/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
4254	AC - 26 - GD	CALTANISSETTA	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	SEMINARIO VESCOVILE DI CALTANISSETTA	4.865	3.821	844	21/10/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
4310	AA - 41 - EA - M	FIRENZE	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	COMUNE DI FIRENZE	20.320	16.862	3.858	15/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urge	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fondi Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
4530	AC - 23 - GA - M	PADOVA	RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	MONASTERO SANTA GIUSTINA	623	620	3			
4559	AA - 41 - ED - M	FIRENZE	SISTEMA INFORMATICO SULLO STATO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA'	COMUNE DI FIRENZE	300	287	33	8/01/99		DEFINANZIAMENTO PARZIALE DI L. 561.000.000 PROROGA TERMINE LETT. C)
4739	AA - 28 - EA - M	MASSA MARITTIMA	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	5.272	1.700	3.572			
4966	BA - 23 - FA - M	PADOVA	RIQUALIFICAZIONE DI AREA INDUSTRIALE DISMESSA	VIBROCEMENTO VENETA S.P.A.	6.000	0	6.000			RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO E DEL COSTO TOTALE CANCELLAZIONE DAL PIANO
5027	AA - 53 - HC - M	BOLOGNA	PERCORSI PER NON VEDENTI	COMUNE DI BOLOGNA	1.550	1.550	0	24/09/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
5052	AC - 12 - LA - B	OTTONE	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	350	350	0	18/09/98	31/10/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
5083	AC - 14 - LA - B	CATANZARO	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	5.537	3.037	2.500	28/09/98		PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urge	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
5330	AA - 12 - EH - M	PARMA	OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S. FRANCESCO	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	3.740	3.200	540			
PROROGA TERMINE LETT. C)										
5523	AC - 12 - GB - B	MONTEROSSO AL MARE	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI PER UNA RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA	PROV. GENOVA FRATI MINORI CAPPUCCINI	1.828	1.147	479	30/11/98		
PROROGA TERMINE LETT. C)										
5645	AC - 31 - HA - L	VICENZA	RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO NEL CONTESTO DEL COMPLESSO DI MONTE BERICO CON LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO PER DISABILI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SERVO SCALA	PROV. VENEZIA DEI SERVI DI MARIA	190	131	85	5/11/98		
PROROGA TERMINE LETT. C)										
5968	AC - 12 - GA - M	FONTANELLATO	MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA ACCESSIBILITA' RISTORO RICETTIVITA' POVERA RESTAURO DI LUOGHI DI IMPORTANZA RELIGIOSA E CULTURALE	MONASTERO DI S. GIUSEPPE PROV. DOMENICANA	528	528	0			DEFINANZIAMENTO DI L. 131.000.000
PROROGA TERMINE LETT. C)										
6104	AC - 12 - LA - B	PIETRASANTA	RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA	PARROCCHIA S. MARTINO	4.687	2.528	2.159	31/12/98		
6104-A			RESTAURO DEL CAMPANILE		1.887	0	1.887	30/6/98		
6104-B			RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DUOMO		2.666	1.981	685	30/6/98		
6104-C			RESTAURO DI AFFRESCHI		347	347	0	30/6/98		

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Termini Let. C) Lett. D)	Note
6121	AA - 41 - HA - L FIRENZE	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	5.000	4.450	550	15/2/99	PROROGA TERMINE LETT. C)
6122	AA - 41 - EA - L FIRENZE	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	COMUNE DI FIRENZE	4.513	3.836	677	30/1/99	PROROGA TERMINE LETT. C)
6219	AA - 41 - IC - M FIRENZE	CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE.	COMUNE DI FIRENZE	1.504	1.278	228	7/01/99	PROROGA TERMINE LETT. C)
6220	AA - 41 - EB - M FIRENZE	VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI	COMUNE DI FIRENZE	1.176	774	402	10/3/99	PROROGA TERMINE LETT. C)
6227	AA - 41 - LA - B FIRENZE	CHIESA DI S. MARIA NOVELLA INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E PULITURA DEGLI INTERNI SUPERFICI INTONACATE COLONNE ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI ED INFISSI	COMUNE DI FIRENZE	4.291	3.175	1.116	23/12/98	PROROGA TERMINE LETT. C)
6389	AC - 41 - GA - M ORVIETO	RECUPERO DEL CONVENTO DI SAN CRISPINO DA VITERBO IN ORVIETO ACCOGLIENZA POVERA	PROV. ROMANA FRATI MINORI CAPPUCINI	1.040	800	240		AZZERAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO
6664	AC - 14 - LA - M SAN GIUSTINO	CHIESA DI S. SILVESTRO IN COROSANO	PARROCCHIA SAN GIUSTINO	314	100	214	10/11/98	PROROGA TERMINE LETT. C)
6661	AC - 22 - FA - L LORETO	AMMODERNAMENTO DELLA CASA SAN FRANCESCO	PROV. PICENA S. GIACOMO DELLA MARCA	1.000	400	600	20/02/99	PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urge	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6782	AB-26-LA-L	GUBBIO	RECUPERO DELL'EREMO DI S. AMBROGIO	CANONICI REGOLARI LATERANENSIS	2.000	700	1.300			MODIFICA DELL'UTILIZZO POST-GIURILARE DA "RICETTIVITA' ALBERGHIERA 1-2 STELLE" IN "CONVENTI - CASE IN COMUNITA' RELIGIOSE"
		AB-36-GA-L								
6800	AC-13-LA-B	GUALDO TADINO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI GAIFANA	PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO	524	400	124	15/07/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
7166	AA-13-IA-B	FOLIGNO	RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE	COMUNE DI FOLIGNO	13.320	1.744	11.576			
7166/A	AA-13-IA-B		RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE - LAVORI ESEGUITI		9.013	0	9.013			DISAGGREGAZIONE E RIDISTRIBUZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO E DI COFINANZIAMENTO INCREMENTATO DI L.13.000.000
7166/B	AA-13-IA-B		RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE - LAVORI DA ESEGUIRE		4.320	1.744	2.576			
7176	AC-21-FD-M	FOLIGNO	REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA A BASSO COSTO A COLFORITO LUNGO LA VIA CHE COLLEGA ASSISI A LORETO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	619	569	50	07/10/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
7265	AA-13-IA-B	TERNI	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CONTELORI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI TERNI	1.590	1.590	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 30.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urge	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Letto. C)	Termini Letto. D)	Note
7356	AA - 13 - EF - M	TERNI	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI S. VALENTINO E AREE LIMITROFE SISTEMAZIONE VIA PAPA ZACCARIA ED OPERE INFRASTRUTTURALI PER L'ACCOGLIENZA LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI SULL'AREA A VALLE DEL COLLE DI SAN VALENTINO	COMUNE DI TERNI	13.990	2.891	11.099			
								24/11/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
7416	AC - 14 - FD - L	CASCIA	CASA DEL PELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN ROCCAPORENA	CHIESA SANTUARIO DI S. RITA	3.975	3.543	432			
					4.123	3.543	580	04/08/98	03/10/99	INCREMENTO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DI L. 147.461.976 E PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
7509	AA - 14 - HA - B	TOLENTINO	REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO FACILITATO DAL PARCHEGGIO DI OSMANI FILZI ALLA CHIESA SANTA MARIA NUOVA	COMUNE DI TOLENTINO	600	600	0			
								25/10/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
7516	AC - 13 - IA - B	FOLIGNO	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOC. FOLIGNO CATTEDRALE DI S. FELICIANO	10.078	5.678	4.400			
					11.078	6.678	4.400			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 1.006.000.000
7605	AA - 14 - FD - B	VIGGIANO	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VIGGIANO	3.000	1.500	1.500			
								21/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 11 di 11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

(legge 7 agosto 1997, n. 270)

ALLEGATO C - NUOVI INTERVENTI

				Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (lire/milioni)	Termini
3150	AA 126 IA	M	Amantea	CS	COMPLETAMENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI S. BERNARDINO	1800	01-feb-99
6404	AB 51 EL	F	Ancona	AN	ARREDO SALA DI ATTESA	50	18-gen-99
6407	AB 51 EA	L	Ancona	AN	PERCORSI PEDONALI PROTETTI	600	15-feb-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6408	AB	51	ED	F	Ancona	AN	SISTEMA INFORMAZIONE PASSEGGERI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	Strutture e/o centri di servizi informativi, di comunicazione, telematici e servizi di gestione	80	80	0	15-feb-99	31-ott-99
7901	AA	31	IA	B	Aquileia	UD	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AL FOLADOR DEL PALAZZO BRUNNER DI AQUILEIA	SOPRINTENDENZA PER I BENI A.A.A.S. FRIULI VENEZIA	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	1150	1150	0	18-feb-98	31-ott-99
1124	AA	26	EA	L	Arcugnano	VI	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	Sedi municipali, centro civici	529	529	0	06-mar-99	31-ott-99
1125	AA	26	EA	L	Arcugnano	VI	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ARCUGNANO	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	473	473	0	20-feb-99	31-ott-99
7404	AA	14	EE	M	Ascoli Piceno	AP	PROGETTO PER UN SISTEMA INFORMATIVO DI SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI BENI DI CARATTERE RELIGIOSO E CULTURALE FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA ED ALL'ORIENTAMENTO DEI VISITATORI PREVISTI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DEL 2000	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	Segnaletica stradale e/o turistica	571	529	42	31-gen-99	31-ott-99
2066	AA	12	FA	L	Barga	LU	ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PALAZZO GHERARDI	COMUNE DI BARGA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	112	56	56	15-giu-99	31-ott-99
5973	AC	12	GA	M	Bore	PR	RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI POZZOLO USO ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	PARROCCHIA DI S. MAURIZIO DI POZZOLO	Ricettività in comunità religiose	507	370	137	02-feb-99	31-ott-99
2732	AC	12	LA	L	Carrara	MS	PROGETTO PER IL RECUPERO DELLA CHIESA DEL SUFFRAGIO IN CARRARA	DIOCESI DI MASSA CARRARA CHIESA DEL SUFFRAGIO	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	781	511	270	15-feb-99	31-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3157	AA	12	GA	L	Castelfranco Di Sotto	PI	RESTAURO CONVENTO SAN MATTEO CON ADEGUAMENTO PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN PROSSIMITA' DI TRACCIATO ORIGINALE DELLA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	Ricettività in comunità religiose	400	280	120	15-mar-99	31-ott-99
4997	AC	26	GA	M	Ceriale	SV	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI SPIRITUALITA' SANTA MARIA BELFIORE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1300	1050	250	10-feb-99	31-ott-99
2693	AE	14	ED	F	Chieti	CH	CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE	CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A.R.L.P.A.	Servizi di visita guidata ed accompagnamento turistico - turismo sociale	1806	1806	0	20-gen-99	31-ott-99
4108	AC	31	GB	M	Chiusi Della Verna	AR	RECUPERO DELLA PARTE DISMESSA DELL'ANTICO OSPIZIO FRANCESCANO DELLA BECCIA PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA E ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI DI S.FRANCESCO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	468	348	120	17-mar-99	31-ott-99
3480	AC	26	GA	M	Cortona	AR	RICETTIVITA' SORELLE DEI POVERI	CONGREGAZIONE SORELLE DEI POVERI DI S. CATERINA DA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	879	829	50	03-feb-99	31-ott-99
3534	AC	26	GA	M	Cortona	AR	RICETTIVITA' OASI S. MARGHERITA	PROVINCIA TOSCANA DI S. FRANCESCO STIMMATIZZATO	Ricettività in comunità religiose	1500	1000	500	30-gen-99	31-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4574	AC 12	LA M	FI	MS	CONSolidAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA PIEVE DI S. STEFANO DI SORANO	PARROCCHIA DI S. STEFANO DI FILATTIERA	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	2616	2296	320	31-gen-99	31-ott-99
3565	AA 41	ED F	Firenze	FI	MATERIALE DI INFORMAZIONE TURISTICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ITINERARI GIUBILARI	COMUNE DI FIRENZE	Strutture e/o servizi di informazione e organizzazione turistica, agenzie, chioschi	714	635	79	01-mar-99	31-ott-99
1425	AA 14	FA L	Fivizzano	MS	CENTRO RICETTIVO NELLEX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI FIVIZZANO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	800	500	300	13-feb-99	27-ott-99
1149	AC 25	GD M	Foggia	FG	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA SANTUARIO MADRE DIO INCORONATA FOGGIA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO OP	Ricettività per giovani e/o casa dello studente	1025	1025	0	15-gen-99	31-ott-99
5256	AC 14	FD M	Grosseto	GR	ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELFIA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	633	443	190	28-feb-99	31-ott-99
5257	AC 14	EA M	Grosseto	GR	AREA DI SOSTA PER AUTOBUS ED AUTOVETTURE SERVIZI IGIENICI UFFICIO ACCOGLIENZA	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELFIA	Strutture e/o servizi di informazione e organizzazione turistica, agenzie, chioschi	439	307	132	31-mar-99	31-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5375	AC 41	GA L	Inclsa In Val D'Arno	FI	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ED ESPERIENZE SOCIALI DI LOPPIANO ALLOGGI CASETTE	P.A.M.O.M. PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA MARIA M	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	572	272	300	01-mar-99	30-set-99
5172	AA 26	HA L	Livorno	LI	ITINERARIO MARIANO LA PIAZZA DEL SANTUARIO LE SUPERFICIE L'ARREDO	COMUNE DI LIVORNO	Itinerari turistici, storici, religiosi	860	460	400	15-feb-99	31-ott-99
5174	AA 26	EA L	Livorno	LI	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO TRASFERIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI	COMUNE DI LIVORNO	Aree urbane o extraurbane attrezzate con servizi	350	250	100	15-feb-99	31-ott-99
5176	AA 26	EA L	Livorno	LI	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON ATTREZZATURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SOSTA	COMUNE DI LIVORNO	Aree di sosta o parcheggio auto e/o bus	300	150	150	15-lug-99	30-set-99
6821	AA 22	EC M	Loreto	AN	COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)	COMUNE DI LORETO	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	2500	2100	400	31-gen-99	30-ott-99
6156	AC 41	LA M	Mantova	MN	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	2100	1890	210	10-feb-99	30-set-99
2006	AC 31	FA L	Monte Sant'Angelo	FG	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARCANGELO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	3000	3000	0	30-gen-99	30-ott-99
5873	AD 41	GA B	Napoli	NA	RIQUALIFICAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA LA RICETTIVITA' DEI PELLEGRINI NELLA NAPOLI SACRA	ISTITUTO FEMMINILE S. GIOVANNI BOSCO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	3809	3025	784	30-gen-99	30-set-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3372	AC 31	EL	M	Nova Ponente	BZ	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	CONVENTO DI PIETRALBA	1133	1133	0	14-feb-99	30-ott-98
1806	AA 26	LA	B	Nuoro	NU	RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE	COMUNE DI NUORO	1950	1950	0	31-gen-99	30-giu-99
2436	AC 41	GA	M	Palermo	PA	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIÀ ATTIVA PER ACCOGLIENZA GIUBILARE	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SAN SISTO VECCHIO	1476	1466	10	21-feb-99	30-ott-99
5862	AA 12	IA	B	Parma	PR	PROGETTO COORDINATO DI RESTAURO DELLA ROCCA E PARCO DI NOCETO E DI UNA EX SCUOLA DI CASTAMEZZANA CON LA REALIZZAZIONE DI CENTRO DI ACCOGLIENZA DISCOGRAFICO MUSICALE E OSTELLO	COMUNE DI NOCETO	370	340	30	30-mar-99	30-set-99
3224	AC 14	FD	L	Pitigliano	GR	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EX ASILO DI PITIGLIANO AD USO RESIDENZE RICETTIVE A BASSO COSTO PER BISOGNOSI E SCOPI SOCIALI	DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETTELLO	1164	815	349	20-feb-99	30-giu-99
6000	AA 12	EL	L	Pontremoli	MS	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANGIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C. BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	1010	930	80	20-feb-99	30-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3294	AC 12	HA	B	Ravenna	RA	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE AGLI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA PER LA DIDATTICA RELIGIOSA PER LE ATTIVITA' CULTURALI PER I SERVIZI E PER L'ACCESSIBILITA' ALLA CHIESA DI SANTA MARIA IN PORTO	ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA	Sistemazioni esterne e/o di arredo urbano, illuminazione etc.	150	130	20	24-mar-99	30-set-99
5232	AC 12	LA	M	San Miniato	PI	RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA DEI SEPOICRETO DI S. URBANO E DI PIETRO NEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A S. MINIATO CON RISANAMENTO E RESTAURO DELLA ANTICA VIA ANGELICA META DI PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI	PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA E S. DOMENICO	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	906	489	417	10-mar-99	30-ott-99
3090	AA 26	IA	L	Sassari	SS	REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DELL'ARTE SACRA NEL NORD SARDEGNA	PROVINCIA DI SASSARI	Centri e/o strutture di prima accoglienza e relativi servizi	6000	2000	4000	30-gen-99	30-ott-99
5512	AA 14	EA	M	Sepino	CB	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	Centri e/o strutture di prima accoglienza e relativi servizi	1169	1169	0	05-feb-99	30-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6928	AC 13	FD	L	Terni	TR	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA SITO IN TERNI VIA MOZZONI	PARROCCHIA S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1200	1000	200	15-feb-99	20-ott-99
7266	AA 13	IA	B	Terni	TR	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE	COMUNE DI TERNI	Centri culturali, sala convegni, biblioteche e relativi servizi	920	920	0	20-feb-99	30-ott-99
1583	AA 12	IA	L	Torino	TO	AREA CAVALLERIZZA RESTAURO CONSERVATIVO E DI FUNZIONALIZZAZIONE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DEL QUARTIERE DELLE GUARDIE DEL CORPO DI S.M.	COMUNE DI TORINO	Centri e/o strutture di prima accoglienza e relativi servizi	1000	1000	0	10-feb-99	31-ott-99
2803	AB 41	EG	M	Venezia	VE	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI	A.M.A.V. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI VENEZIANA	Servizi igienici pubblici	352	176	176	15-mar-99	30-ott-99
4248	AC 26	LA	L	Vittoria	RG	RIQUALIFICAZIONE SALE PLURIUSO E ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE	Centri sociali e di accoglienza	1150	1000	150	21-gen-99	31-ott-99

Rep. N. 202/RC del 30 luglio 1999

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 10 del 4 maggio 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA
CAPITALE, GIUBILEO 2000**

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G. U. n. 247 del 22 ottobre 1997;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 10/99, adottata in data 4 maggio 1999 dalla Commissione ex articolo 2 della legge n. 270/97;

Visto il parere favorevole n. 663, reso in data 13 maggio 1999, dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 10/99 della Commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;

DECRETA

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'all. "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 22.768.000.000.
2. L'intervento "Tecnologie ambientali e mobilità - Proposta per un nuovo parco archeologico a Pompei", rubricato col n. 2143, incluso nel Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 6, della legge n. 270/97, è cancellato dal Piano, a seguito di rinuncia del soggetto privato titolare dello stesso.
3. E' totalmente defanziato, per un ammontare di £. 176.000.000 l'intervento rubricato con n. 2803 "Realizzazione servizi igienici" localizzato a Venezia, a causa della persistente indisponibilità dell'area che ne compromette la realizzabilità in tempo utile per le finalità giubilari.
4. E' totalmente defanziato, per un ammontare di £ 340.000.000, l'intervento rubricato n. 5556, "Riqualificazione del complesso edilizio e monastico Santuario di Crea", in quanto, sulla base della documentazione acquisita in atti i relativi lavori erano già ultimati all'atto dell'inclusione nel Piano, venendo con ciò meno il presupposto del disposto finanziamento a valere sulle risorse della legge n. 270/97.
5. L'intervento rubricato con il n. 3133, "Progetto di restauro delle coperture, rifacimento impermeabilizzazioni e impianti nel complesso della Cattedrale" di Ventimiglia, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £ 2.610.000.000 a £ 1.600.000.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 2.400.000.000 a £ 1.390.000.000, con un'economia pari a £ 1.010.000.000.
6. L'intervento rubricato con il n. 3638, "Infopoint passepartout 2000 - Sistema di nodi informativi dedicati ai disabili" localizzato a Napoli, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.881.000.000 a £ 1.703.320.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 1.781.000.000 a £ 1.603.320.000, con un'economia pari a £ 177.680.000.

7. L'intervento rubricato con il n. 6681, "Ammodernamento della casa di S. Francesco" localizzato a Loreto, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £ 1.000.000.000 a £ 680.000.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 400.000.000 a £ 80.000.000, con un'economia pari a £ 320.000.000.
8. E' assentita la richiesta di incremento della quota di cofinanziamento, proposto dal titolare dell'intervento n. 3373, "Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio destinato all'accoglienza dei pellegrini" localizzato a Nova Ponente, a parità di costo, con equivalente riduzione della quota di finanziamento ex lege n. 270/97, per un importo di £ 1.329.000.000.
9. E' assentita la richiesta di incremento della quota di cofinanziamento, proposto dal titolare dell'intervento rubricato con n. 5954, "Restauro conservativo delle superfici esterne ed interne della chiesa cattedrale" di Brescia, e del conseguente aumento del costo dell'intervento, ed è disposta la riduzione della assegnazione finanziaria ex lege n. 270/97 nella misura di £ 67.080.000, quale importo differenziale dell'intervenuto ribasso d'asta.
10. Le risorse disponibili sono, pertanto, determinate in complessive £ 26.717.932.360, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 530.172.360	Risorse nella disponibilità della Commissione di cui al D. M. 9 febbraio 1999;
£ 22.768.000.000	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento, di cui al punto 1;
£ 516.000.000	Risorse provenienti da definanziamenti totali, di cui ai punti 3 e 4;
£ 1.507.680.000	Risorse provenienti da definanziamenti parziali, di cui ai punti 5, 6 e 7;
£ 1.396.080.000	Risorse provenienti da definanziamenti parziali, di cui ai punti 8 e 9;

11. L'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di avviare la procedura di contestazione e messa in mora, ai fini dell'eventuale defanziamento ed anche ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990, nei confronti dei titolari di interventi per i quali risultino scaduti i termini di cui all'art. 1, co. 4, lettera c) della legge n. 270/97, senza che sia stato comunicato l'intervenuto affidamento dei lavori né sia stata richiesta l'eventuale proroga di detto termine, nonché nei confronti dei titolari degli interventi sottoelencati, per le motivazioni a latere indicate:
 - nn. 1172, 1375, 1378, 5147, in quanto hanno comunicato una consistente riduzione della quota di cofinanziamento;
 - nn. 1589, 3731, per aver richiesto un differimento del termine di cui all'art. 1, co. 4, lettera c) della legge 270/97, tale da ridurre considerevolmente l'originaria previsione dei giorni di lavorazione;
 - n. 3958, per aver proposto una modifica della tipologia dell'intervento da ricettività a restauro di beni culturali, implicando la mancata realizzazione dei previsti posti letto;
 - n. 4741, in quanto dalla documentazione in atti si evince che i lavori oggetto dell'intervento sono stati appaltati ed in larga misura ultimati prima della inclusione nel Piano di cui alla legge n. 270/97 e che negli atti deliberativi di approvazione delle aggiudicazioni e dei contratti non si fa alcun riferimento alle risorse di cui alla citata legge;
 - n. 4739, in quanto, da notizie apparse sulla stampa, la realizzazione di tale intervento potrebbe confliggere con la salvaguardia dei Beni culturali e compromettere la stabilità dei monumenti circostanti.
12. E' assentita la richiesta del soggetto beneficiario dell'intervento "Ristrutturazione ed ampliamento dell'abbazia di S. Cassiano al fine di consentire l'accoglienza dei pellegrini" rubricato col n. 7394, volta a realizzare 59 posti letto, in luogo dei 71 originariamente previsti, a causa delle sopravvenute prescrizioni della competente Soprintendenza.
13. E' reinserito nel Piano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 270/97, l'intervento rubricato col n. 4966 "Riqualificazione di area industriale dismessa" di titolarità di un soggetto privato, a seguito della pronuncia resa dal TAR competente in sede cautelare e volta a riaprire il procedimento amministrativo per l'acquisizione dei necessari atti autorizzativi.
14. Sono assentite le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera, dovute a fatti imprevisi e imprevedibili relative agli interventi indicati nell'allegato "B", per un importo complessivo pari a £ 26.219.874.193, restando, pertanto, nelle disponibilità della Commissione £ 498.058.167.
15. Sono accorpate in un unico intervento che viene incluso nel Piano col n. 17.729, i 51 interventi indicati nell'allegato "B", di titolarità dell'Ente Poste Italiane, al fine di agevolarne le procedure realizzative.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16. Sono assentite, altresì, le richieste di disaggregazione relative ad alcuni interventi già inclusi nel Piano, quelle di cambio titolo, di cambio di soggetto beneficiario e quelle attinenti le proroghe di termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97 e sono corretti meri errori materiali relativi alla diversa imputazione delle quote di finanziamento e di cofinanziamento, come indicato nell'allegato "B".
17. Come previsto dal punto 3 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano di cui all'allegato "A" del D.M. 2.6.1998, gli oneri relativi alle attività preliminari e strumentali alla realizzazione dell'intervento, quali la progettazione, ogni tipo di indagine conoscitiva (preventiva o contestuale all'esecuzione), l'espletamento dell'appalto dei lavori e la stesura dei contratti, la predisposizione dei prescritti Piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 494/96, l'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento, di Direttore dei Lavori, di Coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, il collaudo ed eventuali studi di impatto ambientale, devono, di norma, essere contenuti nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'opera, salvo particolari situazioni opportunamente motivate. Ove tali oneri risultino superiori a detta soglia, le relative parcelle Professionali, redatte nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti tariffe, devono essere vidimate dal competente Ordine Professionale. Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove la progettazione sia affidata dalla stazione appaltante a più professionisti riuniti in Collegio, secondo la procedura di cui all'art. 7 della Legge 2.3.1949, n. 143, viene riconosciuto il compenso per un solo incarico professionale, rimanendo a carico del soggetto beneficiario gli eventuali, ulteriori compensi. Qualora la progettazione sia stata affidata ad un progettista esterno alla stazione appaltante, ove l'Amministrazione non ritenga di svolgere la Direzione dei Lavori con proprio personale, questa deve essere affidata allo stesso progettista, salvo che per oggettiva e documentata impossibilità. Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 4, comma 1, della legge n. 270/97, ove si dà facoltà ai soggetti beneficiari di avvalersi dei Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche in qualità di Stazioni Appaltanti "anche relativamente alla progettazione", il conferimento di incarichi a Società di Servizio per la compilazione dei progetti, per consulenze e per ogni altra attività connessa all'espletamento delle gare ed alla gestione dei lavori deve essere specificatamente ed adeguatamente motivata, ai fini del riconoscimento delle relative spese.
18. Il punto 10 dell'allegato "A" al D.M. 2.6.1998 viene così modificato:
- "10. All'atto della richiesta di erogazione dell'ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato dovrà essere inoltrata all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario pubblico o di un suo delegato apposita certificazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi del punto 8 nella quale siano elencate le spese sostenute suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa. In allegato alla citata certificazione, quale parte integrante, deve essere trasmessa una relazione illustrativa che in riferimento all'elencazione delle spese precisi i titoli di spesa emessi. Per i soggetti beneficiari assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla legge n. 415/98, all'atto della richiesta di erogazione dell'ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato dovrà essere inoltrata all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, apposita certificazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato, ai sensi del punto 8, nella quale siano elencate le spese sostenute suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa, nonché dichiarazione relativa all'avvenuta verifica del versamento da parte delle Imprese dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla mano d'opera impiegata. Con riferimento all'elencazione riportata nella citata certificazione dovrà essere allegata, in copia conforme, la seguente documentazione:
- Lavori:**
- certificati di pagamento intestati all'Impresa titolare dell'appalto e relative fatture quietanzate;
 - fatture quietanzate relative ad eventuali prestazioni in economia certificate dal Direttore dei Lavori;
 - certificati di pagamento intestati ad eventuale impresa sub-appaltatrice e relative fatture con allegato il contratto di subappalto e la connessa autorizzazione della stazione appaltante.
- Espropri:**
- contratto di acquisto od altro titolo ablativo e relativa trascrizione al patrimonio del soggetto beneficiario;
 - pagamenti effettuati per l'occupazione e l'indennità di esproprio intestati ai proprietari dei beni.
- Forniture:**
- Certificato di pagamento intestato al fornitore e relative fatture quietanzate;
 - Certificato di collaudo qualora la fornitura sia stata liquidata in un'unica soluzione.
- Rilievi, studi e sondaggi:**
- Contratti o lettere d'incarico e relative fatture quietanzate;
 - Certificato di regolare esecuzione della prestazione sottoscritto dal Responsabile del procedimento qualora sia stato effettuato il pagamento in un'unica soluzione.
- Progettazione :**
- Parcella professionale vistata dal competente Ordine Professionale, con esclusione di quelle validate dalle Amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- *Convenzione d'incarico o lettera d'incarico;*

Fatture quietanzate del Professionista incaricato.

Altre spese tecniche:

- *Parcella professionale sia per il Direttore dei Lavori che per il Coordinatore della Sicurezza vistata dal competente ordine professionale, con esclusione di quelle validate dalle Amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;*

- *Convenzione o lettera d'incarico del professionista;*

- *Fatture quietanzate del Professionista;*

- *Fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la Commissione di gara, per la pubblicazione del Bando, per le spese postali e per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione certificate dal responsabile del procedimento;*

- *Ricevute di versamenti effettuati alle Amministrazioni Comunali per il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni.*

Allacciamenti:

- *fatture quietanzate e versamenti effettuati alle aziende comunali o alle società di servizio per contributi o spese di allaccio.*

Altro:

Fatture relative ad eventuali prestazioni o lavori specialistici ove sia chiaramente indicato in relazione all'intervento l'oggetto ed il periodo di svolgimento delle attività."

19. Il punto 11 dell'allegato "A" al D.M. 2.6.1998 viene così modificato:

"11. Le ulteriori somme residue, fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, saranno erogate dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario pubblico o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento, per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale successiva utilizzazione per le finalità della legge 270/97. Copia conforme dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento dovranno essere trasmessi all'ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi per la conseguente acquisizione agli atti. Per i soggetti beneficiari assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla Legge n. 415/98, le ulteriori somme residue fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto saranno erogate dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle eventuali procedure di acquisto di immobili o aree attivate e siano elencate tutte le spese sostenute, suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione, con riferimento al Quadro tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa. Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale successiva utilizzazione per le finalità della legge 270/97. Alla richiesta vanno, inoltre, allegati in copia conforme i certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento.

20. Il punto 6 dell'allegato "A" al D.M. 2 giugno 1998 è sostituito dal seguente:

"6. Sono consentite variate distribuzioni di spesa tra le categorie di lavoro corrispondenti a opere civili, opere impiantistiche, arredi, attrezzature ed altre, nel rispetto del totale complessivo dichiarato, qualora non comportino modifiche sostanziali all'intervento finanziato."

21. Ad integrazione e modifica del D.M. 2.6.1998 all. "B" ai soggetti ecclesiastici beneficiari degli interventi inclusi nel Piano di cui alla Legge n. 270/97 assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla Legge 415/98, si applicano tutte le disposizioni della legge ad esclusione di quelle introdotte dagli artt. 7, 14, 19, comma 2 e 2 bis, 27, 32, 33.

Roma, li 1 giugno 1999

Registrato alla Corte dei Conti il 30 luglio 1999

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 278

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 21 aprile 1999

Allegato A

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
233	Padova	PD	RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI PADOVA	DIOCESI DI PADOVA	800.000.000
245	Padova	PD	MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA	DIOCESI DI PADOVA	293.000.000
352	Torralba	SS	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANT'ANTONIO ABATE, DOTAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI E REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMUNE DI TORRALBA	98.000.000
400	Modena	MO	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO DELLA GIOVENTU'	ISTITUTO PROV. S. FILIPPO E S. BENARDINO	334.000.000
470	Codogno	LO	OSPEDALE SOAVE CENTRO POLICULTURALE MUSEALE OPERE DI CONSERVAZIONE ARCHITETTONICHE E TECNOLOGICHE	COMUNE DI CODOGNO	190.000.000
488	Codogno	LO	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX MATTATOIO COMUNALE AD AREA ATTREZZATA PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI CODOGNO	41.000.000
831	Torino	TO	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA BASILICA DI SUPERGA	PROV. PIEMONTESE ORDINE SERVI DI MARIA	454.000.000
899	San Giovanni Rotondo	FG	STRUTTURA ACCOGLIENZA POZZO CAVO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	1.127.000.000
905	San Giovanni Rotondo	FG	ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE CAPPUCINI	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	397.000.000
951	Codigoro	FE	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	20.000.000
1111	Foggia	FG	"CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI P. PIO DI PIANA ROMANA PIETRALCINA"	PROVINCIA FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCINI	1.100.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1138	Napoli	NA	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI	CASA RELIGIOSA DELLA COMP. DI GESU'	332.000.000
1143	Sant'Anastasia	NA	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO	PROVINCIA SAN TOMMASO D'AQUINO	1.299.000.000
1198	Pompei	NA	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI POMPEI	405.000.000
1199	Pompei	NA	TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN OSTELLO	COMUNE DI POMPEI	475.000.000
1217	Mesagne	BR	RESTAURO E RECUPERO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA	COMUNE DI MESAGNE	51.000.000
1337	Mira	VE	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI MIRA	83.000.000
1344	Correzzola	PD	RECUPERO CELLERARIA BENEDETTINA DI CORREZZOLA	COMUNE DI CORREZZOLA	81.000.000
1421	Pianello Val Tidone	PC	RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°	COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	78.000.000
1499	Ferrara	FE	SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S. ROMANO	COMUNE DI FERRARA	250.000.000
1576	Modica	RG	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIA' ATTIVA	CONGREGAZIONE FEMM. SERVE DEI POVERI	116.000.000
1670	Gravina In Puglia	BA	RECUPERO TECNICO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEI TURISTI	COMUNE DI GRAVINA	539.000.000
1709	Tarvisio	UD	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE	PARROCCHIA DI S. EGIDIO	215.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1728	Vicenza	VC	RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA	COMUNE DI VICENZA	183.000.000
1732	Vicenza	VI	SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO	COMUNE DI VICENZA	71.000.000
1736	Vicenza	VI	REALIZZAZIONE AREA DI ACCOGLIENZA NELLE ADIACENZE DEL PARCO STORICO DI VILLA GUICCIOLI	COMUNE DI VICENZA	80.000.000
1742	Vicenza	VI	RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI AMBROGIO E BELLINO	COMUNE DI VICENZA	115.000.000
1798	Empoli	FI	RESTAURO E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA IN VIA SALAIOLA E DELL'ANTISTANTE PIAZZALE	COMUNE DI EMPOLI	93.000.000
1873	Siracusa	SR	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATACOMBA DI S. GIOVANNI E ALLA CRIPTA DI S. MARZIANO	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	34.000.000
1951	Levanto	SP	CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA-RECUPERO EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI LEVANTO	417.000.000
1965	Alberobello	BA	RICETTIVITA' DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ALBEROBELLO	SEMINARIO VESCOVILE DI CONVERSANO	127.000.000
2011	Siracusa	SR	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	76.000.000
2107/A	Milano	MI	ORATORIO PARROCCHIALE DI VIA PARETO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	278.000.000
2107/B	Milano	MI	CERTOSA COMPLESSO MONUMENTALE IN VIA GAREGNANO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	1.796.000.000
2296	Isola Del Gran Sasso d'Italia	TE	SAN GABRIELE 2000 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	1.714.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2770	Napoli	NA	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' ARENELLA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOPI	170.000.000
2781	Brugnato	SP	RECUPERO STRUTTURE EDIFICIO GIA' SEDE VESCOVILE IN BRUGNATO DA DESTINARE A SPAZIO CULTURALE RELIGIOSO POLIFUNZIONALE	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	46.000.000
2843	Cagliari	CA	RISTRUTTURAZIONE EX LAZZARETTO BORGO S. ELIA	COMUNE DI CAGLIARI	800.000.000
3034	Firenze	FI	"AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TIRUSTICI A FIRENZE SUD"	COMUNE DI FIRENZE	299.000.000
3506	Arezzo	AR	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CONVENTO DI SAN PIER PICCOLO	DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	107.000.000
3524	San Marco In Lamis	FG	AREE URBANE ED EXTRAURBANE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO NAVETTE	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	489.000.000
3595	Campagna Lupia	VE	RESTAURO CONSERVATIVO RIUTILIZZO FUNZIONALE CHIESA DI LUGO	COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	88.000.000
3792	Bonifati	CS	OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER TURISMO SOCIALE	COMUNE DI BONIFATI COSENZA	435.000.000
3940	Mercogliano	AV	RECUPERO DEI SENTIERI STORICO RELIGIOSI TRADIZIONALMENTE UTILIZZATI NEI PELLEGRINAGGI VERSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	DIOCESI DI MONTEVERGINE	61.000.000
3992	Acerra	NA	CENTRO DELL'UMANA ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALI EX MONASTERO SS. ANNUNZIATA	DIOCESI DI ACERRA	774.000.000
4015/A	Alezio	LE	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELL'ALIZZA	CURIA VESCOVILE DI NARDO' - GALLIPOLI	160.000.000
4015/B	Alezio	LE	REALIZZAZIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA	CURIA VESCOVILE DI NARDO' - GALLIPOLI	448.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5024	Bologna	BO	PARCHEGGIO PUBBLICO GHISELLO	COMUNE DI BOLOGNA	257.000.000
5321	Bologna	BO	MANUTENZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DELL'ORATORIO E DEI LOCALI DELL'EX OSPEDALE DI S.MARIA DELLA VITA CREAZIONE DEL MUSEO DELLA SANITA' CITTADINA E DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA CHIESA DI BOLOGNA	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	552.000.000
5322/A	Bologna	BO	CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 1° LOTTO	CATTEDRALE METROP. DI S.PIETRO	260.000.000
5333	Parma	PR	FORESTERIA DEL CENTRO CIVICO CINGHIO	COMUNE DI PARMA	59.000.000
5451	Banzi	PZ	RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELL'ABBAZIA DI S. MARIA DI BANZI	COMUNE DI BANZI	199.000.000
5656	La Spezia	SP	IL MONASTERO DEL TERZO MILLENNIO E L'OSPITALITA' BENEDETTINA	MONASTERO S. MARIA DEL MARE	331.000.000
5673	Bagno A Ripoli	FI	OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	185.000.000
5873	Comune di Napoli	NA	RIQUALIFICAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA RICETTIVITA' DEI PELLEGRINI NELLA NAPOLI SACRA	ISTITUTO FEMMINILE S. GIOVANNI BOSCO CASA DELLO ST	604.000.000
6092	Caravaggio	BG	RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL SANTUARIO	COMUNE DI CARAVAGGIO	425.000.000
6192	Pistoia	PT	ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE DI VILLA ROSPIGLIOSI	DIOCESI DI PISTOIA	68.000.000
6201	Caorle	VE	"SISTEMAZIONE URBANISTICA ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA DELLA PIAZZA VESCOVADO"	COMUNE DI CAORLE	320.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6219	Firenze	FI	*INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE	COMUNE DI FIRENZE	228.000.000
6230	Cesena	FO	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA RISTORAZIONE	MONASTERO DI S.MARIA DEL MONTE	21.000.000
6231	Como	CO	RESTAURO FACCIATE DELLA BASILICA DI S. ABBONDIO	SEMINARIO VESCOVILE DI S. ABBONDIO	132.000.000
6706	Foligno	PG	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO PER PELLEGRINI E O TURISTI PREVIA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI	AZIENDA U.S.L. N. 3	416.000.000
6884	Spoleto	PG	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN NICOLÒ SPOLETO	PROVINCIA DI PERUGIA	288.000.000
6960/A	Osimo	AN	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - I° LOTTO - NUOVO REFETTORIO E GARAGE	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	59.000.000
6960/B	Osimo	AN	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - II° LOTTO - CHIOSTRO E RESTAURO BASILICA	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	52.000.000
6960/C	Osimo	AN	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - III° LOTTO - LATO OVEST - RISTRUTTURAZIONE PER L'ACCOGLIENZA	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	84.000.000
6974	Castiglione Del Lago	PG	ISOLA POLVESE SUL LAGO TRASIMENO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER LA GIOVENTU'	PROVINCIA DI PERUGIA	125.000.000
6975	Castiglione Del Lago	PG	RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ISOLA POLVESE	PROVINCIA DI PERUGIA	151.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7041	Montecastrilli	TR	PALAZZO MASSI PENSIONE	COMUNE DI MONTECASTRILLI	33.000.000
7074	Urbino	PS	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MONASTERO DI S. CATERINA	MONASTERO AGOSTINIANE DI S. CATERINA	59.000.000
7077	Todi	PG	RESTAURO ED AMPLIAMENTO PER UN CENTRO DI ACCOGLIENZA NELLA LOCALITA' COLLEVALENZA	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	39.000.000
7377	Perugia	PG	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' VIA BONTEMPI 13	OPERA PIA M. PAOLETTI	64.000.000
7528	Spoletto	PG	VILLA REDENTA EX FRATERIA ED EX SCUDERIA DEL COMPLESSO PATRIMONIALE CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICO	PROVINCIA DI PERUGIA	118.000.000

Tot. Interventi

Tot. Disponibilità

69

22.768.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato "B"

Riunione commissione ex lege n. 270/97 del 21 Aprile 1999

modifiche (*) degli interventi inclusi nel Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

N° Prot. Uрге	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
272	AC - 11 - GA - L	Matera	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	4.361.560.000	3.861.560.000	500.000.000			
329	AC - 14 - LA - B	Capaccio	RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	2.397.000.000	2.397.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.998.416.000
330	AC - 31 - GA - M	Isola Del Gran Sasso d'Italia	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASSIONISTI	3.351.000.000	3.037.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.646.000.000
346	AC - 31 - FG - L	Isola Del Gran Sasso d'Italia	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE GLI INGRESSI AL SANTUARIO CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASSIONISTI	959.000.000	800.000.000	159.000.000	22/04/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
397	AC - 12 - LA - L	Nonantola	OPERE DI MANUTENZIONE COMPLESSO ABBAZIALE	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA	5.084.000.000	3.084.000.000	2.000.000.000	22/04/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
					5.584.000.000	3.584.000.000	2.000.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £. 500.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto corsivo Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 1 di 34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
450	AA - 12 - FD - M	Moconesi	RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FONTANABUONA GENOVA	COMUNE DI MOCONESI	195.000.000	175.000.000	20.000.000			
461	AA - 31 - FB - L	Varallo	COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI VARALLO SESIA	1.456.000.000	1.000.000.000	456.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 16.000.000 MODIFICA TERMINI LETTERA C)
462	AA - 31 - EA - L	Varallo	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	COMUNE DI VARALLO SESIA	450.000.000	450.000.000	0	31/03/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
475	AA - 26 - EC - L	Aquileia	SISTEMA DI PARCHEGGI ATTRAVERSO L'ACCESSO DEI PELLEGRINI E PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N. 352 A SUD DELL'ABITATO	COMUNE DI AQUILEIA	460.000.000	450.000.000	10.000.000		03/07/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
484	AA - 26 - FD - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	1.700.000.000	1.680.000.000	10.000.000	30/06/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
489	AA - 26 - FA - M	Pisa	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	10.470.000.000	7.270.000.000	3.200.000.000		30/03/1998	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
					10.658.256.000	7.458.256.000	3.200.000.000	15/02/1999		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 188.256.000 E MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 2 di 34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
611	AA - 41 - IA - B	Firenze	BASILICA DI S. CROCE IN FIRENZE: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA	FONDO EDIFICI DI CULTO	5.198.000.000	4.598.000.000	600.000.000			
					5.866.274.727	5.260.274.727	606.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.662.274.727
616	AC - 51 - GA - M	Messina	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	7.213.532.000	6.368.532.000	845.000.000			
642	AA - 41 - LA - M	Napoli	DUOMO DI NAPOLI	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	8.233.532.000	7.388.532.000	845.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.1.026.000.000
658	AB - 11 - HA - M	Bari	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 1	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.1.000.000.000
662	AB - 28 - HA - M	NORCIA	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
663	AB - 21 - HA - M	Assisi	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
664	AB - 28 - HA - M	Orvieto	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
665	AB - 21 - HA - M	Assisi	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
667	AB - 28 - HA - M	Perugia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
669	AB - 11 - HA - M	Napoli	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
670	AB - 28 - HA - M	Gubbio	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
671	AB - 41 - HA - M	Sienna	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 4	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
672	AB - 13 - HA - M	Pesaro	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
674	AB - 41 - HA - M	Lucca	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI LOCALIZZATE LUNGO I PERCORSI GIUBILARI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
678	AB - 11 - HA - M	Capua	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
683	AB - 41 - HA - M	Perugia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

№ Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
685	AB - 13 - HA - M	Penaglia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
689	AB - 24 - HA - M	Pompei	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
697	AB - 31 - HA - M	Cascia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI LOCALIZZATE LUNGO I PERCORSI GIUBILARI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
699	AB - 11 - HA - M	Napoli	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 9	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
737	AB - 13 - HA - M	Ancona	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - PIAZZA XXIV MAGGIO	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
740	AB - 22 - HA - M	Loreto	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - VIA PORTA ROMANA 2	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
742	AB - 28 - HA - M	Cagliari	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - V. R.	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
750	AB - 41 - HA - M	Macerata	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urcge	Codice HA - M	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz. Let. c)	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
801	AB - 41 - HA - M	Arezzo	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Centro	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
802	AB - 41 - HA - M	Spoleto	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
803	AB - 28 - HA - M	Terni	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - V. R.	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
804	AB - 41 - HA - M	Todi	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
807	AB - 41 - HA - M	Venezia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
809	AB - 41 - HA - M	Palermo	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Filiale	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
811	AB - 12 - HA - M	Pavia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI-VIA PARTIGIANI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
812	AB - 41 - HA - M	Agrigento	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Filiale	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz. Lett. c)	Termini Lett. d)	Note
813	AB - 41 - HA - M	Firenze	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ.7	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
814	AB - 41 - HA - M	Firenze	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Centro	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
816	AB - 28 - HA - M	Spello	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
817	AB - 25 - HA - M	San Giovanni Rotondo	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - PIAZZA ROMA 6	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
818	AB - 11 - HA - M	Otranto	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - VIA TENENTE EUA	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
819	AB - 28 - HA - M	Monte Sant'Angelo	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
858	AB - 28 - HA - M	Venezia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
859	AB - 11 - HA - M	Bari	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ.5	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgo	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
860	AB - 26 - HA - M	Belluno	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
981	AB - 41 - FD - M	Venezia	CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI	IST. PROV. PER L'INFANZIA S.MARIA	2.500.000.000	2.500.000.000	0	08/10/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1096	AB - 12 - HA - M	Vicenza	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Filiale	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1102 8	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANARIE	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	37.844.000.000	37.844.000.000	0			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1102A			RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANARIE LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO		23.015.000.000	23.015.000.000	0	31/10/1999		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERA D)
1102B			RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANARIE: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO RESTAURO ARTISTICO E STRUTTURALE		14.829.000.000	14.829.000.000		31/10/1999		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERA D)
1121	AA - 13 - FD - L	Catolica	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	3.428.000.000	2.000.000.000	1.428.000.000			PARZIALE MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1133	AC - 11 - FD - L	Carovigno	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO MARIA SS. DI BELVEDERE ED AMPLIAMENTO CON NUOVA STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	1.380.000.000	1.380.000.000	0			
1143	AC - 31 - EC - M	Sant'Anastasia	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO	PROVINCIA SAN TOMMASO D'AQUINO	6.381.000.000	5.681.000.000	500.000.000	10/1/98		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1149	AC - 25 - GD - M	Foggia	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA SANTUARIO MADRE DIO INCORONATA FOGGIA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO OP	1.025.000.000	1.025.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 200.000.000
1213	AA - 41 - LA - B	Napoli	RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DEL CHIOSTRO MAIOLICATO DI S. CHIARA	FONDO EDIFICI DI CULTO	2.822.000.000	2.822.000.000	0	30/06/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1217	AA - 11 - LA - M	Mesagne	RESTAURO E RECUPERO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA	COMUNE DI MESAGNE	1.150.000.000	900.000.000	250.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 400.000.000
1218	AA - 11 - FD - M	Mesagne	RESTAURO E RECUPERO CHIESA E CONVENTO DEI CAPPUCINI DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	COMUNE DI MESAGNE	3.209.000.000	2.850.000.000	359.000.000	09/12/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1237	AA - 14 - LA - B	Portacomaro	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA ROMANICA CIMITERIALE DI SAN PIETRO CON REALIZZAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO	COMUNE DI PORTACOMARO	750.000.000	750.000.000	0	09/12/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
								11/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1247	AC - 14 - GA - B	Sant'Angelo Dei Lomb	RICETTIVITA' DIOCESANA IN ALTA IRPINIA	CURIA ARCIVESCOVILE DI S. ANGELO DEL.	1.998.240.000	1.876.240.000	120.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.89.500.000 ED AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI £.6.930.000
1264	AC - 28 - FD - M	Portofranco	ACCOGLIENZA CULTURALE RELIGIOSA NEL COLLEGIO MARCONI	FONDAZIONE COLLEGIO MARCONI	3.281.325.000	2.241.325.000	1.020.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.586.775.189
1274	AC - 31 - LA - M	Napoli	ITINERARIO FRANCESCO BONAVENTURIANO ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE CULTURALI E SPIRITUALI DEL COMPLESSO CONVENZIONALE DI S. LORENZO MAGGIORE	PROV. DI NAPOLI DEI FRATI MINORI	1.963.000.000	1.963.000.000	0			
1337	AA - 12 - FB - L	Mira	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI MIRA	1.000.000.000	1.000.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.350.000.000
1339	AA - 28 - FB - B	Noto	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (GIÀ CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	COMUNE DI NOTO	3.279.000.000	2.279.000.000	1.000.000.000	05/1/1998		MODIFICA TERMINE LETTERA C)
1344	AA - 28 - LA - B	Correzzola	RECUPERO CELLERARIA BENEDETTINA DI CORREZZOLA	COMUNE DI CORREZZOLA	2.400.000.000	1.880.000.000	720.000.000	17/04/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
1408	AC - 28 - FA - M	Pescara	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE VILLA INMACOLATA IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI PESCARA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	4.300.000.000	3.750.000.000	550.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.44.000.000
1421	AA - 12 - FB - B	Pianello Val Tidone	RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°	COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	1.359.000.000	1.144.000.000	215.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £. 355.682.000 ED AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI £.319.478.000
					1.498.492.192	1.383.492.192	215.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £. 139.492.192

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice HA - LA - FB - HA - M	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1478	AB - 23 - HA - L	Padova	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1534	AA - 14 - LA - B	Trieste	RESTAURO DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO MARTIRE	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRULI V.G.	500.000.000	500.000.000	0			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1537	AA - 12 - FB - L	Fuococchio	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	2.428.670.000	2.028.670.000	400.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.350.000.000
1543	AB - 26 - HA - M	Napoli	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.900.000.000
1544	AB - 24 - HA - M	Pompei	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1545	AB - 31 - HA - M	Pietrelcina	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1550	AB - 14 - HA - M	Lecco	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 2	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1555	AB - 41 - HA - M	Pisa	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 1	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Uрге	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamen- to attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1557	AB - 13 - HA - M	Urbino	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - VIA BRAMANTE 28	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1558	AB - 41 - HA - M	Ascoli Piceno	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI VIA CRISPI 4	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1559	AB - 12 - HA - M	Pavia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Centro	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1560	AB - 26 - HA - M	Ravenna	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1561	AB - 41 - HA - M	Trieste	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ.5	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1562	AB - 41 - HA - M	Torino	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ.12	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1670	AA - 11 - ED - L	Gravina in Puglia	RECUPERO TECNICO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEI TURISTI	COMUNE DI GRAVINA	2.980.000.000	2.903.000.000	57.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.636/111.842

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz. Let. c)	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1684	AC - 26 - GA - L	Udine	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ATTA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	CONGREGAZIONE SUORE COLLEGIO DIMESSE	571.000.000	371.000.000	200.000.000			
1772	AB28HAM 9	AMBITO NAZIONALE	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI IN AGENZIE SITUATE LUNGO PERCORSI GIUBILARI	ENTE POSTE ITALIANE	1.122.000.000	867.000.000	255.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 8.680.000
1806	AA - 26 - LA - B	Nuoro	RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE	COMUNE DI NUORO CURIA VESCOVILE DI NUORO- CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI NUORO	1.950.000.000	1.950.000.000	0			ACCORPAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D) MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
1873	AC - 41 - LA - B	Siracusa	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATACOMBA DI S. GIOVANNI E ALLA CRIPTA DI S. MARZIANO	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	509.000.000	509.000.000	0			MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1960	AC - 26 - GA - L	Mazara Del Vallo	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S.VENERANDA	DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO	1.800.000.000	1.750.000.000	50.000.000		15/01/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA C)
2006	AC - 31 - FA - L	Monte Sani'Angelo	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	3.000.000.000	3.000.000.000	0		31/03/1999 30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2107/ A	AC - 12 - GB - B	Milano	ORATORIO PARROCCHIALE DI VIA PARETO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	2.252.000.000	2.252.000.000	0		30/04/1999 30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2111	AA - 26 - EL - L	Confienti	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	COMUNE DI CONFIENTI	616.000.000	500.000.000	116.000.000		10/11/1998 08/06/1999 31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA C) MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Uрге	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2120	AA - 26 - EL - M	San Luca	RIQUALIFICAZIONE DEL SANTUARIO DI POLSI E CON AREE DI PERTINENZA E RELATIVO ACCESSO	COMUNE DI SAN LUCA	500.000.000	500.000.000	0			
2125	AC - 26 - FD - L	Seminara	RICOSTRUZIONE CASA DEL PELLEGRINO SISTEMAZIONE PIAZZALE DELLA BASILICA	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE	500.000.000	500.000.000	0	26/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2132	AA - 26 - FD - M	Vallelonga	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA E RELATIVI SERVIZI COMPRESI LE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA	COMUNE DI VALLELONGA VV	500.000.000	500.000.000	0	15/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2143	BA - 24 - EL - B	Pompei	TECNOLOGIE AMBIENTALI E MOBILITA' PROPOSTA PER UN NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO A POMPEI	LONGOBARDI MARILICIA	24.714.000.000	0	24.714.000.000	20/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2163	AC - 26 - GA - L	Catagione	RISTRUTTURAZ. E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA S. BARTOLOMEO	SEMINARIO VESCOVILE	670.292.000	770.292.000	100.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER RINUNCIA ALL'INTERVENTO
2278	AD - 41 - GB - B	Venezia	RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE	IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA	576.000.000	546.000.900	30.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.20.000.000
2279	AD - 41 - EF - B	Venezia	RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE	IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA	545.000.000	455.000.000	90.000.000	31/03/1999	31/10/1999	PROROGA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

V° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2329	AC - 41 - GA - M	Fiesole	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLE COPERTURE E DELLA FACCIATA PROSPICIENTI LA PIAZZA DI SAN DOMENICO	CONVENTO DOMENICANI DI S. DOMENICO	1.583.000.000	400.000.000	1.183.000.000			
2416/ A	AC - 28 - GB - M	Ancona	CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA- EDIFICI A-B ed F - I LOTTO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO	3.994.000.000	1.205.000.000	2.789.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.170.000.000
2416/ B	AC - 28 - GB - M	Ancona	CONSOLIDAMENTO STATICO ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA - EDIFICI D-E-G ed il parco - IL LOTTO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO	1.628.000.000	1.205.000.000	423.000.000			MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE FINANZIARIA PER ERRORE MATERIALE ED AUMENTO COFINANZIAMENTO
2436	AC - 41 - GA - M	Palermo	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIÀ ATTIVA PER ACCOGLIENZA GIUBILARE	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SAN SISTO VECCHIO	1.476.000.000	1.466.000.000	10.000.000			MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE FINANZIARIA ED AUMENTO COFINANZIAMENTO
2533	AC - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	RECUPERO TRAMITE RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA ABRESCH	FOND. CASA SOLLIEVO SOFFERENZA	2.676.821.000	2.676.821.000	0	30/03/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2558	AA - 12 - IA - L	Orio Litta	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIÀ GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S. PIETRO	COMUNE DI ORIO LITTA	1.900.000.000	1.700.000.000	200.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.135.000.000
2581	AC - 14 - FB - L	Canossa	RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSENA PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA	4.450.000.000	3.950.000.000	500.000.000		31.10.1999	PROROGA TERMINI LETTERA D)
								12/02/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

V° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2609	AC - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	CENTRO DI ACCOGLIENZA GLI ANGELI DI PADRE PIO	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	13.421.000.000	10.921.000.000	2.500.000.000			
2693	AE - 14 - ED - F	Chieti	CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE	CONSORZIO CELESTINANO SOC. COOP. A.R.L.P.A.	1.806.000.000	1.806.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 120.000.000
2739	AC - 12 - IA - B	Sarzana	ORATORIO DI SAN GEROLAMO	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA	538.000.000	394.000.000	144.000.000	18/05/1999	15/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2763	AC - 12 - GA - M	Sansepolcro	RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CONVENTO DEI SERVI DI MARIA PER ESSERE UTILIZZATO A CASA DI ACCOGLIENZA	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA	1.068.130.000	891.130.000	375.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 183.000.000
2764	AC - 41 - FD - L	Napoli	ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO SCUOLE PIE ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO COMPRESO NELL'ITINERARIO L'ARPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOPI	1.250.000.000	875.000.000	375.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 183.870.000
2797	AB - 41 - FH - F	Venezia	STRUTTURE PREFABBRICATE PER IL PERNOTTAMENTO A BASSO COSTO	A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA	1.801.000.000	1.081.000.000	720.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI € 5.817.000.000
2803	AB - 41 - EG - M	Venezia	STRUTTURE PREFABBRICATE E ADEGUAMENTO DI STRUTTURE IN ABBANDONO PER IL PERNOTTAMENTO A BASSO COSTO	A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA	2.701.000.000	1.981.000.000	720.000.000			MODIFICA TITOLO ED INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 900.000.000
					352.000.000	178.000.000	178.000.000			DEFINANZIAMENTO TOTALE PER RINUNCIA ALL'INTERVENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2915	AC - 41 - LA - L	Fiesole	RESTAURO DELLA FACCIATA LATERALE DELLA CATTEDRALE DI S. ROMOLO	CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI FIESOLE	418.000.000	300.000.000	118.000.000			
2996	AC - 26 - EA - M	Mogliano Veneto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE AL FINE DI ACCOGLIENZE A BASSO COSTO E ASSISTENZA	CASA REL. COLLEGIO SALESIANO ASTORI	534.000.000	444.000.000	90.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 83.762.000 ED AUMENTO COFINANZIAMENTO DI L. 37.921.000
3018	AC - 31 - FD - L	Verbania	ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DIRETTI AI SACRI MONTI AI SANTUARI ED AI LUOGHI DI CULTO TRADIZIONALI	OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	3.827.000.000	1.800.000.000	2.227.000.000		31/01/1999	31/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
3048	AC - 14 - FB - B	Verona	AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTIERA DI VILLA FRANCESCATTI	DIOCESI DI VERONA	4.094.000.000	3.598.000.000	498.000.000		30/04/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA D)
3048/A			AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTIERA DI VILLA FRANCESCATTI - FORESTIERA ALA OVEST		498.000.000	0	498.000.000			FRAZIONAMENTO
3048/B			AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTIERA DI VILLA FRANCESCATTI - FORESTIERE ALA EST - CORPO PRINCIPALE ALA OVEST - SERRE - SCALINATA BAROCCA		3.247.000.000	3.247.000.000	0			FRAZIONAMENTO
3048/C			OPERE DI RESTAURO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE	COMUNE DI SIENA	3.741.028.000	3.741.028.000	0		15/06/99	FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERA C)
3066	AA - 12 - EA - L	Sienna	RISALITA BALDASSARRE PERUZZI CENTRO STORICO	COMUNE DI SIENA	4.500.026.000	4.500.026.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 219.000.000
3133	AC - 14 - IA - L	Ventimiglia	PROGETTO DI RESTAURO DELLE COPERTURE RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI E IMPIANTI NEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA CATTEDRALE	2.810.000.000	2.400.000.000	210.000.000		30/06/99	30/10/99 RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO DI L. 1.010.000 E MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. attrib.	Finanz. Altre Fonti	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3144	AA - 41 - EE - F	Firenze	ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA	REGIONE TOSCANA	6.278.000.000	3.257.000.000	3.022.000.000			
3144/A			ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - SEGNALETICA		3.357.000.000	3.357.000.000	0			FRAZIONAMENTO
3144/B			ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - PROGETTO EDITORIALE		3.022.000.000		3.022.000.000			FRAZIONAMENTO
3194	AA - 41 - EL - M	Firenze	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	2.100.000.000	1.869.000.000	231.000.000			
3195	AA - 41 - EL - F	Firenze	SERVIZIO DI ARREDO E ADOOBBO URBANO CON MATERIALE VEGETALE	COMUNE DI FIRENZE	1.200.000.000	1.068.000.000	132.000.000	18/02/1999		MODIFICA DEI TERMINI DELLA LETTERA C)
3278/C	AA - 12 - EA - M	Ravenna	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (3° LOTTO) - PARCONAVILITA' PEDONALE E CICLABILE - PK - EDIFICIO DI SERVIZIO	COMUNE DI RAVENNA	4.828.002.504	1.726.002.504	2.900.000.000	15/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
3294	AC - 12 - HA - B	Ravenna	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE AGLI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA PER LA DIDATTICA RELIGIOSA PER LE ATTIVITA' CULTURALI PER I SERVIZI E PER L'ACCESSIBILITA' ALLA CHIESA DI SANTA MARIA IN PORTO	ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA	150.000.000	130.000.000	20.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.350.000.000 ED AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.150.000.000.
3372	AC - 31 - EL - M	Nova Ponente	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	CONVENTO DI PIETRALBA	1.133.000.000	1.133.000.000	0		31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA D)
								30/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice Uрге	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3373	AC - 31 - FA - M	Nova Ponente	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI CON LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA TAVOLA CALDA SELF SERVICE	CONVENTO DI PIETRALBA	6.343.000.000	4.229.000.000	2.114.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.1.339.000.000 ED EQUIVALENTE RIDUZIONE DI FINANZIAMENTO
3417	AC - 31 - GB - L	Verello	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000			
3505	AA - 11 - ED - B	Mercogliano	POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI BENI CULTURALI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	SOPRINTENDENZA B.A.A.S. DI SALERNO ED AVELLINO	1.981.000.000	1.981.000.000	0	30/09/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
3638	AA - 41 - HD - M	Napoli	INFOPOINT PASSEPARTOUT 2000 - SISTEMA DI NODI INFORMATIVI DEDICATI AL DISABILI PER L'ACCOGLIENZA, LA GUIDA AL TERRITORIO E LA CONOSCENZA DEI SUOI BENI CULTURALI	COMUNE DI NAPOLI	1.881.000.000	1.781.000.000	100.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 379.600.000
3690	AC - 11 - GA - L	Matera	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUARE ED AUMENTARE LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO ESISTENTE	IST. SUORE RIPARATRICI SACRO CUORE	1.793.320.000	1.603.320.000	190.000.000			REDUZIONE FINANZIAMENTO DI L.177.680.000
3697	AD - 23 - LA - M	Camposampiero	RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	580.000.000	410.000.000	170.000.000	30/09/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA D)
3761	AC - 12 - LA - B	Susa	INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA CHIOSTRI DI S. FRANCESCO	PROV. LIGURE PIEMONTESE FRATI MINORI	970.000.000	820.000.000	150.000.000	20/02/1999	30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
								24/10/1998		MODIFICA TERMINE PER ERRORE MATERIALE

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urge	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3868	AC-31-GA-L	Azignano	RECUPERO DELLA ROCCA SCALIGERA E DEGLI IMMOBILI ADIACENTI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA E DELL'EX CONVENTO FRANCESCO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	6.885.430.000	6.885.430.000	817.000.000			
3868/A			RECUPERO DELLA ROCCA SCALIGERA E DELLE MURA DELLA PARROCCHIA E DELL'EX CONVENTO FRANCESCO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA		3.622.094.692	3.222.769.498	399.325.194			FRAZIONAMENTO
3868/B			EX CONVENTO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE		2.410.170.000	2.196.000.000	214.170.000			
3868/C			LOGGIA DEL VICARIO DELLA SERENISSIMA		447.315.308	344.010.302	203.304.806			
3868/D			ARREDI E ATTREZZATURE		405.550.000	405.550.000				
3992	AC-11-GA-M	Acerra	CENTRO DELL'UMANA ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALI EX MONASTERO SS. ANNUNZIATA	DIOCESI DI ACERRA	6.628.000.000	6.128.000.000	500.000.000			
4019	AC-14-GA-L	AVELLINO	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROSETO	PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCCINI	6.970.000.000	6.470.000.000	500.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.342.000.000
4061	AC-11-ED-M	Orta	RESTAURO E RIUTILIZZO DEL RITIRO MARIA IMMACOLATA DA ADIBIRE A RISTORO PELLEGRINI; CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	SEM. VESCOVILE S. CARLO BORROMEO	5.264.688.068	1.993.000.000	3.271.688.068			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.1.378.688.068
4104	AA-28-GA-M	L'Aquila	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO	PROVINCIA DI L'AQUILA	1.544.400.000	1.344.400.000	200.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.84.400.000

1.500/1999 31/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 20 di 34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4194	AA - 41 - EF - M	Firenze	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	1.285.000.000	1.144.000.000	141.000.000			
4196	AA - 41 - EG - L	Firenze	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	COMUNE DI FIRENZE	1.587.000.000	1.395.000.000	172.000.000	16/03/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
4247	AC - 26 - LA - B	Agrigento	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIADATTAMENTO DELLA CATTEDRALE DI AGRIGENTO E LOCALI ANNESSI	PARROCCHIA S. GERLANDO	1.085.900.000	1.085.900.000	0	10/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
4248	AC - 26 - LA - L	VITTORIA	RIGUALIFICAZIONE SALE PLURIUSO E ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE	1.160.000.000	1.000.000.000	150.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.367.400.000
4275	AC - 41 - LA - B	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO DELL'INTERNO DELLA CHIESA DEL SS. REDENTORE	PARROCCHIA DEL SS.REDENTORE	2.283.759.000	1.833.759.000	450.000.000	15/04/99		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
4310	AA - 41 - EA - M	Firenze	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	COMUNE DI FIRENZE	20.320.000.000	18.662.000.000	3.858.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.303.000.000
4381	AC - 14 - IA - B	Urbino	RECUPERO AMBIENTALE E RIPRISTINO DI LOCALI D'ALTO VALORE STORICO E RELIGIOSO DA INSERIRE NEL TOUR GIUBILARE DEGLI AVVENIMENTI LITURGICI LEGATI AL GIRO DELLE GROTTE E DEGLI ORATORI	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	21.702.339.998	18.044.339.998	3.658.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.1.382.339.998
4632	AA - 41 - ED - M	Trieste	ITINERARI D'ARTE E RELIGIOSITA' NEL FRIULI VENEZIA GIULIA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. FRIULI V.G.	1.367.000.000	1.307.000.000	60.000.000	15/03/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

30/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERA D)

Pagina 21 di 34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urge	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
454/	AA - 26 - IA - L	Varallo	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO STRUTTURALE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA "MADONNA DELLE GRAZIE (2° LOTTO)	COMUNE DI VARALLO SESIA	600.000.000	600.000.000	0			
4814	AA - 14 - EC - M	GORIZIA	LA REALIZZAZIONE DELLA PORTA INFORMATICA PRESSO LA STAZIONE CONFINARIA INTERNAZIONALE DI SANT'ANDREA	COMUNE DI GORIZIA	450.000.000	350.000.000	100.000.000		19/02/1999	31/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
4882	AC - 52 - GB - M	San Giuliano Milanese	RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DI UNA ANTICA FORESTIERA MONASTICA	MONASTERO BENEDETTINE SS. PIETRO E PAOLO	2.294.117.000	1.204.117.000	1.090.000.000			INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO DI L. 256.000.000
4915	AA - 14 - IA - M	Cagliari	RESTAURO ARCHITETTONICO DEL PALAZZO VICEREGIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI	2.471.717.000	1.381.717.000	1.090.000.000			INTEGRAZIONE DI FINANZIAMENTO DI L. 171.600.000
4966	BA-23-FA-M	LIMENA	RIQUALIFICAZIONE DI AREA INDUSTRIALE DISMESSA	VIBROCEMENTO VENETA S.P.A.	2.436.000.000	1.626.000.000	810.000.000		31/04/1999	28/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
4997	AC - 26 - GA - M	Cenale	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI SPIRITUALITA' SANTA MARIA BELFIORE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	1.300.000.000	1.050.000.000	250.000.000			REINSERIMENTO NEL PIANO
					6.000.000.000	6.000.000.000			15/04/1999	31/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5000	AC - 12 - HA - M	San'Ambrogio Di Torino	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	3.250.000.000	3.200.000.000	50.000.000			
5000/A			OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - MONASTERO NUOVO		2.267.452.510	2.267.452.510	0	11.09.98		FRAZIONAMENTO E PROROGA TERMINI LETTERA Q
5000/B			OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - FORESTERIA PICCOLA		367.920.000	367.920.000	0	08.10.98		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERA Q
5000/C			OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - STRADA PERIMETRALE		793.577.351	743.577.351	50.000.000	21.10.98		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERA Q - INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.178.948.861
5091	AA - 31 - IA - B	Aquileia	RESTAURO VALORIZZAZIONE E RIUSO DEL BATTISTERO CHIESA DEI PAGANI ANNESSI AL COMPLESSO DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	650.000.000	650.000.000	0		30/10/1999	MODIFICA TERMINE LETTERA D)
5214	AA - 41 - LA - B	Genova	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CROSTRO DI SAN LORENZO	SOPRINTENDENZA B. A. A. DI GENOVA	3.114.000.000	2.864.000.000	250.000.000			
5215	AA - 41 - LA - B	Genova	RESTAURO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI PRE'	SOPRINTENDENZA B. A. A. DI GENOVA	1.569.000.000	3.179.000.000	250.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.315.000.000
5232	AC - 12 - LA - M	San Miniato	RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CAPPPELLA DEI SEPOICRETO DI S. URBANO E DI PIETRO NEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A S. MINIATO CON RISANAMENTO E RESTAURO DELLA ANTICA VIA ANGELICA META DI PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI	PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA E S. DOMENICO	906.000.000	488.000.000	417.000.000		12/04/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini		Note	
								Let. c)	Let. d)		
5324	AA - 12 - FB - L	PELEGRINO PARMENSE	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ANTICO EDIFICIO CONVENTUALE	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE	2.038.520.000	1.428.520.000	810.000.000				
5335	AC - 12 - FB - L	MEDESANO	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICETTIVITA' POVERA IN TERRITORIO PARMENSE	PARROCCHIA DI SAN PANTALEONE	1.000.000.000	800.000.000	400.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 70.000.000	
5343	AA - 12 - FH - M	COMPIANO	FORESTERIA DEL CASTELLO A BASSO COSTO E SERVIZI CATEGORIA L/F	COMUNE DI COMPIANO	1.952.000.000	802.000.000	1.350.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 312.000.000 E COFINANZIAMENTO DI L. 172.000.000	
5375	AC - 41 - GA - L	Incisa in Val D'Arno	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ED ESPERIENZE SOCIALI DI LORPIANO ALLOGGI CASETTE	P.A.M.O.M. PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA MARIA M	572.000.000	272.000.000	300.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 400.000.000	
5427	AC - 28 - FD - M	Gimigliano	CASA DI SPIRITUALITA' E DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	AMMINISTRAZIONE SANTUARIO MADONNA DI PORTO	792.000.000	500.000.000	292.000.000		01/05/1999	30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C E D)
5464	AC - 14 - GB - L	Pisa	RECUPERO DI LOCALI SOTTOTETTO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA	CONGR. REL. ISTIT. SUORE FRANCISCANE	450.000.000	250.000.000	200.000.000		31/03/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C E D)
5492	AA - 51 - EL - L	Trieste	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	920.000.000	800.000.000	120.000.000		30/03/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
5493	AA - 51 - FA - L	Trieste	FORESTERIA PER I PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	1.800.000.000	1.800.000.000	0		30/09/98	01/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERE C E D)
									21/10/98	30/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERE C E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz-ziamiento attrib.	Altre Fonti Finanz. Let. c)	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5502	AC - 14 - FD - L	ORVIETO	ESPERIENZA FRANCESCA NEL GIUBILEO	FAMIGLIA DEI DISCEPOLI IST. REL.	3.158.000.000 3.606.000.000	2.590.000.000 2.972.000.000	568.000.000 634.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.382.000.000. ED AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.65.000.000
5512	AA - 14 - EA - M	Sepino	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	1.169.000.000	1.169.000.000	0			30/05/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
5523	AC - 12 - GB - B	MONTEROSSO AL MARE	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCINI PER UNA RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA	PROV. GENOVA FRATI MINORI CAPPUCINI	1.546.970.000	1.087.970.000	479.000.000			
5556	AC - 12 - FD - L	Serralunga Di Crea	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO E MONASTICO SANTUARIO DI CREA	SANTUARIO DI C. MADONNA DI CREA	490.000.000	340.000.000	150.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.272.506.000
5593	AA - 28 - EA - L	Pavia	NUOVA AREA DI SOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL MONUMENTO	COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA	1.074.000.000	1.074.000.000	0			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE
5748	AC - 28 - GA - L	Castelpetroso	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA	ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOIANO	4.286.000.000	4.286.000.000	0			17/02/1999 31/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
5748/A			RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - VIABILITA' DI ACCESSO E SERVIZI - OPERE DI CONSOLIDAMENTO		1.623.000.000	1.623.000.000	0			FRAZIONAMENTO
5748/B			RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE		2.663.000.000	2.663.000.000	0			FRAZIONAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5793	AC - 11 - GA - M	Grottaglie	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA AI FINI DELL' ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	PROV. S. FRANCESCO DI PAOLA	1.557.000.000	1.357.000.000	200.000.000			
5797	AA - 53 - IA - B	Bologna	LAVORI DI RESTAURO E DI CONSOLIDAMENTO DEL PORTICO DI S. LUCA	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI BOLOGNA	5.000.000.000	5.000.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 610.000.000
5799	AA - 12 - LA - L	Asti	CHIESA DI S. GIUSEPPE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO	COMUNE DI ASTI	2.850.000.000	1.500.000.000	1.150.000.000	14/12/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
5954	AC - 41 - LA - B	Brescia	RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE DELLA CHIESA CATTEDRALE	CATTEDRALE DI BRESCIA	1.992.080.000	492.080.000	1.500.000.000	31/12/1998	28/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
5962	AA - 12 - IA - B	NOCETO	PROGETTO COORDINATO DI RESTAURO DELLA ROCCA E PARCO DI NOCETO E DI UNA EX SCUOLA DI CASTAMEZZANA CON LA REALIZZAZIONE DI CENTRO DI ACCOGLIENZA DISCOGRAFICO MUSICALE E OSTELLO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NELLA EX SCUOLA DI COSTA MEZZANA	COMUNE DI NOCETO	370.000.000	340.000.000	30.000.000			AUMENTO COFINANZIAMENTO DI L. 670.000.200 RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO DI L. 67.088.000
5973	AC - 12 - GA - M	Bore	RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI POZZOLO USO ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	PARROCCHIA DI S. MAURIZIO DI POZZOLO	507.000.000	370.000.000	137.000.000			VARIAZIONE DEL TITOLO DELL'INTERVENTO
5976	AC - 12 - IA - B	TERENZO	RESTAURO DELLA PIEVE DI BARNONE E RECUPERO A FINI MUSEALI DI LOCALI ACCESSORI	PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V.MARIA	1.062.000.000	777.000.000	305.000.000	1/04/1999		MODIFICA TERMINE LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urege	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6000	AA - 12 - EL - L	Pontremoli	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C. BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	1.010.000.000	930.000.000	80.000.000			
6121	AA - 41 - HA - L	Firenze	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	5.000.000.000	4.450.000.000	550.000.000		20/04/1999 31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C E D)
6156	AC - 41 - LA - M	Mantova	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	2.100.000.000	1.890.000.000	210.000.000		02/03/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6219	AA - 41 - IC - M	Firenze	CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE.	COMUNE DI FIRENZE	1.504.000.000	1.278.000.000	228.000.000		22/04/1999 31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
6239	AB - 53 - FD - L	Bologna	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI	3.125.000.000	1.000.000.000	2.125.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.110.000.000
6244	AC - 53 - FD - L	Bologna	MAISON D'ACCUEIL DAL MONTE	FONDAZIONE GESU' DIVINO OPERAIO	850.000.000	650.000.000	200.000.000		10/12/1998	MODIFICA TERMINE LETTERA C)
6245	AA - 53 - GA - L	Bologna	RIQUALIFICAZIONE LOCALI CONVENTO SAN DOMENICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI	PREFETTURA DI BOLOGNA	350.000.000	350.000.000	0		26/11/1998	AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI £.733.000.000 E MODIFICA TERMINI LETTERA C)
					365.000.000	365.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.15.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6279	AA - 12 - FB - M	BIONAZ	RECUPERO DEL FABBRICATO LA BATISE AD USO OSTELLO	COMUNE DI BIONAZ	1.919.516.000	1.288.516.000	633.000.000			
6333	AA - 21 - EA - M	Assisi	PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' MOJANO	COMUNE DI ASSISI	2.094.912.000	1.461.912.000	633.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI E.175.396.000
6366	AA - 26 - LA - B	Panicale	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SANTUARIO DI MONGIOVINO	SOPRINTENDENZA B.A.A.S. DELL'UMBRIA	3.610.000.000	3.600.000.000	10.000.000		15/06/1999 31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) F D)
6387	AA - 31 - LA - B	Cascia	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. AGOSTINO	FONDO EDIFICI DI CULTO	1.100.000.000	1.100.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI E.722.000.000
6442/ C	AB - 13 - EA - M	Norcia	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIOSO DEL CENTRO STORICO - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI NORCIA	5.757.000.000	5.757.000.000	0		09/04/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA G
6453	AC - 21 - GB - L	Assisi	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO IL MIGLIORAMENTO L'ADEGUAMENTO E LA CRESCITA DELLA STRUTTURA RICETTIVA CASA DI S. BRIGIDA	ORDINE DEL SS.MO SALVATORE DI S. BRIGIDA	950.000.000	950.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI E.100.000.000.
6495	AA - 14 - IA - M	Sassoterrato	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RISUSO DEL PALAZZO DEGLI SCALZI	COMUNE DI SASSOFERRATO	7.222.128.000	5.867.128.000	1.555.000.000		25/02/1999 31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) F D)
6537	AC - 12 - FD - M	PESARO	ACCOGLIENZA POVERA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DISMESSO DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	4.388.024.000	4.188.024.000	200.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI E.1.555.000.000
					4.469.024.000	4.269.024.000	200.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI E.81.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenta del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 28 di 34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prof. Urtge	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz. Let. c)	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6538	AA - 12 - EA - M	PESARO	RECUPERO FUNZIONALE AI FINI CENTRO DI SOSTE RISTORO INFORMAZIONE DI UN'ALA DELL'EX CONVENTO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI	COMUNE DI PESARO	5.071.950.000	3.956.950.000	1.115.000.000			
6681	AC - 22 - FA - L	Loreto	AMMODERNAMENTO DELLA CASA SAN FRANCESCO	PROV. PICENA S. GIACOMO DELLA MARCA	1.000.000.000	400.000.000	600.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 366.300.000
6706	AB - 13 - EH - M	Foligno	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO PER PELLEGRINI E O TURISTI PREVIA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI	AZIENDA U.S.L. N. 3	4.090.000.000	4.000.000.000	0			RIDUZIONE FINANZIAMENTO DI L. 326.000.000
6717	AC - 21 - IA - B	Assisi	ADEGUAMENTO LITURGICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA	PROTOMONASTERO DI S. CHIARA ASSISI	2.000.000.000	2.000.000.000	0	18/12/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6800	AC - 13 - LA - B	Guaido Tadino	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI GAIFANA	PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO	524.000.000	400.000.000	124.000.000	10/04/1999	29/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
6804	AC - 13 - LA - B	Norcia	RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN BENEDETTO	ARCIDIOSI DI SPOLETO NORCIA	3.830.103.000	3.830.103.000	200.000.000	04/11/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6821	AA - 22 - EC - M	Loreto	COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)	COMUNE DI LORETO	2.500.000.000	2.100.000.000	400.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 934.651 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DI COFINANZIAMENTO
6888	AC - 14 - GB - M	Montemonaco	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA CASA GIOIOSA	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO IN FERRA'	1.255.000.000	1.000.000.000	255.000.000	28/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urge	Codice HA - L LC - B GA - M GC - M EA - L LA - B FB - M FD - M	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6905	AD - 21 - HA - L	Assisi	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	IST. TERZIARIE FRANCISCANE ALCANTARINE	3.207.430.000	1.609.430.000	1.598.000.000			
6906	AC - 21 - LC - B	Assisi	REALIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI E SALA POLIVALENTE DI S. MARIA DELLE ROSE	CATTEDRALE DI S. RUFINO	1.058.380.000	633.380.000	425.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.33.545.000 E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
6970	AC - 13 - GA - M	Spoleto	RECUPERO DEL MONASTERO DI S. PONZIANO TRASFORMAZIONE PARZIALE IN CASA RELIGIOSA DI OSPITALITÀ E RESTAURO DEL MONASTERO ESISTENTE	MONASTERO DI S. PONZIANO	3.824.000.000	3.124.000.000	500.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.4.616.667 E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
6980	AC - 26 - GC - M	Todi	CENTRO DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E ZONA DI PARCHEGGI	CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'AMORE MISERICORDIOSO	2.600.000.000	2.600.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.382.000.000
6986	AA - 22 - EA - L	Loreto	AREA URBANA PREDISPOSTA PER LA SOSTA ED IL RISTORO	COMUNE DI LORETO	440.000.000	440.000.000	0	04/05/1999	30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
7014	AA - 13 - LA - B	Montecastrilli	TORRE AMERINA	COMUNE DI MONTECASTRILLI	122.000.000	110.000.000	12.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.38.000.000 MODIFICA TERMINI LETTERA C)
7031	AA - 13 - FB - M	Amelia	OSTELLO DI PALAZZO GIUSTINIANI	COMUNE DI AMELIA	2.653.000.000	2.388.000.000	265.000.000	15/04/1999	30/09/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
7036	AA - 13 - FD - M	Giove	LA TORRE DEL BORGIO	COMUNE DI GIOVE	589.000.000	589.000.000	0	03/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
								22/04/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
7065	AC - 13 - GA - M	Cagli	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MONASTERO BENEDETTINO DI SAN PIETRO	MONASTERO BENEDETTINE DI SAN PIETRO	3.308.990.000	3.088.990.000	218.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 194.000.000
7084	AA - 26 - FB - M	VALLO DI NERA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO	COMUNE DI VALLO DI NERA	1.491.470.000	1.491.470.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 463.000.000 ED AUMENTO COFINANZIAMENTO DI € 100.000.000
7167	AC - 13 - GA - M	SantiAnastolia Di Narco	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERA IN SAN FELICE	ARCIDIocESI DI SPOLETO NORCIA	1.909.397.000	1.709.397.000	200.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 60.750.007 E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7201	AC - 13 - LA - B	Gubbio	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCESCANO DI GUBBIO CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO	CHIESA DI S. FRANCESCO GUBBIO	3.041.895.000	2.946.895.000	95.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 86.554.247
7235	AC - 21 - GB - L	Assisi	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO NEL BORGO MEDIOVALE DI S. GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO	1.531.770.000	819.770.000	712.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 8.445.753 E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7265	AA - 13 - IA - B	TERNI	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CONTELORI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI TERNI	1.620.000.000	1.620.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 16.614.538 E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
					1.650.000.000	1.650.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 30.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
7266	AA - 13 - 1A - B	Terni	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE	COMUNE DI TERNI	920.000.000	0			
7268	AA - 13 - 1A - M	SPOLETO	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO COLLICOLA IN SPOLETO QUALE CENTRO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIUBILARE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONNESSE INFORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE	COMUNE DI SPOLETO	5.257.654.000	1.000.000.000	10/04/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
7278	AC - 21 - LA - M	Assisi	RESTAURO CONSERVATIVO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN PORZIUNCOLA	PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO	13.579.571.000	10.772.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 115.131.074 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7351	AC - 22 - FD - M	LORETO	CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI E PELLEGRINI VILLA PIO XII	PROV. ITALIANA CONGR. MISSIONARI	3.381.900.000	600.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 1.786.136.302 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7356/ B	AA - 13 - EF - M	Terni	RIQUALIFICAZIONE DEL COLLE DI SAN VALENTINO	COMUNE DI TERNI	2.981.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 40.345.000
					3.161.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA € 180.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
7377	AC - 14 - FB - L	Perugia	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' VIA BONTEMPI 13	OPERA PIA M. PAOLETTI	2.230.000.000	2.000.000.000	230.000.000			
7416	AC - 14 - FD - L	Cascia	CASA DEL PELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN ROCCAPORENA	CHIESA SANTUARIO DI S. RITA	4.121.813.054	3.542.351.078	579.461.976	21/01/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
7464	AA - 51 - LA - B	Ancona	RESTAURO FACCIATA CHIESA SAN DOMENICO	COMUNE DI ANCONA	344.000.000	344.000.000	0	10/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
7516	AC - 13 - IA - B	Foligno	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOC. FOLIGNO CATTEDRALE DI S. FELICIANO	11.078.087.989	6.678.087.989	4.400.000.000			MODIFICA TERMINI LETTERA C)
7570	AC - 14 - FD - B	Bevagna	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLEX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI BEVAGNA	2.225.984.000	1.725.984.000	500.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.162.542.431 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7622	AC - 28 - GA - M	ACIREALE	INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE DEL SEMINARIO ESTIVO ADIBITO A CENTRO STUDI	SEMINARIO VESCOVILE ACIREALE	758.789.000	659.799.000	100.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.79.659.459 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7663	AA - 12 - EC - L	Carbonara Al Ticino	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO ED ARTISTICO DEI COMUNI DELLA FASCIA LITORANEA OCCIDENTALE DEL TICINO SULLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CARBONARA AL TICINO	517.022.000	467.022.000	50.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.38.750.000 MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
7901	AA - 31 - IA - B	Aquileia	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AL FOLADOR DEL PALAZZO BRUNNER DI AQUILEIA	SOPRINTENDENZA PER I BENI A.A.A.S. FRIULI VENEZIA	1.150.000.000	1.150.000.000	0			
7902	AA - 28 - LA - B	Aquileia	RESTAURO DELLA CARENA LIGNEA DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	900.000.000	900.000.000	0	10/02/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
8976	AC - 21 - GB - M	ASSISI	CASTELLO DI PORZIANO RECUPERO PARZIALE	PARROCCHIA SANTI LORENZO E ANNA	1.490.000.000	1.490.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 590.000.000
					930.000.000	660.000.000	250.000.000	15/02/99	31/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 34 di 34

Rep. N. 209/RC dell'11 ottobre 1999

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 11 del 19 maggio 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G. U. n. 247 del 22 ottobre 1997;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 101 alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;

VISTA la nota del 12 maggio 1999, con la quale l'INAIL ha comunicato l'elenco degli interventi da cancellare dal Piano, motivando tale scelta, per quelli rubricati con nn. 6016, 7659 e 6030, con l'impossibilità di rispettare i termini giubilari e per quello rubricato con n. 6015, con la rinuncia dell'offerente alla vendita;

VISTA la stessa nota in data 12 maggio 1999 con la quale l'INAIL medesimo ha chiesto di includere nel Piano degli interventi, in sostituzione delle sopra accennate esclusioni, gli interventi rubricati con i nn. 6024, 6032 e 6038, già comunicati a questo Ufficio in sede di originaria formulazione della proposta di Piano, per i rispettivi nuovi importi indicati dallo stesso INAIL;

CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta del 19 maggio c. a., nell'esercizio del potere ad essa affidato dall'art. 1, comma 7 della legge n. 270/97, ha ritenuto meritevole di approvazione la proposta di modifica del Piano degli interventi INAIL, risultando comprovata, per i nuovi tre interventi, l'intervenuta intesa con i Comuni nel cui ambito sono localizzati, nonché la loro coerenza e rilevanza rispetto alle finalità giubilari di cui alla legge n. 270/97, ed all'uso post-giubilare ed ha, conseguentemente, recepito la proposta di inserimento nel Piano dei predetti interventi, negli importi espressamente indicati dall'INAIL, sulla base di autonomi criteri di investimento e di gestione delle proprie risorse;

VISTA la deliberazione n. 11/99, adottata in data 19 maggio 1999 dalla Commissione ex articolo 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il parere favorevole n. 713, reso in data 25 giugno 1999, dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 11/99 della Commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del decreto di approvazione della delibera in esame, a seguito della sopravvenuta indagine giudiziaria relativa all'impegno di fondi pubblici, la Commissione ha ritenuto di riesaminare la propria delibera n. 11/99 nella parte in cui sono stati inclusi nel piano gli interventi proposti dal soggetto titolare INAIL;

CONSIDERATO che, a seguito di tale riesame, effettuato nella seduta del 28 Luglio 1999, la Commissione è pervenuta alla determinazione di sospendere, in via provvisoria e cautelativa, la statuizione di cui sopra, informandone la competente Procura della Repubblica al fine di acquisire indicazioni utili per le proprie definitive determinazioni;

DECRETA

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'all. "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 9.709.000.000;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Sono totalmente defINANZIATI, a seguito dell'esito negativo del relativo procedimento di contestazione e messa in mora per un ammontare complessivo pari a £ 13.824.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno evidenziato gli interventi sotto indicati:

n. 198 - "Costruzione nuovo parcheggio bus turistici" localizzato a Napoli - £ 5.600.000.000;

n. 1676 - "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi" localizzato a Udine - £ 1.400.000.000;

n. 3958 - "Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostri monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività" localizzato a Brescia - £ 3.804.000.000;

n. 4741 - "Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo Comunale" localizzato a Massa - £ 1.120.000.000;

n. 6523 - "Trasformazione distributiva dell'immobile - struttura ricettiva a basso costo" localizzato a Fabriano. - £ 1.900.000.000.

3. Sono concessi ulteriori 10 giorni, a carattere ultimativo, ai destinatari della procedura di contestazione e messa in mora, di cui al comma 11 del decreto n. 202/RC del 1 giugno 1999, che non abbiano ancora inviato le proprie controdeduzioni all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi.

4. Sono defINANZIATI totalmente, a seguito della rinuncia al finanziamento espresso dai soggetti titolari e per un ammontare complessivo pari a £ 2.863.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato i sotto indicati interventi:

n. 1313 "Opere di restauro ed adeguamento funzionale del Convento S. Maria degli Angeli", localizzato a Montoro Superiore - £ 200.000.000;

n. 3362, "Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico" localizzato a Venezia - £ 2.663.000.000.

5. E' assentita la riduzione da £ 8.800.000.000 a £ 7.000.000.000 del costo dell'intervento localizzato a Milano e rubricato col n. 5147 - "Itinerari religiosi nella Città - riqualificazione del sagrato della Basilica giubilare di S. Lorenzo Maggiore" e della relativa quota di cofinanziamento che passa da £ 4.400.000.000 a £ 3.500.000.000 ed è, conseguentemente, disposta la riduzione del finanziamento a carico della legge n. 270/97 da £ 4.400.000.000 a £ 3.500.000.000 con un'economia pari a £ 900.000.000;

6. Sono parzialmente defINANZIATI, a seguito di riprogrammazione dei rispettivi soggetti titolari, per un ammontare complessivo pari a £ 1.965.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato i sotto indicati interventi:

n. 3018, "Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali" a Verbania, la cui assegnazione finanziaria è ridotta da £ 1.600.000.000 a £ 635.000.000, con un'economia pari a £ 965.000.000;

n. 3997, "Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda" a Padova, la cui assegnazione finanziaria è ridotta da £ 4 miliardi a £ 3 miliardi, con un'economia pari a £ 1 miliardo.

7. E' corretto l'errore materiale attinente all'importo dell'assegnazione finanziaria ex lege n. 270/97 afferente l'intervento "Riqualificazione della struttura Istituto Don Orione appartenente alla Provincia religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di Don Orione" a Messina, rubricato col n. 616, per la cui realizzazione sono assentite £ 7.118.532.000 anziché £ 7.388.532.000, con una economia pari a £. 270.000.000;

8. Le risorse disponibili sono, pertanto rideterminate in complessive £ 30.029.058.167, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 498.058.167	Risorse residue nella disponibilità della Commissione
£ 9.709.000.000	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 del presente decreto
£ 16.687.000.000	Risorse provenienti da defINANZIAMENTI TOTALI di cui al punto 2 e 4 del presente decreto
£ 3.135.000.000	Risorse provenienti da defINANZIAMENTI parziali di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente decreto

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. Sono cancellati dal Piano, su richiesta del soggetto titolare e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti interventi, meglio indicato nell'allegato "B"

n. 6015- INAIL - Torino

n. 6016- INAIL - Sarzana

n. 7659 INAIL- Firenze

n. 6030 INAIL -San Benedetto Val di Sambro

10. E' sospesa, in via temporanea e cautelativa, la statuizione di cui al punto 10 della deliberazione n. 11/99, nella parte in cui dispone l'inclusione nel Piano dei seguenti interventi proposti dall'INAIL:

n. 6032 "Soc. Rover s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l. - Bologna - £ 51.360.000.000;

n. 6024 "Soc. Sparaco Spartaco Spa - Verona" - £ 40.866.000.000;

n. 6038 "Soc. Grandi Lavori Fincosit Spa - Pisa" - £ 49.800.000.000;

11. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, come indicato nell'allegato "B".

12. Sono inclusi nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato "C" per un importo complessivo di £ 24.827.000.000.

13. Restano pertanto nella disponibilità della Commissione £ 5.201.358.167.

Roma, li 5 agosto 1999

Registrato alla Corte dei Conti l'11 ottobre 1999

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 99

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 19 maggio 1999

Allegato A

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
459	Lavagna	GE	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI	COMUNE DI LAVAGNA	80.000.000
484	Aquileia	UD	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	136.000.000
489	Pisa	PI	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	798.000.000
1408	Pescara	PE	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE VILLA IMMACOLATA IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI PESCARA	SEMINARIO ARCVESCOVILE	420.000.000
1432	Padova	PD	COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	COMUNE DI PADOVA	143.000.000
1960	Mazara del Vallo	TP	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S. VENERANDA	DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO	19.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2315/A	Riese Pio X	TV	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BARCHESSA ZORZI PER IL RICAVO DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RECUPERO DI BENE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER LA REALIZZ. DI AREA . LAVORI DI ULTIMAZIONE BARCHESSA ZORZI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	COMUNE DI RIESE PIO X	290.000.000
2558	Orio Litta	LO	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIA' GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S.PIETRO	COMUNE DI ORIO LITTA	174.000.000
2839	Cagliari	CA	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	850.000.000
2847/A	Cagliari	CA	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ENTE DIOCESI CATTEDRALE DI CAGLIARI	633.000.000
2847/B	Cagliari	CA	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	ENTE PARROCCHIA DI S. CECILIA	361.000.000
2847/C	Cagliari	CA	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VICO DUOMO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	135.000.000
2848	Cagliari	CA	RESTAURO DELL'AUDITORIUM PIAZZA DETTORI	COMUNE DI CAGLIARI	260.000.000
3194	Firenze	FI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	100.000.000
3315	Firenze	FI	CHIESA DI S. M. NOVELLA E CHIOSTRI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC RIVELAZIONE INCENDIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	COMUNE DI FIRENZE	290.000.000
4104	L'Aquila	AQ	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE	PROVINCIA DI L'AQUILA	348.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4194	Firenze	FI	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	110.000.000
4739	Massa Marittima	GR	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	473.000.000
5484	Trieste	TS	LOCALI DI ACCOGLIENZA PER RISTORO CON ANNESSI SERVIZI IMPIANTISTICA E PERCORSI ATTREZZATI INTERNI ED ESTERNI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER DISABILI	PARROCCHIA MARIA MADRE E REGINA	68.000.000
5486	Trieste	TS	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI MUGGIA VECCHIA E DEL SUO SANTUARIO	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	68.000.000
5492	Trieste	TS	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	70.000.000
5493	Trieste	TS	FORESTERIA PER I PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	180.000.000
5868	Bagno Di Romagna	FO	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE	IST. CLARISSE SS SACRAMENTO	58.000.000
5987	Bologna	BO	RESTAURO CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENOBIO DI S. VITTORE AD USO DI ACCOGLIENZA RISTORO E LUOGO DI CULTO	CONGR. ORATORIO DI S. FILIPPO NERI	516.000.000
6122	Firenze	FI	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	COMUNE DI FIRENZE	500.000.000
6220	Firenze	FI	VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI	COMUNE DI FIRENZE	230.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6239	Bologna	BO	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI	252.000.
6413	Ascoli Piceno	AP	RECUPERO DEL COMPLESSO DI VILLA SGARIGLIA COME ALBERGO PENSIONE 1/2 STELLE	COMUNE DI ASCOLI PICENO	500.000.
6526	Fabriano	AN	CASA ALBERGO PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PROV. ITAL. CONGR. FRATELLI DI N. SIGNORA	370.000.
6969	Spoletto	PG	PIANO GENERALE E PROGETTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI LUNGO I PERCORSI E LE METE GIUBILARI NEL CENTRO STORICO DI SPOLETO	COMUNE DI SPOLETO	105.000.
7258	Gubbio	PG	RITORNO ALL'ACROPOLI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A SCALA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE DA VIA XX SETTEMBRE AGLI ORTI DELLA CATTEDRALE	COMUNE DI GUBBIO	85.000.
11622	Vercelli	VC	PALAZZO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBITI DESTINATI ALL'ARCHIVIO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	567.000.
13058	Alessandria	AL	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S.MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	520.000.

Tot. Interventi

33

Tot. Disponibi

9.709.000.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato "B"

Riunione commissione ex lege n. 270/97 del 19 Maggio 1999

Modifiche (*) degli interventi inclusi nel Piano degli Interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

° rot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. - attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
198	AA - 52 - EL - M	Napoli	COSTRUZIONE NUOVO PARCHEGGIO BUS TURISTICI	MIN. TRASP. - NAVIGAZIONE D.G.A.C.	7.000.000.000	5.800.000.000	1.400.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE
206	AD - 11 - LA - M	Brindisi	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI S. MICHELE DELLA DELLE SCUOLE PIE PER ATTIVITA' CULTURALI	PARROCCHIA VISIT. GIOVANNI BATTISTA	1.081.000.000	195.000.000	886.000.000			
343	AC - 28 - FA - L	Ploeghe	SISTEMAZIONE STRUTTURA PER OSPITARE A BASSO COSTO PORTATORI DI HANDICAP	FONDAZIONE OPERA S. GIOVANNI BATTISTA	2.900.000.000	2.400.000.000	500.000.000	30.07.99		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
474	AC - 26 - EC - L	Aquila	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N 352	COMUNE DI AQUILEA	300.000.000	290.000.000	10.000.000	30/06/99		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
476	AA - 28 - EC - L	Aquila	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL NUOVO CENTRO VISITE DELLA SOPRINTENDENZA	COMUNE DI AQUILEA	691.000.000	681.000.000	10.000.000	15.07.99	30.10.99	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 1 di 6

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codece rot.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
477	Aquila	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL MUSEO NAZIONALE IN VIA CURIEL-ANGOLO VIA JULIA, AUGUSTA	COMUNE DI AQUILEIA	300.000.000	280.000.000	10.000.000	24.07.99	30.10.99	MODIFICA TERMINI LETTERE C e D)
478	Aquila	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO LUNGO LA VIA A. GRANDI	COMUNE DI AQUILEIA	280.000.000	270.000.000	10.000.000	10.6.1999	30.10.1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C e D)
516	Massina	RIGUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	8.233.532.000	7.368.532.000	845.000.000			
951	Codigoro	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	560.000.000	444.000.000	116.000.000	03.05.1999	20.10.1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C e D)
1221	Aquila	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AGENZIA DI AQUILEIA	POSTE ITALIANE E. P. E. SEDE FRIULI V. G.	30.000.000	30.000.000	0	06.05.1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1313	Montoro Superiore	RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI S. MARIA DEGLI ANGELI	COMUNITA' MONTANA SERINESE SOLOFRANA	550.000.000	200.000.000	350.000.000			
1457	Montemagno	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO DEI RESTI DELLA CHIESA ROMANICA DEI SS. VITTORE E CORONA	COMUNE DI MONTMAGNO	317.000.000	260.000.000	57.000.000		31/10/99	CANCELLAZIONE DAL PIANO PER RINUNCIA ALL'INTERVENTO MODIFICA TERMINI LETTERA D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

° rot.	Codice Urgo	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
589	AA - 12 - EA - L	Torino	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA	COMUNE DI TORINO	4.320.000.000	4.320.000.000	0	10.05.1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
676	AA - 28 - EA - L	Udine	PARCHEGGIO COLLEGATO ALLA STAZIONE FF. SS. E PARCHEGGIO FRA VIA MEDICI E VIA DEL VASCHELLO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI UDINE	2.000.000.000	1.400.000.000	600.000.000			
677	AC - 28 - EF - L	Udine	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AMPLIAMENTO	PARROCCHIA S. PIO X	927.000.000	680.000.000	247.000.000	19/05/99	31/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
716	AA - 28 - FH - L	Cervignano Del Friuli	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER FERIE FORESTIERA	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	550.000.000	412.000.000	138.000.000			
1128	AA - 28 - FD - M	Serra San Bruno	COMPLETAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	2.825.000.000	500.000.000	2.125.000.000	19.03.1999	14.05.1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
1280	AA - 28 - EA - L	Prato	INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO	COMUNE DI PRATO	175.000.000	75.000.000	100.000.000	28.05.1999		MODIFICA DEI TERMINI LETTERA C)
1559/ B	AA - 12 - IA - M	Castell'Arquato	SISTEMAZIONE DELLA PARTE ESTERNA DELL'EDIFICIO	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	312.000.000	172.000.000	140.000.000	31.07.1999	30.11.1999	MODIFICA DEI TERMINI LETTERE C) E D)
1662	AA - 12 - FD - L	Rocchetta Tanaro	RECUPERO E RIUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA ROCCETTA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCETTA TANARO	1.500.000.000	1.500.000.000	0		30.10.1999	MODIFICA DEI TERMINI LETTERA D)
1918	AA - 41 - IA - B	Milano	RESTAURO DELLA CRIPTA DI S. GIOVANNI IN CONCA	SOPRINTENDENZA A. DELLA LOMBARDIA	700.000.000	700.000.000	0	16/03/99		MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

° rot.	Codice Urege	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato attrib.	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1018	AC - 31 - FD - L	Verbania	ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DIRETTI AI SACRI MONTI AI SANTUARI ED AI LUOGHI DI CULTO TRADIZIONALI	OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	3.827.000.000	1.600.000.000	2.227.000.000			
3172	AD - 22 - EA - L	Loreto	PARCHEGGIO SCALA SANTA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	2.462.000.000	635.000.000	2.227.000.000			RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO DI L. 965.000.000
3362	AC - 41 - LA - B	Venezia	OPERE RELATIVE AL RESTAURO DELL'ANTICO COMPLESSO ARCHITETTONICO	CONGREGAZIONE ARMENA MECHITARISTA	5.313.000.000	2.663.000.000	2.650.000.000		30.05.1999 30.10.1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
3731	AA - 11 - LA - B	Taranto	CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' NELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI	COMUNE DI TARANTO	3.787.000.000	2.198.000.000	1.589.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER RINUNCIA ALL'INTERVENTO
3768	AC - 26 - GB - M	Domodossola	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI SPIRITUALITA' ROSMINIANA	PROV. ITALIANA DI S. MAURIZIO DELL'ISTITUTO DELLA CARITA'	723.000.000	623.000.000	100.000.000		30.05.1999 30.10.1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
3902	AA - 11 - EE - L	Ginosa	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	COMUNE DI GINOSA	303.965.000	203.965.000	100.000.000		14/04/1999 11/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
3958	AC - 41 - GA - B	Brescia	RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI 4 CHIOSTRI MONUMENTALI DEL TEMPIO CONVENTO DI S. FRANCESCO D'ASSISI DA ADIBIRE A RICETTIVITA'	COMUNITA' FRATI MINORI CONVENTUALI	4.304.000.000	3.804.000.000	500.000.000		31/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERA D)
3997	AA - 23 - HC - M	Padova	CASA DI ACCOGLIENZA PELLEGRINI DISABILI BREDA	PIA FONDAZIONE V. S. BREDA	10.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE
4196	AA - 41 - EG - L	Firenze	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	COMUNE DI FIRENZE	1.587.000.000	1.395.000.000	172.000.000		22/02/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I° rot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. attrib.	Finanz. ziamento altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4739	AA - 26 - EA - M	Massa Marittima	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	4.219.000.000	1.700.000.000	2.519.000.000			
4741	AA - 12 - EE - M	Massa	SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI DI CONGIUNZIONE TRA CATTEDRALE CHIESA DI SAN SEBASTIANO E PUNTO INFORMAZIONI MULTIMEDIALE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE	COMUNE DI MASSA	2.800.000.000	1.120.000.000	1.680.000.000	1/06/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
4817	AA - 14 - IA - M	Gorizia	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEIA	COMUNE DI GORIZIA	4.470.000.000	4.470.000.000	0			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALB
4847	AA - 11 - EA - M	Mercogliano	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE AVELLINO OVEST DA DESTINARE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL FLUSSO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI MERCOLIGLIANO	225.000.000	225.000.000	0	31/05/99		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
4886	AA - 13 - IA - M	Monte Colombo	RECUPERO DELLE MURA DEL CASTELLO DI SAN SAVINO	COMUNE DI MONTECOLOMBO	800.000.000	598.000.000	212.000.000	08/03/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
4949	AC - 41 - GA - B	Venezia	ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI PARROCCHIA S. CRISTOFORO	PARROCCHIA S. CRISTOFORO	236.000.000	208.000.000	30.000.000		31/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERA D)
4976	AA - 14 - EH - L	Viggiano	REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO E DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DENOMINATA ORTO DELLA MADONNA.	COMUNE DI VIGGIANO	2.540.000.000	1.340.000.000	1.200.000.000	30/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
5147	AA - 41 - IA - B	Milano	ITINERARI RELIGIOSI NELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA GIUBILARE DI S. LORENZO MAGGIORE	COMUNE DI MILANO	9.800.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000	06/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz-ziamiento attrib.	Altre Fonti Finanz. Let. c)	Termini Let. d)	Note
5167	AA - 41 - EA - L	Milano	RISTRUTTURAZIONE P. LE CADORNA	COMUNE DI MILANO	6.400.000.000	3.089.000.000	3.301.000.000	29/04/99	MODIFICA TERMINI LETTERA C)
5768	AC - 23 - FB - L	Monselice	OSTELLO S. GIACOMO	PROV. FRATI MINORI S. FRANCESCO	280.000.000	250.000.000	30.000.000		
5868	AD - 12 - GB - B	Bagno Di Romagna	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE	IST. CLARISSE SS SACRAMENTO	1.548.000.000	1.348.000.000	200.000.000	31/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERA D)
5869/ C	AC - 26 - FD - B	Ceranesi	AUDITORIUM - PIAZZALE SOSTA AUTOMEZZI	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	2.456.000.000	1.681.000.000	775.000.000	20/01/99	MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6015	CA - 12 - NC - M	Torino	INAIL 2000 PROT. 7590	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	23.000.000.000	0	23.000.000.000	15/03/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6016	CA - 12 - NC - M	Sarzana	INAIL 2000 PROT. 7483	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	0	0	0		CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL'ENTE TITOLARE
6030	CA - 14 - ND - M	San Benedetto Val Di Sambro	INAIL 2000 PROT 7718	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	25.000.000.000	0	25.000.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL'ENTE TITOLARE
6523	AC - 14 - FD - M	Fabriano	TRASFORMAZIONE DISTRIBUTIVA DELL'IMMOBILE - STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO	SEMINARIO VESCOVILE	2.400.000.000	1.900.000.000	500.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL'ENTE TITOLARE
7659	CA - 41 - NC - M	Firenze	INAIL 2000 PROT. 7780	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	47.000.000.000	0	47.000.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato C

PROF.	(COD. URSCG)	COMUNISPER	INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO	SPEDIZIONE IN CARTELLA	OGGETTO	VALORE IN EURO	VALORE IN EURO	VALORE IN EURO	VALORE IN EURO	DATA
203	AA 26	IA B	Ospedalett o Lodigiano	RECUPERO DEL NOVIZIATO COME OSTELLO FABBRICATO DEL 1152 CITATO GIA' ECCLESIA IPSIUS HOSPITALIS	COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO	2750	2000	750	24-apr-99	27-ott-99
876	AA 12	LA L	Bonassola	LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DELL'ORATORIO DI SAN ROCCO IN MONTARETTO COMUNE DI BONASSOLA	COMUNE DI BONASSOLA	320	320	0	15-giu-99	30-ott-99
928	AC 11	GA L	Venosa	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CHIESA CONVENTO DI S. MARIA IN MONTALTO	CURIA VESCOVILE	3000	3000	0	01-lug-99	30-ott-99
2388	AC 14	GA M	Bisignano	CONSOLIDAMENTO RECUPERO E RESTAURO DELL'IMPIANTO CONVENTUALE DEL BEATO UMILE E SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE	ORDINI FRATI MINORI BEATO UMILE DI BISIGNANO	2400	2000	400	01-lug-99	30-ott-99
2396	AA 14	FD M	Romagne e	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE IN LOCALITA' CASA CASARINI DI ROMAGNESE	COMUNE DI ROMAGNESE	1950	1100	850	01-lug-99	30-ott-99
2771	AC 12	GA L	Sansepolter o	RECUPERO E ADEGUAMENTO DI VECCHIO FABBRICATO GIA' DESTINATO AD ALBERGO IN CASA FRANCESCANA PER L'ACCOGLIENZA	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	400	400	0	30-giu-99	31-ott-99
2832	AC 12	GA B	Poppi	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE NEL SACRO EREMO DI CAMALDOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA	CASA GENERALIZIA CONGR. DEGLI EREMITI CAMALDOLESI	937	787	150	30-giu-99	20-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi											
2842	AA 26	HA L	CA	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI CAGLIARI	Ricettività per disabili e categorie disagiate	1180	1180	0	01-lug-99	30-ott-99
3131	AA 26	FD M	IS	RECUPERO DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO PER PRESIDIO TURISTICO RELIGIOSO E CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL GIUBILEO DEL 2000	COMUNE DI VENAFRO	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	2000	2000	0	01-lug-99	31-ott-99
3258	AC 26	GD B	CL	DA HOTEL A CASA ALBERGO PER ANZIANI E SACERDOTI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE. COMPLETAMENTO FINALE FONDAZIONE MAZZONE	FONDAZIONE CARLO MAZZONE	Ricettività in comunità religiose	2350	2000	350	01-lug-99	31-ott-99
3387	AC 26	GA B	PO	RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI PORZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE FRANCESCO DEL XIII SECOLO	PARROCCHIA DI S. DONATO IN S. FRANCESCO	Ricettività in comunità religiose	742	350	392	30-mar-99	30-ott-99
3684	AC 12	FB L	SP	RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO DEL DISMESSO C. D. U. E TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE	ENTE PARROCCHIA S. FELICITA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1000	1000	0	30-giu-99	31-ott-99
3998	AC 14	GC M	BL	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL CENTRO PAPA LUCIANI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	Aree verdi attrezzate e/o parchi pubblici, visite naturalistiche	330	180	150	20-giu-99	31-ott-99
4334	AE 12	EL M	BL	ADEGUAMENTO DELLE DUE SALE CONFERENZE ALLE NORMATIVE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI PUBBLICI SPETTACOLI	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	230	180	50	20-giu-99	31-ott-99
4808	AA 11	EA M	AV	RQUALIFICAZIONE URBANA AREA A VALLE DEL VIALE DI SAN MODESTINO PER REALIZZARE UN'AREA DI INTERSCAMBIO TRA TRASPORTO PRIVATO E NAVETTE PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO AL SANTUARIO DI MONTEVERGINE ED	COMUNE DI MERCOGLIANO	Servizi di trasporto pubblico, navette	2080	2080	0	01-lug-99	31-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO		ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO		ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO		ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO		ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO		ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO		ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO		ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO	
4862	AC 14	LA L	Crotone	KR	COMPLETAMENTO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA MINORE SANTUARIO BEATA VERGINE DI CAPO COLONNA	ENTE DIOCESI CROTONE SANTA SEVERINA	Beni monumentali, di carattere culturale, ambientale o religioso e relativi servizi - recupero	1350	1350	0	30-giu-99	31-ott-99			
5552	AD 12	IA B	Cremolino	AL	RESTAURO DEL PAVIMENTO DEL SANTUARIO DELLA BRUCETA	PARROCCHIA DI N.S. DEL CARMINE CREMOLINO	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	2500	2820	320	26-apr-99	31-ott-99			
6024	CA 41	NC M	Verona	VR	INAIL 2000 PROT. 7538 OFFERENTE SPARACO SPARTACO SPA VERONA	I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASSIC. CONTRO GLI INF	Ricettività per giovani e/o casa dello studente	0	40866	40866	30-set-97	31-ott-99			
6032	CA 53	NB M	Bologna	BO	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7681 OFFERENTE ROVER EST SRL BOLOGNA	I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASSIC. CONTRO GLI INF	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	0	51360	51360	01-apr-98	31-ago-99			
6038	CA 12	NC M	Pisa	PI	INAIL 2000 PROT. 7554 OFFERENTE GRANDI LAVORI FINCOSIT PISA	I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASSIC. CONTRO GLI INF	Ricettività per giovani e/o casa dello studente	0	49800	49800	30-apr-98	30-set-99			
6306	AA 22	LA B	Loreto	AN	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI NEL SOTTOTETTO DEL CORPO LATERALE DEL PALAZZO ILLIRICO DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTON	Beni monumentali, di carattere culturale, ambientale o religioso e relativi servizi - recupero	1000	1000	0	30-giu-99	27-ott-99			
6553	AC 21	ED M	Assisi	PG	G.AUDI.U.M. GIUBILEO ALL'AUDITORIO DELLA CITTADELLA PER L'UNIVERSALITA' DELLE ARTI DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	PRO CIVITA'TE CHRISTIANA	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	1400	1400	0	30-apr-99	18-ott-99			

Rep. N 210/RC del 22 ottobre 1999

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 12 del 28 luglio 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA
CAPITALE, GIUBILEO 2000**

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G. U. n. 247 del 22 ottobre 1997;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 101 alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 12/99, adottata in data 28 luglio 1999 dalla Commissione ex articolo n. 270/97;

VISTO il parere favorevole n. 749, reso in data 5 agosto 1999, dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 12/99 della Commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;

VISTO il proprio decreto in data 5 agosto 1999 che, al punto 10 del dispositivo, ha già recepito quanto stabilito al punto 6 della deliberazione n. 12/99 del 28 luglio 1999, in ordine alla sospensione dell'inclusione nel Piano di taluni interventi proposti dall'INAIL;

RITENUTO, pertanto, di non riportare del dispositivo del presente provvedimento la suddetta sospensione;

DECRETA

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'all. "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 9.482.353.356.
2. Sono totalmente defINANZIATI, a seguito dell'esito negativo del relativo procedimento di contestazione e messa in mora, per un ammontare complessivo di £ 7.682.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, gli interventi:

n. 1678 - "Ostello per la Gioventù"	£	840.000.000
n. 510 - "Scambiatore intermodale Catacombe di San Gennaro"	£	4.500.000.000
n. 4732 - "Restauro ed adeguamento funzionale della Cattedrale di Catania"	£	2.342.000.000
3. E' defINANZIATO totalmente, a seguito della rinuncia al finanziamento espressa dal soggetto titolare e per un ammontare pari a £ 600.000.000, l'intervento n. 5406 "Centro di accoglienza presso il Santuario di S. Maria delle Grazie".

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Sono parzialmente defianziati a seguito di riprogrammazione dei rispettivi soggetti titolari e su loro richiesta, i sottoindicati interventi, per un ammontare complessivo pari a £ 2.991.521.441:

n. 928 "Ristrutturazione ed adeguamento Chiesa Convento di S. Maria in Montalto", localizzato in Venosa, il cui stanziamento è ridotto da £ 3.000.000.000 a £ 450.000.000 con un'economia pari a £ 2.550.000.000;

n. 3224 "Ristrutturazione e completamento funzionale dell'ex asilo di Pitigliano ad uso residenze ricettive a basso costo per bisognosi e scopi sociali", localizzato in Pitigliano, il cui costo è ridotto da £ 1.164.000.000 a £ 883.700.000, ed il cui stanziamento è ridotto da £ 815.000.000 a £ 618.590.000, con economia pari a £ 196.410.000;

n. 6405 "Copertura in tensostrutture per aree di sosta veicoli leggeri in attesa di imbarco" localizzato in Ancona, il cui costo stimato e lo stanziamento sono ridotti da £ 800.000.000 a £ 554.888.559, con un'economia pari a £ 245.111.441.

5. Le risorse disponibili sono, pertanto rideterminate in complessive £ 25.957.232.964, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 5.201.358.167	Risorse residue nella disponibilità della Commissione
£ 9.482.353.356	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 del presente decreto
£ 7.682.000.000	Risorse provenienti da defianziamenti totali di cui al punto 2 del presente decreto
£ 600.000.000	Risorse provenienti da rinuncia di cui al punto 3 del presente decreto
£ 2.991.521.441	Risorse provenienti da defianziamenti parziali di cui al punto 4 del presente decreto

6. Sono assentite le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera, dovute a fatti imprevisi e imprevedibili o comunque necessarie per la piena funzionalità degli interventi indicati nell'allegato "B", per un importo complessivo pari a £ 24.131.636.300, restando, pertanto, nella disponibilità della Commissione £ 1.825.596.664.
7. Sono assentite a taluni interventi localizzati nella Regione Umbria e meglio specificati nell'allegato "B", le integrazioni di finanziamento a latere di ciascuno indicate, a titolo di reintegrazione di quota parte dei ribassi d'asta già erroneamente acquisiti alla disponibilità di questa Commissione, per garantire la piena realizzabilità degli interventi.
8. Sono assentite le modifiche al Piano concernenti le riduzioni del costo degli interventi, l'incremento delle quote di cofinanziamento e le disaggregazioni, le cancellazioni, le rettifiche per errore materiale, i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art.1, co. 4, della legge n. 270/1997, come specificato nell'allegato "B".
9. A parziale modifica del punto 2 della deliberazione n. 11/99 del 19 maggio 1999, è confermata l'inclusione nel Piano dell'intervento proposto dal comune di Udine, contraddistinto con il prot. 1676 - "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e Parcheggio tra via Medici e via del Vascello e relativi servizi", con l'originaria assegnazione finanziaria di £ 1.400 milioni e con i seguenti nuovi termini: lett. c) 1° luglio 1999; lett. d) 31 ottobre 1999.
10. Al punto 5, ultima parte, degli Indirizzi per l'attuazione finanziaria, di cui all'allegato A del DM 2 giugno 1998, le parole: "avvenuto trasferimento della proprietà" sono sostituite con le seguenti: "l'acquisita disponibilità del bene".

Roma, li 13 settembre 1999

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 luglio 1999

Allegato A

PROT	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILI LITA' (minori occorrenze finanziarie)
329	Capaccio	SA	RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	427.000.000
342	Codrangianos	SS	SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARGIA	COMUNE DI CODRONGIANOS	784.000.000
450	Moconesi	GE	RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FONTANABUONA GENOVA	COMUNE DI MOCONESI	19.000.000
461	Varallo	VC	COMPLETAMENTO DEL COSTRUENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI VARALLO SEZIA	207.000.000
643	Monterosso Al Mare	SP	COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE	259.000.000
1339	Noto	SR	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (GIA' CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	COMUNE DI NOTO	226.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1504	Sesto al Reghena	PN	PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI VICINI ALL'AREA PARCHEGGIO ESISTENTE	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	21.000.000
1589	Torino	TO	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA	CITTA' DI TORINO	1.707.000.000
1912	S. Marco in Lamis	FG	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATI M.	750.000.000
2111	Confienti	CZ	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	COMUNE DI CONFLENTI	114.000.000
2397	Romagnese	PV	RECUPERO E RIPRISTINO ANTICA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI ROMAGNESE	30.000.000
2570	Napoli	NA	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANIA	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	320.000.000
2581	Canossa	RE	RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSENA PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA	81.000.000
2775	Sarzana	SP	MUSEO DIOCESANO DI SARZANA NELL'ORATORIO DELLA MISERICORDIA	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	83.000.000
2777	La Spezia	SP	MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	827.000.000
3008	Padova	PD	RESTAURO DELLA CRIPTA CINQUECENTESCA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA	MONASTERO DI S. GIUSTINA	22.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3057	Genova	GE	OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN VINCENZO DE' PAOLI	FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI	36.000.000
3058	Genova	GE	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER OSPITALITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA	FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI	68.000.000
3185	Cefalu'	PA	RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO S. PASQUALE	CONGR. SUORE SERVE DEI POVERI	38.000.000
3417	Varallo	VC	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO	106.000.000
3572	Savona	SV	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAVONA	DIOCESI DI SAVONA	24.000.000
3697	Camposampiero	PD	RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	53.000.000
3719	Camposampiero	PD	RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO AD USO RICETTIVITA'	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	203.000.000
4660	Lucca	LU	SISTEMA MUSEALE DI ARTE SACRA DELLA DIOCESI DI LUCCA EX REAL COLLEGIO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NEL COMPLESSO DELL'EX REAL COLLEGIO	COMUNE DI LUCCA	917.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4884	Saludecio	RN	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO FUNZIONALE	COMUNE DI SALUDECIO	33.000.000
4989	Castelfiorentino	FI	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	253.000.000
5054	Ottone	PC	RECUPERO DI EDIFICIO MUNICIPALE PER UFFICI E MUSEO DI ARTE SACRA	COMUNE DI OTTONE	22.000.000
5949	Sotto Il Monte Giovanni XXIII	BG	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ABBAZIA DI S. EGIDIO, DEI LOCALI ANNESSI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI	PARROC. S. CUORE DI GESU' E S. EGIDIO	294.000.000
6121	Firenze	FI	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	197.000.000
6156	Mantova	MN	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	66.000.000
6222	Firenze	FI	SEGNALETICA E ARREDO GIUBILARE E DEI PERCORSI SPECIALI	COMUNE DI FIRENZE	152.000.000
6376	Loreto	AN	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F	COMUNE DI LORETO	724.000.000
6389	Orvieto	TR	RECUPERO DEL CONVENTO DI SAN CRISPINO DA VITERBO IN ORVIETO ACCOGLIENZA POVERA	PROV. ROMANA FRATI MINORI CAPPUCINI	56.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6390	Loreto	AN	RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN VIA SOLARI CENTRO STORICO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELLE ZONE DI SOSTA E RISTORO ED ALTRE ALLEGATO PIANO GENERALE PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI LORETO	35.000.000
6602	Perugia	PG	MOBILITA' PER DISABILI	COMUNE DI PERUGIA	47.000.000
6905	Assisi	PG	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	IST. TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	1.130.393
6986	Loreto	AN	AREA URBANA PREDISPOSTA PER LA SOSTA ED IL RISTORO	COMUNE DI LORETO	21.000.000
7014	Montecastrilli	TR	TORRE AMERINA	COMUNE DI MONTECASTRILLI	16.000.000
7201	Gubbio	PG	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO, RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCESCANO DI GUBBIO CHIESA DI SAN FRANCESCO E CONVENTO	CHIESA DI SAN FRANCESCO GUBBIO	8.445.753
7235	Assisi	PG	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO NEL BORGO MEDIEVALE DI SAN GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO	586.677
7245	Fossombrone	PS	CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI FOSSOMBRONE	PARROCCHIA S. ALDEBRANDO E AGOSTINO	20.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7268	Spoletto	PG	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO COLLICOLA IN SPOLETO QUALE CENTRO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIUBILARE E DELL'ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONNESSE, INFORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE	COMUNE DI SPOLETO	135.131.074
7570	Bevagna	PG	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL' EX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	MONASTERO SUORE CLAUSTRALI DOMENICANE SAN GIUSEPPE	79.059.459

Tot. Interventi

Tot.

43

Disponibilità
9.482.353.356

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato "B"

Riunione commissione ex lege n. 270/97 del 28 LUGLIO 1999

modifiche (*) degli interventi inclusi nel Piano degli Interventi di Interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
415	AA - 28 - ED - M	Manoppello	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANOPPELLO	410.983.700	340.983.700	70.000.000			
459	AA - 12 - ED - M	Lavagna	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI	COMUNE DI LAVAGNA	617.000.000	510.000.000	107.000.000	2/1998		PROROGA TERMINI LETT. C
474	AC - 28 - EC - L	Aquila	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N. 352	COMUNE DI AQUILEA	703.338.955	596.338.955	107.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA L. 46.358.355
475	AA - 28 - EC - L	Aquila	SISTEMA DI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI E PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N. 352 A SUD DELL'ABITATO	COMUNE DI AQUILEA	460.000.000	450.000.000	10.000.000	06/0999		MODIFICA LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
										RICHIESTA PROROGA TERMINI LETT. C

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 1 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

° rot.	Codice Uрге	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. attrib.	Finanz. Altre Fonti	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
477	AA-26-EC-L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL MUSEO NAZIONALE IN VIA CURIEL ANGOLO VIA JULIA AUGUSTA	COMUNE DI AQUILEIA	300.000.000	290.000.000	10.000.000			
479	AA-26-HA-L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITA' DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITA' ALLA BASILICA ED ALLE PRINCIPALI METE RELIGIOSE ARCHEOLOGICHE E TURISTICHE	COMUNE DI AQUILEIA	1.059.000.000	1.049.000.000	10.000.000	30/08/99	30/10/1999	RICHIESTA PROROGA TERMINI LETT. C
484	AA-26-FD-L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	1.564.000.000	1.554.000.000	10.000.000			PROROGA TERMINI LETT.C & LETT. D
507	ACI-26-GA-M	Avezzano	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	8.884.000.000	5.984.000.000	700.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 95.000.000
510	AC-41-EA-L	Napoli	SCAMBIATORE INTERMODALE CATAcombe DI SAN GENNARO	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	4.500.000.000	4.500.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 347.150.000
599	AB-11-FB-L	Matera	CASA DEL PELLEGRINO FORESTERIA OSTELLO DELLE MONACELLE	I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	4.441.651.000	3.486.651.000	945.000.000			DEFINANZIATO E CANCELLATO DAL PIANO
					4.691.651.000	3.746.651.000	945.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 250.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgo	Comune di Localizzazione	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi				Note	
			Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.		Termini Term. c) Let. d)
625	AC - 26 - FB - M	Lendinara	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI LENDINARA	CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA	2.176.997.000	1.628.997.000	550.000.000	
643	AC - 12 - GA - M	Monterosso Al Mare	RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE	4.329.000.000	4.059.000.000	270.000.000	31/10/99 PROROGA TERMINI LETT. D
650	AA - 12 - IA - M	Lucca	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ITINERARI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI LUCCA	12.424.872.000	8.724.872.000	3.700.000.000	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.900.000.000
713	AA - 23 - LC - L	Teolo	PARCHEGGIO DELL'ABBZIA DI PRAGLIA	COMUNE DI TEOLO	1.572.682.700	1.220.682.700	352.000.000	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 750.000.000
890	AC - 25 - GA - L	San Giovanni Rotondo	CASA DI ACCOGLIENZA PER IL CLERO	PROVINCIA DI FOGGIA DEI F.F.M.M. CAPPUCCINI	15.418.000.000	4.634.000.000	10.784.000.000	31/10/99 INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.54.544.700 E PROROGA TERMINI LETTERA D)
928	AC - 11 - GA - L	Venosa	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CHIESA CONVENTO DI S. MARIA IN MONTALTO	CURIA VESCOVILE	3.000.000.000	3.000.000.000	0	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.500.000.000
1098	AC - 14 - LA - L	Lecco	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALTARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTROSOFFITTO LIGNEO LACUNARI DELLE SALE A PIAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	3.445.530.000	1.093.530.000	2.328.000.000	RIDUZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO DI L. 2.350.000.000
					3.445.232.503	1.177.232.503	2.328.000.000	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.33.702.503

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urge	Codice Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi			Termini Lett. c)	Termini Lett. d)	Note
			Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. - ziamento attrib.			
1100	AA - 14 - GA - L Cavallino	RESTAURO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI PADRI DOMINICANI IN CAVALLINO PER USO RICETTIVO	COMUNE DI CAVALLINO	2.715.304.994	2.566.304.994	149.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.314.695.006
1121	AA - 13 - FD - L Cattolica	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	3.428.000.000	2.000.000.000	1.428.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.210.000.000
1124	AA - 26 - EA - L Arcugnano	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	529.000.000 644.000.000	529.000.000 539.000.000	0 119.000.000	31/10/1999	AUMENTO DEL COSTO DELL'INTERVENTO E DEL COFINANZIAMENTO DI L. 119.000.000 - MODIFICA TERMINE LETTERA D)
1124 3	AC - 14 - GA - B Lagonegro	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI	5.789.832.000	5.789.832.000	0		
1132	AC - 26 - EA - L Certosa Di Pavia	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RISTORO	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO	6.399.832.000 480.000.000 561.547.354	6.399.832.000 400.000.000 400.000.000	0 80.000.000 161.547.354		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.000.000.000
1138	AC - 41 - GA - M Napoli	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI	CASA RELIGIOSA DELLA COMP. DI GESU'	3.341.000.000	3.341.000.000	0		INTEGRAZIONE DEL COFINANZIAMENTO PER L.81.347.334
1504	AA - 14 - EA - M Sesto Al Reghena	PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI VICINI ALL'AREA PARCHEGGIO ESISTENTE	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	530.000.000	420.000.000	110.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.521.532.572
1512	AC - 31 - LC - M Chivari	AMPLIAMENTO DEL MUSEO DIOCESANO	DIOCESI DI CHIAVARI	185.000.000	195.000.000	0	30/10/99	PROROGA TERMINI LETT.D

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi									
n° rot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. - zamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Note
1514	AC - 31 - LA - L	Cogorno	RESTAURO CONSERVATIVO RIASSETTO E RECUPERO DI STABILI DISMESSI NEL COMPLESSO STORICO MONUMENTALE DI SAN SALVATORE CREAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA AD ESSO COLLEGATO	DIOCESI DI CHIAVARI	6.001.000.000	6.001.000.000	0		
1676	AA-28-EA-L	UDINE	PARCHEGGIO COLLEGATO ALLA STAZIONE FF.SS. E PARCHEGGIO FRA VIA MEDICI E VIA DEL VASCHELLO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI UDINE	2.000.000.000	1.400.000.000	600.000.000	15/10/99	PROROGA TERMINI LETT.D
1678	AA - 28 - FA - L	Udine	OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI UDINE	2.000.000.000	1.400.000.000	600.000.000		REINSERIMENTO NEL PIANO
1692	AA - 28 - IC - M	Gemona Del Friuli	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI PALAZZO ELTI PER MOSTRE ESPOSIZIONI PINACOTECA BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	310.000.000	248.000.000	62.000.000		DEFINANZIATO
1820	AC - 41 - LA - L	Milano	CHIARAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO	MONASTERO COMUNITA' CISTERCENSE CHIARAVALLE	2.491.240.000	2.491.240.000	0		AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.170.000.000
1912	AC - 12 - IA - L	San Marco In Lamis	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATI M.	5.085.000.000	4.155.000.000	930.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.330.500.000
1951	AA - 12 - EC - M	Levanto	CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA-RECUPERO EX CONVENTO DEGLI'AGOSTINIANI	COMUNE DI LEVANTO	4.035.000.000	3.255.000.000	780.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.530.000.000
					4.589.715.578	3.809.715.578	780.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA L.554.715.578

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini		Note
								Let. c)	Let. d)	
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
2005	AC-31-LA-M	Monte Sant'Angelo	IL PERCORSO DEL PELLEGRINO RESTAURO SCALINATA ANGIOINA E SISTEMAZIONE ACCESSI	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	3.578.948.000	2.828.948.000	650.000.000			
2094	AA-11-EC-M	Mottola	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI MOTTOLA	431.000.000	211.000.000	220.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.856.000.000
2123	AA-28-EA-M	San Sosti	AREA URBANA ATTREZZATA PER SOSTA PARCHEGGIO E SERVIZIO NAVETTE PER E DAL SANTUARIO	COMUNE DI SAN SOSTI	500.000.000	500.000.000	0	04/12/98		PROROGA TERMINI LETT.C
2358	AC-26-FB-L	Udine	OSTELLO PER LA GIOVENTU'	PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE SPOSO B.V.M.	301.000.000	200.000.000	101.000.000	14/05/99	30/10/99	PROROGA TERMINI LETT. C E LETT.D
2443	BA-25-FD-M	San Giovanni Rotondo	AFFITTACAMERE SCARALE	SCARALE GIUSEPPE	287.000.000	0	287.000.000	07/10/98		AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.194.571.594
2515	AC-41-FB-L	Venezia	ADEGUAMENTO CASA STUDENTESCA S. FOSCA CANNAREGIO ED AUMENTO CAPACITA' RICETTIVA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	3.555.000.000	2.825.000.000	730.000.000			PROROGA TERMINI LETT. C
3515/A			RESTAURO CASA STUDENTESCA S. FOSCA E AUMENTO CAPACITA' RICETTIVA		2.235.000.000	1.775.000.000	460.000.000	1/10/99		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETT.C
3515/B			ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA CASA STUDENTESCA S. FOSCA		1.320.000.000	1.050.000.000	270.000.000	4/12/98	8/10/99	FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETT. C e D)
2517	AC-41-GB-L	Venezia	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO ISTITUTO MARIA ASSUNTA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	5.200.000.000	2.500.000.000	2.700.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.1.027.885.000
2570	AC-41-FA-M	Napoli	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANIA	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	2.884.000.000	2.884.000.000	0	05/05/99		PROROGA TERMINI LETT.C

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 6 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urghe	Comune di Localizzazione	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi				Note				
			Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. - Attrib.		Finanz. - Altre Fonti	Termini Let. c)	Termini Let. d)	
2624	AC - 41 - FD - L	Palermo	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL COLLEGIO PER LE MISSIONI ALL'ESTERO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COLLEGIO MISSIONI ESTERE FRATI MINORI CAPPUCCINI	4.470.505.187	4.470.505.187	0				
2630	AA - 14 - FB - M	Carpinetti	RECUPERO E RIUSO DELLA MATILDICA PIEVE DI S. VITALE DELL'ANNEXA CANONICA	COMUNE DI CARPINETTI	1.868.000.000	900.000.000	968.000.000			31/10/99	PROROGA TERMINI LETTERA D)
2781	AC - 12 - IA - M	Brugnato	RECUPERO STRUTTURE EDIFICIO GIA' SEDE VESCOVILE IN BRUGNATO DA DESTINARE A SPAZIO CULTURALE RELIGIOSO POLIFUNZIONALE	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	2.031.616.668	900.000.000	1.131.616.668				AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.165.616.668
2839	AA - 20 - IA - B	Cagliari	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	1.504.000.000	1.504.000.000	0				INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.300.000.000
2864	AC - 12 - GA - B	San Marco In Lamis	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL CONVENTO DELLA CHIESA E DEL BOSCO DI MARIA SS. DI STIGNANO CON CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	PROV. DI S. MICHELE ARCANGELO FRATI MINORI	6.057.000.000	2.537.000.000	3.500.000.000				INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.407.000.000
3008	AC - 23 - LA - B	Padova	RESTAURO DELLA CRIPTA CINQUECENTESCA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA	MONASTERO SANTA GIUSTINA	6.175.000.000	5.575.000.000	600.000.000				INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.282.000.000
3048/ C	AC - 14 - FB - B	Verona	AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTIERIA DI VILLA FRANCESCATTI - OPERE DI RESTAURO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE	DIOCESI DI VERONA	348.000.000	348.000.000	0			09/04/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA G)
										15/07/99	PROROGA TERMINI LETT.C

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urcge	Codice Comuni di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi				Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
			Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. - ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.			
3163	AA - 14 - IA - B L'Aquila	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BASILICA DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO	SOPRINTENDENZA B.A.A.S. PER L'ABRUZZO	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0		
3172	AD - 22 - EA - L Loreto	PARCHEGGIO SCALA SANTA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	640.000.000	640.000.000	0	0	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 975.863.000	
3175	AD - 22 - FD - M Loreto	CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANNI PAOLO II PER GIOVANI PELLEGRINI D'ITALIA E D'EUROPA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	10.748.000.000	10.748.000.000	0	0	MODIFICA TERMINE LETTERA Q 16/06/1999	
3224	AC - 14 - FD - L Pitigliano	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EX ASILO DI PITIGLIANO AD USO RESIDENZE RICETTIVE A BASSO COSTO PER BISOGNOSI E SCOPPI SOCIALI	DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETTELLO	1.164.000.000	815.000.000	349.000.000	0	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.637.000.000	
3278/ D	AA - 12 - EA - M Ravenna	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (4° LOTTO) - VIABILITA' VEICOLARE DI COLLEGAMENTO FAR PARCO E VIA ROMEA	COMUNE DI RAVENNA	800.000.000	0	800.000.000	265.110.000	RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO DI L.194.110.000 E DEL COFINANZIAMENTO DI L.83.890.000	
3318	AC - 14 - GA - M Castiglione Del Capo	RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DI LEUCA MANUTENZIONE ORDINARIA STRACORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORME DEGLI EDIFICI MARIS STELLA E PENSIONE SANTUARIO	SANT. S. M. DI LEUCA E PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE MARIA V.	4.050.034.540	3.510.034.540	540.000.000	1.400.000.000	RICHIESTA AUMENTO COFINANZIAMENTO PER L.600.000.000	
3372	AC - 31 - EL - M Nova Ponente	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	CONVENTO DI PIETRALBA	1.133.000.000	1.133.000.000	0	0	INTEGRAZIONE FINANZIARIA PER L.220.000.000	

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

15/08/99

Pagina 8 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3592	AC - 26 - IA - L	Caorle	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA CANONICA DELLA PARROCCHIA S. STEFANO	PARROCCHIA S. STEFANO PROFOMARTIRE DI CAORLE	400.000.000	200.000.000	200.000.000			
3768	AC - 26 - GB - M	Domodossola	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI SPIRITUALITÀ ROSMINIANA	PROV. ITALIANA DI S. MAURIZIO DELL'ISTITUTO DELLA CARITÀ	723.000.000	623.000.000	100.000.000	12/10/1998		MODIFICA TERMINE LETTERA Q
4104	AA - 26 - GA - M	L'Aquila	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO	PROVINCIA DI L'AQUILA	2.152.000.000	2.152.000.000	0			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 47.609.230
4463	AC - 14 - LA - M	Chiavenna	ALLESTIMENTO MUSEO DEL TESORO	PARROCCHIA SAN LORENZO	990.000.000	490.000.000	500.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 380.000.000
4732	AC - 26 - LA - M	Catania	RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CATTEDRALE DI CATANIA	BASILICA CATTEDRALE S. AGATA	2.342.000.000	2.342.000.000	0			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 28.255.685
4817	AA - 14 - IA - M	Gorizia	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEIA	COMUNE DI GORIZIA	4.470.000.000	4.470.000.000	0	31/7/99		DEFINANZIATO E CANCELLATO DAL PIANO
4862	AC - 52 - GB - M	San Giuliano Milanese	RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLE CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DI UNA ANTICA FORESTIERIA MONASTICA	MONASTERO BENEDETTINE SS. PIETRO E PAOLO	2.471.716.057	1.381.716.057	1.090.000.000			PROROGA TERMINI LETT. C
4943	AA - 12 - EE - M	Volterra	RESTAURO BASTIONE MEDICEO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI/AREE DI SOSTA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI VOLTERRA	372.000.000	222.000.000	150.000.000		30/10/99	PROROGA TERMINI LETT. D
								01/04/99		PROROGA TERMINI LETT. C

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codece Urtge	Comune di Localizzazione	Il titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4990	AC - 12 - FD - M	Vergemoli	ADATTABILITA' E RISTRUTTURAZIONE LOCALI DELLA FORESTERIA DELL'EREMO	PARROCCHIA S. TOMMASO APOSTOLO IN CALOMINI	270.000.000	200.000.000	70.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 100.000.000
5000/ A	AC - 12 - HA - M	Sant'Ambrogio Di Torino	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - MONASTERO NUOVO	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO DELL'ISTITUTO DELLA CARITA'	2.287.452.510	2.287.452.510	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 81.391.537
5025	AA - 53 - EA - L	Bologna	PARCHEGGIO FOSCOLO PORTA SARAGOZZA	COMUNE DI BOLOGNA	3.135.690.000	2.735.690.000	400.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 32.000.000
5046	AC - 12 - LA - L	Bobbio	CENTRO DI ACCOGLIENZA LE GRAZIE	PARROCCHIA DEL DUOMO	200.000.000	130.000.000	70.000.000			MODIFICA DEI TERMINI LETTERA C e D
5083	AC - 14 - LA - B	Catanzaro	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	4.688.475.000	2.199.475.000	2.500.000.000			CAMBIO TITOLO
5103	AC - 41 - GB - B	Venezia	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIONATO MARIA IMMACOLATA A DORSODURO	CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'IST. DELLE F.D.C	16.807.000.000	3.687.000.000	13.120.000.000			FRAZIONAMENTO
5103/A			RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIONATO MARIA IMMACOLATA A DORSODURO - 1° STRALCIO		9.341.028.470	3.687.000.000	5.654.028.470			FRAZIONAMENTO
5103/B			RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIONATO MARIA IMMACOLATA A DORSODURO - 2° STRALCIO		7.465.971.530	0	7.465.971.530			FRAZIONAMENTO
5200	AC - 11 - GA - L	Cesinaro	PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	CHIESA S. EUFEMIA	1.600.000.000	1.600.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 300.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 10 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice rot. Uрге		Comune di Localizzazione		Titolo dell'intervento		Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi				Termini Lett. d)		Note		
				Soggetto beneficiario		Costo Stimato	Finanz. attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. c)	Termini Lett. d)				
3219	AC - 14 - IA - B	Napoli		INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO		9.203.000.000	8.203.000.000	1.000.000.000						
3311	AA - 26 - IA - B	Reggio		ABBAZIA DI VALLOMBROSA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ELETTRICHE ATMOSFERICHE		10.203.000.000	9.203.000.000	1.000.000.000						INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.1.000.000.000
3342	AA - 12 - IC - M	Fontanello		RECUPERO DI PARTE DI ROCCA SANVITALE A MUSEO DI BENI CULTURALI A CARATTERE RELIGIOSO AD INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELL'ESISTENTE MUSEO ROCCA SANVITALE		3.471.000.000	3.271.000.000	200.000.000						INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.330.000.000
3371	BA - 25 - FD - L	San Giovanni Rotondo		RISTRUTTURAZIONE MURARIA EDIFICIO PREESISTENTE E DESTINAZIONE AD AFFITTA CAMERE		139.000.000	0	139.000.000			30/10/99			PROROGA TERMINI LETT.D
3406	AC - 25 - LA - M	San Giovanni Rotondo		CENTRO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL SANTUARIO DI S. MARIA DELLE GRAZIE CAPPUCCINI		600.000.000	600.000.000	0						RINUNCIA ALL'INTERVENTO
3464	AC - 14 - GB - L	Pisa		RECUPERO DI LOCALI SOTTOTETTO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA		450.000.000	250.000.000	200.000.000						RINUNCIA ALL'INTERVENTO
3469	AA - 12 - EL - M	Firenze		CHIESE DI TOSCANA IMPIANTI ILLUMINOTECNICI E INFORMATIVI LUMINA. CITTÀ DI TOSCANA.		500.200.000	250.000.000	250.200.000						AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO E DEL COSTO DELL'INTERVENTO DI L. 50.200.000
3487	AC - 51 - GB - L	Trieste		ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CONVITTO		7.708.000.000	3.820.000.000	3.888.000.000						CAMBIO TITOLO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

30/07/99 PROROGA TERMINI LETT. D

Pagina 11 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi			Termini Lett. d)	Termini Lett. e)	Note
			Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.			
5492	AA - 51 - EL - L	Trieste	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	850.000.000 1.137.650.000	730.000.000 891.150.000	120.000.000 246.500.000	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 161.150.000 E AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 176.500.000	
5493	AA - 51 - FA - L	Trieste	FORESTERIA PER I PELLEGRINI	1.620.000.000 2.113.800.000	1.620.000.000 2.066.300.000	0 27.500.000	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 463.300.000 E DI COFINANZIAMENTO DI L. 273.500.000	
5738	AB - 14 - ED - M	Torvisio	ITINERARI RELIGIOSI ITALIANI E SVILUPPO SERVIZI DI SUPPORTO PER IL 2000	311.000.000	140.000.000	171.000.000		
5768	AC - 23 - FB - L	Monsellica	OSTELLO S. GIACOMO	260.000.000	250.000.000	30.000.000	31/10/99 RICHIESTA PROROGA TERMINI LETT. D	
5848	AC - 14 - LA - B	Racale	CONSolidAMENTO RIsANAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. M. LA NOVA ED ANNESSO CONVENTO	307.869.690 1.667.020.944	277.869.690 1.667.020.944	30.000.000 0	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 27.869.690	
6012	AC - 11 - LA - L	Matera	ITINERARIO DEGLI HABITAT RUPESTRI CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI DI MATERA	1.797.020.944 8.387.340.000	1.797.020.944 2.887.340.000	0 5.500.000.000	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 116.000.000	
6018	CA - 14 - NC - M	Como	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7528	8.624.574.442 32.000.000.000	3.124.574.442 0	5.500.000.000 32.000.000.000	PROROGA TERMINI LETT. C E LETT. D ED INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER L. 237.244.442	
6020	CA - 14 - NC - M	Milano	INAIL 2000 PROT. 7508	21.600.000.000 62.000.000.000	0 0	21.600.000.000 62.000.000.000	RI DUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO	
6022	CA - 12 - NC - M	Pavia	INAIL 2000 PROT. 7610	28.743.000.000 28.000.000.000 28.620.000.000	0 0 0	28.743.000.000 28.000.000.000 28.620.000.000	RI DUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO AUMENTO COSTO DELL'INTERVENTO	

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

V° Prot.	Codice Uрге	Comune di Localizzazione	TITOLO dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6031	CA - 12 - NB - M	Parma	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7650	ALFA INGEGNERIA S.R.L. - PARMA	12.000.000.000	0	12.000.000.000			
6035	CA - 14 - NA - M	Ferrara	INAIL 2000 PROT. 7586	COOPERATIVA COSTRUTTORI - FERRARA	42.000.000.000	0	42.000.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6036	CA - 41 - NB - M	Bologna	INAIL 2000 PROT. 7630	GALOTTI S.P.A. - BOLOGNA	36.000.000.000	0	36.000.000.000			RIDUZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO
6046	CA - 26 - NB - M	Perugia	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7702	EDILPINA - PERUGIA	33.000.000.000	0	33.000.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6048	CA - 14 - NC - M	Perugia	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7603	MARINELLI S.P.A. - PERUGIA	11.000.000.000	0	11.000.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6049	CA - 14 - NC - M	Terni	INAIL 2000 PROT. 7764	COMUNE DI TERNI	10.200.000.000	0	10.200.000.000			AUMENTO COSTO DELL'INTERVENTO
6050	CA - 22 - ND - M	Loreto	INAIL 2000 PROT. 7732	IMAR SRL - LORETO	25.000.000.000	0	25.000.000.000			RIDUZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO
6051	CA - 14 - NA - M	Ancona	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7659	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	10.000.000.000	0	10.000.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6052	CA - 14 - PD - M	Montemarciano	INAIL 2000 PROT. 7512	EDIL RIVIERA S.R.L. - MONTEMARCIANO	11.000.000.000	0	11.000.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6058	CA - 14 - NC - M	Montesilvano	INAIL 2000 PROT. 7487	ARTEL SOCIETA' IMMOBILIARE S.R.L. - MONTESILVANO	34.000.000.000	0	34.000.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi			Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
				Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. attrib.			
6408	AB - 51 - ED - F	Ancona	SISTEMA INFORMAZIONE PASSEGGERI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	80.000.000	80.000.000	0		
6526	AC - 14 - GA - L	Fabiano	CASA ALBERGO PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PROV. ITAL. CONGR. FRATELLI DI N. SIGNORA	7.892.000.000	3.630.000.000	4.262.000.000	18/09/99	PROROGA TERMINI LETT.C
6528	AA - 14 - FB - L	Genoa	CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA ED OSTELLO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO FUMI SERMATTEI	COMUNE DI GENGA	1.882.580.975	1.782.580.975	100.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.347.765.064
6692	AC - 14 - GA - M	San Benedetto Del Tronto	RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO S. GIOVANNI B. PER LA CREAZIONE DI RICTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA	IST. S. GIOVANNI BATTISTA	930.000.000	730.000.000	200.000.000	30/10/99	PROROGA TERMINI LETT. D
6705	AA - 13 - EA - L	Montelupo	AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSO LA SOSTA E LA MOBILITA'	COMUNE DI MONTEFALCO	1.800.000.000	1.280.000.000	320.000.000		AUMENTO COFINANZIAMENTO PER L.347.765.064
6775	AC - 20 - LA - B	Jesi	RESTAURO DELLE COPERTURE DELLA CATTEDRALE DI S. SETTIMIO DUOMO DI JESI	ENTE DIOCESI DI JESI	650.000.000	455.000.000	195.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.346.006.000
6804	AC - 13 - LA - B	Nordia	RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN BENEDETTO	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	3.830.102.202	3.640.058.853	190.045.349		INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PER L.70.895.036
					3.902.102.202	3.702.102.202	200.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.72.006.000 MENO L.9.954.651 PER RECUPERO SOMME REGIMARIE E AUMENTO COFINANZIAMENTO PER L.9.954.651

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi			Note				
				Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamto attrib.		Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	
6905	AD - 21 - HA - L	Assisi	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	IST.TERZIARIE FRANCISCANE ALCANTARINE	3.207.430.000	1.042.975.000	1.564.455.000				
					3.209.694.786	1.642.975.000	1.566.715.786				AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 1-086.311 PER RECUPERO SOMME DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
6906	AC - 21 - LC - B	Assisi	REALIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI E SALA POLIVALENTE DI S. RUFINO MARIA DELLE ROSE	CATTEDRALE DI S. RUFINO	1.058.380.000	637.996.887	420.383.333				
					1.058.380.000	638.069.272	420.316.728				AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DI L. 72-603 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO PER RECUPERO RIBASSI
7102	AD - 21 - IA - M	Assisi	PATRIARCALE BASILICA DI S. FRANCESCO DI ASSISI PALAZZO PAPALE MUSEO PALAZZO NORD PALAZZO OVEST RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ACCOGLIENZA	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	19.583.063.000	18.583.083.000	1.000.000.000				
7143	AA - 22 - EA - L	Porto Recanati	PISTA CICLABILE PORTO RECANATI LORETO	COMUNE DI PORTO RECANATI	300.000.000	300.000.000	0				INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 3.000.000.000
					300.000.000	300.000.000	0				PROROGA TERMINI LETT. C
7167	AC - 13 - GA - M	Sant'Anatolia Di Narco	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERA IN SAN FELICE	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	1.909.397.000	1.770.147.087	139.249.813				
					2.109.396.415	1.999.396.415	200.000.000				INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI L. 139-249.813 E DEL COFINANZIAMENTO DI L. 40-730.087 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
7201	AC - 13 - IA - B	Gubbio	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCISCANO DI GUBBIO CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO	CHIESA DI S. FRANCESCO	3.041.894.746	2.955.340.499	86.554.247				
					3.050.340.499	2.955.340.499	95.000.000				AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 8-445.753 PER RECUPERO SOMME DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice rot. Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi			Note			
			Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. - zamento attrib.		Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)
'374 AB - 13 - FB - M	Spoleto	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA SUD DELL'EX OSPEDALE S. CARLO BORROMEO IN OSTELLO	IST. CIV. RIUNITI DI BENEFICENZA	6.383.848.760	4.163.848.760	2.220.000.000			
'465 AA - 51 - EA - M	Ancona	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	COMUNE DI ANCONA	6.671.382.420	4.451.382.420	2.220.000.000	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.287.535.660		
'516 AC - 13 - IA - B	Foligno	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOC. FOLIGNO CATTEDRALE DI S. FELICIANO	2.381.860.000	1.881.860.000	500.000.000	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.630.000.000		
'570 AC - 14 - FD - B	Bevagna	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI BEVAGNA	11.078.067.989	6.840.610.420	4.237.457.568	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.1.078.067.989		
'581 AD - 21 - LA - B	Assisi	RESTAURO PIAZZA INFERIORE SAN FRANCESCO	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO ASSISI	2.225.984.000	1.805.043.459	420.940.541	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.1.759.397 PER RECUPERO RIBASSO A CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO		
7654 CA - 28 - NA - L	Vicenza	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7536	SOCIETA' PARCO CITTA' S.P.A.	2.505.043.459	2.095.043.459	500.000.000	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.200.000.000 ED AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.79.039.459 PER RECUPERO SOMME DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA		
7656 CA - 23 - NB - M	Padova	INAIL 2000 PROT. 7559	ASS. IMPR. MANTOVANI - PD E COOP. IL PROGRESSO - FE	8.308.108.123	7.808.108.123	500.000.000	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.773.000.000		
				8.579.108.123	8.079.108.123	500.000.000			
				36.000.000.000	0	36.000.000.000			
				29.150.000.000	0	29.150.000.000			
				60.000.000.000	0	60.000.000.000			
				59.730.000.000	0	59.730.000.000			

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi				Note
			Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz. Let. c)	
7658	CA - 41 - NB - M Bologna	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7773	SOCIETA' COSTRUZIONI EDILI ZUCCHINI S.P.A.	16.000.000.000 15.600.000.000	0 0	16.000.000.000 15.600.000.000	RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
7660	CA - 21 - ND - M Perugia	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7766	SOCIETA' ARMIN S.R.L.	11.000.000.000 10.860.000.000	0 0	11.000.000.000 10.860.000.000	RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio del Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le delibere

Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 1999

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTO la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in ordine alle richieste di modifica inoltrate da taluni soggetti titolari di interventi inclusi nel Piano;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all "A" sono risultate necessarie, per la relativa realizzazione minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di £ 31.069.730.000;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia al finanziamento, formulata dai soggetti titolari degli interventi sotto indicati:

- n. 1681 "Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi" £. 960.000.000*
- n. 3173 "Centro Casa del Carmelo" £. 2.100.000.000*

che vengono, pertanto, cancellati dal Piano;

RITENUTO di disporre il definanziamento totale, con il conseguente recupero di £ 131.000.000, dell'intervento rubricato:

*n. 5645 "Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto servoscala",
per l'intervenuta realizzazione dei lavori a totale carico del soggetto proponente;*

RITENUTO di prendere atto della rinuncia al finanziamento formulata dal titolare dell'intervento rubricato:

n. 4530 "Recupero della Cripta medioevale per accoglienza dei pellegrini",

il cui stanziamento è ridotto da £ 620.000.000 a £ 59.000.000, con una economia immediata pari a £ 561.000.000, fatta salva la maggior somma che risulterà all'esito della procedura contabile di recupero delle somme non utilizzate;

RITENUTO di assentire alle richieste di riduzione delle quote di cofinanziamento, conseguenti alla riduzione del costo degli interventi, in quanto tali da non precludere la piena funzionalità degli interventi stessi, nella loro originaria configurazione;

RITENUTO di prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento proposte da taluni soggetti beneficiari e del conseguente aumento del costo stimato dell'intervento, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

RITENUTO di accogliere la ulteriore richiesta di disaggregazione dell'intervento rubricato con n. 6104, disposto con D. M del 6 agosto 1998, pubblicato su G.U n. 252 del 28 10 1998, al fine di razionalizzare le procedure realizzative con conseguente modifica del titolo e della ripartizione della quota di finanziamento e di cofinanziamento;

RITENUTO di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dall'Ente Arcidiocesi di Firenze, soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con n. 4062, in ordine al subentro nella titolarità dell'intervento medesimo, da parte del Convitto Ecclesiastico della Calza, quale usuario dell'immobile oggetto dei lavori;

RITENUTO di dover rettificare il D.M. n. 183/RC del 27 gennaio 1999, approvativo della delibera della Commissione n. 8/98 del 16 dicembre 1998, nella parte in cui dispone il definanziamento totale per £ 1.800.000.000 dell'intervento rubricato con n. 897 "Recupero e riorganizzazione funzionale del Chiostrò monumentale del Convento di San Lorenzo da adibire a ricettività in comunità religiose e i relativi servizi", anziché il definanziamento parziale per £ 1.620.000.000, avendo l'U.R.C.G.E. già provveduto a trasferire al soggetto beneficiario £ 180.000.000, a titolo di anticipazione per gli oneri di progettazione;

RITENUTO, sulla base della documentata richiesta dei soggetti titolari, di accogliere il cambio del titolo di taluni interventi in conseguenza della diversa localizzazione o tipologia realizzativa;

RITENUTO di dover correggere alcuni errori materiali segnalati dai soggetti interessati ed attinenti la localizzazione o l'individuazione del soggetto beneficiario relativo;

RITENUTO di includere nel Piano nuovi interventi, in quanto coerenti con i criteri di cui al D.M. 17 settembre 1997 ed anche in conformità al parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, relativamente agli interventi localizzati nella regione Toscana ed afferenti la proposta di modificazione del Piano, approvata dalla Commissione con deliberazione n. 8 del 16 dicembre 1998, le cui statuizioni, in parte de qua, sono state stralciate con relativo D.M. di approvazione n. 183/RC del 27 gennaio 1999;

All'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £. 31.069.730.000.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono totalmente defINANZIATI, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, gli interventi sottoindicati, per un ammontare complessivo di £ 3.060.000.000:

- n. 1681 "Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi" £. 960.000.000
- n. 3173 "Centro Casa del Carmelo" £. 2.100.000.000

E' totalmente defINANZIATO, per un ammontare di £. 131.000.000, le conseguentemente cancellato dal Piano l'intervento rubricato:

n. 5645 "Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto servoscala",

avendo il titolare provveduto a realizzare i lavori a proprio totale carico.

E' parzialmente defINANZIATO l'intervento rubricato con n. 4530 "Recupero della Cripta medioevale per accoglienza dei pellegrini", il cui stanziamento è ridotto da £ 620.000.000 a £ 59.000.000, con una economia immediata pari a £ 561.000.000, e fatta salva la maggior somma che risulterà all'esito della procedura contabile di recupero delle somme non utilizzate.

A rettifica del D. M. n. 183/RC del 27 gennaio 1999, in ordine al defINANZIAMENTO totale di £ 1.800.000.000 dell'intervento rubricato con n. 897, è disposto il defINANZIAMENTO parziale di £ 1.620.000.000, avendo l'URCGE già trasferito al titolare dell'intervento la somma di £ 180.000.000 per oneri di progettazione, fino all'esito del procedimento di recupero delle somme non utilizzate, previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge n. 270/97.

Le risorse disponibili sono, pertanto determinate in complessive £ 44.512.172.360, pari alla somma dei seguenti importi:

- | | |
|-----------------|--|
| - 9.690.442.360 | Risorse rese disponibili e non riassegnate con D.M. del 27 gennaio 1999; |
| -31.069.730.000 | Risorse rivenienti da ribassi d'asta di cui al punto 1; |
| - 3.191.000.000 | Risorse rivenienti da defINANZIAMENTI totali di cui ai punti 2 e 3; |
| - 561.000.000 | Risorse rivenienti dal defINANZIAMENTO parziale di cui al punto 4. |

Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d), dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, i cambi titolo e di soggetto beneficiario, le aggregazioni e disaggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato B;

Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato B, per un ammontare complessivo di £ 2.430.000.000.

Sono inclusi nel Piano, in coerenza con le finalità della legge e sulla base di esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato C, per un importo complessivo di £ 41.732.000.000, restando nella disponibilità della Commissione £ 350.172.360

Il Segretario
f.to BARBATO

Il Presidente
f.to MICHELI

Deliberazione n. 10 del 21 aprile e del 4 maggio 1999

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

Sedute del 21 aprile e 4 maggio 1999

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in ordine alle richieste di modifica inoltrate da taluni soggetti titolari di interventi inclusi nel Piano;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'all. "A" sono risultate necessarie, per la relativa realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di £ 22.768.000.000;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia alla realizzazione dell'intervento rubricato con n. 2143, "Tecnologie ambientali e mobilità - Proposta per un nuovo parco archeologico a Pompei", comunicata dal soggetto privato titolare dello stesso per motivi afferenti il finanziamento e le procedure amministrative di attuazione;

RITENUTO di disporre il definanziamento totale dell'intervento rubricato con n. 2803, "Realizzazione servizi igienici" localizzato a Venezia, a causa della persistente indisponibilità dell'area che ne compromette la realizzabilità in tempo utile per le finalità giubilari;

RITENUTO di disporre il definanziamento totale dell'intervento rubricato con n. 5556, "Riqualificazione complesso edilizio e monastico Santuario di Crea", in quanto, sulla base della documentazione acquisita in atti è emerso che i lavori erano già ultimati all'atto dell'inclusione nel Piano venendo con ciò meno il presupposto del disposto finanziamento a carico dei fondi di cui alla legge n. 270/97;

RITENUTO di prendere atto della riduzione del costo stimato, con conseguente definanziamento parziale, formulata dai rispettivi soggetti beneficiari, relativamente ai seguenti interventi n. 3133, "Progetto di restauro delle coperture, rifacimento impermeabilizzazioni e impianti nel complesso della Cattedrale" di Ventimiglia, la cui assegnazione finanziaria è, pertanto, ridotta di £ 1.010.000.000;

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 3638, "Infopoint passepartout 2000 – Sistema di nodi informativi dedicati ai disabili" di Napoli, la cui assegnazione finanziaria è, pertanto, ridotta di £ 177.680.000;

n. 6681, "Ammodernamento della casa di S. Francesco" di Loreto, la cui assegnazione finanziaria è, pertanto, ridotta di £ 320.000.000;

RITENUTO di prendere atto dell'incremento della quota di cofinanziamento proposto dal titolare dell'intervento n. 3373, "Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio destinato all'accoglienza dei pellegrini" di Nova Ponente, a parità di costo, con equivalente riduzione della quota di finanziamento ex lege n. 270/97, per un importo di £ 1.329.000.000;

RITENUTO di prendere atto, altresì, dell'incremento della quota di cofinanziamento proposto dal titolare dell'intervento n. 5954, "Restauro conservativo delle superfici esterne ed interne della chiesa cattedrale" di Brescia, e del conseguente aumento del costo dell'intervento, disponendo la riduzione della assegnazione finanziaria ex lege n. 270/97 nella misura di £ 67.080.000, quale importo differenziale dell'intervenuto ribasso d'asta;

RITENUTO di disporre la cancellazione dal Piano dei 51 interventi indicati nell'allegato "B", di titolarità dell'Ente Poste Italiane, accogliendo la contestuale richiesta di accorpamento degli stessi in un unico intervento, rubricato col n. 17.729, al fine di agevolare le procedure realizzative;

RITENUTO di dare mandato all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi di avviare la procedura di contestazione e messa in mora, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ai fini dell'eventuale definanziamento, nei confronti dei titolari degli interventi rubricati con i nn. 1172, 1375, 1378, 1589, 3731, 3958, 4739, 4741, 5147, nonché nei confronti dei titolari di quegli interventi per i quali risultino scaduti i termini di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), della legge n. 270/97, senza che sia stato comunicato l'intervenuto affidamento dei lavori né sia stata richiesta l'eventuale proroga di detto termine;

RITENUTO di assentire le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera dovute a fatti imprevisi e imprevedibili, formulate dai titolari di taluni interventi;

RITENUTO di accogliere le richieste di disaggregazione di alcuni interventi inclusi nel Piano con la contestuale modifica del titolo, al fine di razionalizzarne le procedure realizzative;

RITENUTO di assentire la richiesta di riduzione del numero dei posti letto relativi all'intervento, "Ristrutturazione ed ampliamento dell'abbazia di S. Cassiano, al fine di consentire l'accoglienza dei pellegrini" rubricato col n. 7394, in quanto connessa a sopravvenute prescrizioni della competente Soprintendenza;

RITENUTO di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con le prescrizioni temporali indicate dalla legge;

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Nuoro, soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con n. 1806, "Ristrutturazione Cattedrale" di Nuoro, in ordine al subentro nella titolarità dell'intervento medesimo, della Curia Vescovile di Nuoro – Capitolo della Cattedrale di Nuoro, in quanto proprietaria dell'immobile oggetto dell'intervento;

RITENUTO di reinserire nel Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 6, della legge n. 270/97, l'intervento di un soggetto privato rubricato col n. 4966, "Riqualificazione di area industriale dismessa", a seguito della pronuncia resa dal TAR competente in sede cautelare, volta a riaprire il procedimento amministrativo per l'acquisizione dei necessari atti autorizzativi;

RITENUTO di dover correggere alcuni errori materiali relativi all'imputazione delle quote di finanziamento e di cofinanziamento, in ordine a taluni interventi e derivanti da disaggregazioni disposte con precedenti decreti;

CONSIDERATO che per numerosi interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 270/97 si registrano incrementi anche superiori al 10% del costo complessivo dell'opera, con riferimento agli oneri per spese di progettazione, appalto, direzione dei lavori a collaudo;

CONSIDERATO che molti interventi inclusi nel Piano sono in avanzata fase di esecuzione e che si rende, pertanto, necessario fornire ai soggetti beneficiari chiarimenti e precisazioni in ordine alle modalità della richiesta sia per l'erogazione dell'ulteriore quota di finanziamento del 35% dell'importo impegnato, che per il trasferimento della residua somma fino al 100% del finanziamento attribuito;

CONSIDERATO che la legge n. 109/94 è stata modificata ed integrata dalla legge 415/98, con la conseguente estensione ai soggetti privati di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), dell'applicazione di ulteriori articoli della legge stessa e che pertanto occorre procedere all'aggiornamento di quanto indicato nel D.M. 2 giugno 1998, all. "A", relativo agli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.";

All'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'all. "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 22.768.000.000.

L'intervento "Tecnologie ambientali e mobilità - Proposta per un nuovo parco archeologico a Pompei", rubricato col n. 2143, incluso nel Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 6, della legge n. 270/97, è cancellato dal Piano, a seguito di rinuncia del soggetto privato titolare dello stesso.

E' totalmente defanziato, per un ammontare di £ 176.000.000 l'intervento rubricato con n. 2803 "Realizzazione servizi igienici" localizzato a Venezia, a causa della persistente indisponibilità dell'area che ne compromette la realizzabilità in tempo utile per le finalità giubilari.

E' totalmente defanziato, per un ammontare di £ 340.000.000, l'intervento rubricato n. 5556, "Riqualficazione del complesso edilizio e monastico Santuario di Crea", in quanto, sulla base della documentazione acquisita in atti i relativi lavori erano già ultimati all'atto dell'inclusione nel Piano, venendo con ciò meno il presupposto del disposto finanziamento a valere sulle risorse della legge n. 270/97.

L'intervento rubricato con il n. 3133, "Progetto di restauro delle coperture, rifacimento impermeabilizzazioni e impianti nel complesso della Cattedrale" di Ventimiglia, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £ 2.610.000.000 a £ 1.600.000.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 2.4000.000.000 a £ 1.390.000.000, con un'economia pari a £ 1.010.000.000.

L'intervento rubricato con il n. 3638, "Infopoint passepartout 2000 - Sistema di nodi informativi dedicati ai disabili" localizzato nell'area di Napoli, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £ 1.881.000.000 a £ 1.703.320.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 1.781.000.000 a £ 1.603.320.000, con un'economia pari a £ 177.680.000.

L'intervento rubricato con il n. 6681, "Ammodernamento della casa di S. Francesco" localizzato a Loreto, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £ 1.000.000.000 a £ 680.000.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 400.000.000 a £ 80.000.000, con un'economia pari a £ 320.000.000.

E' assentita la richiesta di incremento della quota di cofinanziamento, proposto dal titolare dell'intervento n. 3373, "Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio destinato all'accoglienza dei pellegrini" localizzato a Nova Ponente, a parità di costo, con equivalente riduzione della quota di finanziamento ex lege n. 270/97, per un importo di £ 1.329.000.000

E' assentita la richiesta di incremento della quota di cofinanziamento, proposto dal titolare dell'intervento rubricato con n. 5954, "Restauro conservativo delle superfici esterne ed interne della chiesa cattedrale" di Brescia, e del conseguente aumento del costo dell'intervento, ed è disposta la riduzione della assegnazione finanziaria ex lege n. 270/97 nella misura di £ 67.080.000, quale importo differenziale dell'intervenuto ribasso d'asta;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risorse disponibili sono, pertanto, determinate in complessive £ 26.717.932.360, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 530.172.360	Risorse nella disponibilità della Commissione di cui al D. M. 9 febbraio 1999
£ 22.768.000.000	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento, di cui al punto 1 della presente deliberazione
£ 516.000.000	Risorse provenienti da definanziamenti totali, di cui ai punti 3 e 4 della presente deliberazione
£ 1.507.680.000	Risorse provenienti da definanziamenti parziali, di cui ai punti 5, 6 e 7 della presente deliberazione
£ 1.396.080.000	Risorse provenienti da definanziamenti parziali, di cui ai punti 8 e 9 della presente deliberazione

L'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di avviare la procedura di contestazione e messa in mora, ai fini dell'eventuale definanziamento ed anche ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990, nei confronti dei titolari di interventi per i quali risultano scaduti i termini di cui all'art. 1, co. 4, lettera c) della legge n. 270/97, senza che sia stato comunicato

l'intervenuto affidamento dei lavori né sia stata richiesta l'eventuale proroga di detto termine, nonché nei confronti dei titolari degli interventi sottoelencati, per le motivazioni a latere indicate:

nn. 1172, 1375, 1378, 5147, in quanto hanno comunicato una consistente riduzione della quota di cofinanziamento;

nn. 1589, 3731, per aver richiesto un differimento del termine di cui all'art. 1, co. 4, lettera c) della legge 270/97, tale da ridurre considerevolmente l'originaria previsione dei giorni di lavorazione;

n. 3958, per aver proposto una modifica della tipologia dell'intervento da ricettività a restauro di beni culturali, implicando la mancata realizzazione dei previsti posti letto;

n. 4741, in quanto dalla documentazione in atti si evince che i lavori oggetto dell'intervento sono stati appaltati ed in larga misura ultimati prima della inclusione nel Piano di cui alla legge n. 270/97 e che negli atti deliberativi di approvazione delle aggiudicazioni e dei contratti non si fa alcun riferimento alle risorse di cui alla citata legge;

n. 4739, in quanto, da notizie apparse sulla stampa, la realizzazione di tale intervento potrebbe configgere con la salvaguardia dei Beni culturali e compromettere la stabilità dei monumenti circostanti.

E' assentita la richiesta del soggetto beneficiario dell'intervento "Ristrutturazione ed ampliamento dell'abbazia di S. Cassiano al fine di consentire l'accoglienza dei pellegrini" rubricato col n. 7394, volta a realizzare 59 posti letto, in luogo dei 71 originariamente previsti, a causa delle sopravvenute prescrizioni della competente Soprintendenza;

E' reinserito nel Piano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 270/97, l'intervento rubricato col n. 4966 "Riqualificazione di area industriale dismessa", di titolarità di un soggetto privato a seguito della pronuncia resa dal TAR competente in sede cautelare e volta a riaprire il procedimento amministrativo per l'acquisizione dei necessari atti autorizzativi;

Sono assentite le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera, dovute a fatti imprevedibili e imprevedibili relative agli interventi indicati nell'allegato "B", per un importo complessivo pari a £ 26.219.874.193, restando, pertanto, nella disponibilità della Commissione £ 498.058.167.

Sono accorpati in un unico intervento che viene incluso nel Piano col n. 17.729, i 51 interventi indicati nell'allegato "B", di titolarità dell'Ente Poste Italiane, al fine di agevolare le procedure realizzative.

Sono assentite, altresì, le richieste di disaggregazione relative ad alcuni interventi già inclusi nel Piano, quelle di cambio titolo, di cambio di soggetto beneficiario e quelle attinenti le proroghe di termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97 e sono corretti meri errori materiali relativi alla diversa imputazione delle quote di finanziamento e di cofinanziamento, come indicato nell'allegato "B",

Come previsto dal punto 3 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano di cui all'allegato "A" del D.M. 2. 6. 1998, gli oneri relativi alle attività preliminari e strumentali alla realizzazione dell'intervento, quali la progettazione, ogni tipo di indagine conoscitiva (preventiva o contestuale all'esecuzione), l'espletamento dell'appalto dei lavori e la stesura dei contratti, la predisposizione dei prescritti Piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 494/96, l'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento, di Direttore dei Lavori, di Coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, il collaudo ed eventuali studi di impatto ambientale, devono, di norma, essere contenuti nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'opera, salvo particolari situazioni opportunamente

motivate. Ove tali oneri risultino superiori a detta soglia, le relative parcelle Professionali, redatte nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti tariffe, devono essere vidimate dal competente Ordine Professionale. Al fine del contenimento della spesa: pubblica, ove la progettazione sia affidata dalla stazione appaltante a più professionisti riuniti in Collegio, secondo la procedura di cui all'art. 7 della Legge 2.3.1949, n. 143, viene riconosciuto il compenso per un solo incarico professionale, rimanendo a carico del soggetto beneficiario gli eventuali, ulteriori compensi. Qualora la progettazione sia stata affidata ad un progettista esterno alla stazione appaltante, ove l'Amministrazione non ritenga di svolgere la Direzione dei Lavori con proprio personale, questa deve essere affidata allo stesso progettista, salvo che per oggettiva e documentata impossibilità. Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 4, comma 1, della legge n. 270/97, ove si dà facoltà ai soggetti beneficiari di avvalersi dei Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche in qualità di Stazioni Appaltanti "anche relativamente alla progettazione", il conferimento di incarichi a Società di Servizio per la compilazione dei progetti, per consulenze e per ogni altra attività connessa all'espletamento delle gare ed alla gestione dei lavori deve essere specificatamente ed adeguatamente motivata, ai fini del riconoscimento delle relative spese.

Il punto 10 dell'allegato "A" al D.M. 2.6.1998 viene così modificato:

"10. All'atto della richiesta di erogazione dell'ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato dovrà essere inoltrata all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario pubblico o di un suo delegato apposita certificazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi del punto 8 nella quale siano elencate le spese sostenute suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa. In allegato alla citata certificazione, quale parte integrante, deve essere trasmessa una relazione illustrativa che in riferimento all'elencazione delle spese precisi i titoli di spesa emessi. Per i soggetti beneficiari assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla legge n. 415/98, all'atto della richiesta di erogazione dell'ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato dovrà essere inoltrata all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, apposita certificazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato, ai sensi del punto 8, nella quale siano elencate le spese sostenute suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa, nonché dichiarazione relativa all'avvenuta verifica del versamento da parte delle Imprese dei

contribuiti previdenziali ed assistenziali relativi alla mano d'opera impiegata. Con riferimento all'elencazione riportata nella citata certificazione dovrà essere allegata, in copia conforme, la seguente documentazione:

Lavori:

- certificati di pagamento intestati all'Impresa titolare dell'appalto e relative fatture quietanzate;
- fatture quietanzate relative ad eventuali prestazioni in economia certificate dal Direttore dei Lavori;
- certificati di pagamento intestati ad eventuale impresa sub-appaltatrice e relative fatture con allegato il contratto di subappalto e la connessa autorizzazione della stazione appaltante;

Espropri:

- contratto di acquisto od altro titolo ablativo e relativa trascrizione al patrimonio del soggetto beneficiario;
- pagamenti effettuati per l'occupazione e l'indennità di esproprio intestati ai proprietari dei beni;

Forniture:

- Certificato di pagamento intestato al fornitore e relative fatture quietanzate;
- Certificato di collaudo qualora la fornitura sia stata liquidata in un'unica soluzione;

Rilievi, studi e sondaggi:

- Contratti o lettere d'incarico e relative fatture quietanzate;
- Certificato di regolare esecuzione della prestazione sottoscritto dal Responsabile del procedimento qualora sia stato effettuato il pagamento in un'unica soluzione.

Progettazione :

- Parcella professionale vistata dal competente Ordine Professionale, con esclusione di quelle validate dalle Amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;
- Convenzione d'incarico o lettera d'incarico;
- Fatture quietanzate del Professionista incaricato.

Altre spese tecniche:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Parcella professionale sia per il Direttore dei Lavori che per il Coordinatore della Sicurezza vistata dal competente ordine professionale, con esclusione di quelle validate dalle Amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;

- Convenzione o lettera d'incarico del professionista;

- Fatture quietanzate del Professionista;

- Fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la Commissione di gara, per la pubblicazione del Bando, per le spese postali e per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione certificate dal responsabile del procedimento;

Ricevute di versamenti effettuati alle Amministrazioni Comunali per il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni;

Allacciamenti:

- fatture quietanzate e versamenti effettuati alle aziende comunali o alle società di servizio per contributi o spese di allaccio;

Altro:

Fatture relative ad eventuali prestazioni o lavori specialistici ove sia chiaramente indicato in relazione all'intervento l'oggetto ed il periodo di svolgimento delle attività."

Il punto 11 dell'allegato "A" al D.M. 2.6.1998 viene così modificato:

"11. Le ulteriori somme residue, fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, saranno erogate dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario pubblico o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento, per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale successiva utilizzazione per le finalità della legge 270/97. Copia conforme dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento dovranno essere trasmessi all'ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi per la conseguente acquisizione agli atti. Per i soggetti beneficiari assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla Legge n. 415/98, le ulteriori somme residue fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto saranno erogate dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle eventuali procedure di acquisto di immobili o aree attivate e siano elencate tutte le spese sostenute, suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione, con riferimento al Quadro tecnico Economico acquisito agli

atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa. Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale successiva utilizzazione per le finalità della legge 270/97. Alla richiesta vanno, inoltre, allegati in copia conforme i certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento.

Il punto 6 dell'allegato "A" al D.M. 2 giugno 1998 è sostituito dal seguente:

"6. Sono consentite variate distribuzioni di spesa tra le categorie di lavoro corrispondenti a opere civili, opere impiantistiche, arredi, attrezzature ed altre, nel rispetto del totale complessivo dichiarato, qualora non comportino modifiche sostanziali all'intervento finanziato."

Ad integrazione e modifica del D.M. 2.6.1998 all. "B" ai soggetti ecclesiastici beneficiari degli interventi inclusi nel Piano di cui alla Legge n. 270/97 assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla Legge 415/98, si applicano tutte le disposizioni della legge ad esclusione di quelle introdotte dagli artt. 7, 14, 19, comma 2 e 2 bis, 27, 32, 33.

Il Segretario
f.to BARBATO

Il Presidente
f.to MICHELI

Deliberazione n. 11 del 19 maggio 1999

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

Seduta del 19 maggio 1999

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'all. "A" sono risultate necessarie, per la relativa realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di £ 9.709.000.000;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi sull'esito della procedura di contestazione e messa in mora anche ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ai fini dell'eventuale definanziamento degli interventi individuati nella precedente riunione del 4 maggio 1999;

RITENUTO, sulla base delle controdeduzioni acquisite in esito alla procedura di contestazione e messa in mora, di disporre il definanziamento totale per complessive £ 13.824.000.000 degli interventi sottoindicati:

- n. 198 - "Costruzione nuovo parcheggio bus turistici" localizzato a Napoli;
- n. 1676 - "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi" localizzato a Udine;
- n. 3958 - "Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostrini monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività" localizzato a Brescia;
- n. 4741 - "Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo Comunale" localizzato a Massa Marittima;
- n. 6523 - "Trasformazione distributiva dell'immobile - struttura ricettiva a basso costo" localizzato a Fabriano.

RITENUTO di concedere ai destinatari della procedura di contestazione e messa in mora, che non abbiano ancora inviato le proprie controdeduzioni, una proroga del termine, a carattere ultimativo, di 10 giorni, per fornire all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi i riscontri richiesti;

RITENUTO di prendere atto delle rinunce a realizzare gli interventi rubricati con i nn. 3362 "Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico" localizzato a Venezia, e 1313, "Opere di restauro ed adeguamento

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzionale del Convento S. Maria degli Angeli" localizzato a Montoro Superiore, comunicate dai soggetti titolari degli interventi medesimi, con un complessivo recupero di risorse finanziarie pari a £ 2.863.000.000;

RITENUTO di prendere atto della riduzione del costo dell'intervento rubricato con n. 5147 - "Itinerari religiosi nella Città - riqualificazione del sagrato della Basilica giubilare di S. Lorenzo Maggiore" localizzato a Milano e della relativa diminuzione

della quota di cofinanziamento, e di disporre, altresì, la riduzione dell'assegnazione finanziaria ex lege 270/97 nella misura di £ 900.000.000.

RITENUTO di prendere atto della riduzione del costo stimato, con conseguente definanziamento parziale, degli interventi sottoindicati e con un complessivo recupero di risorse finanziarie pari a £ 1.965.000.000:

n. 3018, "Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali" a Verbania, la cui assegnazione finanziaria ex lege 270/97 è ridotta da £ 1600 milioni a £ 635 milioni, con un'economia pari a £ 965 milioni;

n. 3997, "Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda" a Padova, la cui assegnazione finanziaria ex lege 270/97 è ridotta da £ 4 miliardi a £ 3 miliardi, con un'economia pari a £ 1 miliardo;

RITENUTO di dover correggere un mero errore materiale attinente all'importo dell'assegnazione finanziaria ex Legge n. 270/97 dell'intervento "Riqualificazione della struttura Istituto Don Orione appartenente alla Provincia religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di Don Orione" a Messina, rubricato col n. 616, per la cui realizzazione sono assentite assegnazione £ 7.118.532.000 anziché £ 7.388.532.000, con una economia pari a £. 270 milioni;

RITENUTO di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

RITENUTO di cancellare dal Piano su richiesta del soggetto titolare i seguenti interventi, a causa di accertati problemi legati alla realizzazione degli stessi:

n. 6015 - INAIL - Torino

n. 6016 - INAIL - Sarzana

n. 6030 - INAIL - San Benedetto Val di Sambro

n. 7659 - INAIL - Firenze

RITENUTO di includere nel Piano, sulla base delle esigenze strategiche segnalate dall'INAIL, i seguenti interventi:

6024, "Soc. Sparaco Spartaco s.p.a. - Verona;

6032, "Soc. Rover Est s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l. - Bologna

6038, "Soc. Grandi Lavori Fincosit s.p.a. - Pisa

RITENUTO di includere nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo, gli interventi indicati nell'allegato "C" per un importo complessivo di £ 24.827.000.000;

All'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'all. "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 9.709.000.000;

Sono totalmente definanziati, per un ammontare complessivo pari a £ 13.824.000.000, gli interventi sottoindicati e per l'importo a fianco di ciascuno evidenziato:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- n. 198 - "Costruzione nuovo parcheggio bus turistici" localizzato a Napoli - £ 5.600 milioni;
- n. 1676 - "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi" localizzato a Udine - £ 1.400 milioni;
- n. 3958 - "Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostrì monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività" localizzato a Brescia - £ 3.804 milioni;
- n. 4741 - "Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo Comunale" localizzato a Massa Marittima - £ 1.120 milioni;
- n. 6523 - "Trasformazione distributiva dell'immobile - struttura ricettiva a basso costo" localizzato a Fabriano. - 1.900 milioni.

Sono concessi ulteriori 10 giorni, a carattere ultimativo, ai destinatari della procedura di contestazione e messa in mora che non abbiano ancora inviato le proprie controdeduzioni all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi.

Sono defanziati totalmente, a seguito della rinuncia al finanziamento espresso dai soggetti titolari e per un ammontare complessivo pari a £ 2.863.000.000, i sottoindicati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- n. 1313 "Opere di restauro ed adeguamento funzionale del Convento S. Maria degli Angeli", localizzato a Montoro Superiore - £ 200 milioni
- n. 3362, "Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico" localizzato a Venezia - £ 2.663 milioni.

E' assentita la riduzione del costo dell'intervento rubricato con n. 5147 - "Itinerari religiosi nella Città - riqualificazione del sagrato della Basilica giubilare di S. Lorenzo Maggiore" localizzato a Milano e la relativa diminuzione della quota di cofinanziamento ed è disposto, altresì, il definanziamento parziale nella misura di £. 900.000.000 milioni.

Sono parzialmente defanziati, per un ammontare complessivo pari a £ 1.965.000.000, i sottoindicati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- n. 3018, "Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali" a Verbania, la cui assegnazione finanziaria è ridotta da £ 1.600 milioni a £ 635 milioni, con un'economia pari a £ 965 milioni;
- n. 3997, "Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda" a Padova, la cui assegnazione finanziaria è ridotta da £ 4 miliardi a £ 3 miliardi, con un'economia pari a £ 1 miliardo.

E' corretto l'errore materiale attinente all'importo dell'assegnazione finanziaria ex Lege n. 270/97 dell'intervento "Riqualificazione della struttura Istituto Don Orione appartenente alla Provincia religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di Don Orione" a Messina, rubricato col n. 616, per la cui realizzazione sono assentite £ 7.118.532.000 anziché £ 7.388.532.000, con una economia pari a £. 270 milioni;

Le risorse disponibili sono, pertanto rideterminate in complessive £ 30.029.058.167, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 498.058.167	Risorse residue nella disponibilità della Commissione
£ 9.709.000.000	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 della deliberazione
£ 16.687.000.000	Risorse provenienti da definanziamenti totali di cui al punto 2 e 4 della presente deliberazione
£ 3.135.000.000	Risorse provenienti da definanziamenti parziali di cui ai punti 5, 6 e 7 della presente deliberazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono cancellati dal Piano, su richiesta del soggetto titolare e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti interventi, come indicato nell'allegato "B"

<i>n. 6015- INAIL - Torino</i>	<i>£ 23 miliardi</i>	
<i>n. 6016- INAIL - Sarzana</i>	<i>£ 12 miliardi</i>	
<i>n. 7659 INAIL- Firenze</i>	<i>£ 47 miliardi</i>	
<i>n. 6030 INAIL -San Benedetto Val di Sambro</i>		<i>£ 25 miliardi</i>

Sono inclusi nel Piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7, della legge n. 270/97 e sulla base delle esigenze strategiche segnalate dal soggetto titolare l'INAIL, i seguenti interventi, come indicato nell'allegato "B":

- n. 6024, "Soc. Sparaco Spartaco s.p.a. - Verona - £ 40.866 milioni;*
- n. 6032, "soc. Rover Est s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l. - Bologna - £ 51.360 milioni;*
- n. 6038, "soc. Grandi Lavori Fincosit s.p.a. - Pisa - £ 49.800 milioni.*

Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, come indicato nell'allegato "B".

Sono inclusi nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato "C" per un importo complessivo di £ 24.827.000.000; restano pertanto nella disponibilità della Commissione £ 5.201.358.167

*Il Segretario
f.to BARBATO*

*Il Presidente
f.to MICHELI*

Deliberazione n. 12 del 28 luglio 1999

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

Seduta del 28 luglio 1999

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel pi. degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religio-tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la propria deliberazione n. 11/99 del 19 maggio 1999 ed avuto specifico riguardo al punto 12 della stessa nel quale si atto che restano nella disponibilità della Commissione £ 5.201.358.167;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico economico di progetto esecutivo, dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'allegato "A" sono risultate necessarie, per la relativa realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di £ 9.482.353.356

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi sulle procedure di contestazione e messa in mora attivate ai fini dell'eventuale definanziamento di interventi ricompresi nel Piano;

VALUTATE le controdeduzioni del soggetto titolare dell'intervento n. 1678 "Ostello per la gioventù" localizzato a Udine, esito alla contestazione e messa in mora ed all'avviso di avvio di procedimento di definanziamento, anche ai sensi dell'art. 241/1990, e ritenutele insufficienti a superare le ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della contestazione addebito;

RITENUTO di provvedere al definanziamento degli interventi n. 510 "Scambiatore intermodale catacombe di San Gennaro" e 4732 "Restauro ed adeguamento funzionale della Cattedrale di Catania" per i quali, i rispettivi soggetti titolari nonostante l'ulteriore termine di 10 giorni assegnato dalla Commissione per corrispondere alle contestazioni in ordine al mancato rispetto del termine di cui alla lett. c) art. 1 c.4, della legge n.270/91, non hanno ancora fatto pervenire le relative controdeduzioni, richiesta motivata di proroga del detto termine;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia a realizzare l'intervento rubricato con n. 5406 "Centro di accoglienza presso Santuario di S. Maria delle Grazie", localizzato in S. Giovanni Rotondo, comunicata dal soggetto titolare dell'intervento medesimo, con il conseguente recupero di risorse finanziarie pari a £ 600.000.000;

RITENUTO di accogliere le richieste di riduzione del costo di taluni interventi formulata dai rispettivi soggetti titolari a seguito riprogrammazione e di disporre conseguentemente il definanziamento parziale ;

RITENUTO di dover sospendere temporaneamente in via cautelativa , a seguito della recente indagine giudiziaria avviata sull'impiego di fondi pubblici, la statuizione contenuta nella delibera n. 11/99 del 19/5/99, al punto sub 10, nella parte in cui

include nel Piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7, della legge n. 270/1997, gli interventi indicati dall'INAIL e rispettivamente rubricati con n. 6032 "Soc. Rover s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l.- Bologna" - costo stimato £ 51.360.000.000"; n. 6024 "Soc. Sparaco Spartaco Spa - Verona" costo stimato £ 40.866.000.000; n. 6038 "Soc. Grandi Lavori Fincosit Spa - Pisa" costo stimato £ 49.800.000.000 e di darne debita informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al fine di acquisire indicazioni utili per le proprie definitive determinazioni;

RITENUTO di accogliere la richiesta, in data 12 maggio 1999, con la quale l'INAIL , relativamente agli interventi già ricompresi nel Piano - sulla base di proprie esigenze strategiche - ha comunicato il definitivo importo dei costi di singoli interventi, accertato all'esito delle relative procedure contrattuali, nella misura risultante dall'allegato B;

CONSIDERATO che con la richiamata deliberazione n. 11/99 è stato disposto il definanziamento totale dell'intervento rubricato con n. 1676 concernente "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e Parcheggio tra via Medici e via del Vascello e relativi servizi", localizzato nel comune di Udine e finanziato con fondi ex lege n. 270/97 per £ 1.400 milioni;

CONSIDERATO che, nelle more del perfezionamento dell'anzidetta statuizione, con successive comunicazioni in atti, il Comune di Udine, soggetto beneficiario dell'intervento succitato, ha rappresentato la possibilità di "modificare le mere modalità costruttive della struttura individuata all'epoca della presentazione della domanda di finanziamento che avevano portato alla redazione del primo cronoprogramma" e pertanto ha proposto un nuovo cronoprogramma rispettoso dei tempi di realizzazione sanciti dalla legge n. 270/1997;

RITENUTO di accogliere il nuovo cronoprogramma proposto dal Comune di Udine per la realizzazione dell'intervento in questione e, pertanto, di reinserire tale intervento nel Piano con l'originario finanziamento di £ 1.400 milioni;

CONSIDERATO che taluni interventi inclusi nel piano e localizzati nella Regione Umbria, espongono a titolo di cofinanziamento risorse finanziarie assentite dalla detta Regione a valere sui fondi ex lege 30 marzo 1998 n. 61;

CONSIDERATO altresì che, a seguito dell'intervenuto espletamento della gara di appalto, sia la Commissione ex lege n. 270/97, che la Regione Umbria hanno acquisito alla propria disponibilità, per intero, le economie rivenienti dalle dette gare, così compromettendo la realizzazione dei relativi interventi;

RITENUTO opportuno riconoscere proporzionalmente alla quota di finanziamento pubblico la corrispettiva quota di recupero delle economie di gara da parte della Regione Umbria e di questa Commissione;

RITENUTO di assentire le richieste di integrazione finanziaria formulate dai titolari di taluni interventi e connesse a varianti in corso d'opera dovute a fatti imprevisi e imprevedibili, o comunque necessarie per la piena funzionalità degli interventi medesimi;

RITENUTO di accogliere le richieste di disaggregazione di alcuni interventi inclusi nel Piano con la contestuale modifica del titolo, al fine di razionalizzarne le procedure realizzative;

RITENUTO di accogliere le richieste di incremento delle quote di cofinanziamento, di cambio di titolo, di riduzione del costo di taluni interventi, di differimento dei termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

RITENUTO di dover procedere alla modifica del punto 5 degli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria" di cui all'all. A al D.M. 2 giugno 1998, nella parte relativa al trasferimento delle risorse concernenti l'acquisizione dell'immobile oggetto dell'intervento, in ragione della complessità anche temporale, della conclusione della procedura di trasferimento di proprietà;

All'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, si ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato "A", nella misura di fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 9.482.353.356;

Sono totalmente definanziati, a seguito dell'esito negativo del relativo procedimento di contestazione e messa in mora, per ammontare complessivo di £ 7.682.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, gli interventi:

n. 1678 - "Ostello per la Gioventù"	£	840.000.000
n. 510 - "Scambiatore intermodale Catacombe di San Gennaro"	£	4.500.000.000
n. 4732 - "Restauro ed adeguamento funzionale della Cattedrale di Catania"	£	2.342.000.000

E' definanziato totalmente, a seguito della rinuncia al finanziamento espressa dal soggetto titolare e per un ammontare pari a 600.000.000, l'intervento n. 5406 "Centro di accoglienza presso il Santuario di S. Maria delle Grazie";

Sono parzialmente definanziati a seguito di riprogrammazione dei rispettivi soggetti titolari e su loro richiesta, i sottoindici interventi, per un ammontare complessivo pari a £ 2.991.521.441:

- n. 928 "Ristrutturazione ed adeguamento Chiesa Convento di S. Maria in Montalto", localizzato Venosa, il cui stanziamento è ridotto da £ 3.000.000.000 a £ 450.000.000 con un'economia pari a £ 2.550.000.000;
- n. 3224 "Ristrutturazione e completamento funzionale dell'ex asilo di Pitigliano ad uso residenze ricettive a basso costo per bisognosi e scopi sociali", localizzato in Pitigliano, il cui costo è ridotto da £ 1.164.000.000 a £ 883.700.000, ed il cui stanziamento è ridotto da £ 815.000.000 a £ 618.590.000, con economia pari a £ 196.410.000;
- n. 6405 "Copertura in tensostrutture per aree di sosta veicoli leggeri in attesa di imbarco" localizzato in Ancona, il cui costo stimato e stanziamento sono ridotti da £ 800.000.000 a £ 554.888.559, con un'economia pari a £ 245.111.441;

Le risorse disponibili sono, pertanto, rideterminate in complessive £. 25.957.232.964, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 5.201.358.167	Risorse residue nella disponibilità della Commissione
£ 9.482.353.356	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 della presente deliberazione
£ 7.682.000.000	Risorse provenienti da definanziamenti totali di cui al punto 2 della presente deliberazione
£ 600.000.000	Risorse provenienti da rinunce di cui al punto 3 della presente deliberazione
£ 2.991.521.441	Risorse provenienti da definanziamenti parziali di cui al punto 4 della presente deliberazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E' sospesa, in via temporanea e cautelativa, la statuizione di cui al punto 10 della deliberazione n. 11/99, nella parte in cui dispone l'inclusione nel Piano dei seguenti interventi proposti dall'INAIL:

n. 6032, "soc. Rover Est s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l. - Bologna -
£ 51.360.000.000;

n. 6024 "Soc. Sparaco Spartaco Spa - Verona" £ 40.866.000.000;

n. 6038 "Soc. Grandi Lavori Fincosit Spa - Pisa" £ 49.800.000.000;

Sono assentite le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera, dovute a fatti imprevisti e imprevedibili o comunque necessarie per la piena funzionalità degli interventi indicati nell'allegato "B", per un importo complessivo pari a £ 24.131.636.300, restando, pertanto, nella disponibilità della Commissione £ 1.825.596.664;

Sono assentite a taluni interventi localizzati nella Regione Umbria e meglio specificati nell'allegato "B", le integrazioni di finanziamento a latere di ciascuno indicate, a titolo di reintegrazione di quota parte dei ribassi d'asta già erroneamente acquisiti alla disponibilità di questa Commissione, per garantire la piena realizzabilità degli interventi;

Sono assentite le modifiche al Piano concernenti le riduzioni del costo degli interventi, l'incremento delle quote di cofinanziamento e le disaggregazioni, le cancellazioni, le rettifiche per errore materiale, i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997, come specificato nell'allegato "B".

A parziale modifica del punto 2 della deliberazione n. 11/99 del 19 maggio 1999, è confermata l'inclusione nel Piano dell'intervento proposto dal comune di Udine, contraddistinto con il : prot. 1676 - "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e Parcheggio tra via Medici e via del Vascello e relativi servizi", con l'originaria assegnazione finanziaria di £ 1.400 milioni e con i seguenti nuovi termini: lett. c) 1° luglio 1999; lett. d) 31 ottobre 1999;

Al punto 5, ultima parte, degli Indirizzi per l'attuazione finanziaria, di cui all'allegato A del DM 2 giugno 1998, le parole: "avvenuto trasferimento della proprietà" sono sostituite con le seguenti: "l'acquisita disponibilità del bene"

*Il Segretario
f.to BARBATO*

*Il Presidente
f.to MICHELI*

